

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

FECHA

1512024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3111 - 2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE INICIO: 01/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2023

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 169,456,000.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 169,456,000.00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3.

CONTRATISTA:

INJEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2656

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento				Mejoramiento			
	Rehabilitación				Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			Estructuras	Túneles			
	Puentes				Puentes			
	Pontones				Pontones			
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros				Otros (Especificar cuales)				
(Especificar)								

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 142,400,000.00	\$ 27,056,000.00	\$ 169,456,000.00
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)			\$ -
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 142,400,000.00	\$ 27,056,000.00	\$ 169,456,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 35,600,000.00	\$ 6,764,000.00	\$ 42,364,000.00	\$ 42,364,000.00
SUBTOTAL BÁSICO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
VALOR BÁSICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2.5%)				
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 35,600,000.00	\$ 6,764,000.00	\$ 42,364,000.00	\$ 42,364,000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	
		FECHA	15 1 2024 (Día / Mes / Año)
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 169,456,000.00		MANO DE OBRA CALIFICADA: 10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 127,092,000.00		MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 75.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
(ANTES - DURANTE - DESPUES) LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 27+0831 (7008)		(ANTES- DURANTES - DESPUES) MEJORAMIENTO CAPA DE RODADURA EN EL PR 22+0250 (7008)	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div><div></div><div>Firma Ruben Isaza Palacio Representante Legal COINZA ING SAS NIT: 901.164.885 cel: 311 308 3033</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>			

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3111-2023	Contratista:	INJEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S
Contrato de Interventoría No.	2656-2023	Interventoría:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA

Objeto Contrato de Obra:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3.

INFORME MENSUAL No.	3	MES O PERIODO:	01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
----------------------------	---	-----------------------	----------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	INTRODUCCION		8
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		10
2.4	Características técnicas del proyecto		11
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		13
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		13
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	36
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	38
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	40
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		14
5.1	Información general del contrato		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		15
5.3	Informes especialistas y profesionales		16
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		16
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		16
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	49
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	51
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	55
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	57
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		17
8	Anexos		20
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		60
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 
 Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

**CONTRATO No. 3111 DE 2023: SERVIVIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA - ALTO DEL
POZO, PR 07+0000 - PR 38+0000 LOTE 3.**



**PERIODO: 01 al 31 de diciembre de 2023
Ocaña, 01 de enero de 2024**

CONTRATO No. 2656 DE 2023

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA
TERRITORIAL OCAÑA GRUPO 1 LOTE 10**



CONTENIDO

Anexo 1	Informe Semanal	4
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	4
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8		4
Anexo 4	Estado General del Tiempo	4
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	4
Anexo 6	Actas de comité	4
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría	4
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	4
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	4
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	4
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada	4
1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1	Localización	6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..	7
2.3	Inventario y Estado Inicial de la Vía	7
2.4	Características Técnicas del Proyecto	7
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	Información General del Contrato	8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	8
3.3	Seguimiento ítems no previstos	9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría	9
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	9
4.1	Informe Semanal	9
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	9
4.3	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra	9
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	10
4.5	Estado General del Tiempo	10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	10
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	10
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	10
4.9	Otros documentos seguimiento mensual:	10
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
5.1	Información general del contrato	11
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	11
5.3	Informes especialistas y Profesionales	12
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC	12
5.5	Informe Matriz de Riesgos	12
5.6	Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría	12
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
6.1	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría	13
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	13
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	13
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	13
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	13



7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13
8.	ANEXOS.....	14
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....	14
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.....	14
	LIMPIEZA ALCANTARILLA	15
	PR29+0534	15
	LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS.....	15
	PR33+0000	15
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales	16
8.4	Copia de la Bitácora del mes Correspondiente.....	16
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	8
	FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8	8
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	9
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	10
	ACTAS DE COMITE	11
	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO	16



LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Informe Semanal Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
Anexo 5	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Anexo 6	Actas de comité
Anexo 7	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
Anexo 8	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
Anexo 9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9
Anexo 10	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Anexo 11	Relación de la correspondencia generada
Anexo 12	Bitácora del mes correspondiente



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías ha destinado \$ 538,709,446,00 acumulados para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1 LOTE 10 y \$169.456.000,00 acumulados para ejecutar OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la vía objeto del alcance: Vía 7008, carretera Ocaña - Alto del Pozo desde el PR 07+0000 al PR 38+0000.

Esta carretera sirve de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña con el oriente del país y la frontera colombo venezolana, desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 2656 de 2023, por parte del CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 3111 de 2023, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de noviembre del 2023.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Norte de Santander, en la vía: Ocaña – Alto del Pozo, en el tramo que va desde el PR 07+0000 al PR 38+0000, en el corredor vial ruta 70 tramo 08 que une la frontera Colombo Venezolana, en el puente internacional Simón Bolívar.



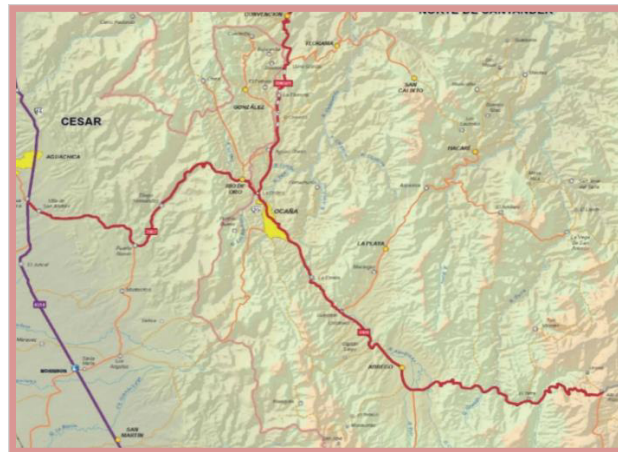
El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento Norte de Santander y Cesar.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

- Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
- Códigos de las vías.
- Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

No.	TERRITORIAL	CÓDIGO DE LA VIA	NOMBRE DE LA VIA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULADO PARCIAL (Km)
1	OCAÑA - NORTE DE SANTANDER	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO	PR 07+0000	PR 38+0000	31,00	31,00
TOTAL, DE KILÓMETROS							31,00

2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que benefician u optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.



3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	3111 DE 2023
OBJETO	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Ocaña sectores 7008 Ocaña – Alto del Pozo, PR 07+0000 - PR 38+0000.
CONTRATISTA	INJEKOP Construcciones y Mantenimiento de obras civiles S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1:	31 DE ENERO DE 2024
PLAZO FINAL	HASTA 31 DE ENERO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 169.456.000,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 169.456.000,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

SEMANA 10 DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000; ROCERÍA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000; LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000; LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000; MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 13+0500 AL PR 17+0000; RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000; ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 22+0000 AL PR 25+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000; EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 11 DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.



SEMANA 12 DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

SEMANA 13 DEL 22 AL 28 DICIEMBRE DEL 2023:

SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000; MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN LA RUTA 7008; ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000; VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas por la microempresa, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al contrato mencionado, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por las microempresas, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal, Control Aportes Legales y seguridad Social Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 2)



4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo
Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
Ver formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 **No Aplica**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento Programa de Obra
(No Aplica)

- Acta de Comité de Obra
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Actas de Reunión
Ver Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**



5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	2656 de 2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, GRUPO 1, LOTE 10.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA
GESTOR DEL PROYECTO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	31 DE ENERO DE 2024
FECHA INICIACIÓN	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 375.843.799,00 (incluido IVA)
VALOR QUE SE ADICIONA 1:	162.865.647,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 538.709.446,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.
- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.



- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.
- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y Profesionales
(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC
(No aplica).

5.5 Informe Matriz de Riesgos
(No aplica)

5.6 Información otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 6)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 7)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 8)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 9)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**
Ver Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**
- Plan de Cargas o reprogramación al plan de Cargas aprobado
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**
- Seguimiento al Plan de Cargas
Ver Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene realizando todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección Territorial quien venía realizando la supervisión de los contratos de mantenimiento rutinario.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

- La principal actividad ejecutada por la microempresa de mantenimiento rutinario fue realizar las actividades de mantenimiento periódico de las vías en jurisdicción de la territorial Ocaña.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- El inspector SISO de la administración vial semanalmente realiza la supervisión al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El estado de salud de los asociados es bueno. Se confirma que vienen desarrollando actividades en la vía los asociados contratados.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

(Ver anexo 11)

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.



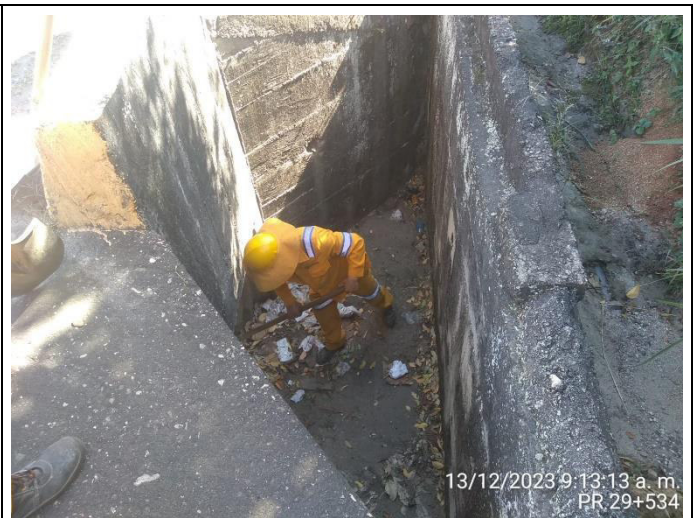
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

**CONTRATO No. 3111 DE 2023: CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO,
PR 07+0000 - PR 38+0000.**

COOPERATIVA INJEKOP – DICIEMBRE DE 2023



**MEJORAMIENTO TAPA DE RODADURA
PR 13+0650**



**LIMPIEZA ALCANTARILLA
PR29+0534**



**MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE
RODADURA
PR15+0843**



**LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS
PR33+0000**



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

8.4 Copia de la Bitácora del mes Correspondiente

(Ver anexo 12)



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

ANEXOS



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 1

INFORME SEMANAL FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL						CÓDIGO	MEPI-0001-R-15-FR-3		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1	DE	2

							FECHA	8	12	2023
							EDICIÓN / AÑO			

PROYECTO:

Aguadara-Ocaña (7007) y Ocaña-Alto del Pozo (7008)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 10 del 01/12/2023 al 07/12/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

ELIAS JAMES FERNANDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

ELIAS JAMES FERNANDEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO. PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO. PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se renueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: INUEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S CON NIT 901.364.579-2				INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S : COINZA ING S.A.S			
INTEGRANTES: CONTRATO No.: 3111 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 VALOR INICIAL: \$ 169.456.000,00				INTEGRANTES: CONTRATO No.: 2656-2023 VALOR INICIAL: \$ 375.843.799,00			
FECHA DE INICIO: 01/10/2023 VALOR ADICIONES: \$				FECHA DE INICIO: 08/08/2023 VALOR ADICIONES: \$			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 169.456.000,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 08/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 375.843.799,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/12/2023 VALOR ANTICIPO: \$			
				VALOR AMORTIZADO: \$			
				SALDO POR AMORTIZAR: \$			

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023				
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 169.456.000,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 169.456.000,00				
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 375.843.799,00				
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 71.619.868,47				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 304.223.930,53				

(Fianciado de la inversión correspondiente al valor total adeudado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA	VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 142.400.000,00		91 DIAS	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 84.039.154,47	49,59%
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 70.621.138,21	49,59%		TOTAL INVERSIÓN EJEUTADA:	\$ 70.621.138,21	84,03%
	INVERSIÓN OBRA EJEUTADA ACUMULADA (B):	\$ 70.621.138,21	49,59%		LA SEMANA	\$ 21.389.484,50	5,60%
	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ 0,00%	INVERSIÓN EJEUTADA EN LA SEMANA		\$ 9.643.637,40	5,60%	
	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 0,00%	INVERSIÓN EJEUTADA EN LA SEMANA		\$ 9.643.637,40	5,60%	
	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	\$ 0,00%					
	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 84.039.154,47	49,59%				
	TOTAL INVERSIÓN EJEUTADA:	\$ 70.621.138,21	49,59%				
	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ 0,00%					
	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 9.643.637,40	5,60%				
INVERSIÓN EJEUTADA EN LA SEMANA	\$ 9.643.637,40	5,60%					

SI	NO
X	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 84880 DE FECHA 15/11/23

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023

VALOR FACTURA: \$ 42.364.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite).

Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual

ANTICIPOS		INDICADOR IC	ANTICIPOS	
Otorgado \$			Otorgado \$	
Amortizado \$			Amortizado \$	
Saldo \$			Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

Meta Física Programada % 5,60% Avance o Atraso Físico % 0,00%

Meta Física Ejecutada % 5,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

FUENTES DE MATERIALES	DISPONIBLE				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	----	NO	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	----	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	----	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	----	NO
					APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	----	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	----	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	----	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	----	NO	Ocupación de CAUCES:	SI	----	NO
					VERTIMENTOS:	SI	----	NO
			</					

<table border="1"> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td>OBRA</td> <td>INTER</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td>14</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> </table>				TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	12	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	7	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5		10	7	V. GESTIÓN SOCIAL No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ----- No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ----- DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -----		OBSERVACIONES: <div></div>	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	12																				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	10	7																				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	5																				
	10	7																				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ----- 25				VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)																		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ----- 0 FICHAS PREDIALES APROBADAS: ----- 0 AVALÚOS APROBADOS: ----- 0 PREDIOS ADQUIRIDOS: ----- 0				OBSERVACIONES: NO APLICA <div></div>																		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)																						
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 2. ROGERÍA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 5. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 13+0500 AL PR 17+0000. 6. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 7. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 22+0000 AL PR 25+0000. 8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000. 11. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 12. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.																						
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																						
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000. 3. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.																						
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																						
N/A																						
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																						
<table border="0"> <tr> <td> RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787 </td> <td rowspan="4"> <div></div> Programado <div></div> Ejecutado </td> </tr> <tr> <td> RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787 </td> </tr> <tr> <td> RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000 </td> </tr> <tr> <td> RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000 </td> </tr> </table>								RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787	<div></div> Programado <div></div> Ejecutado	RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787	RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000	RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000										
RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787	<div></div> Programado <div></div> Ejecutado																					
RUTA No. 7007 PR 43+0000 PR 54+0787																						
RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000																						
RUTA No. 7008 PR 00+0000 PR 07+0000																						
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.																						
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																						
 <p>MEJORAMIENTO TAPA DE RODADURA PR 13+0650</p>		 <p>EMBELLECIMIENTO DEL TRAMO VIAL PR23+0930</p>		 <p>LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA PR23+0300</p>																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 185 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Caliservicos. Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal.						FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____																
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del PROYECTO. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.																						

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 10 DEL 01/12/2023 AL 07/12/2023		FECHA 07 12 2023 (Día) (Mes) (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 07+0000 al PR 38+0000.		
CONTRATISTA: INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3111 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 07+0000 A PR 38+0000.				
INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J		CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.				
LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.				
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.				
SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.				
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS				
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.				
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN				
UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.				
EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS : Cuidados al momento de usar herramientas de trabajo , comunicacion acertiva, imprtancia de las pausas activas . protejamonos del sol.				
II. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.				
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS DIEZ (10) ASOCIADOS CONTRATADOS.				
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.				
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA  NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____	FIRMA  NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 38202-31751-ATL
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFECCIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS

REGISTRO DE CHARLAS

01-12-2023 / 07-12-2023

FECHA		1-dic-23	4-dic-23	5-dic-23	6-dic-23	7-dic-23
#	NOMBRE	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	CRISANTO BACCA PEREZ	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P
2	CRISTIAN ORIELSO OVALLES	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles
3	GIOVANNY ORTIZ BAYONA	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.
4	GUSTAVO BAYONA ORTIZ	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona
5	JESUS EMEL ORTIZ ORTIZ	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz
6	JOSE LUIS BAYONA ORTIZ	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz
7	LEANDRO JACOME ARENAS	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas
8	MILTON CARDENAS BAYONA	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas
9	NEFTALY ROPERO TARAZONA	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero
10	RAUL AIMELE PAEZ ARENAS	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez

Carrera 8 No.7-04 Barrio Bolivar - Ábrego, Norte de Santander

injekopsas@gmail.com

3127525851 - 3208299817

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL							
CODIGO	MEP-MN-16-15-FR-3							
VERSION	1							
PAGINA	1	DE	2					

FECHA			15	12	2023
			(Día/Mes/Año)		

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Aguaclara-Ocaña (7007) y Ocaña-Alto del Pozo (7008)				
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA	SEMANA No.11.....del ..08/12/2023... al ...14/12/2023... Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	ELIAS JAMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:	ELIAS JAMES FERNANDEZ	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3				
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3					
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vias, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remuevan de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.					

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	INUEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S CON NIT 901.364.579-2		INTERVENIOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO NO.3111 DEL 06 DE 30/09/2023 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$169.456.000,00.....	CONTRATO NO.2056-2023 DE 2023	VALOR INICIAL:	\$375.843.799,00.....
FECHA DE INICIO:01/10/2023.....	VALOR ADICIONES:	\$-	FECHA DE INICIO:09/09/2023.....	VALOR ADICIONES:	\$162.865.847,00.....
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:31/12/2023.....	VALOR ACUMULADO:	\$169.456.000,00.....	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:08/12/2023.....	VALOR ACUMULADO:	\$538.709.446,00.....
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/01/2024.....			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/12/2023.....	VALOR ANTICIPO:	\$-
				VALOR AMORTIZADO:	\$-
				SALDO POR AMORTIZAR:	\$-

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$169.456.000,00.....			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$169.456.000,00.....			
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$538.709.446,00.....			
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$\$ 71.619.868,47.....			
	SALDO DE VIGENCIA	\$467.089.577,53.....			\$-
(Reservado de la vigencia correspondiente al valor total adelantado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA			INTERVENTORIA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): AVANCE O ATRASO DE OBRA: OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
\$142.400.000,00..... \$78.725.203,25..... \$78.725.203,25..... \$0,00%..... \$-%.....			91 DIAS TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$538.709.446,00..... TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$393.030.082,00..... INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$19.096.183,00..... LA SEMANA0,00%..... INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$19.096.183,00..... LA SEMANA4,81%.....		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$93.682.991,87..... TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$93.682.991,87..... AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$0,00%..... INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$9.643.837,40..... INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$9.643.837,40.....			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X		
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:84880 DE FECHA 15/11/23..... PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023 VALOR FACTURA: \$42.364.000,00.....			No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:85740 DE FECHA 25/11/23..... PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023 VALOR FACTURA: \$\$ 71.619.868,47.....		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite). Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite). Observaciones:		

ANTICIPOS		INDICADOR IC		ANTICIPOS	
Otorgado \$		En el mes:		Otorgado \$	
Amortizado \$		Acumulado:		Amortizado \$	
Saldo \$				Saldo \$	

III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
Meta Fisica Programada %5,69%.....	Avance o Atraso Fisico %0,00%.....				
Meta Fisica Ejecutada %5,69%.....					
Meta Fisica (Programa de Obra) Líneas Base					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	%
Estudios y diseños				Prog Ejec	
				Prog Ejec	
				Prog Ejec	
				Prog Ejec	
				Prog Ejec	
				Prog Ejac	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n):					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI DISPONIBLE	NO	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI NO N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	Aprovechamiento Forestal:	SI NO N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO N/A
				Ocupación de CAUCES:	SI NO N/A
				VERTIENTES:	SI NO N/A
			EMISIONES:	SI NO N/A	
			OTROS (Especificar cual)	SI NO N/A	
OBSERVACIONES: NO APLICA			OBSERVACIONES: NO APLICA		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA					

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	7
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:-----

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:-----

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:-----

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:-----0

FICHAS PREDIALES APROBADAS:-----0

AVALÚOS APROBADOS:-----0

PREDIOS ADQUIRIDOS:-----0

OBSERVACIONES: NO APLICA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.

2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000.

3. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.

2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000.

3. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 7007

PR 43+0000PR 54+0787

RUTA No. 7007

PR 43+0000PR 54+0787

RUTA No. 7008

PR 00+0000PR 07+0000

RUTA No. 7008

PR 00+0000PR 07+0000

Programado

Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE Puentes Y PONTONES
PR 27+0831



LIMPIEZA ALCANTARILLA
PR29+0534



LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PR29+0698

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de trabajo Asociado Caliservicios

Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal

FIRMA

NOMBRE: _____

No. MAT: _____

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del R0003.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 11 DEL 08/12/2023 AL 14/12/2023		FECHA 14 12 2023 (Dia) (Mes) (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 07+0000 al PR 38+0000.		
CONTRATISTA: INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3111 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 07+0000 A PR 38+0000.				
INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J		CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.				
LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.				
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.				
SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.				
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS				
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.				
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN				
UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.				
EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS : Comunicacion acertiva , importancia de la seguridad vial , alimentacion saludable , cuidados de los epps.				
II. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><p>12/12/2023 10:30:47 a. m. PR 28+963</p></div> <div><p>12/12/2023 3:16:20 p. m. PR 29+230</p></div> <div><p>8.0600945N 73.20375819W Ocaña-Cucuta 29+400 13 dic. 2023 10:07:58 a. m.</p></div> <div><p>8.05997351N 73.20672212W Ocaña-Cucuta 29+400 13 dic. 2023 8:12:51 a. m.</p></div>				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.				
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS DIEZ (10) ASOCIADOS CONTRATADOS.				
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.				
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA  ANYITH TORCOROMA RINCON NOMBRE: No. MAT:	FIRMA  RAFAEL DAVID REYES NOMBRE: No. MAT:
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS

REGISTRO DE CHARLAS

08-12-2023 / 14-12-2023

FECHA		8-dic-23	11-dic-23	12-dic-23	13-dic-23	14-dic-23
#	NOMBRE	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	CRISANTO BACCA PEREZ	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P
2	CRISTIAN ORIELSO OVALLES	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles
3	GIOVANNY ORTIZ BAYONA	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.
4	GUSTAVO BAYONA ORTIZ	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona
5	JESUS EMEL ORTIZ ORTIZ	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz
6	JOSE LUIS BAYONA ORTIZ	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz
7	LEANDRO JACOME ARENAS	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas
8	MILTON CARDENAS BAYONA	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas
9	NEFTALY ROPERO TARAZONA	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero
10	RAUL AIMELE PAEZ ARENAS	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez

Carrera 8 No.7-04 Barrio Bolivar - Ábrego, Norte de Santander

injekopsas@gmail.com

3127525851 - 3208299817

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL						CODIGO	MEP-001-R-15-FB-3		
						VERSION	1		
						PAGINA	1	DE	2
						FECHA	22	12	2023
						EDICION / AÑO			
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO: Aguadara-Ocaña (7007) y Ocaña-Alto del Pozo (7008)									
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No.: 12 del 15/12/2023 al 21/12/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAMES FERNANDEZ				GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAMES FERNANDEZ					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3									
ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS									
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3									
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se renueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.									
CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: INUEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S CON NIT 901.364.579-2					INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.; COINZA ING.S.A.S.				
INTEGRANTES:					INTEGRANTES:				
CONTRATO No.: 3111 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023					CONTRATO No.: 2656-2023				
VALOR INICIAL: \$ 169.456.000,00					VALOR INICIAL: \$ 375.843.790,00				
FECHA DE INICIO: 01/10/2023					FECHA DE INICIO: 06/09/2023				
VALOR ADICIONES: \$ -					VALOR ADICIONES: \$ 162.865.647,00				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 08/12/2023				
VALOR ACUMULADO: \$ -					VALOR ACUMULADO: \$ 538.709.446,00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024				
					VALOR ANTICIPO: \$ -				
					VALOR AMORTIZADO: \$ -				
					SALDO POR AMORTIZAR: \$ -				
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONTRATO	VIGENCIA	2023							
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	169.456.000,00						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	103.326.829,27						
	SALDO DE VIGENCIA	\$	66.129.170,73						
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	538.709.446,00						
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	415.052.195,50						
	SALDO DE VIGENCIA	\$	123.657.250,50						
(Presentado de la vigencia correspondiente al valor total adelantado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
OBRA				INTERVENTORIA					
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): AVANCE O ATRASO DE OBRA: OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: TOTAL INVERSIÓN EJEUTADA: AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA INVERSIÓN EJEUTADA EN LA SEMANA					
\$ 142.400.000,00 \$ 86.829.268,29 \$ 86.829.268,29 \$ - \$ -				91 DIAS TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 538.709.446,00 TOTAL INVERSIÓN EJEUTADA: \$ 415.052.195,50 INVERSIÓN PROGRAMADA EN \$ 21.112.213,50 LA SEMANA INVERSIÓN EJEUTADA EN \$ 21.112.213,50 LA SEMANA					
% 60,98% % 60,98% % 60,98% % 0,00% %				% 100,00% % 77,65% % 5,62% % 5,62%					
SI NO X				SI NO X					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023 VALOR FACTURA: \$ 42.364.000,00				No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE DE 2023 VALOR FACTURA: \$ 75.675.474,89					
84886 DEL FECHA 15/11/23				887181 DE NOVIEMBRE 2023					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite). Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 08/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite). Observaciones:					
ANTICIPOS				INDICADOR IC				ANTICIPOS	
Otorgado \$				En el mes:				Otorgado \$	
Amortizado \$				Acumulado:				Amortizado \$	
Saldo \$								Saldo \$	
III. AVANCE FISICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
Meta Fisica Programada % 5,69% Avance o Atraso Fisico % 0,00% Meta Fisica Ejecutada % 5,69%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Descripción Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base									
Meta Fisica Contractual Unidad Cantidad Vigencia Vigencia (n)									
Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %									
Proq. Ejec. Proq. Ejec. Proq. Ejec. Proq. Ejec.									
Total									
Equipo mínimo corresponde al estado en el óleo de condiciones.									
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR (n):									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL(NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)									
FUENTES DE MATERIALES									
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL FORESTAL: SI NO N/A									
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO N/A CONCESSION DE AGUAS: SI NO N/A									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A OCUPACION DE CAUCE: SI NO N/A									
VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A									
OTROS (Especificar cual): SI NO N/A									
OBSERVACIONES: NO APLICA									
OBSERVACIONES: NO APLICA									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)									
ESTADO:									
OBSERVACIONES:									

			V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	Nº DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-----	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	12	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 28					
VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0			OBSERVACIONES: NO APLICA		
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0					
AVALÚOS APROBADOS: 0					
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)					
1. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000. 3. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
1. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000. 2. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN LA RUTA 7008. 3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000. 4. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
N/A					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
<div><div><div>RUTA No. 7007</div><div>PR 43+0000PR 54+0787</div></div><div>RUTA No. 7007</div><div>PR 43+0000PR 54+0787</div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 00+0000PR 07+0000</div><div>RUTA No. 7008</div><div>PR 00+0000PR 07+0000</div></div> <div><div>Programado</div><div>Ejecutado</div></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
<div><div><p>MEJORAMIENTO A LA CAPA DE RODADURA PR 16+0550</p></div><div><p>MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA PR 15+0843</p></div><div><p>MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA PR 25+0800</p></div></div>					
<p>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</p> <p>El presente Informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 180 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Caliservicios.</p> <p>Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal</p>					
			FIRMA: _____ NOMBRE: _____ No. MAT: _____		
<p><small>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del R0003. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.</small></p>					

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SEMANA No. 12 DEL 15/12/2023 AL 21/12/2023

FECHA
21 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 07+0000 al PR 38+0000.

CONTRATISTA: INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO No. 3111 DE 2023 FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA.
CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 07+0000 A PR 38+0000.

INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J. CONTRATO No. 2656 DE 2023

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.

LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.

1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.

SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.

2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.

3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN

UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.

EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS : Alimentos y nutrientes , Acoso laboral , Actitud isica , agotamiento por calor , comida saludable.

II. REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA

INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIAS EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.

EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS DIEZ (10) ASOCIADOS CONTRATADOS.

NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.

CUADRO RESUMEN			INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA  ANYITH TORCOROMA RINCON NOMBRE: No. MAT:		FIRMA  RAFAEL DAVID REYES NOMBRE: No. MAT:	
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X					
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X					
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X					
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X					



CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS

REGISTRO DE CHARLAS

15-12-2023 / 21-12-2023

FECHA		15-dic-23	18-dic-23	19-dic-23	20-dic-23	21-dic-23
#	NOMBRE	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	CRISANTO BACCA PEREZ	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P
2	CRISTIAN ORIELSO OVALLES	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles
3	GIOVANNY ORTIZ BAYONA	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.
4	GUSTAVO BAYONA ORTIZ	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona
5	JESUS EMEL ORTIZ ORTIZ	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz
6	JOSE LUIS BAYONA ORTIZ	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz
7	LEANDRO JACOME ARENAS	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas
8	MILTON CARDENAS BAYONA	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas
9	NEFTALY ROPERO TARAZONA	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero
10	RAUL AIMELE PAEZ ARENAS	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez

Carrera 8 No.7-04 Barrio Bolivar - Ábrego, Norte de Santander

injekopsas@gmail.com

3127525851 - 3208299817

		<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL</div>	<div>CODIGO VERSION PAGINA</div>	<div>MEP-MN-16-15-FR-3 1 2</div>
			FECHA	<div>28122023</div>
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: Aguadara-Ocaña (7007) y Ocaña-Alto del Pozo (7008)				
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA		SEMANA No.: 13 del 22/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal: No (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ELIAS JAMES FERNANDEZ		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ELIAS JAMES FERNANDEZ		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vias, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remuevan de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.				
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: INUEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S CON NIT 901.364.579-2		INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S - COINZA ING S.A.S		
INGREDIENTES: CONTRATO NO: 3111.065.06 DE 30/09/2023 VALOR INICIAL: \$ 169.456.000,00		INGREDIENTES: CONTRATO NO: 2056-2023 VALOR INICIAL: \$ 375.845.799,00		
FECHA DE INICIO: 01/10/2023 VALOR ADICIONES: \$ 162.865.847,00		FECHA DE INICIO: 09/09/2023 VALOR ADICIONES: \$ 375.845.799,00		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 169.456.000,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 375.845.799,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2024		
		VALOR ANTICIPO: \$ -		
		VALOR AMORTIZADOR: \$ -		
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO	VIGENCIA	2023		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 169.456.000,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 112.970.666,67		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 56.485.333,33		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 538.709.446,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 436.164.409,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 102.545.037,00		
(Reservado de la vigencia correspondiente al valor total adeudado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
OBRA		91 DIAS		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 142.400.000,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 94.933.333,33		66,67%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 94.933.333,33		66,67%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 56.485.333,33		0,00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -		0,00%		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 112.970.666,67		66,67%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 112.970.666,67		66,67%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 0,00%		0,00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 9.643.837,40		5,82%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 9.643.837,40		5,82%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI X NO				
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 84880 DE FEBRERO 15/11/23				
PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2023				
VALOR FACTURA: \$ 42.364.000,00				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: La Administración Vial COINZA ING S.A.S contrato 2056-2023 hace claridad que se hace la supervisión a partir del 09/08/2023 fecha del acta de inicio del proceso contractual				
ANTICIPOS		INDICADOR IC		
Otorgado \$		En el mes:		
Amortizado \$		Acumulado:		
Saldo \$				
ANTICIPOS		ANTICIPOS		
Otorgado \$		Otorgado \$		
Amortizado \$		Amortizado \$		
Saldo \$		Saldo \$		
III. AVANCE FÍSICO (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)				
Meta Física Programada % 5,69% Avance o Atraso Físico % 0,00%				
Meta Física Ejecutada % 5,69%				
MAQUINARIA Y EQUIPO				
Meta Física (Programa de Obra) Líneas Base				
Meta Física Contratual				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Tramo y/o Sector 1 Tramo y/o Sector 2 Tramo y/o Sector (n) Total %				
Proq				
Ejec				
Proq				
Ejec				
Proq				
Ejec				
Proq				
Ejec				
Total				
Equipo mínimo correspondiente al estado en el caso de condiciones.				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)				
FUENTES DE MATERIALES				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIENTES: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cuál) SI NO N/A				
OBSERVACIONES: NO APLICA				
OBSERVACIONES: NO APLICA				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO:				
OBSERVACIONES:				

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10		7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4		5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10		7
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:		26	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -----			
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -----			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -----			
OBSERVACIONES:			
VI. GESTIÓN PREDIAL (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	0		
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0		
AVALÚOS APROBADOS:	0		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0		
OBSERVACIONES: NO APLICA			
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO)			
1. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
2. MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA EN LA RUTA 7008			
3. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
4. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
1. LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
2. ROCERÍA EN EL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
3. LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
4. LIMPIEZA DE CALZADA EN EL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
5. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
6. ARREGLO DE DEFENSAS DEL PR 33+0500 AL PR 35+0000.			
7. APOYO A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA EL DÍA 03/04/2024.			
8. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
9. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
11. EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL PR 07+0000 AL PR 38+0000.			
12. VIGILANCIA DIARIA AL CORREDOR VIAL.			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
RUTA No. 7007	PR 43+0000	PR 54+0787	
RUTA No. 7007	PR 43+0000	PR 54+0787	
RUTA No. 7008	PR 00+0000	PR 07+0000	
RUTA No. 7008	PR 00+0000	PR 07+0000	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
LIMPIEZA DE ENCOQUE Y DESCOLE PR 31+0800	LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS PR33+0000	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR33+0646	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
El presente informe semanal, corresponde a la semana 1 de la administración vial y a la semana 188 de la Cooperativa de Trabajo Asociado Caliservicios			
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal			
FIRMA		NOMBRE:	
No. MAT:			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMAIS.			
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.			

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
SEMANA No. 13 DEL 22/12/2023 AL 28/12/2023		FECHA 28 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008)		TRAMO Y/O SECTOR(S): 7008 del PR 07+0000 al PR 38+0000.		
CONTRATISTA: INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S		FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2023		
CONTRATO No. 3111 DE 2023		FECHA DE TERMINACION: 31 DE ENERO DE 2024		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA 7008: OCAÑA - ALTO DEL POZO, PR 07+0000 A PR 38+0000.				
INTERVENTOR: INSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.J		CONTRATO No. 2656 DE 2023		
I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				
EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL INFORME SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL; A LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DE 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DE 2020 Y AL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDAS POR EL INVIA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE LOS CONTRATISTAS Y LAS INTERVENTORIAS DEBEN REALIZAR RESPECTIVAMENTE.				
LA INTERVENTORIA EN SUS VISITAS A LAS VIAS A CARGO REALIZA EL CONTROL A CADA TRABAJADOR SOBRE LA UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE TAPABOCAS, ADEMÁS DEL DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO QUE DEBEN TENER COMO MÍNIMO 2 MTS ENTRE CADA TRABAJADOR.				
1. ENTREGA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S HACE ENTREGA SEMANALMENTE POR CADA ASOCIADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y DE LOS CUALES SE LLEVA UN REGISTRO EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO ENTREGA SEMANAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD.				
SEIS (6) TAPABOCAS DESECHABLES, 250 ML DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, 350 ML DE ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70%, 120 ML DE GEL ANTIBACTERIAL.				
2. LAVADO E HIGIENE DE MANOS				
LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS CADA ASOCIADO LA REALIZA MÍNIMO CADA 3 HORAS UTILIZANDO EL JABÓN ANTIBACTERIAL ENTREGADO Y EL DISPENSADOR PORTATIL DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE. ASÍ MISMO, PERMANENTEMENTE CADA UNO SE APLICA EL GEL ANTIBACTERIAL CADA VEZ QUE LO REQUIERE.				
3. CHARLAS DIARIAS DE PREVENCIÓN				
UNA VEZ REUNIDOS TODOS LOS ASOCIADOS PARA INICIAR SU JORNADA LABORAL EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZA UNA CHARLA DE DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS. LOS TEMAS QUE SE TRATAN SE RELACIONAN EN EL FORMATO ANEXO DENOMINADO REGISTRO DE CHARLAS.				
EN ESTA SEMANA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS : Alimentos y nutrientes , Acoso laboral , Actitud isica , agotamiento por calor , comida saludable.				
II. REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA				
INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES S.A.S VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 1238 DEL 21 DE JULIO DE 2022, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , ADEMÁS DE LO ORDENADO POR EL INVIA EN LAS CIRCULARES EXTERNAS No. 003 DEL 07 DE MAYO DEL 2020 Y No. 004 DEL 27 DE JULIO DEL 2020 Y EN EL MEMORANDO CIRCULAR No. SG 49556 DEL 05 DE JULIO DE 2022.				
EN LA SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTA SEMANA POR PARTE DEL INSPECTOR SISO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL SE REALIZÓ UNA CHARLA TITULADA " REDUCIR EL RIESGO DE CAIDA O DESLIZAMIENTO ". SE CONFIRMA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA VIA POR PARTE DE LOS DIEZ (10) ASOCIADOS CONTRATADOS.				
NO SE HAN PRESENTADO A LA FECHA CONTAGIADOS NI SOSPECHOSOS CON COVID -19. EL ESTADO DE SALUD DE LOS ASOCIADOS ES BUENO.				
CUADRO RESUMEN		INSPECTOR SISO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	FIRMA NOMBRE: ANYITH TORCOROMA RINCON No. MAT: _____	FIRMA NOMBRE: RAFAEL DAVID REYES No. MAT: 38202-31751-ATL
ENTREGA DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN DE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	X			
INSPECCIÓN, HIGIENE, LIMPIEZA Y DENSIFICACIÓN DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	X			
INSPECCIÓN LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	X			



CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS

REGISTRO DE CHARLAS

22-12-2023 / 28-12-2023

FECHA		22-dic-23	25-dic-23	26-dic-23	27-dic-23	28-dic-23
#	NOMBRE	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
1	CRISANTO BACCA PEREZ	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P	Crissant. Bacca. P
2	CRISTIAN ORIELSO OVALLES	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles	Cristian Ovalles
3	GIOVANNY ORTIZ BAYONA	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.	GIOVANNY ORTIZ B.
4	GUSTAVO BAYONA ORTIZ	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona	Gustavo Bayona
5	JESUS EMEL ORTIZ ORTIZ	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz	Jesús Emel Ortiz
6	JOSE LUIS BAYONA ORTIZ	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz	Jose Luis Ortiz
7	LEANDRO JACOME ARENAS	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas	Leandro Jacome Arenas
8	MILTON CARDENAS BAYONA	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas	Milton Cardenas
9	NEFTALY ROPERO TARAZONA	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero	Neetali ropero
10	RAUL AIMELE PAEZ ARENAS	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez	Raul Paez

Carrera 8 No.7-04 Barrio Bolivar - Ábrego, Norte de Santander

injekopsas@gmail.com

3127525851 - 3208299817



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 2

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

										INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO										CÓDIGO			
																				VERSIÓN			
																				PÁGINA			
																				PERIODO		dic-23	
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL										DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA													
CONTRATO DE SERVICIO DE MTO RUTINARIO No: 3111-2023										CONTRATISTA: INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S													
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023										OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO													
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2656-2023										PROYECTO: DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000, LOTE 3													
										CONSULTOR: ADMINISTRACION VIAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA													
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE SERVICIO																							
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior									
2023		1035823		C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21		PROPIOS		3111-2023		\$ 169,456,000.00		\$ 84,728,000.00									
TOTAL												\$ 169,456,000.00											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:										\$ 169,456,000.00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO																							
Acta No.		Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones						
															SI		NO						
										1035823 DEL 2023	\$ 169,456,000.00	\$ 169,456,000.00					CONTRATO PRINCIPAL						
1		Servicio	01-31 DE OCT 2023	\$ 35,600,000.00	\$ 6,764,000.00	\$ 42,364,000.00				1035823 DEL 2023	\$ 127,092,000.00	\$ 127,092,000.00	84880 DE FECHA 15NOV2023		X								
2		Servicio	01-30 DE NOV 2023	\$ 35,600,000.00	\$ 6,764,000.00	\$ 42,364,000.00				1035823 DEL 2023	\$ 84,728,000.00	\$ 84,728,000.00			X								
3		Servicio	DICIEMBRE DE 2023	\$ 35,600,000.00	\$ 6,764,000.00	\$ 42,364,000.00				1035823 DEL 2023	\$ 42,364,000.00	\$ 42,364,000.00					PRESENTE ACTA						
TOTALES				\$ 106,800,000.00	\$ 20,292,000.00	\$ 127,092,000.00					\$ 42,364,000.00	\$ 42,364,000.00											
Todas las Actas aprobadas por la supervision deben relacionarse esten o no facturadas.																							
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																							
				VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL															
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				\$ 106,800,000.00		\$ 20,292,000.00		\$ 127,092,000.00															
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES																							
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																							
AJUSTES																							
ESTUDIOS Y DISEÑOS																							
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																							
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																							
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																							
VALOR TOTAL				\$ 106,800,000.00		\$ 20,292,000.00		\$ 127,092,000.00															
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																							
Firma Kelly Ortiz P. Nombre: Kelly Ortiz Pérez Representante Legal INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S.A.S. C.C. No.: 1.005.073.727 - Abrego																							
Firma Wilson Jaime Bragosa. Nombre: WILSON JAIME BRAGOSA Matrícula No. 25202-24862																							



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10																											
			VERSIÓN																													
			FECHA		1	DE	1																									
			FECHA		15	1	24																									
					(Día)	(Mes)	(Año)																									
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																													
CONTRATO DE OBRA No: 3111 - 2023			CONTRATISTA: INJEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES S.A.S																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3.																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2656 -2023			INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
Firma Kelly Ortiz P. Nombre: (KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA Representante Legal Cooperativa Trabajo Asociado INJEKOP C.C. No.: 88.147.526 de Abrego																																
Firma [Signature] Nombre: ELÍAS JAIMES FERNANDEZ Matrícula No. 54202-099505 NTS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 5

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA **FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA		15	1	24
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCION TERRITORIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA
-------------------	-----------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.	3111 - 2023	CONTRATISTA:	C/ INJEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES S.A.S
----------------------	-------------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3.	

FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/01/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 169,456,000.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 169,456,000.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA
-------------------------------	-----------	--------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 16,945,600.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 33,891,200.00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	9	2023	1	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	9	2023	31	12	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400-47-994000094806
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADOA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	30/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 232,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	9	2023	31	12	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	400-74-994000023611	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADOA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 16,945,600.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 33,891,200.00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	9	23	1	8	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	9	23	31	1	27
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400-47-994000094806

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		232.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	9	23	31	1	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400-74-994000023611 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

OBSERVACIONES:

- NOTAS:
- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 - El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 6

ACTAS DE COMITE **FORMATO MEPI-MN-IN-14-FR-1**



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVÍAS D.T. OCAÑA

Anexo 7

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5

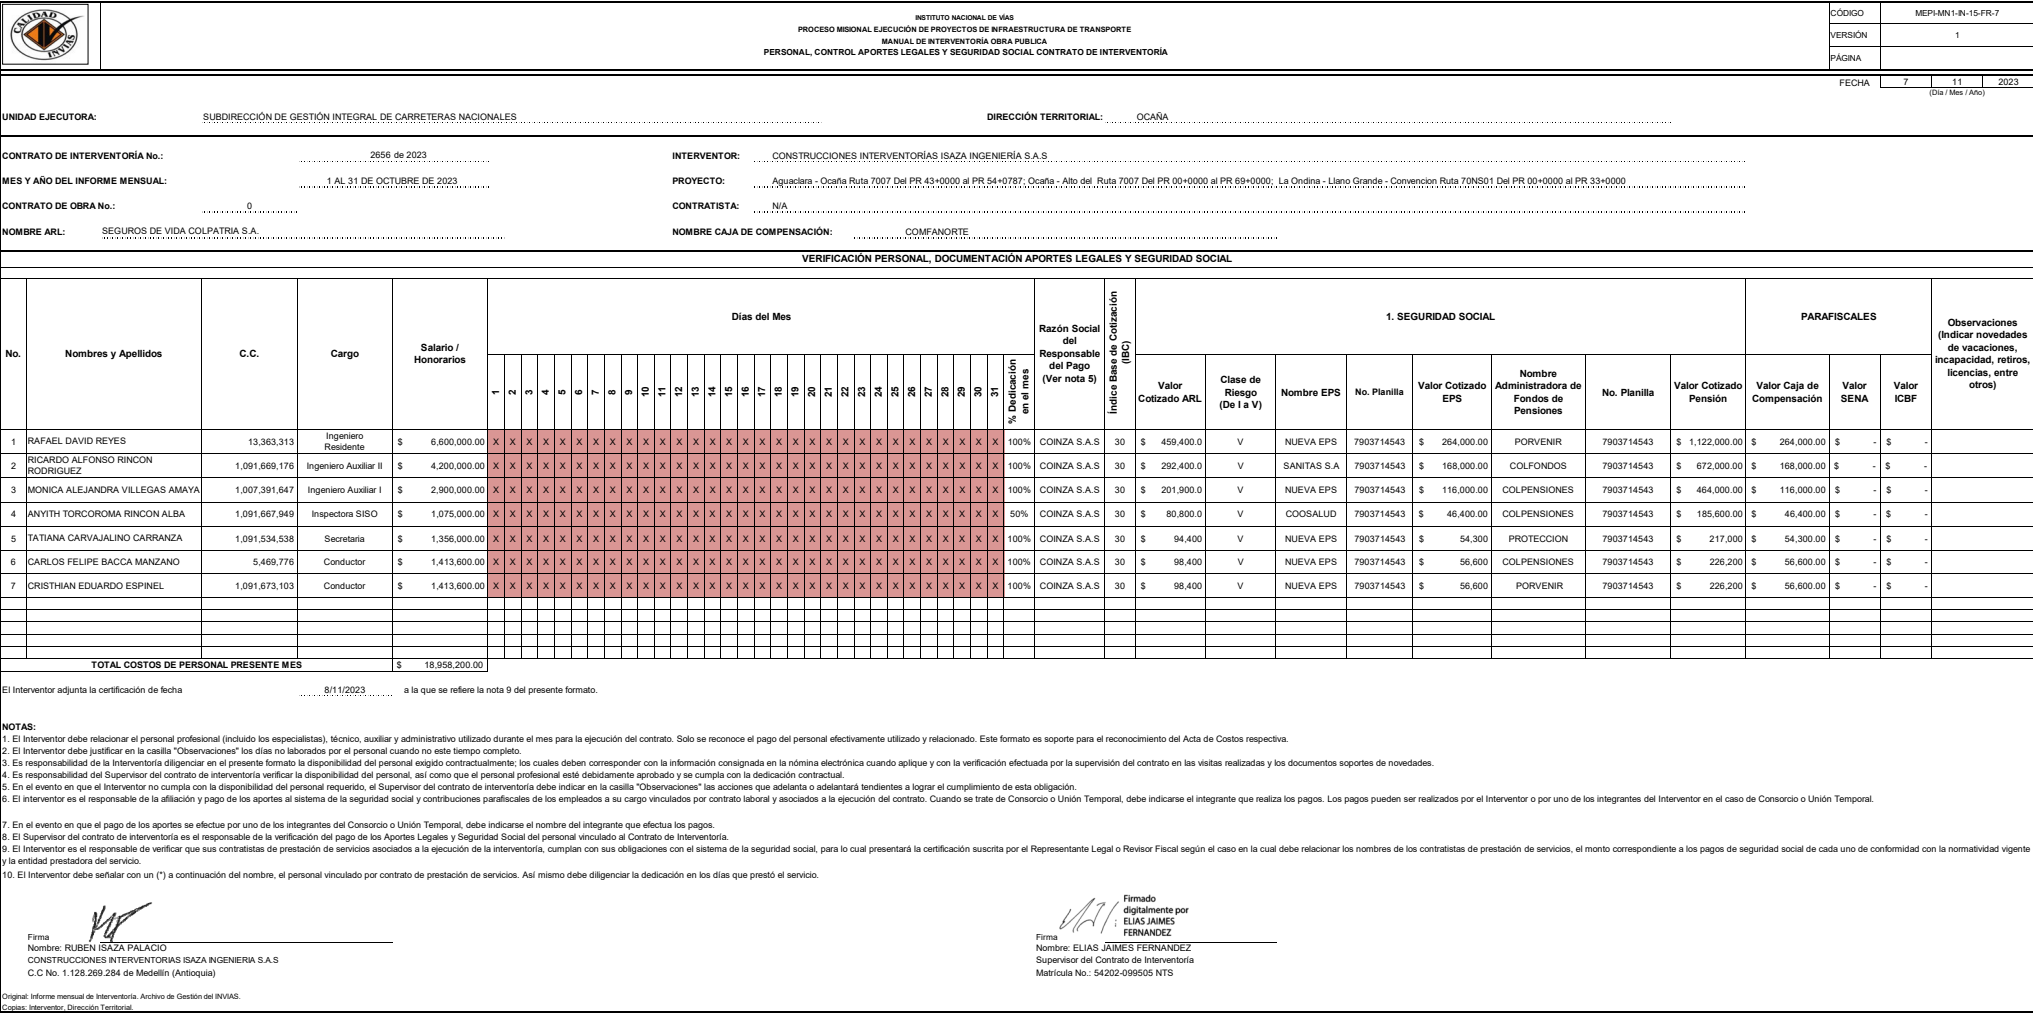
[illegible]



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 8

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7





CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO	MEP-MNI-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA					
							FECHA	7 11 2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2656 de 2023							INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S					
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023							PROYECTO: Aguacilara - Ocaña Ruta 7007 Del PR 43+0000 al PR 54+0787; Ocaña - Alto del Ruta 7007 Del PR 00+0000 al PR 69+0000; La Ondina - Llano Grande - Convencion Ruta 70NS01 Del PR 00+0000 al PR 33+0000					
CONTRATO DE OBRA No: 0							CONTRATISTA: NA					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 250.456.699,24	\$ 416.229.728,52					
2023	919123	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Contrato principal	\$ 281.882.849,00	\$ 416.229.728,52					
TOTAL						\$ 538.709.446,00						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 538.709.446,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								919123 de 2023-08-08	\$ 538.709.446,00	\$ 538.709.446,00		CONTRATO PRINCIPAL
1	8 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$ 42.270.894,79	\$ 8.031.470,01	\$ 50.302.364,80				919123 de 2023-08-08	\$ 50.302.364,80	\$ 488.407.081,20	81755 de fecha 18/09/2023	
2	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 60.653.237,55	\$ 11.524.115,13	\$ 72.177.352,68				919123 de 2023-08-08	\$ 122.479.717,48	\$ 416.229.728,52	83725 de fecha 26/10/2023	
3	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 60.184.763,42	\$ 11.435.105,05	\$ 71.619.868,47				919123 de 2023-08-08	\$ 194.099.585,95	\$ 344.609.860,05		EN TRÁMITE
TOTALES		\$ 163.108.895,76	\$ 30.990.690,19	\$ 194.099.585,95					\$ 538.709.446,00	\$ 344.609.860,05		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO			IVA		TOTAL						
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 126.059.914,00			\$ 23.951.383,66		\$ 150.011.297,66						
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 37.048.981,76			\$ 7.039.306,53		\$ 44.088.288,29						
* VALOR TOTAL	\$ 163.108.895,76			\$ 30.990.690,19		\$ 194.099.585,95						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
<div><div></div><div>Firma Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S C.C No. 1.128.269.284 de Medellín (Antioquia)</div></div> <div><div></div><div>Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoria Matrícula No.: 54202-099505 NTS</div></div>												
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 10

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

		FECHA		15	1	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	OCAÑA
-------------------	--	------------------------	-------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2656-2023	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA
-------------------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 1 LOTE 10.		
----------------------	---	--	--

FECHA DE INICIO:	08/08/2023
PLAZO INICIAL:	08/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 375,843,799.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 538,709,446.00 (Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 37,584,379.90	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			3	8	2023	8	06	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 75,168,759.80	DD	MM	AA	DD	MM	AA
Calidad del servicio	30%	\$ 112,753,139.70	3	8	2023	8	12	2026
			3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	65-44-101223482
Certificado de modificación o anexo No.:	2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	08/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Desde			Hasta		
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 53,870,944.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	\$ 107,741,889.20
Calidad del servicio	30%	\$ 161,612,833.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	8	2023	8	06	2024
DD	MM	AA	DD	MM	AA
3	8	2023	8	12	2026
3	12	2023	3	06	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223482

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Ruben Isaza Palacio
Representante Legal
COINZA ING SAS
NIT. 901.164.885
cel: 311 308 3033

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 11

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
			VERSIÓN	1		
			PAGINA	1	DE	1
			FECHA	15	1	24
Contrato de obra 3111 - 2023						
Contratista:		INJEKOP CONTRATACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES S.A.S				
Conformación:						
Objeto:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA SECTORES 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 LOTE 3.				
Fecha de Inicio:		01 DE OCTUBRE DE 2023				
Valor Inicial:		\$ 169,456,000				
Valor Actual:		\$ 169,456,000				
Plazo Inicial:		31/12/2023				
Fecha de Iniciación:		01/10/2023				
Fecha de Vencimiento:		miércoles, 31 de enero de 2024				
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2023						
CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO			
OF-CTO 2656 DE 2023-0241	05-dic-23	Ingeniero JESUS ALFREDO CONTRERAS Gerente ESPO.S. A Ocaña, Norte de Santander	Reporte daños Ruta 7007 Ocaña – Alto del Pozo.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0242	05-dic-23	CIRO ANTONIO LOBO ORTEGA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA Y TRÁNSITO ALCALDIA MUNICIPAL DE CONVENCION Convención, Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION.		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0243	05-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CON FUNCIONES DE INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ABREGO Abrego N.S.	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO (PASO NACIONAL MUNICIPIO DE ABREGO).		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0244	05-dic-23	GUSTAVO ADOLFO BLANCO NIÑO Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Norte de Santander	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0245	05-dic-23	INTENTENDENTE POLICIA WALTER SURMAY PEREZ	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA.		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0246	05-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA, 7008 OCAÑA – ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCION		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0247	05-dic-23	INSPECCIÓN DE POLICIA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO	INFORMACIÓN ACCIDENTALIDAD CARRETERA NACIONAL 7007 AGUACLARA – OCAÑA		ss	
OF-CTO 2656 DE 2023-0248	07-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Acta de costos No. 4, contrato 2656-2023		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0249	08-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0250	08-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0251	08-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0252	08-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO	Programación semana comprendida del 08 al 14 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0253	11-dic-23	JUAN CARLOS JACOME ROPERO - Alcalde Municipal de Abrego	Daño a la Infraestructura Vial.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0254	12-dic-23	SECRETARIA DE TRÁNSITO ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA	Solicitud Información.		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0255	12-dic-23	A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Atn: Miguel Álvarez Arroyo	Solicitud de información		SOLICITUD	
OF-CTO 2656 DE 2023-0256	14-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.9		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0257	14-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.10		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0258	16-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.		INFORMATIVA	
OF-CTO 2656 DE 2023-0259	16-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.		INFORMATIVA	

OF-CTO 2656 DE 2023-0260	16-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0261	16-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 15 al 21 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0262	17-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	nforme accidente ocurrido el día 04-12-2023 en el PR 50+0237, ruta 7007	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0263	18-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	solicitud de prórroga No. 2 CTO 2656-2023	SOLICITUD
OF-CTO 2656 DE 2023-0264	20-dic-23	Señores A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S Atn: Miguel Álvarez Arroyo NIT No. 901.508.126-1	Contestación al oficio recibido el día 16 de diciembre del 2023.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0265	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta oficio Radicado 2023S-VOCA-030378 de Fecha 2023-12-20	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0266	22-dic-23	Señores SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0267	22-dic-23	Señores COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TARRA CIRO ALFONSO BECERRA ROPERO Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0268	22-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA Representante Legal	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0269	22-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 22 al 28 de diciembre de 2023 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0270	27-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.11	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0271	27-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Remisión Informe Semanal No.12	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0278	28-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Informe Accidente Ocurrido el día 14-12-2023 en el PR 50 + 0237, Ruta 7007.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0279	28-dic-23	FABIO MOJICA FERNANDEZ - SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	Informe mensual de accidentalidad mes de noviembre 2023	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0280	31-dic-23	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS MERCEDES NEIL DEL CARMEN ANGARITA GARCIA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024 Cooperativa de Trabajo Asociado Las Mercedes. Ruta 70NS01: PR 00+0000 al PR 33+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0281	31-dic-23	SERVICONSTRUCCIONES J Y R SAS MICHAEL RINCON DELGADO	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024. Ruta 7007: PR 43+0000 al PR 54+0787; ruta 7008: PR 00+0000 al PR 07+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0282	31-dic-23	CIRO ALFONSO BECERRA - COOPERATIVA EL TARRA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024 para la Cooperativa de Trabajo Asociado El Tarra. Ruta 7008: PR 38+0000 al PR 69+0000.	INFORMATIVA
OF-CTO 2656 DE 2023-0283	31-dic-23	INJEKOP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES SAS KELLY JOHANA ORTIZ PEÑARANDA	Programación semana comprendida del 29 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024. Ruta 7008: PR 07+0000 al PR 38+0000.	INFORMATIVA



CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. OFICIO	FECHA	REMITE	ASUNTO	
2023S-VOCA-025707	04-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-029239	INFORMATIVA
2023S-VOCA-027202	11-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-029691	INFORMATIVA
2023S-VOCA-027504	12-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud de entrega Informe Topográfico ? Informe de Monitoreo	SOLICITUD
2023S-VOCA-027613	12-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Socialización Memorando No 2023I-VBOG-028790	SOLICITUD
No aplica	16-dic-23	MIGUEL ERAZMO ALVAREZ ARROYO	Socialización Memorando No 2023I-VBOG-028790	SOLICITUD
2023S-VOCA-030378	20-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Solicitud Reporte Conforme a Derecho de Petición OMEGA LTDA	SOLICITUD
2023S-VOCA-031459	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Observaciones a la Publicación APU regionalizados periodo 2023_2	SOLICITUD
2023S-VOCA-031538	22-dic-23	ELIAS JAIMES FERNANDES - DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-039350	INFORMATIVA



CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISASA S.A.S
ADMINISTRACIÓN VIAL - INVIAS D.T. OCAÑA

Anexo 12

BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

01/dic/23.	En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.
	Actividades = Se Realiza mejoramiento de la capa de Rodadura en los PR 16+558; PR 16+580; PR 13+650; PR 14+500; PR 14+630; PR 15+000 PR 15+900; PR 16+480;
	En la Tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
02/dic/23.	En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
03/dic/23	En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.
	Firma 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
04/dic/23	En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.
	Actividades = Se Realiza limpieza de la via PR 24+300; limpieza de cuneta Revestida PR 24+050; Embellecimiento de la

líder=

Via PR 24+300; Roca y desmonte PR 23+900; PR 24+400

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

05/Dic/2023. En la mañana = tiempo soleado; tránsito Normal

Actividades = se Realiza limpieza de Alcantarilla PR y limpieza de cunetas Revestidas y en tiarol; embellecimiento de la via.; limpieza de cunetas.

En la tarde = tiempo soleado; tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

06/Dic/2023 En la mañana = tiempo soleado; tránsito Normal.

Actividades = Se Realizan Actividades de limpieza de cunetas revestidas; PR 23+200; PR 23+300;

En la tarde = tiempo soleado; tránsito Normal.





Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202 - 31751 ATL.

líder

07/Dic/2023	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	Actividades = se Realiza Remoción de derrumbes con maquinaria.
	En la tarde = tiempo Soleado; Transito Normal.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.
08/Dic/2023	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.
09/Dic/2023	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202 - 31751 ATL.
10/Dic/23	En la mañana. = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	Firma = 
	Nombre = Rafael David Reyes Alvarez - Ing. Residente.

líder

11/dic/23 En la mañana = tiempo soleado; Tránsito Normal.

Actividades = Se realiza limpieza de cunetas Revestidas PR28+050; PR28+050; limpieza Alcantarilla PR27+831; Se realiza limpieza de descoles PR; limpieza de la vía PR28+570.

En la Tarde = tiempo Soleado; tránsito Normal.

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

12/dic/23. En la mañana = tiempo Soleado; tránsito Normal.

Actividades = Se realiza limpieza de la vía PR28+570; PR28+530; limpieza de puentes PR28+570; limpieza de descoles PR28+688; limpieza de cunetas Revestidas; PR28+725; limpieza de Alcantarilla PR28+963; limpieza de encole y descole PR28+963; limpieza de cunetas Revestidas y en Tierra PR29+100; PR29+230.

En la Tarde = tiempo Soleado; tránsito Normal

Firma

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL

13/dic/23 En la mañana = tiempo Soleado; tránsito Normal.

Actividades = Se realiza limpieza de alcantarilla PR29+534;

líder=

limpieza de cunetas. Revestidas PR30+150; limpieza de Alcantarilla PR29+698; limpieza de defensas metálicas PR29+698; limpieza de cunetas Revestidas PR29+400;

En la tarde = tiempo soleado; Tránsito Normal.

Firma:

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

14/dic/23. En la mañana = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Actividades = se Realiza limpieza de desvle y encole PR31+017
limpieza de cunetas Revestidas y en tierra PR30+900; PR30+600.

En la Tarde = tiempo soleado; Tránsito Normal.

Firma:

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

15/dic/23 En la mañana = Tiempo soleado; Tránsito Normal.

Actividades = Se Realiza mejoramiento capa voladura PR15+800;
PR16+400; PR16+500; PR16+600; PR16+640; PR17+309;
PR17+320; PR17+450;

En la Tarde = Tiempo soleado; Tránsito Normal.


Firma =

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez - ing. Residente.

líder =

16/dic/23	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal. En la tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal. Firma. Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
17/dic/23	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal. En la tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal. Firma. = Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
18/dic/23	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal. Actividades = Se continua con el mejoramiento de la copa rocedural PR18+613; PR18+070; PR17+664; PR17+870. En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal. Firma. Nombre = Rafael David Reyes Alvarez. Cargo = Ingeniero Residente. No Mat = 08202-31751 ATL.
19/dic/23	En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal. Actividades = se continua con el mejoramiento de la copa Rockedural PR15+843; al PR17+000.

líder=

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

20/01/23. En la mañana = tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = se continua con el mejoramiento capa rodadura
PR26+550; PR26+500; PR26+450; PR15+843; PR18+850;
PR18+870; PR18+900; PR19+100; PR19+550; PR19+800; PR21+700
PR22+250.

En la Tarde = tiempo soleado; Transito Normal.

Firma = 

Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751 ATL.

21/01/23. En la mañana = tiempo soleado; Transito Normal.

Actividades = se continua con el mejoramiento capa rodadura.
PR26+250; PR26+180; PR26+050; PR26+100; PR25+900;
PR25+800; PR25+700; PR25+650; PR25+600; PR27+100;
PR26+900; PR26+800; PR26+700.

En la Tarde = tiempo soleado; Transito Normal.

Firma = 


Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.


Cargo = Ingeniero Residente.

No Mat = 08202-31751.

líder=



22/dic/23. En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
 Actividades; Inspeccion y vigilancia en todo el tramo vial,
 y demas.
 En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.
 Firma = 
 Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
 Cargo = Ingeniero Residente.
 No Mat = 08202-31751 ATL.

23/dic/23. En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
 En la tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
 Firma = 
 Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
 Cargo = Ingeniero Residente.
 No Mat = 08202-31751 ATL.

24/dic/23. En la mañana = Tiempo soleado; Transito Normal.
 En la tarde = Tiempo soleado; Transito Normal.
 Firma = 
 Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
 Cargo = Ingeniero Residente.
 No Mat = 08202-31751 ATL.

25/dic/23. En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
 En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
 Firma = 
 Nombre = Rafael David Reyes Alvarez.
 Cargo = Ingeniero Residente.

líder=

26/01/23	En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Actividades = se realiza limpieza de encofe y descofe. PR31+800; limpieza de cunetas revestidas; hoy se trabajo del PR30 al PR31+800.
	En la tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
27/01/23	En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal.
	Actividades = se realizan actividades del PR31+800 al PR33+000 con limpieza de cunetas Revestidas; limpieza de encofe y descofe; Rocella; limpieza de Alcantarilla.
	En la tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Firma. = 
	Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.
	Cargo. = Ingeniero Residente.
	No Mat = 08202-31751 ATL.
28/01/23	En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.
	Actividades = se realizan actividades del PR33+000 al PR33+700 en limpieza de cunetas; descofes, encofes, calzada y Retiro de material.

líder=

En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.

Firma =

Rafael

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No MAT = 08202 - 31751 ATL.

29/01/23

En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.

En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.

Firma =

Rafael

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No MAT = 08202 - 31751 ATL.

30/01/23

En la mañana = Tiempo Soleado; Transito Normal.

En la Tarde = Tiempo Soleado; Transito Normal.

Firma =

Rafael

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No MAT = 08202 - 31751 ATL.

31/01/23

En la mañana = Tiempo Nublado; Transito Normal.

En la Tarde = Tiempo Nublado; Transito Normal.

Firma =

Rafael

Nombre. = Rafael David Reyes Alvarez.

Cargo. = Ingeniero Residente.

No MAT = 08202 - 31751 ATL.

líder=
