



CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2022.

“MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL”

**INFORME TÉCNICO MENSUAL 21
DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DE ENERO DE 2025**

**CONSORCIO OBRAS MG
REGIONAL CENTRAL**

**Interventor:
NO SE CUENTA CON INTERVENTORIA PARA EL PERIODO DE ENERO 2025**

**Contratante:
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC**



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	5
2. OBJETIVOS	6
2.1. GENERAL.....	6
2.2. ESPECIFICOS	6
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	7
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	9
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	11
6. MANEJO DEL ANTICIPO	12
7. POLIZAS.....	13
7.1 Pólizas iniciales.....	13
7.2 Polizas Otro Si No. 2	13
7.3 Polizas Otro Si No 3	14
7.4 Polizas Otro Si No. 4	15
7.5 Polizas Otro Si No. 5	16
7.6 Polizas otro si No. 6	17
7.7 Polizas otro si No.7	17
8. Estado y avance de obra acorde con el cronograma aprobado y vigente.....	19
9. Balance presupuestal.	21
10. Control financiero	22
11. Gestión de actividades no previstas	23
12. Ejecución de pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones.....	27
13. Manejo de los materiales sobrantes y entrega de áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.....	27



14. Medidas que han garantizado el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial.....	27
15. Cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) (solo aplica, para agua potable).....	28
16. Horarios de trabajo que se han aplicado durante el período del corte.	28
18. Personal que se encontraba en el período de corte, por cuadrilla y personal calificado.	28
19. Copia por mes de las planillas de pago de seguridad social y parafiscales de los trabajadores.	29
20. Descripción de los cerramientos que se tienen instalados en las áreas de los trabajos.	29
21. Lista de equipos, maquinarias, herramientas y materiales utilizados en la obra.	29
22. Evidencia de garantía de calidad de materiales y elementos de la obra.	30
23. Actividades realizadas en el corte.	30
24. Actividades atrasadas en el corte.....	31
25. Actividades programadas para el próximo corte.....	32
26. Observaciones y/o novedades.	33
27. Registro fotográfico.	33
28. Resultados de los análisis in situ tomados a diario. Los parámetros serán previamente concertados de acuerdo con la interventoría.....	34
29. Copia de la bitácora.	34
30. Presencia o no de hallazgos arqueológicos.....	34
31. Planos guía de avance ejecutados en el periodo	34
32. Informe de seguridad en el trabajo.....	34
33. Informe de manejo ambiental.....	34
34. Actualización del programa de ejecución de actividades.....	34
35. Acreditación de pago de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda	34

CONSORCIO OBRAS MG



Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
Teléfono: 3133876020
Correo electrónico:
miagrupoempresarial@gmail.com Bogotá D.C -
Colombia



1. INTRODUCCION

El presente INFORME MENSUAL DE OBRA describe las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra **No. USPEC-CTO-314-2022** y cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL** y corresponde al periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero de 2025.

Se proporciona a través de este informe la información relacionada con el desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato de obra USPEC CTO 314 de 2022 durante el mes de enero de 2025.



2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Presentar información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario - USPEC, de los actos de ejecución del contrato de obras **No. USPEC – CTO – 314 2022, “MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL”**.

2.2. ESPECIFICOS

- Dar a conocer a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario - USPEC, de los actos de ejecución del contrato de Obras **No. USPEC – CTO – 314 2022, “MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL”**.
- Presentar en forma resumida las actividades técnicas, administrativas y financieras ejecutadas por el contratista de obra, durante el periodo de dicho informe.
- Informar al ente contratante de las diferentes decisiones tomadas por los participantes en la **MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC- REGIONAL CENTRAL**, de ajustes en campo de cada una de las actividades en ejecución, según requerimientos de terreno y diseños.



3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

El contrato de obra **No. USPEC – CTO – 314 2022** fue adjudicado al **CONSORCIO OBRAS MG** con el fin de desarrollar las obras de Mantenimiento en los establecimientos penitenciarios de la Regional central, las obras a llevarse a cabo contemplaban inicialmente once (11) establecimientos penitenciarios, tal como se describe a continuación:

FRENTE	ESTABLECIMIENTO
1	CPMSC CHIQUINQUIRA
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO
3	EPMSC YOPAL
4	CPAMS EL BARNE
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO
6	CPMS ACACIAS
7	EPMSC NEIVA
8	PMS GUADUAS
9	CPMSC GIRARDOT
10	CPMS ESPINAL
11	EP HELICONIAS

CONSORCIO OBRAS MG



No obstante, y de acuerdo al Otrosí No.3 del 30 de octubre de 2023 se aprobó redistribución de recursos del establecimiento EPMSC Neiva, a los establecimientos de CPAMSEB - EL BARNE (Combita) y el EPMSC Yopal. Por lo tanto, las actividades para el establecimiento EPMSC Neiva no serán ejecutadas.

FRENTE	ESTABLECIMIENTO
1	CPMSC CHIQUINQUIRA
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO
3	EPMSC YOPAL
4	CPAMS EL BARNE
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO
6	CPMS ACACIAS
7	PMS GUADUAS
8	CPMSC GIRARDOT
9	CPMS ESPINAL
10	EP HELICONIAS

El día ocho (8) de agosto de 2024 se firma la reactivación de contrato y se REINICIA la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2022; el día 10 de agosto de 2024, se realiza una reprogramación con finalización de ejecución el día diez (10) de marzo de 2025.

Se procede a acto administrativo en el cual se aprueba una prórroga Mediante otro si No. 5 con plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No 314 DE 2022 por el término de CUATRO (4) MESES, es decir, hasta el DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2024.

Mediante Otro Si No. 6 se realiza la inclusión de ítems no previstos de conformidad con el Informe Revisión de Análisis de Precios Unitarios No Previstos de fecha 06 de noviembre de 2024 suscrita por el Profesional del Grupo de Presupuestos.

Como última modificación a la vigencia del contrato 314 de 2022, por medio de acto administrativo en el cual se aprueba una prórroga Mediante otro si No. 7 con plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No 314 DE 2022 por el término de TRES (3) MESES, es decir, hasta el DIEZ (10) DE MARZO DE 2025



4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

- ✓ **Número de contrato:** **CONTRATO DE OBRA No. 314 DE 2022**

- ✓ **Objeto:** MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPE-REGIONAL CENTRAL

- ✓ **Fecha de acta de inicio:** 17 de noviembre de 2022
- ✓ **Valor inicial del contrato:** \$ 8.977.713.455
- ✓ **Adición presupuestal No 1:** \$ 3.526.474.647
- ✓ **Adición presupuestal No 2:** \$ 1.115.920.000
- ✓ **Valor actual de contrato:** \$ 13.620.108.092
- ✓ **Plazo inicial:** *Hasta el 31 de diciembre de 2022*
- ✓ **Prorroga 01:** *Hasta el 30 de junio de 2023*
- ✓ **Prorroga 02:** *Hasta el 30 de octubre de 2023*
- ✓ **Prorroga 03:** *Hasta el 29 de febrero de 2024*
- ✓ **Prorroga 04:** *Hasta el 10 de agosto de 2024*
- ✓ **Prorroga 05:** *Hasta el 10 de diciembre de 2024*
- ✓ **Otro si No. 06:** Se mantiene plazo final
- ✓ **Prorroga 07:** Hasta el 10 de marzo de 2025
- ✓ **ENERO 2025** **NO SE TIENE INTERVENTORIA**

CONSORCIO OBRAS MG



✓ Estado de las actas de pago parcial:	Acta parcial de obra 12 y 13
✓ Valor de las Actas parciales pagadas:	ACTA 01: \$ 406.030.075,38
	ACTA 02: \$ 510.528.439,00
	ACTA 03: \$ 167.425.321,00
	ACTA 04: \$ 974.210.731,37
	ACTA 05: \$84.079.335,61
	ACTA 06: \$1.472.756.903,50
	ACTA 07: \$1.065.777.511,40
	ACTA 08: \$ 1.214.897.962,35
	ACTA 09: \$ 1.125.524.371,10
	ACTA 10: \$ 1.921.938.048,15
	ACTA 11: \$ 1.073.335.803,28
✓ Valor de las actas en trámite:	ACTA 12: \$ 205.001.437,41
	ACTA 13: \$138.148.684,21
Contratista:	CONSORCIO OBRAS MG
✓ Interventoría:	NO SE TIENE EN EL PERIODO DE ENERO 2025



5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

5.1. ASPECTOS ADMINSTRATIVOS

Se reinicia el contrato a partir del 10 de agosto de 2024 hasta el 10 de marzo de 2025, prórroga solicitada para realizar la intervención en los establecimientos de CPAMS EL BARNE, CPMS ACACIAS Y EPMSC GUADUAS.

Como novedad importante, durante las eventualidades llevadas a cabo en el mes de enero de 2025, se presenta la suspensión del contrato de Interventoría la cual estuvo a cargo de EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICO CUNDINAMARCA (Acompañamiento hasta el 29 de diciembre de 2024), lo cual no nos ha sido notificado formalmente por parte de la entidad, esto ha creado incertidumbre en el normal desarrollo de actividades a ejecutar, y en la responsabilidad de las actividades que se han venido ejecutando.

Modificación en tiempo - prórrogas y suspensiones.

TIPO DE MODIFICACION	MOTIVO	PERIODO	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA
OTRO SI No. 1 – PRORROGA	Ampliación de la ejecución	1 de enero a 30 de junio de 2023	30 de junio de 2023
OTRO SI No. 1 – ADICION	Adición Presupuestal	1 de enero a 30 de junio de 2023	30 de junio de 2023
OTRO SI No. 2 – PRORROGA	Ampliación de la ejecución	1 de junio a 30 de octubre de 2023	30 de octubre de 2023
OTRO SI No. 2 – ADICION	Adición Presupuestal	1 de julio a 30 de octubre de 2023	30 de octubre de 2023
OTRO SI No. 3 – ADICION	Ampliación ejecución de plazo traslado de recursos e inclusión de NP	1 de noviembre de 2023 a 29 de febrero 2024	29 de febrero de 2024
OTRO SI No.4 - SUSPENSIÓN	suspensión de contrato	30 de febrero hasta 8 de agosto de 2024	8 de agosto de 2024
OTRO SI No. 5 PRORROGA	Prórroga Reinicio de actividades	10 de agosto hasta 10 de diciembre 2024	10 de diciembre de 2024



OTRO SI No. 6 PRORROGA	Inclusión de ítem no previstos	29 de noviembre de 2024	
OTRO SI No. 7 PRORROGA	Prorroga ampliación tiempo de ejecución	10 de diciembre de 2024 hasta el 10 de marzo de 2025	10 de marzo de 2025

Tabla 1 Modificaciones contrato

5.2. ASPECTOS LEGALES

El contrato se encuentra vigente hasta el 10 de marzo de 2025.

Se presenta la suspensión del contrato de Interventoría la cual estuvo a cargo de EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICO CUNDINAMARCA (Acompañamiento hasta el 29 de diciembre de 2024) lo cual no nos ha sido notificado formalmente por parte de la entidad.

6. MANEJO DEL ANTICIPO

El contrato de obra 314 de 2023, tiene un anticipo del 40% sobre el valor inicial del mismo, equivalente a **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 3.591.085.378,00).**

CONSORCIO OBRAS MG



7. POLIZAS

7.1 Pólizas iniciales.

Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	400044700	3-11-2022	30-06-2023	2.693.314.034.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	400044700	3-11-2022	31-12-2025	897.771.345.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	400044696	3-11-2022	30-06-2023	3.591.085.378.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	400044696	31-12-2022	31-12-2027	2.693.314.034.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	400044696	03-11-2022	21-12-2022	2.693.314.034.00
CALIDAD DEL SERVICIO	400044696	03-11-2022	30-06-2023	1.795.542.689.00

Compañía de seguros:	Seguros Del Estado	Fecha de expedición N:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	17-11-2021	31-12-2022	\$ 500.000.000,00

7.2 Polizas Otro Si No. 2

CONSORCIO OBRAS MG



Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	400044700	12-12-2022	30-12-2023	\$2.693.314.034.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	400044700	12-12-2022	30-06-2026	897.771.345.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	400044696	12-12-2022	30-12-2023	3.591.085.378.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	400044696	30-06-2023	30-06-2028	2.693.314.034.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	400044696	12-12-2022	30-06-2023	2.693.314.034.00
CALIDAD DEL SERVICIO	400044696	12-12-2022	31-12-2023	1.795.542.689.00

Compañía de seguros:	Seguros Del Estado	Fecha de expedición N:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	17-11-2021	30-06-2023	\$ 500.000.000,00

7.3 Polizas Otro Si No 3

OTRO SI No. 3				
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	400044700	30/04/2024	31/08/2024	\$ 4.068.032.427,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400044700	31/10/2027	01/03/2027	\$ 1.362.010.809,20
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	400044700	30/04/2024	31/08/2024	\$ 3.591.085.378,00

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
 Teléfono: 3133876020
 Correo electrónico:
miagrupoeempresarial@gmail.com Bogotá D.C -
 Colombia

CONSORCIO OBRAS MG



Estabilidad de la obra	400044700	28/04/2024	28/02/2029	\$ 4.086.032.427,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	400044700	08/11/2023	29/02/2024	\$ 4.086.032.427,60
Calidad de servicio	400044700	30/04/2024	31/08/2024	\$ 2.724.021.618,40

Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	31/10/2023	29/02/2024	\$ 580.000.000,00

7.4 Polizas Otro Si No. 4

OTRO SI No. 4				
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	400044700	20/12/2023	31/08/2024	\$ 4.068.032.427,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400044700	20/12/2023	01/03/2027	\$ 1.362.010.809,20
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	400044700	20/12/2023	31/08/2024	\$ 3.591.085.378,00
Estabilidad de la obra	400044700	28/04/2024	28/02/2029	\$ 4.086.032.427,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	400044700	20/12/2023	29/02/2024	\$ 4.086.032.427,60

CONSORCIO OBRAS MG



Calidad de servicio	400044700	20/12/2023	31/08/2024	\$ 2.724.021.618,40
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	31/10/2023	29/02/2024	\$ 580.000.000,00

7.5 Polizas Otro Si No. 5

OTRO SI No. 5				
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	400044700	08/08/2024	10/06/2025	\$ 4.068.032.427,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400044700	08/08/2024	10/12/2027	\$ 1.362.010.809,20
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	400044700	08/08/2024	10/06/2025	\$ 3.591.085.378,00
Estabilidad de la obra	400044700	10/12/2024	10/12/2029	\$ 4.086.032.427,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	400044700	08/08/2024	10/12/2024	\$ 4.086.032.427,60
Calidad de servicio	400044700	08/08/2024	10/06/2025	\$ 2.724.021.618,40
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	29/02/2024	10/12/2024	\$ 580.000.000,00

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201

Teléfono: 3133876020

Correo electrónico:

miagrupoespresarial@gmail.com Bogotá D.C -

Colombia

CONSORCIO OBRAS MG



RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	400044700	10/12/2024	10/09/2025	\$ 4.068.032.427,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400044700	10/12/2024	10/03/2028	\$ 1.362.010.809,20
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	400044700	10/12/2024	10/09/2025	\$ 3.591.085.378,00
Estabilidad de la obra	400044700	10/3/2025	10/03/2030	\$ 4.086.032.427,60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	400044700	10/12/2024	10/09/2025	\$ 4.086.032.427,60
Calidad de servicio	400044700	10/12/2024	10/09/2025	\$ 2.724.021.618,40
Compañía de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPIDICION:		
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	400044696	10/12/2024	10/03/2025	\$ 580.000.000,00

A continuación, se listan cada uno de los centros penitenciarios con el valor actualizado incluido el traslado de recursos según Otrosí No.3:

CONSORCIO OBRAS MG



FRENTE	ESTABLECIMIENTO	VALORES PRESUPUESTO INICIAL	INICIAL + ADICIÓN	VALOR ACTUALIZADO
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	\$ 178.043.842,00	\$ 368.043.842,00	\$ 368.043.842,00
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	\$ 96.009.854,00	\$ 376.123.680,00	\$ 376.123.680,00
3	EPMSC YOPAL	\$ 289.253.981,00	\$ 1.012.371.484,00	\$ 1.308.666.480,00
4	CPAMS EL BARNE RANCHO	\$ 1.937.469.179,00	\$ 1.937.469.179,00	\$ 1.637.445.202,00
4	CPAMS EL BARNE CONYUGALES			\$ 109.050.268,00
4	CPAMS EL BARNE PABELLON			\$ 525.912.530,00
4	CPAMS EL BARNE SUBESTACION			\$ 129.016.308,00
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	\$ 906.853.424,00	\$ 1.966.329.281,00	\$ 1.966.329.281,00
6	CPMS ACACIAS	\$ 1.378.448.614,00	\$ 2.841.925.428,00	\$ 2.841.925.428,00
7	CPMSC NEIVA	\$ 676.220.520,00	\$ 676.220.520,00	
8	PMS GUADUAS	\$ 1.426.088.292,00	\$ 2.352.181.979,00	\$ 2.268.152.374,00
9	CPMSC GIRARDOT	\$ 305.365.331,00	\$ 305.482.291,00	\$ 305.482.291,00
10	CPMS ESPINAL	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.265.531,00
11	EP HELICONIAS	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.877,00
		\$ 8.977.713.445,00	\$ 13.620.108.092,00	\$ 13.620.108.092,00

Tabla 2. Balance general contrato 314 OTROSI No 3.

8. Estado y avance de obra acorde con el cronograma aprobado y vigente.

Con corte a 31 de enero de 2025 el contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado del 83,01% y un porcentaje programado del 99,07% según programación contractual y un avance financiero correspondiente al 76,97%. Este avance obedece a la ejecución de obras generadas sobre los siguientes establecimientos:

- CPMSC CHIQUINQUIRA
- CPMSC PAZ DE ARIPORO
- EPMSC YOPAL

CONSORCIO OBRAS MG



- CPAMS EL BARNE
- CPMS ACACIAS
- CPMSC - RM VILLAVICENCIO
- EP HELICONIAS
- CPMSC GIRARDOT
- EPMS GUADUAS

AVANCE DE OBRA A LA FECHA

No.	ESTABLECIMIENTO	VALORES PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL DEL CONTRATO	% EJECUCION EN VALOR	% EJECUCION	% PROGRAMADO EN VALOR	% PROGRAMACION	% AVANCE
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	\$ 178.043.842,00	\$ 368.043.842,00	\$ 368.041.726,90	100,0%	\$ 368.043.842,00	100,0%	0%
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	\$ 96.009.854,00	\$ 376.123.680,00	\$ 376.123.649,09	100,0%	\$ 376.123.680,00	100,0%	0%
3	EPMS YOPAL	\$ 289.253.981,00	\$ 1.308.666.480,00	\$ 1.308.665.690,50	100,0%	\$ 1.308.666.480,00	100,0%	0%
4	CPAMS EL BARNE	\$ 1.937.469.179,00	\$ 2.401.424.308,00	\$ 2.233.324.606,44	93,0%	\$ 2.353.395.821,84	98,0%	-5%
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	\$ 906.853.424,00	\$ 1.966.329.281,00	\$ 1.966.329.347,27	100,0%	\$ 1.966.329.281,00	100,00%	0%
6	CPMS ACACIAS	\$ 1.378.448.614,00	\$ 2.841.925.428,00	\$ 1.506.220.476,84	53,0%	\$ 2.642.990.648,04	93,00%	-40%
7	NEIVA	\$ 676.220.520,00		\$ -				
8	PMS GUADUAS	\$ 1.426.088.292,00	\$ 2.268.152.374,00	\$ 635.082.664,72	28,0%	\$ 1.979.845.392,10	87,3%	-59%
9	CPMSC GIRARDOT	\$ 305.365.331,00	\$ 305.482.291,00	\$ 305.460.353,22	100,0%	\$ 305.482.291,00	100,0%	0%
10	CPMS ESPINAL	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.262.945,55	100,0%	\$ 1.354.265.531,00	100,0%	0%
11	EP HELICONIAS	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.869,52	100,0%	\$ 429.694.877,00	100,0%	0%
TOTAL		\$ 8.977.713.445,00	\$ 13.620.108.092,00	\$ 10.483.206.330,05	76,97%	\$ 13.084.837.843,98	96,07%	-19,10%

Tabla 3, AVANCE DE OBRA A 31 DE ENERO 2025

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201
 Teléfono: 3133876020
 Correo electrónico:
miagrupoespresarial@gmail.com Bogotá D.C -
 Colombia

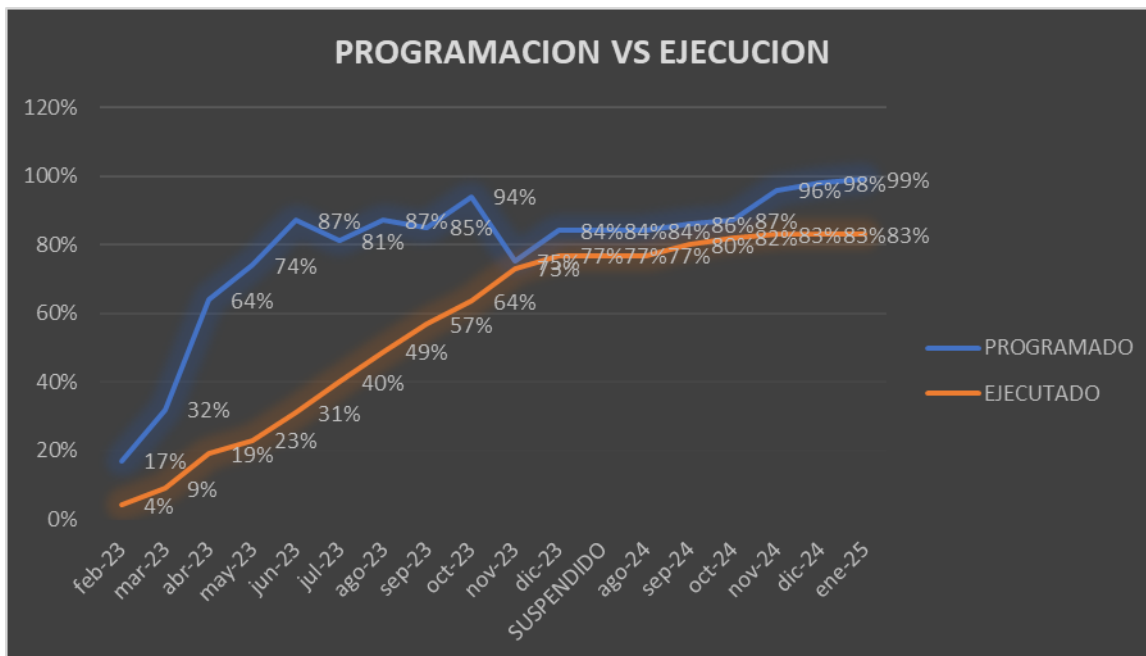


Gráfico 01. Programación vs ejecución de contrato

9. Balance presupuestal.

De acuerdo con las visitas realizadas a los establecimientos se identificó que para dar cumplimiento a los alcances contractuales y la inclusión de las actividades NO PREVISTAS era necesario actualizar el balance en cada establecimiento, ejercicio que como resultado un balance general final el cual requería una adición presupuestal. **Adición que ya se hizo efectiva mediante el otro si No 2. Así mismo, mediante otro si No 3, de prorroga y redistribución de recurso fue MODIFICADO el balance, quedando de la siguiente manera.**

Para continuar con la ejecución del contrato y sus nuevos balances actualizados de los establecimientos que se encuentran en ejecución, se realiza la inclusión de los ítem no previstos aprobados mediante Otro si No.6

CONSORCIO OBRAS MG



FRENTE	ESTABLECIMIENTO	VALORES PRESUPUESTO INICIAL	INICIAL + ADICIÓN	VALOR ACTUALIZADO
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	\$ 178.043.842,00	\$ 368.043.842,00	\$ 368.043.842,00
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	\$ 96.009.854,00	\$ 376.123.680,00	\$ 376.123.680,00
3	EPMSC YOPAL	\$ 289.253.981,00	\$ 1.012.371.484,00	\$ 1.308.666.480,00
4	CPAMS EL BARNE RANCHO	\$ 1.937.469.179,00	\$ 1.937.469.179,00	\$ 1.637.445.202,00
4	CPAMS EL BARNE CONYUGALES			\$ 109.050.268,00
4	CPAMS EL BARNE PABELLON			\$ 525.912.530,00
4	CPAMS EL BARNE SUBESTACION			\$ 129.016.308,00
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	\$ 906.853.424,00	\$ 1.966.329.281,00	\$ 1.966.329.281,00
6	CPMS ACACIAS	\$ 1.378.448.614,00	\$ 2.841.925.428,00	\$ 2.841.925.428,00
7	CPMSC NEIVA	\$ 676.220.520,00	\$ 676.220.520,00	
8	PMS GUADUAS	\$ 1.426.088.292,00	\$ 2.352.181.979,00	\$ 2.268.152.374,00
9	CPMSC GIRARDOT	\$ 305.365.331,00	\$ 305.482.291,00	\$ 305.482.291,00
10	CPMS ESPINAL	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.265.531,00	\$ 1.354.265.531,00
11	EP HELICONIAS	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.877,00	\$ 429.694.877,00
		\$ 8.977.713.445,00	\$ 13.620.108.092,00	\$ 13.620.108.092,00

Tabla 4. balance otro si No 3.

10. Control financiero

El desarrollo financiero del contrato no ha cumplido con lo programado toda vez que a la fecha se han EJECUTADO **\$ 11.304.689.716,36** de **\$ 13.483.907.011,08** PROGRAMADOS lo cual equivale a un 83,00%. de avance ejecutado y a un 99,07% del valor total programado del contrato.



Gráfico 02. Avance financiero Programacion Vs Ejecución

11. Gestión de actividades no previstas

A la fecha se han incorporado dentro del contrato de obra los ITEMS NO PREVISTOS identificados en cada establecimiento.

Se realizó inclusión de ítem no previstos mediante Otro si No.3 y Otro Si No.6 los cuales fueron evaluados por junto con interventoría y supervisión del contrato, dando viabilidad.

Item no Previstos Otro Si No.6, aprobados en noviembre 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	Valor Unitario	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
NP-GAS07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AG 1 1/4" ASTM A 53 SCH 40 CON ACCESORIOS ROSCADOS	M	\$ 183.438,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AG 1" ASTM A 53 SCH 40 CON ACCESORIOS ROSCADOS	m	\$ 158.760,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato

CONSORCIO OBRAS MG



NP-GAS09	SOPORTERÍA PARA TUBERIA TIPO RIEL CHANEL CON ABRAZADERA AJUSTABLE Y AISLANTE DIELECTRICA 1" (1 TUBO)	UND	\$ 42.990,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CORTE GAS CR 1"	UND	\$ 57.982,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIVERSAL DE GAS AG 1"	UND	\$ 57.982,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CORTE GAS CR 1 1/4"	UND	\$ 216.742,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN DE SEGUNDA ETAPA 1800 CPB2 1 1/4" ORIF 5/16 PS 1-30 PSI	UND	\$ 2.464.217,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN ASOCIADA SIN VENTEO DE SEGUNDA ETAPA 1"	UND	\$ 935.500,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR INDUSTRIAL AL 425 -10	UND	\$ 6.798.800,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-GAS16	Mantenimiento y adecuación de Red de suministro de Gas de las Martimitas; incluye suministro de elementos necesarios para su correcto funcionamiento (hasta 50 MI), y cambio de accesorios en mal estado.	UND	\$ 54.690.139,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC43	Suministro, transporte e instalación de sobre cubierta, con perfil tipo estructural (Viga Tubular, columna tubular, correas platinas, anclajes, cortavientos, templetes o demás elementos necesarios para ejecución de la actividad) (Incluye andamio, equipo de izaje, soldadura, anticorrosivo y pintura)	kg	\$ 29.654,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC44	Suministro, transporte e instalación de teja arquitectónica o similar Cal. 26 (Incluye teja arquitectónica, tornillería, andamio y equipo necesario para instalación)	m2	\$ 112.735,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201

Teléfono: 3133876020

Correo electrónico:

miagrupoesmpresarial@gmail.com Bogotá D.C -

Colombia

CONSORCIO OBRAS MG



NP-OC45	Resane correctivos sobre muros en bloque estructural a la vista que presentan humedades y filtraciones de agua. Incluye pañete con mortero 1:3 impermeabilizado, superficie de aplicación entre 2 cm hasta 3.5 cm de grosor. Incluye capa protectora sobre pañete a base de invercyl 500 resina acrílica impermeabilizante, implementos para trabajos en altura. Incluye mediacaña en mortero y recubierta con manto asfáltico altura 50CM.	M2	\$ 261.481,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC46	Reparqueo sobre losa de cubierta con manto asfáltico preexistente que presenta filtraciones. Incluye desmonte del manto afectado, limpieza y preparación del área. Incluye suministro e instalación de manto asfáltico AUTOADH 2.5mm TEXSA, así mismo, aplicación de emulsión asfáltica para una mejor adherencia.	M2	\$ 151.092,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC47	Tubería CPVC 3/4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.	m	\$ 52.328,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC48	Tubería CPVC 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.	m	\$ 46.255,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato

CONSORCIO OBRAS MG



NP-OC49	Punto AC CPVC 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	Und	\$ 112.775,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC50	Suministro e instalación de contramarco en acero inoxidable 304 con ángulo de 1 y ¼" X 3/16" y platinas de 1 y ¼" con espacios entre platinas máximo de 2cm, de 0.25 x 1.20.	Und	\$ 1.164.501,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP-OC51	Suministro e instalación de contramarco en acero inoxidable 304 con ángulo de 1 y ¼" X 3/16" y platinas de 1 y ¼" con espacios entre platinas máximo de 2cm, de 0.30 x 1.20; incluye bandeja microperforada en acero inoxidable tipo batea con punto de evacuación de líquidos.	Und	\$ 1.717.121,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato
NP - OC52	Demolición manual de placa de contrapiso resistencia de 4000 a 5000 psi h.>30<=40 cm. Incluye retiro manual de malla electrosoldada y varillas 3/8 (de 3 a 5 mallas existentes en la placa) , cargue manual en carretilla, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	M2	\$ 188.261,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato para los establecimientos que aun están en ejecucion
NP - OC53	Suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema de bombeo y presión (Incluye 2 bombas 2Hp, 1 tanque hidroflew de 200 litros, un tablero tipo estrella triángulo para arranque y control de trabajo con sistema de relevo de bombas, válvulas tipo cheque, válvula de corte, válvula de pie, tubería pvc y demás accesorios necesarios para la conexión a tanques de suministro hasta la conexión a la tubería de descarga.)	und	\$ 38.795.951,00	Actividad requerida según el diseño hidráulico para la zona de Rancho, esto con el fin de garantizar el flujo en toda la red de presión.
NP - OC54	Suministro, transporte, montaje, instalación y puesta en marcha de sistema de bombeo y presión (Incluye 2 bombas 1 Hp, 1 tanque hidroflew de 100 litros, un tablero tipo estrella triángulo para arranque y control de trabajo con sistema de relevo de bombas, válvulas tipo cheque, válvula de corte, válvula de pie, tubería pvc y demás accesorios necesarios para la conexión a	und	\$ 32.982.231,00	Actividad requerida según el diseño hidráulico para la zona de Rancho, esto con el fin de garantizar el flujo en toda la red de presión

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201

Teléfono: 3133876020

Correo electrónico:

miagrupoempresarial@gmail.com Bogotá D.C -

Colombia



	tanques de suministro hasta la conexión a la tubería de descarga.)			
NP-OC55	SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITA DE ACEITE TERMICO . Incluye marmita de aceite termico, fabricada en acero inoxidable 304, capacidad de 360 litros, sistema volcable, potencia 145.000 BTU, doble camisa, Temperatura maxima 200°C en el aceite térmico, Quemador indeformable, valvula de seguridad, Válvula de desagüe y Caja reductora	und	\$47.695.000,00	ACTIVIDAD REQUERIDA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PABELLON AB DE ACACIAS
NP-E39	Reconfiguración de transferencia automática recableado sistema de control sincronización de interruptores motorizados	UND	\$ 3.948.000,00	Actividad requerida con el fin de cumplir con el contrato

12. Ejecución de pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones.

No se presentaron pruebas.

13. Manejo de los materiales sobrantes y entrega de áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

No se están realizando actividades de manejo de sobrantes o entrega de áreas en los establecimientos por intervenir. (CPAMS EL BARNE, CPMS ACACIAS Y EPMSC GUADUAS)

Áreas de trabajo limpias y despejadas.

14. Medidas que han garantizado el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial.

Establecimientos CPMS ACACIAS Y EPMSC GUADUAS.

A la fecha todo el personal presente en obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social teniendo en cuenta lo que establece la ley y cuentan con los elementos de protección personal, propios de las actividades realizadas, tal y como se puede observar en el informe SST.

Como requisito para la ejecución de las actividades del contrato de la referencia, se presenta anexo con informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores a partir de una política de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la satisfacción de los trabajadores.

Dirección: Carrera 8 # 12-21 Of 1201

Teléfono: 3133876020

Correo electrónico:

miagrupoempresarial@gmail.com Bogotá D.C -

Colombia



Para el establecimiento CPAMS EL BARNE; no se han iniciado actividades

15. Cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) (solo aplica, para agua potable).

. (CPAMS EL BARNE, CPMS ACACIAS Y EPMSC GUADUAS).

16. Horarios de trabajo que se han aplicado durante el período del corte.

En los establecimientos en los cuales se programaron actividades en el mes enero se suspendieron actividades a partir del día 20 de diciembre de 2024 hasta el día 13 de enero.

Debido a celebraciones de fin de año en los establecimientos de ACACIAS y GUADUAS-

El horario de trabajo para todos los establecimientos es el siguiente:

LUNES A VIERNES	8:00 A.M. 4: 00 P.M.
SABADOS	MEDIO DIA
DOMINGO	NO SE TRABAJA

17. Tabla 3. Horario de trabajo en establecimientos

18. Personal que se encontraba en el período de corte, por cuadrilla y personal calificado.

El contratista en el periodo tramita el ingreso del siguiente personal a los diferentes centros penitenciarios.

Personal CPAMS EL BARNE

RELACIÓN DE PERSONAL MES DE ENERO DEL 2025				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CC	ESTADO
1	LIZETH TATIANA LEANDRO ÁVILA	INSP DE OBRA	1.049.654.585	ACTIVO
2	ANGIE VIVIANA MORENO	RES DE OBRA 1	1.032.452.812	ACTIVO



Personal EPMSC GUADUAS

RELACIÓN DE PERSONAL MES DE ENERO DEL 2025				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CC	Fecha de ingreso
1	NICOLE ROJAS SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRA	1.105.790.903	5/11/24

Personal CPMS ACACIAS

No Aplica

19. Copia por mes de las planillas de pago de seguridad social y parafiscales de los trabajadores.

Ver **Anexo 03.** Pago de planillas de seguridad social, fondo de pensiones y ARL.

20. Descripción de los cerramientos que se tienen instalados en las áreas de los trabajos.

Los centros penitenciarios no han requerido instalación encerramientos.

21. Lista de equipos, maquinarias, herramientas y materiales utilizados en la obra.

EQUIPOS	MATERIALES
PULIDORA	
TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH	
RANA COMPACTADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
PULIDORA	
TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH	
RANA COMPACTADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
PULIDORA	
TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH	
RANA COMPACTADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
COMPRESOR NEUMATICO	
MARTILLOS NEUMATICOS	

Tabla 5. Relación de equipos y materiales.

Ilustración 1, PERSONAL EN OBRA



22. Evidencia de garantía de calidad de materiales y elementos de la obra.

Ver **Anexo 04**. Certificados de calidad de materiales.

23. Actividades realizadas en el corte.

En el periodo se ejecutaron obras en los establecimientos de:

- ✓ CPAMS EL BARNE
- ✓ CPMS ACACIAS
- ✓ CPMC GUADUAS

FRENTE	ESTABLECIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	Obras culminadas.
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	Obras culminadas.
3	EPMSC YOPAL	Obras culminadas.
4	CPAMS EL BARNE	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere acompañamiento de interventoría para reconocimiento y recibo de actividades ejecutadas durante el periodo, y así cumplir con el desarrollo normal de las obras programadas. A la espera de Definición y asignación de espacios donde se llevará acabo las actividades pendientes en cuarto de bombeo
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	Obras culminadas.
6	CPMS ACACIAS	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere acompañamiento de interventoría para reconocimiento y recibo de actividades ejecutadas durante el periodo, y así cumplir con el desarrollo normal de las obras programadas. Se requiere con urgencia definición de DISEÑOS DE REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS para poder avanzar con la ejecución de forma mas optimizada



		<ul style="list-style-type: none"> • Se continua en este periodo adelantando diseños del rancho del área c, balances y programaciones de obras. • Se inicia la planificación para iniciar las demoliciones de acabados de pisos, • Demoliciones de placas de contrapisos, demoliciones de enchapes y demoliciones de muros.
7	CPMSC NEIVA	Recursos redistribuidos
8	CPMS GUADUAS	<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere acompañamiento de interventoría para reconocimiento y recibo de actividades ejecutadas durante el periodo, y así cumplir con el desarrollo normal de las obras programadas. • Se requiere con urgencia definición de DISEÑOS DE REDES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS para poder avanzar con la ejecución de forma mas optimizada • Se adelantan las actividades de demoliciones y desmontes de enchapes. • Se continua en este periodo adelantando diseños, balances y programaciones de obras.
9	CPMSC GIRARDOT	Obras culminadas.
10	CPMS ESPINAL	Obras culminadas.
11	EP HELICONIAS	Obras culminadas.

Tabla 6. Actividades ejecutadas

24. Actividades atrasadas en el corte.

De acuerdo con lo relacionado en la Tabla 07, se presentan atrasos que obedecen principalmente a que no se han entregado por parte de la USPEC los zonas de trabajo para intervención en **CPAMS EL BARNE**, definición de diseños ranchos de **CPMS ACACIAS; PMS GUADUAS**; en la **Tabla 07** se puede evidenciar los porcentajes.

Se presenta la suspensión del contrato de Interventoría la cual estuvo a cargo de EMPRESA INMOBILIRIA Y DE SERVICIOS LOGISTICO CUNDINAMARCA (Acompañamiento hasta el 29 de diciembre de 2024) lo cual no nos ha sido notificado formalmente por parte de la entidad.



No.	ESTABLECIMIENTO	TOTAL DEL CONTRATO	% de Incidencia en el Contrato	% EJECUCION	% PROGRAMACION	% AVANCE
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	\$ 368.043.842,00	2,70%	100,0%	100,0%	0%
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	\$ 376.123.680,00	2,76%	100,0%	100,0%	0%
3	EPMSC YOPAL	\$ 1.308.666.480,00	9,61%	100,0%	100,0%	0%
4	CPAMS EL BARNE	\$ 2.401.424.308,00	17,63%	93,0%	98,0%	-5%
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	\$ 1.966.329.281,00	14,44%	100,0%	100,00%	0%
6	CPMS ACACIAS	\$ 2.841.925.428,00	20,87%	53,0%	93,00%	-40%
7	NEVA					
8	PMS GUADUAS	\$ 2.268.152.374,00	16,65%	28,0%	87,3%	-59%
9	CPMSC GIRARDOT	\$ 305.482.291,00	2,24%	100,0%	100,0%	0%
10	CPMS ESPINAL	\$ 1.354.265.531,00	9,94%	100,0%	100,0%	0%
11	EP HELICONIAS	\$ 429.694.877,00	3,15%	100,0%	100,0%	0%
TOTAL		\$ 13.620.108.092,00	100%	76,97%	96,07%	-19,10%

Tabla 07. programación vs ejecución

25. Actividades programadas para el próximo corte.

FRENTE	ESTABLECIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1	CPMSC CHIQUINQUIRA	Establecimiento terminado.
2	CPMSC PAZ DE ARIPORO	Establecimiento terminado.
3	EPMSC YOPAL	Establecimiento terminado.
4	CPAMS EL BARNE	Dependemos de la definición del cuarto de bombeo
5	CPMSC - RM VILLAVICENCIO	Establecimiento terminado.
6	CPMS ACACIAS	Demoliciones de placas de contrapiso, retiro de escombros, demoliciones de muros, desmontes de equipos en acero inoxidable, desmonte de aparatos sanitarios



7	CPMSC NEIVA	Redistribución de recursos mediante otro si No 3.
8	PMS GUADUAS	Construcción de placa contra piso, mantenimiento de cubierta, y enchape de muros
9	CPMSC GIRARDOT	Establecimiento terminado.
10	CPMS ESPINAL	Establecimiento terminado.
11	EP HELICONIAS	Establecimiento terminado.

26. Observaciones y/o novedades.

No aplica en este periodo

27. Registro fotográfico.

No aplica

- Demolición manual de Pañetes:
- Relleno manual con recebo B-200
- Excavación manual en material común
- Relleno manual con arena de río
- Instalación de Tuberías PVCs 2", 3", 4" y 6" instalada subterránea.



28. Resultados de los análisis in situ tomados a diario. Los parámetros serán previamente concertados de acuerdo con la interventoría

No aplica en este periodo

29. Copia de la bitácora.

Ver Anexo 02. Bitácoras de obra.

30. Presencia o no de hallazgos arqueológicos.

No se presentaron en el periodo hallazgos arqueológicos en ninguno de los centros penitenciarios intervenidos.

31. Planos guía de avance ejecutados en el periodo

Se realiza toma de medidas y se atienden observaciones con solicitudes por parte de los establecimientos, CPMS ACACIAS Y EPMSC GUADUAS. Respecto a los diseños para culminar su presentación y proceder a la aprobación del mismo.

32. Informe de seguridad en el trabajo.

N/A

33. Informe de manejo ambiental.

N/A

34. Actualización del programa de ejecución de actividades.

En el **Anexo 07. Programaciones de obra** Se presentan las programaciones vigentes para el periodo.

35. Acreditación de pago de aportes parafiscales, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda

Ver Anexo 03. Pago de planillas de seguridad social, fondo de pensiones y ARL.
