


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Sucesoras	Predecesoras	5	feb	mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul
0	0	PROGRAMA - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPACIO PUBLICO MARINILLA	84 días	mar 25/03/25	lun 16/06/25	\$ 275.366.000,00											
1	1	INICIO DE OBRA	0 días	mar 25/03/25	mar 25/03/25	\$ 0,00	2;7FC+40 días;20FC+40										
2	2	Visita de reconocimiento de campo	14 días	mar 25/03/25	lun 7/04/25	\$ 0,00	3	1									
3	3	Recopilación de información preliminar	5 días	mar 8/04/25	sáb 12/04/25	\$ 0,00	5;16;18;17	2									
4	4	FRENTE 1	65 días	dom 13/04/25	lun 16/06/25	\$ 181.594.000,00											
5	4.1	Estudio topográfico, incluye ortofotos	15 días	dom 13/04/25	dom 27/04/25	\$ 23.800.000,00	6	3									
6	4.2	Diseño arquitectonico preliminar	15 días	lun 28/04/25	lun 12/05/25	\$ 6.545.000,00	8;9;10;11	5									
7	4.3	Estudio de suelos y diseño de pavimentos	15 días	dom 4/05/25	dom 18/05/25	\$ 18.207.000,00	9	1FC+40 días									
8	4.4	Diseños arquitectónicos	15 días	mar 13/05/25	mar 27/05/25	\$ 19.635.000,00	13	6									
9	4.5	Diseño estructural	15 días	lun 19/05/25	lun 2/06/25	\$ 24.395.000,00	13;10CC+1 día	6;7									
10	4.6	Diseño de redes hidrosanitarias y diseño hidráulico.	15 días	mar 20/05/25	mar 3/06/25	\$ 17.612.000,00	13;11CC+1 día	6;9CC+1 día									
11	4.7	Diseño eléctrico	15 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	\$ 26.299.000,00	13;12CC	6;10CC+1 día									
12	4.8	Diseño de iluminación	15 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	\$ 23.205.000,00	13	11CC									
13	4.9	Presupuesto, cronograma, manual de especificaciones técnicas y análisis de riesgo	12 días	jue 5/06/25	lun 16/06/25	\$ 15.946.000,00	28	8;9;10;11;12									
14	4.10	Inventario forestal	7 días	sáb 24/05/25	vie 30/05/25	\$ 5.950.000,00	28	1FC+60 días									
15	5	FRENTE 2	65 días	dom 13/04/25	lun 16/06/25	\$ 93.772.000,00											
16	5.1	Estudio predial	15 días	dom 13/04/25	dom 27/04/25	\$ 8.330.000,00	28	3									
17	5.2	Estudio de impacto social	15 días	dom 13/04/25	dom 27/04/25	\$ 4.760.000,00	28	3									
18	5.3	Estudio topográfico	10 días	dom 13/04/25	mar 22/04/25	\$ 12.495.000,00	19	3									
19	5.4	Diseño arquitectonico preliminar	12 días	mié 23/04/25	dom 4/05/25	\$ 4.641.000,00	21;22;23;24	18									
20	5.5	Estudio de suelos	15 días	dom 4/05/25	dom 18/05/25	\$ 8.330.000,00	22	1FC+40 días									
21	5.6	Diseños arquitectónicos y de urbanismo	15 días	lun 5/05/25	lun 19/05/25	\$ 13.923.000,00	26	19									
22	5.7	Diseño estructural de todos los elementos urbanos requeridos del proyecto.	15 días	lun 19/05/25	lun 2/06/25	\$ 13.149.500,00	26;23CC+1 día	19;20									
23	5.8	Diseño de redes hidrosanitarias y diseño hidráulico	15 días	mar 20/05/25	mar 3/06/25	\$ 5.950.000,00	26;24CC+1 día	19;22CC+1 día									
24	5.9	Diseño eléctrico	15 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	\$ 7.140.000,00	26;25CC	19;23CC+1 día									
25	5.10	Diseño de iluminación	15 días	mié 21/05/25	mié 4/06/25	\$ 6.842.500,00	26	24CC									
26	5.11	Presupuesto, cronograma, manual de especificaciones técnicas y análisis de riesgo	12 días	jue 5/06/25	lun 16/06/25	\$ 5.831.000,00	28	21;22;23;24;25									
27	5.12	Inventario forestal	5 días	sáb 24/05/25	mié 28/05/25	\$ 2.380.000,00	28	1FC+60 días									
28	6	FIN DE OBRA	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	\$ 0,00		27;16;17;13;14;26									

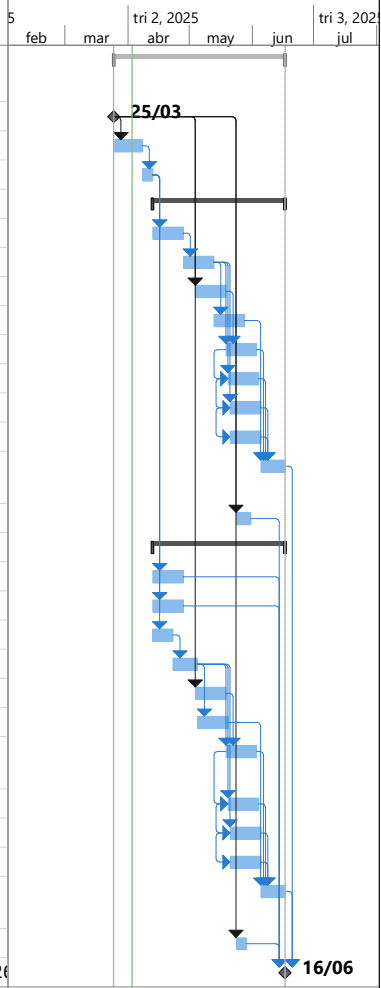

PAULO A. GUARIN
Paulo Andrés Guarín Walteros
Representante Legal

Proyecto: PROGRAMA - ESTUD Fecha: jue 3/04/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			
