

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic															
					tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025						
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct						
1	CRONOGRAMA PRELIMINAR COP-552-2024(120683)	166 días	mar 21/01/25	lun 22/09/25																
2	ETAPA PRELIMINAR	14 días	mié 22/01/25	lun 10/02/25																
3	Firma acta de inicio	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25																
4	Actualización de pólizas según acta de inicio	2 días	jue 23/01/25	vie 24/01/25																
5	Hojas de vida de personal profesional	13 días	jue 23/01/25	lun 10/02/25																
6	Recorrido reconocimiento de CIV's(Contratista, interventoria y supervisión).	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25																
7	ETAPA DE DIAGNÓSTICO	22 días	jue 23/01/25	vie 21/02/25																
8	Reporte de inicio de contrato a empresas de servicios públicos	2 días	mar 28/01/25	mié 29/01/25																
9	verificación de segmentos viales que se encuentren en el PEMP y reservas de PMT /IDU	15 días	jue 23/01/25	mié 12/02/25																
10	Cronograma general del proyecto	5 días	jue 23/01/25	mié 29/01/25																
11	Plan anual de caja (PAC)	8 días	jue 23/01/25	lun 3/02/25																
12	Entrega de diagnósticos de segmentos viales	22 días	jue 23/01/25	vie 21/02/25																
13	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	44 días	mar 21/01/25	vie 21/03/25																
14	Análisis de precios unitarios según propuesta económica y desglose de A.I.U	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25																

Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: jue 23/01/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic															
					tri 1, 2025			tri 2, 2025			tri 3, 2025			tri 4, 2025						
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct						
15	Recorrido de obra N°1 asistencia de Contratista,FDLT, Interventoria visita a (10) CIV's de calzada	1 día	mié 29/01/25	mié 29/01/25																
16	Recorrido de obra N°2 asistencia de Contratista,FDLT, interventoria visita a (5) CIV's de calzada-cicloruta y andenes	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25																
17	Presupuesto del proyecto	30 días	mié 29/01/25	mar 11/03/25																
18	Priorización de segmentos viales	1 día	mar 11/02/25	mar 11/02/25																
19	Plan de gestión de RCD	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25																
20	Apertura de PIN	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25																
21	Entrega de diseños de pavimento y espacio público	30 días	jue 6/02/25	mié 19/03/25																
22	Inicio inspección de redes de alcantarillado con CCTV(7 CIV'S)	30 días	lun 10/02/25	vie 21/03/25																
23	Programación de visitas técnicas para identificación de redes con EPS (ETB,Vanti) 4 Frentes	15 días	jue 20/02/25	mié 12/03/25																
24	Plan de manejo de tráfico-PMT	30 días	lun 10/02/25	vie 21/03/25																
25	Plan de calidad	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25																
26	Plan de inspección de ensayos	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25																
27	Plan de manejo ambiental	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25																

Proyecto: CRONOGRAMA 552- Fecha: jue 23/01/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

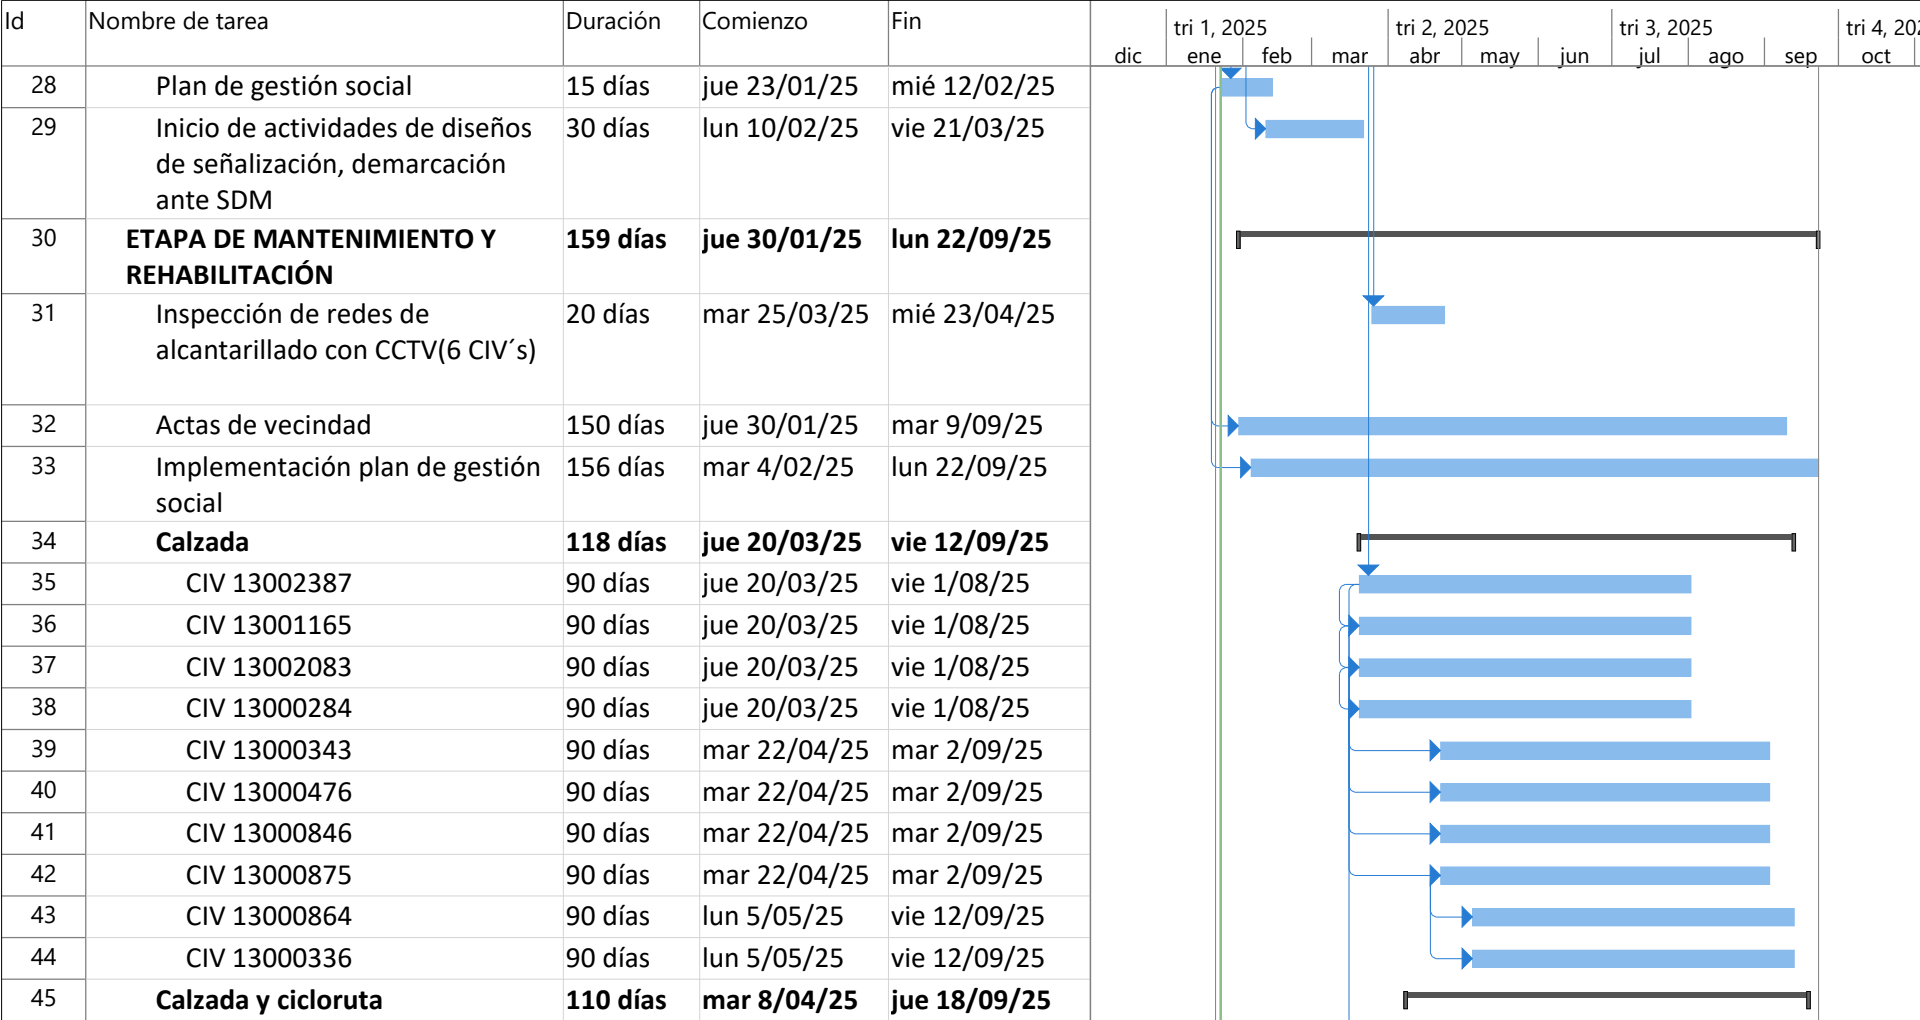

Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: jue 23/01/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart Timeline																				
					dic	tri 1, 2025 ene	feb	mar	tri 2, 2025 abr	may	jun	tri 3, 2025 jul	ago	sep	tri 4, 2025 oct										
46	CIV 13000593	110 días	mar 8/04/25	jue 18/09/25																					
47	CIV 13000686	110 días	mar 8/04/25	jue 18/09/25																					
48	CIV 13000794	110 días	mar 8/04/25	jue 18/09/25																					
49	Andenes	97 días	vie 2/05/25	lun 22/09/25																					
50	CIV 13000826	75 días	vie 2/05/25	jue 21/08/25																					
51	CIV 13000814	75 días	vie 2/05/25	jue 21/08/25																					
52	Programación de recorrido con EPS de verificación final	15 días	lun 1/09/25	vie 19/09/25																					
53	Entrega de diseños de señalización y demarcación aprobados por SDM	2 días	vie 19/09/25	lun 22/09/25																					

Proyecto: CRONOGRAMA 552- Fecha: jue 23/01/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
