
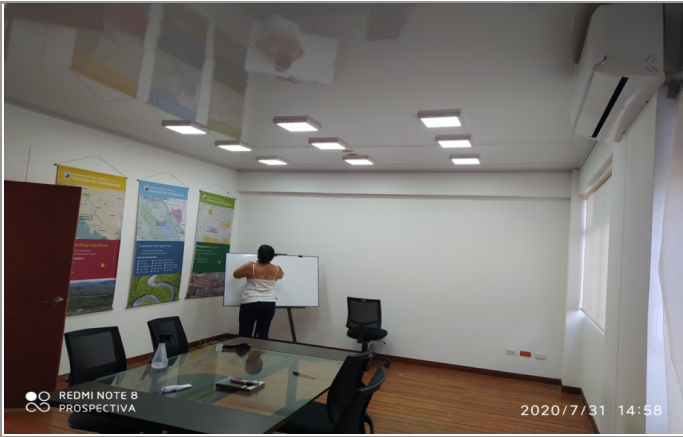


<table><tr><td colspan="3">Fecha</td></tr><tr><td>18</td><td>8</td><td>2020</td></tr><tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr></table>			Fecha			18	8	2020	DD	MM	AA	CONTRATISTA: PROSPECTIVA INGENIEROS SAS		
Fecha														
18	8	2020												
DD	MM	AA												
CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE DE LA RNN NUKAK														
CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES														
CONTRATO No. DTAM NACIÓN-CO 006-2020														
INFORME DE OBRA														
PERIODO		1	DEL		27/07/20 AL 16/08/20									
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO														
CONTRATO N° 6 de 2020														
CONTRATISTA PROSPECTIVA INGENIEROS SAS														
INTERVENTOR N/A Cto. No. _____														
SUPERVISOR RICARDO TOVAR DUARTE														
OBJETO DEL CONTRATO														
CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE DE LA RNN NUKAK														
CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Contratista PROSPECTIVA INGENIEROS SAS			Interventor N/A											
Contrato N° 006-2020			Contrato N° N/A											
Valor Inicial \$ 9.624.816,00			Valor Inicial N/A											
Valor Actualizado \$ 9.624.816,00			Valor Actualizado N/A											
Plazo Inicial 3 SEMANAS			Plazo Inicial N/A											
Fecha de Iniciación 27 DE JULIO DE 2020			Fecha de Iniciación N/A											
Fecha de terminación 16 DE AGOSTO DE 2020			Fecha de Terminación N/A											
B. ESTADO FINANCIERO (en miles de pesos)														
Valor contrato \$ 9.624.816,00			Inversión Acumulada anterior _____											
Valor contrato modificado N°01 NA			Inversión presente Periodo _____											
Valor final contrato \$ 9.624.816,00			Inversion Financiera _____											
Valor Anticipo 30% NA			Inversion progr. acumulada _____											
Pago parcial N°01 NA			Inversion desfase/avance _____											
Pago parcial N°02 NA			Desfase _____											
Pago parcial N°03 NA														
Total pagos \$ -														
C. AVANCE DE OBRA (en miles de pesos)														
Porcentaje físico Programado 100,00%			Porcentaje físico Ejecutado 100,00%											
Valor Inver. Programada Periodo -			Valor Inversion ejecutada periodo -											
Valor Inver. Programada acumulada -			Valor Inv. Ejecutada acum -											
Porcentaje acum. inversion programado 0,00%			Porcentaje acum. Inv. ejecutado 100,00%											
Fronte de obra (labores representativas)														
	UND	CANT	VR UNT	VR TOTAL	Ejecutado	Acumulado	% avance	Observ.						
TRABAJO EN LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE														
REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA 10MM	M2	28,74	\$ 117.040,00	\$ 3.363.730	100,00	0,00	100,00%							
REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA 1/2"	M2	18	\$ 114.560,00	\$ 2.062.080	100,00	0,00	100,00%							
CIELO RASO EN PVC	M2	44	\$ 40.080,00	\$ 1.763.520	100,00	0,00	100,00%							
REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	UND	13	\$ 24.400,00	\$ 317.200	100,00	0,00	100,00%							
ARREGLO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO AL PATIO POSTERIOR	UND	1	\$ 104.000,00	\$ 104.000	100,00	0,00	100,00%							
CAMBIO DE CERRADURAS INTERNAS	UND	4	\$ 88.480,00	\$ 353.920	100,00	0,00	100,00%							
CAMBIO DE CERRADURAS EXTERNAS	UND	2	\$ 126.080,00	\$ 252.160	100,00	0,00	100,00%							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAISAJISMO EN EL PATIO INTERIOR														
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE BAJO	UND	2	\$ 52.000,00	\$ 104.000	100,00	0,00	100,00%							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE MEDIO	UND	2	\$ 68.320,00	\$ 136.640	100,00	0,00	100,00%							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN TIPO HIEDRA DE CUBRIMIENTO SOBRE CAPA VEGETAL CON FLORACIÓN DE COLOR. DEBE SER UNA ESPECIE PROPIA DE LA REGIÓN	M2	1,23	\$ 55.360,00	\$ 67.831	100,00	0,00	100,00%							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA TIPO BOLA REDONDA DE TAMAÑO PROMEDIO DE 1" PARA SER ESPARCIDA DE ACUERDO CON UN DISEÑO DE PAISAJISMO QUE SERÁ ELABORADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN	M3	0	\$ 231.600,00	\$ 0	0,00	0,00	0,00%							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA QUE SE DEBE APLICAR EN EL PATIO CENTRAL	M3	0	\$ 65.600,00	\$ 0	0,00	0,00	0,00%							
D. ACTIVIDADES REALIZADAS														
LAS INTERVENCIONES REALIZADAS SE LLEVARON A ENTERA SATISFACCION, DE IGUAL MANERA FUE NECESARIO REALIZAR UN BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, PUES LAS CANTIDADES CONTRATADAS RESPECTO A LA REJA EN VARILLA DE 10MM ERA MUY MENOR A LA QUE REALMENTE DEBÍO INSTALARSE. DE IGUAL MANERA SUCEDIÓ CON LA REINSTALACIÓN DE LUCES DE ILUMINACIÓN Y Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CIELO RASO EN PVC. ASÍ LAS COSAS PARA DARLE MANEJO Y POR PRIORIDAD SE EJECUTARON ESTAS ACCIONES, LO QUE IMPLICO QUE LA ZONA DE PAISAJISMO SE VIERA REDUCIDA EN SUS CANTIDADES DE ESPECIES ARBÓREAS Y DE MATERIAL DE CANTERA Y ORGÁNICO.														
E. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO														
EL CONTRATO SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100% TODAS SUS ACTIVIDADES														
F. ANEXOS														
N° anexo	Aplica		Nombre Anexo				N° hojas							
	SI	NO												
1	X		Cuadro de Avance de Obra				1							
2	X		Anexo Fotográfico				5							
3		X	Seguridad social				2							
4	X		Acta de recibo de obra				1							
5		X	Cuenta de cobro				1							
OBSERVACIONES														
R/L PROSPECTIVA INGENIEROS SAS														
YERSON CAMILO OROZCO LONDOÑO														
Nombre														
Firma														

<div>Fecha</div> <div>1882020</div> <div>DDMMAA</div>			<div>PROSPECTIVA INGENIEROS SAS</div> <div>CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE DE LA RNN NUKAK</div>		
<div>PNN RNN NUKAK</div>					
<div>CONTRATO No. DTAM NACIÓN-CO 006-2020</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div>					
<div>PERIODO No. 1 DEL 27/07/20 AL 16/08/20</div> <div>TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO 3 SEMANAS</div> <div>ANEXO Nº 02 REGISTRO FOTOGRAFICO</div>					
<div>ESTADO INICIAL</div>					
					
<div>PATIO CENTRAL</div>			<div>PATIO CENTRAL (VISTA AÉREA)</div>		
					
<div>PATIO INTERNO (VISTA AÉREA)</div>			<div>AUDITORIO</div>		
<div>OBSERVACIONES</div> <div></div>			<div>REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>YERSON CAMILO RODRIGUEZ</div> <div></div> <div>Firma</div>		
<div>Original:</div> <div>Dependencia Responsable del Contrato</div>					

<div>Fecha</div> <div>1882020</div> <div>DDMMAA</div>			<div>PROSPECTIVA INGNIEROS SAS</div> <div>CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE DE LA RNN NUKAK</div>		
<div>PNN RNN NUKAK</div>					
<div>CONTRATO No. DTAM NACIÓN-CO 006-2020</div>					
<div>PERIODO No. 1 DEL 27/07/20 AL 16/08/20</div>					
<div>TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO 3 SEMANAS</div>					
<div>ANEXO Nº 02 REGISTRO FOTOGRAFICO</div>					
<div>DURANTE</div>					
					
					
<div>OBSERVACIONES</div> <div></div>			<div>REPRESENATNTE LEGAL</div> <div>YERSON CAMILO RODRIGUEZ</div> <div><div>Nombre</div><div>Firma</div></div>		
<div>Origir Dependencia Responsable del Contrato</div>					

<div> <div>Fecha</div> <div>1882020</div> </div> <div> <div>DDMMAA</div> </div>			<div> <div>PROSPECTIVA INGNIEROS SAS</div> <div>CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - GUAVIARE DE LA RNN NUKAK</div> </div>		
<div> <div>PNN RNN NUKAK</div> </div>					
<div> <div>CONTRATO No.</div> <div>DTAM NACIÓN-CO 006-2020</div> </div>					
<div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO</div> </div>					
<div> <div> <div>PERIODO No.</div> <div>1</div> <div>DEL</div> <div>27/07/20</div> <div>AL</div> <div>16/08/20</div> </div> <div> <div>TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO</div> <div>3 SEMANAS</div> </div> </div>					
<div> <div>ANEXO N° 02 REGISTRO FOTOGRAFICO</div> </div>					
<div> <div>FINALIZADO</div> </div>					
					
					
<div> <div>OBSERVACIONES</div> <div></div> </div>			<div> <div>REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> <div>YERSON CAMILO RODRIGUEZ</div> <div>Nombre</div> <div>Firma</div> </div> </div>		
<div> <div>Original: Dependencia Responsable del Contrato</div> </div>					

[illegible]
