

**OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO
CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



TAURAMENA 2025

FECHA: (12/05/2025)



935

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

CONTRATO No.	597 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
R/LEGAL	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ C.C.: 79799614
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA Contrato No. 98 de 17 de febrero de 2025
VALOR CONTRATO	\$ 166.021.232
FECHA INICIACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	28 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE MARZO DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100,00%
% AVANCE FISICO	100,00%
FECHA PRESENTE INFORME	12 DE MAYO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2024 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula sexta del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	UND	RESULTADOS OBTENIDOS
Demolicion de muros- fachadas superiores espesor menor a 0.15 m, a doble altura, con retiro	m2	31,78
Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	150,06
Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	528,21
Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	0
Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en Concreto 3000 psi	m³	0
Caja de inspeccion 80 x 80	und	0
Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	0
Bajante A.L.L. PVC 4"	m	81
Codo presion PVC 45° ø 4. Suministro e instal.	und	18
Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 Au = 0.50 m, incluye: accesorios	m	0
Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m²	72,46
Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	352,29
Anclaje pedestal en acero ASTM-36 de 0.20 x 0.20 m, Incluye 4 pernos de anclaje 5/8" DE 200mm, platina base, platina guia. Suministro e instal.	und	0



Estructura metalica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	6,83
Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 2 manos.	m	0
Mortero tipo grout para anclaje. Suministro e Instal.	m³	0
Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	m²	516,11
Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	m	60,22
Pared una cara superboard 8 mm - fachada, incluye pintada. Suministro e Instal.	m²	0
Desmante de cielo raso	m2	468,28
Suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26 y canal o vigueta 38x20 cal 26 para refuerzo de estructura del cielo raso e instalacion de cielo raso existente previamente lavado y limpio	m2	401,58
Limpieza y lavado mecánico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	m	879,44
Limpieza y lavado mecánico de cielo raso tipo pvc	m2	401,58
Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos. (incluye anticorrosivo)	m	879,44
Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación (sin anticorrosivo y pintura)	m	70,54
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	4	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			7/02/2025
Cumplimiento del contrato	X			7/02/2025
Pago de salarios	X			7/02/2025
Responsabilidad civil extra contractual	X			7/02/2025

PÓLIZA N°	COMPAÑIA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
167052	segurexpo de Colombia SA	Cumplimiento	\$ 16.602.123,20	21/12/2024	29/07/2025	N/A
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 83.010.616	21/12/2024	29/07/2025	N/A
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 8.301.061,60	21/12/2024	29/07/2025	N/A
16171		Responsabilidad civil	\$ 284.700.000	21/12/2024	29/07/2025	N/A



936

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	\$ 166,021,232.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado		\$ 83,010,616.00		\$ 83,010,616.00
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No.xxx				\$ -
Valor presente Acta		\$ -83,009,709.00	\$ 166,020,325.00	\$ 83,009,709.00
Saldo por ejecutar			\$ 907.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$ 166,021,232.00		\$ 166,021,232.00	\$ 166,020,325.00

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

No fue necesario.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	30 de diciembre de 2024
Acta de suspensión No.1	31 de diciembre de 2024
Acta de reiniciación No. 1	20 de enero de 2025
Prorroga No. 1	28 de enero de 2025
Modificatorio No.1	10 de marzo de 2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe final de obra con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros) los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	BUENO	PUNTAJE:	96	
----------------------------	-------	----------	----	--

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe final de obra
2. Anexo 2. Pago de seguridad social y aportes parafiscales (SENA, ICBF, y caja de compensación familiar)
3. Anexo 3. Certificado de personería
4. Anexo 3. Soporte pago FIC

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

LAURA CRISTINA GARVAJAL MORA
Cargo: Apoyo a la supervisión



937

ANEXO 1**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL**

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**1 DEMOLICIONES**

se ejecutaron labores de demolición de muros en fachadas superiores con espesor menor a 0,15 m, los cuales, al encontrarse en doble altura; también se realizó el desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias, así como el desmontaje de la cubierta metálica. Todas las actividades se llevaron a cabo garantizando las condiciones de seguridad para el personal durante la intervención.

2 CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS

Se ejecutó el suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas en acero ASTM A500C y ASTM A1011 como parte de la adecuación y refuerzo estructural del área. Posteriormente, se realizó la instalación de tejas tipo master 1000 calibre 28 pintadas, acompañadas de caballetes metálicos TZL calibre 26/28 prepintados con un ancho de 0,60 m. En cuanto al sistema de aguas lluvias, se instalaron bajantes en PVC de 4" junto con codos de presión de 45° del mismo diámetro. Finalmente, en algunas áreas se adecuó cielo raso en lámina PVC de 7 mm, incluyendo la instalación de cornisa y también se construyó una pared en laminas pvc de 7 mm en las fachadas, con el fin de evitar el ingreso de murciélagos y palomas.

3 ITEMS NO PREVISTOS

Se realizó el desmonte del cielo raso existente, seguido de la limpieza y lavado mecánico tanto de los perfiles metálicos estructurales —tipo correas, cerchas, ángulos— como del cielo raso tipo PVC. Posteriormente, se ejecutó la pintura de la estructura metálica con esmalte en dos manos, incluyendo la aplicación de anticorrosivo. Adicionalmente, se llevó a cabo el suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm calibre 26 y canal o vigueta 38x20 mm calibre 26 como refuerzo para la estructura del cielo raso, sobre el cual se reinstaló el cielo raso previamente lavado y acondicionado. Finalmente, se instaló una canaleta en lámina galvanizada calibre 18 con un ancho útil de 0,5 m, incluyendo todos los accesorios requeridos para su instalación.


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR


LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
Cargo: Apoyo a la supervisión



938

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDUAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO



Instalación de canales



Instalación de cubierta



Bajantes, codo y canales instalados



Refuerzo estructura cielo raso



ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO




Estado inicial de la cubierta



Desmanto de cubierta



Demolición de muro

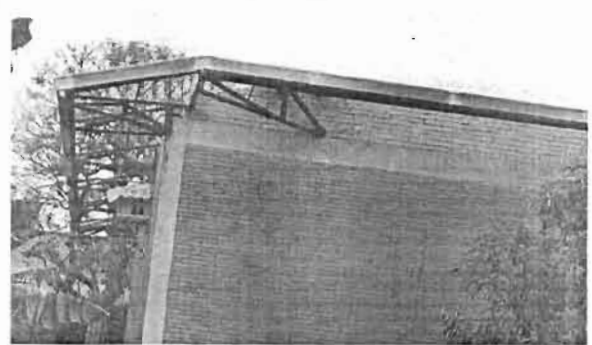


Instalación de estructuras metalicas

939

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL


OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRÉTO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

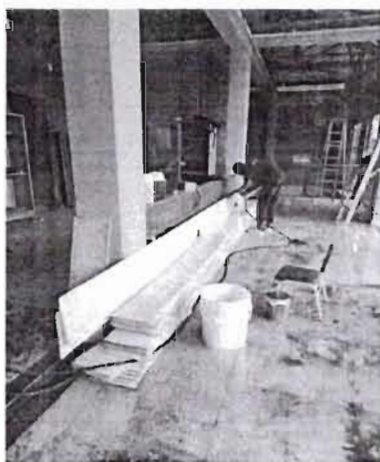INFORME FOTOGRAFICO


Lavado de láminas de pvc




Instalación de laminas de PVC

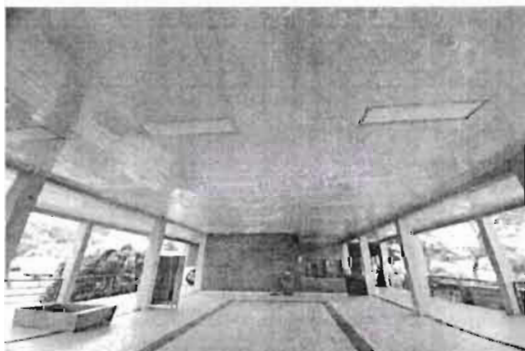

Estado final




Estado final de la cubierta



LINO RODRIGUEZ OCHOA

Cargo: SUPERVISOR



LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA

Cargo: Apoyo a la supervisión



ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE	
CONTRATISTA	EDUAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ N.T. 79799614-9	
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCIOA	

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

UN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICATORIO 01	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO MOD 01	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR MODIFICATORIO 1	VALOR EJECUTADO
DENOMINACIONES											
1	Demolicion de muros laterales superiores escisor menor a 0.15 m, a sobre altura con retro	3' 29	3' 28	3' 78	0.19%	0.9%	-0.5	9.596.00	\$ 312,732.00	\$ 312,675.00	\$ 312,675.00
2	Desmante de canchales y bajantes de aguas lluvias	44.78	136.06	150.06	0.35%	0.39%	-14.0	4,280.00	\$ 619,658.00	\$ 582,337.00	\$ 642,257.00
3	Desmante tuberías metálicas con arco y acero	652.67	480.00	528.21	3.40%	3.75%	-48.2	11,777.00	\$ 815,757.00	\$ 5,652,960.00	\$ 6,220,729.00
4	Demolicion manual placa de piso 0.10 m con retro	9.05	0.00	-	0.00%	0.00%	0.0	45,003.00	\$ 427,142.00	\$ -	\$ -
CUBIERTA Y AGUA LLUVIAS											
2	Reparacion de andenes, salientes y curvas en Centro 3000 psi	1.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$1119,747.00	\$ 1,186,932.00	\$ -	\$ -
2	Caja de inspeccion 80 x 80	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$732,929.00	\$ 1,465,858.00	\$ -	\$ -
2	Tubería sanitaria PVC 4" Suministro e instal	23.49	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$59,466.00	\$ 1,396,856.00	\$ -	\$ -
2	Baldosa A.L.L. PVC 4"	45.00	81.00	81.00	3.59%	3.59%	0.0	\$73,502.00	\$ 3,067,590.00	\$ 5,953,662.00	\$ 5,953,662.00
2	Codo presion PVC 45° x 4" Suministro e instal	10.00	18.00	18.00	1.73%	1.73%	0.0	\$158,288.00	\$ 1,592,880.00	\$ 2,867,184.00	\$ 2,867,184.00
2	Canaleta en lamina galvanizada cal. 18 x 1.50 m, incluye accesorios	98.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$219,587.00	\$ 21,701,190.00	\$ -	\$ -
2	Cableado en lamina PVC 7 mm (cable comita)	152.77	43.65	72.46	2.81%	4.84%	-28.8	\$10,874.00	\$ 16,828,833.00	\$ 4,637,031.00	\$ 8,029,582.00
2	Alcoba C incluye suministro e instalacion - pintura - montaje	1,093.69	636.53	352.29	10.11%	5.55%	284.2	\$26,362.00	\$ 28,831,856.00	\$ 16,780,204.00	\$ 9,287,558.00
2	Arco de concreto en arco A5' x 36 de 0.20 x 0.20 m, incluye 4 barras de arco 618 DE 200mm, placa base, 2 barras de Suministro e instal	20.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$361,940.00	\$ 7,238,800.00	\$ -	\$ -
2	Alcoba metálica en arco A5' x 36 de 0.20 x 0.20 m, incluye 4 barras de arco 618 DE 200mm, placa base, 2 barras de Suministro e instal	0.00	6.83	6.83	0.10%	0.10%	0.0	\$24,197.00	\$ -	\$ 165,266.00	\$ 165,266.00
2	Alcoba metálica en arco A5' x 36 de 0.20 x 0.20 m, incluye 4 barras de arco 618 DE 200mm, placa base, 2 barras de Suministro e instal	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$38,114.00	\$ 4,167,766.00	\$ -	\$ -
2	Verdadero tipo grout para arco	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0	\$23,456,707.00	\$ 704,871.00	\$ -	\$ -
2	Suministro e instal	733.73	515.25	515.25	24.11%	24.11%	-0.9	\$77,697.00	\$ 57,001,283.00	\$ 40,328,227.00	\$ 40,095,038.00
2	Cableado TLZ metálico cal. 26/28	63.60	60.00	60.22	2.07%	2.08%	-0.2	\$57,243.00	\$ 3,634,931.00	\$ 3,434,550.00	\$ 3,447,173.00
2	Placa de acero inoxidable 5 mm x 1.50 m, incluye pintura Suministro e instal	47.12	26.75	0.00	2.80%	0.00%	29.8	\$156,282.00	\$ 7,364,479.00	\$ 4,640,687.00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS											
1	Demolicion de muro	464.38	464.38	468.28	4.80%	4.83%	-2.9	\$ 17,118.00	\$ -	\$ 7,969,546.00	\$ 8,016,077.00



ANEXO 3
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

OBJETO	ADQUISICIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSANA DEL CENTRO POBLADO PASO CUSANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDUAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT 79799614-9
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD MODIFICATORIO 01	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO MOD 01	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VALUNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR MODIFICATORIO 1	VALOR EJECUTADO
Suministro e instalación de perfil ondulado calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26	m2	392.83		401.58	16.97%	17.35%	-8.8	\$ 71.732.00	\$ -	\$ 28.178.482.00	\$ 28.806.137.00
Nº02 Y carna e vigueta 36x20 cal 26 para relleno de estructura del cielo raso e instalación de cielo raso existente previamente lavado y limpiado.	m2										
Limpieza y lavado mecánico de pilares metálicos tipo correa.	m	659.04		879.44	3.89%	5.18%	-220.4	\$ 9.800.00	\$ -	\$ 6.459.592.00	\$ 8.618.512.00
Nº03 Limpieza y lavado mecánico de cielo raso 100 - 250 mm.	m2	392.83		401.58	2.32%	1.37%	-8.8	\$ 4.788.00	\$ -	\$ 3.845.020.00	\$ 3.930.085.00
Nº04 Limpieza en estribo para estructura metálica existente 100.	m	659.04		879.44	11.51%	15.36%	-220.4	\$ 28.000.00	\$ -	\$ 19.128.19.00	\$ 25.504.639.00
Nº05 Cerrajas, cerchas, limpias y arreglos 50 - 200 mm, 2 marcos. (incluye arcosos)	m										
Cerrajería en lámina galvanizada cal. 18	m										
Nº06 Al = 0.5 m. de Jye.	m										
Accesorios instalación (sin arcosos y v. m. m. m.)	m	75.92		70.54	9.45%	8.50%	5.4	\$ 200.152.00	\$ -	\$ 15.195.540.00	\$ 14.118.122.00
COSTO DIRECTO TOTAL									\$ 166.021.232	\$ 166.020.812	\$ 166.020.325
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO									\$	\$	\$

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

LARA YERMINA CHAVEZ DE VERA
Cargo: Aprobada la Supervisión




941

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

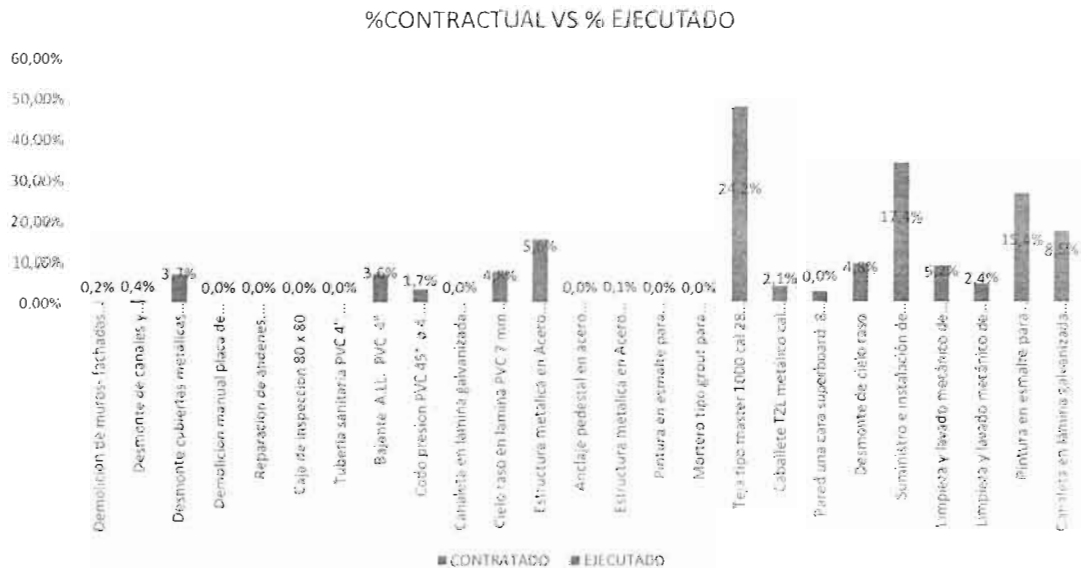


LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR


LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
Cargo: Apoyo a la Supervisión



942

ANEXO 5
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 FINAL

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT: 79799614-9
INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
DICIEMBRE	1					
	2					
	3					
	4	Revisión de Documentos		Acta de Inicio / Acta de reunión 01/ Acta suspensión		
ENERO	1					
	2					
	3			Acta reiniciación 1	Seguimiento	
	4				Seguimiento	
FEBRERO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta de reunión 02 / Acta de reunión 03	Seguimiento	
	4			Prorroga	Seguimiento	
MARZO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta final de terminación	Seguimiento	
ABRIL	1					
	2					
	3					
	4					
MAYO	1					
	2			Acta de recibo final		Informe de supervisión
	3			Acta de liquidación		
	4					

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

LAURA CRISTINA GARCIA AL MORA
Cargo: Apoyo a la supervisión

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614			BARRETO GUTIERREZ EDUAR ALEXANDER		B MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A 8B 82	TAURAMENA-CASAVARE	31440136027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05			E	9484389213	2025/05/06			0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-04	2025-05			9484388213		€			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ingresos	cedula	tasas	aportes	contribuciones	seguros	invalidez	aportes	retiro	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Extensores SINIA e ICF	Total Aportes						
SUCURSAL: TAUARAMENA (4 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)																																			
Ciudad: TAUARAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)																																			
1	CC	74381093										23030 1	5	\$237,250	\$38,000	EP5037	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$0	\$0	\$294,400	
2	CC	1006415999										23030 1	5	\$237,250	\$38,000	EP5037	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$0	\$0	\$294,400	
3	CC	1062912994										23030 1	5	\$237,250	\$38,000	EP5041	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$0	\$0	\$294,400	
4	CC	1042577245										23100 1	5	\$237,250	\$38,000	CCF65	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	CCF69	5	\$237,250	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$0	\$0	\$294,400	
Total Afiliados(4)															\$949,000	\$152,000			\$949,000	\$152,000			\$949,000	\$152,000			\$949,000	\$152,000	\$38,000	\$38,000	\$949,000	\$38,000	\$0	\$0	\$294,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. DNI	_____
3. CATEGORIA	_____
4. CATEGORIA	_____
5. CATEGORIA	_____
6. CATEGORIA	_____
7. CATEGORIA	_____
8. CATEGORIA	_____
9. CATEGORIA	_____
10. CATEGORIA	_____
11. CATEGORIA	_____
12. CATEGORIA	_____
13. CATEGORIA	_____
14. CATEGORIA	_____
15. CATEGORIA	_____
16. CATEGORIA	_____
17. CATEGORIA	_____
18. CATEGORIA	_____
19. CATEGORIA	_____
20. CATEGORIA	_____
21. CATEGORIA	_____
22. CATEGORIA	_____
23. CATEGORIA	_____
24. CATEGORIA	_____
25. CATEGORIA	_____
26. CATEGORIA	_____
27. CATEGORIA	_____
28. CATEGORIA	_____
29. CATEGORIA	_____
30. CATEGORIA	_____
31. CATEGORIA	_____
32. CATEGORIA	_____
33. CATEGORIA	_____
34. CATEGORIA	_____
35. CATEGORIA	_____
36. CATEGORIA	_____
37. CATEGORIA	_____
38. CATEGORIA	_____
39. CATEGORIA	_____
40. CATEGORIA	_____
41. CATEGORIA	_____
42. CATEGORIA	_____
43. CATEGORIA	_____
44. CATEGORIA	_____
45. CATEGORIA	_____
46. CATEGORIA	_____
47. CATEGORIA	_____
48. CATEGORIA	_____
49. CATEGORIA	_____
50. CATEGORIA	_____
51. CATEGORIA	_____
52. CATEGORIA	_____
53. CATEGORIA	_____
54. CATEGORIA	_____
55. CATEGORIA	_____
56. CATEGORIA	_____
57. CATEGORIA	_____
58. CATEGORIA	_____
59. CATEGORIA	_____
60. CATEGORIA	_____
61. CATEGORIA	_____
62. CATEGORIA	_____
63. CATEGORIA	_____
64. CATEGORIA	_____
65. CATEGORIA	_____
66. CATEGORIA	_____
67. CATEGORIA	_____
68. CATEGORIA	_____
69. CATEGORIA	_____
70. CATEGORIA	_____
71. CATEGORIA	_____
72. CATEGORIA	_____
73. CATEGORIA	_____
74. CATEGORIA	_____
75. CATEGORIA	_____
76. CATEGORIA	_____
77. CATEGORIA	_____
78. CATEGORIA	_____
79. CATEGORIA	_____
80. CATEGORIA	_____
81. CATEGORIA	_____
82. CATEGORIA	_____
83. CATEGORIA	_____
84. CATEGORIA	_____
85. CATEGORIA	_____
86. CATEGORIA	_____
87. CATEGORIA	_____
88. CATEGORIA	_____
89. CATEGORIA	_____
90. CATEGORIA	_____
91. CATEGORIA	_____
92. CATEGORIA	_____
93. CATEGORIA	_____
94. CATEGORIA	_____
95. CATEGORIA	_____
96. CATEGORIA	_____
97. CATEGORIA	_____
98. CATEGORIA	_____
99. CATEGORIA	_____
100. CATEGORIA	_____

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDUAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 164 88 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-04	2025-05			9484388213	E	2025/02/06			0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$114,000	\$0	\$0	\$38,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$66,400	\$0	\$0	\$114,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
CAPRESOCA	EPS025	891,856,000	7	1	\$9,500	\$0	\$0	\$38,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500
TOTAL				4	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79795814	9	EDMIR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 1423	UNICA	492*	Nat./-26
MUNICIPIO	DIRECCION		TELEFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-470	TRANSVERSAL 16A NUMERO 68 82		7632366			EDWARD@BETOTAL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSION	2025-23	PERÍODO SALUD	2025-03	PLANILLA	37746778	TIPO PLANILLA	1	FECHA PAGO	2025-04-08	CENTRO DE TRABAJO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	CDCS	MUNICIPIO	722 810	VALOR PAGO	INTERES X MORA	2 600	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS		REF. DE PAGO (PIN)	37746778	FECHA LIMITE PAGO	2025-04-03	ESTADO PLANILLA	Pagada													

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
C.C. 77799814	0	EDUARDA F. MANCINI BARRERO OLIVEROS	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Nacional
MUN. DEP.	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
BS-470	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8012		7632095		EDWARD@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

[illegible]

TOTALES IBC

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)				1	320.000	0	1.100	321.100
PORVENIR	230301	8000248C8	8	1	320.000	0	1.100	321.100
EPS/Administradoras: 1)				1	250.000	0	900	250.900
SANTAS	EP5005	800251440	6	1	250.000	0	900	250.900
ARPA/Administradoras: 1)				1	139.200	0	500	139.700
POSITIVA	14-23	865011153	6	1	139.200	0	500	139.700
OCF/Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	12.100
COMFACASANARE	OCF68	844203382	8	1	12.000	0	100	12.100
Gran Total					721.200	0	2.600	723.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79756814	0	EDUARDO ALEXANDER BARRERO GUTIERREZ	1	0	DOCE (VAL.) 4-23	UNICA	4227	N.C.78
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-1-C	TRANSVERSAL 16A NUMERO 48 B2		832299		EDUARDO23@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	28547054	1	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
28547054	2024-05-06	2024-05-06	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79756814	0	EDUARDO ALVARO GARCIA GUTIERREZ	1	0	P023799A - 12-39	ÚNICA	4223	N.C.78
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
85-1-C	TRANSVERSAL 16A NUMERO 48 B2		832299		EDUARDO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	28547054	1	2024-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28547054	2024-05-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	2.000.000	IBC SALUD	2.000.000	IBC RIESGOS	2.000.000	IBC CAJAS	2.000.000	IBC PARAF	0
-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANTAS	EPS005	6192571440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
AFP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860071358	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79796814	0	EDUAR ALEXANDER BARRIO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4327	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
85-410	TRANSVERSAL -6A NUMERO 88 82		7632065		EDUWAR08@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-22	2025-02	33464462	I	2025-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
.	33464462	2025-03-05	Pagado							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 71798814	0	EDUAR ALEXANDER BARRIO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4821	N/A	
MUN. DEP.		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
85-410		TRANSVERSAL 164 NUMERO 89 82	7632065			EDUARDO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

[illegible]

TOTALS IBC

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	2.000.000	IBC SALUD	2.000.000
		IBC RIESGOS	2.000.000
		IBC CAJAS	2.000.000
			IBC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradores: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS (Administradores: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANTAS	EPS005	80025440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP (Administradores: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	865011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF (Administradores: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
CONFACASANARE	CCF59	844003352	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Grat Total					721.200	0	0	0	721.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 777996-1		BARRETO GUTIERREZ EDUAR ALEXANDER	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16a BB 62	TAURAMENA-CASA GIRE	3144214027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago
2025 02	2025 03	€	2025/03/05	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,943,900	\$0	\$0	\$1,943,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,488,300	\$0	\$0	\$1,488,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$845,800	\$0	\$0	\$845,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$845,800	\$0	\$0	\$845,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$476,400	\$0	\$0	\$476,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	\$476,400	\$0	\$0	\$476,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$486,400	\$0	\$0	\$486,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPRECOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$85,500	\$0	\$0	\$85,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$172,900	\$0	\$0	\$172,900
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				10	\$3,752,500	\$0	\$0	\$3,752,500



846

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 79799574	9	EDUAR ALEXANDER BARBETO GUTIERREZ		0	POSITIVA - 14-23	UNICA	492*	Nat. col	
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
84-2-2	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7632665		EDUARDE@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
2025-01	2025-01	35110308	I	2025-02-06	TODOS LOS CENTROS	BOGOTÁ	TOCÓS
						VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
						727.900	700
							ENTIDAD RECAUDO
							BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
:	171133206	26/25/22-25	Pagada

[illegible]RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 797796174	U	EDUAR ALFONSO BARRIO GUINERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	NAL-PA
MUN DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
65-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7532065		EDUARDO@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	321033008	I	2025-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.900	700	BANCO OREJA

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PAQAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	300	0	320.300
PORVENIR	230301	8002248CA	8	1	320.000	0	300	0	320.300
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	200	0	250.200
SANTAS	EP5005	80025144C	6	1	250.000	0	200	0	250.200
ARF(Administradoras: 1)				1	139.200	0	100	0	139.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	100	0	139.300
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	0	12.100
COMFACASANARE	CCF49	844003392	8	1	12.000	0	100	0	12.100
Gran Total					721.200	0	700	0	721.900

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
REG. 2775914	0	COMPAÑIA ALVARADO BARRERO S.A.S	1	0	2057IVA-1-23	JACA	402*	N/A	
NÚN. DEP.		DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
85-16		TRANSVERSAL 14A VÍA MERO 380		705988			COMUNICACIONAL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	32464462	I	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TCCOS	72' 200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	32464462	2025-01-08	pagada

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
52-197985-4	0	EDUAR ALFONSO BARRIO CORTIPEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	N/A - #	
MUN. DEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
85-410		TRANSVERSAL 16A, NUMERO 88 A2		93-8095			EDUARDO@HOTMAIL.COM	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32684862	I	2025-03-05	TIPOS LOS CENTROS	TOCDB	TOCOS	721 200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	32464462	2025-03-05	Pagada

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	2.000.000	IBC SALUD	2.000.000	IBC CAJAS
				IBC RIESGOS
				2.000.000
				2.000.000
				IBC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANTAS	EPS005	801251442	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	862011753	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
CONF ACASANARE	CCF69	8441003892	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	av	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 797596.14		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA, CASANARE	3164036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-01	2025-02			€		2025/02/05			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



9150

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
C.C. 78766418	0	EDUARDO ALEXANDER BARRERO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4821	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7832065		EDUARDOBB@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31882064	1	2024-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31882064	2025-01-01	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES										DÍAS		PENSION				SALUD				CCF		RIESGOS		TARIFA PARAF		SEN		ICBF		ESAP		MIN		Tipo Col		Sub Tipo Col		Total		Eventos de Parafiscación		Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODIFICACIÓN DE SALARIO	IND	RST	TAE	VTE	VST	VAE	VAC	APV	APPT	APR	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
C.C. 78766418	0	EDUARDO ALEXANDER BARRERO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4821	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7832065		EDUARDOBB@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31882064	1	2024-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	31882064	2025-01-01	Pagada

TOTALES IBC									
IBC PENSION	2.000.000	IBC SALUD	2.000.000	IBC RIESGOS	2.000.000	IBC CAJAS	2.000.000	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
POREVENIR	230301	800224808	6	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS (Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800254403	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP (Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
PO3ITIVA	14-23	860071551	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF (Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
COMPUCA SANAHE	CCF68	864005392	6	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total				1	721.200	0	0	0	721.200

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	131392808	1475504353	12/05/2025

951

Número de Identificación

79799614

Primer Apellido (si es Persona natural)

BARRETO

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CASANARE

Dirección de Domicilio

TRANSVERSAL 16A N 8b-82

Localización

Nacional

Correo electrónico

EDWWARDB@HOTMAIL.COM

Regional

Casanare

Número Licencia de Obra

597-2024

Nombre Obra

ADECU CUBIERTA CUSIANA

Fecha Terminación Obra

28/03/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

16021000.00

Valor Intereses Moratorios

5000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

YOPAL (CASANARE)

Ciudad de Domicilio

TAURAMENA

Teléfono de Contacto

+57,310 3207844

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-085-000000

Número Contrato de Obra

597-2024

Fecha Inicio Obra

20/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

TAURAMENA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

166021232.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

71175.00

Valor del Pago

71175.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	131392808	1475504353	12/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **79799614**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.14.232.132**

Su transacción fue **APROBADA** por la
Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 76,175.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 76,175.00	COP\$ 76,175.00

953

Número de Identificación	Primer Nombre ó Razón Social
79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Primer Apellido (si es Persona natural)	Tipo de documento
BARRETO	03
Dígito de Verificación (Si es persona	Naturaleza Juridica
	03
Departamento	Ciudad Capital
CASANARE	YOPAL (CASANARE)
Dirección de Domicilio	Ciudad de Domicilio
TRANSVERSAL 16A N 8b-82	TAURAMENA
Localización	Teléfono de Contacto
Nacional	+57,310 3207844
Correo electrónico	Código SIIF
EDWWARDB@HOTMAIL.COM	3-2-07-1-02-1-04-43
Regional	Regional Centros SIIF
Casanare	36-02-00-085-000000
Número Licencia de Obra	Número Contrato de Obra
597-2025	597-2025
Nombre Obra	Fecha Inicio Obra
Adec cubierta venado	20/01/2025
Fecha Terminación Obra	Ciudad de Ejecución de la Obra
26/03/2025	TAURAMENA
Tipo FIC	Año Periodo a Pagar
Mensual	2025
Mes Periodo a Pagar	Costo Total de Obra a Todo Costo
2	166021232.00
Costo Total Mano de Obra	Número de Trabajadores en el Periodo
16602123.00	2
Valor Intereses Moratorios	Aporte FIC
4000.00	71175.00
Aporte SENA	Valor del Pago
0.00	71175.00

954

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	131393438	1475523024	12/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **79799614**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.14.232.132**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 75,175.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,175.00	COP\$ 75,175.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	131393844	1475535363	12/05/2025

955

Número de Identificación

79799614

Primer Apellido (si es Persona natural)

BARRETO

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CASANARE

Dirección de Domicilio

TRANSVERSAL 16A N 8b-82

Localización

Nacional

Correo electrónico

EDWWARDB@HOTMAIL.COM

Regional

Casanare

Número Licencia de Obra

597-2024

Nombre Obra

Adec cubierta venado

Fecha Terminación Obra

28/03/2025

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

6021232.00

Valor Intereses Moratorios

3000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

YOPAL (CASANARE)

Ciudad de Domicilio

TAURAMENA

Teléfono de Contacto

+57,310 3207844

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-085-000000

Número Contrato de Obra

597-2024

Fecha Inicio Obra

20/01/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

Tauramena

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

166021232.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

71175.00

Valor del Pago

71175.00

936

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	131393844	1475535363	12/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **79799614**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.14.232.132**

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 74,175.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 74,175.00	COP\$ 74,175.00

957

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-MIPG	CÓDIGO: FOR-1-01- 01
	DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	VERSIÓN: 2
	CERTIFICACION	FECHA: 28/12/2023

Tauramena Casanare, cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Señor

EDUAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ


R/L CONTRATISTA

Tauramena Casanare

REF. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

De acuerdo a la solicitud enviada a este despacho, una vez revisados los Archivos de la oficina no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra de la empresa que usted representa, en lo concerniente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 597 del 21 de diciembre de 2024, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE" actividad desarrollada en esta jurisdicción.

Cordialmente,



LIZETH CALLESTEROS RAMOS
Personería Municipal

Proyecto: Nancy Viviana Muñoz Velia
Auxiliar Administrativo
