

Modo de tarea

1

Nombre de tarea

PROGRAMACION GENERAL

Duración

142,75 días

Comienzo

4 mar 6/05/25

Fin

30 mar 30/09/25

Predecesos

Costo

\$ 934.951.404,66

2

ETAPA DE PLANEACION

21 días

mar 6/05/25

mar 27/05/25

\$ 0,00

3

HANGAR

39 días

lun 4/08/25

sáb 13/09/25

\$ 276.698.219,86

6

PRELIMINARES

5 días

lun 4/08/25

vie 8/08/25

\$ 8.270.788,46

7

DESMONTE DE CUBIERTA

5 días

lun 4/08/25

vie 8/08/25

\$ 8.270.788,46

23

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0 días

jue 7/08/25

jue 7/08/25

\$ 0,00

26

CIMENTACIÓN

0 días

jue 7/08/25

jue 7/08/25

\$ 0,00

31

INSTALACIONES ELECTRICAS

0 días

jue 7/08/25

jue 7/08/25

\$ 0,00

35

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

11 días

mar 2/09/25

sáb 13/09/25

\$ 19.044.558,16

36

CANAL METALICA CALIBRE 14

10 días

mar 2/09/25

vie 12/09/25

67 \$ 13.324.610,00

37

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4

8 días

vie 5/09/25

sáb 13/09/25

36CC+3 \$ 5.719.948,16

38

MAMPOSTERÍA

0 días

jue 7/08/25

jue 7/08/25

\$ 0,00

43

CARPINTERÍA METALICA

11 días

mié 27/08/25

lun 8/09/25

\$ 29.744.000,00

51

VENTANERÍA ALUMINIO CORREDIZA

11 días

mié 27/08/25

lun 8/09/25

64 \$ 29.744.000,00

53

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONE

20 días

vie 15/08/25

jue 4/09/25

\$ 11.371.498,77

58

REVESTIMIENTO DE PÓLIURETAN

20 días

vie 15/08/25

jue 4/09/25

7FC+6 d\$ 11.371.498,77

60

PINTURA

29 días

mié 6/08/25

jue 4/09/25

\$ 68.889.625,42

61

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS

20 días

vie 15/08/25

jue 4/09/25

7CC+11 \$ 18.483.905,29

63

PINTURA PARA ESTRUCTURA DE C

10 días

mié 6/08/25

sáb 16/08/25

7CC+2 c\$ 27.151.407,27

64

PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE

10 días

dom 17/08/25

mié 27/08/25

61CC+2 \$ 23.254.312,86

65

CUBIERTA

20 días

sáb 16/08/25

vie 5/09/25

\$ 138.723.893,54

67

TEJIA KINGROOF - SIN TRASLAPO

16 días

sáb 16/08/25

lun 1/09/25

7FC+7 d\$ 134.249.773,54

68

FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA

15 días

jue 21/08/25

vie 5/09/25

7FC+12 \$ 4.474.120,00

69

CIELORRASO

0 días

jue 7/08/25

jue 7/08/25

\$ 0,00

71

ASEO

3 días

mié 27/08/25

sáb 30/08/25

\$ 653.855,21

73

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE

3 días

mié 27/08/25

sáb 30/08/25

64 \$ 653.855,21

74

ESM

31 días

vie 29/08/25

mar 30/09/25

\$ 222.966.911,45

76

PRELIMINARES

12 días

vie 29/08/25

jue 11/09/25

\$ 31.335.403,93

77

DESMONTE DE MUEBLES EN AGLC

3 días

mar 2/09/25

jue 4/09/25

79 \$ 52.313,18

78

DESMONTE DE CUBIERTA

12 días

vie 29/08/25

jue 11/09/25

6CC+25 \$ 8.137.041,51

79

DESMONTE DE ESTRUCTURA EN M

3 días

vie 29/08/25

lun 1/09/25

78CC \$ 176.442,23

80

REGATA PARA INSTALACIÓN DE TU

3 días

lun 1/09/25

mié 3/09/25

79CC+2 \$ 103.512,84

81

DESMONTE PUERTAS Y VENTANA

3 días

sáb 30/08/25

mar 2/09/25

79CC+1 \$ 54.531,79

82

CERRAMIENTO EN MALLA VERDE

3 días

vie 29/08/25

lun 1/09/25

79CC \$ 235.819,08

84

LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIP

3 días

mar 2/09/25

jue 4/09/25

82 \$ 20.361.568,75

85

DEMOLICION DE ENCHAPE DE PIS

5 días

mar 2/09/25

dom 7/09/25

79CC+3 \$ 477.313,28

86

DESMONTE APARATOS SANITARI

1 día

mié 3/09/25

mié 3/09/25

79CC+4 \$ 38.925,34

87

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLU

3 días

mié 3/09/25

vie 5/09/25

79CC+4 \$ 976.560,51

88

DESMONTE DE ELEMENTOS METÁ

4 días

lun 1/09/25

jue 4/09/25

79CC+2 \$ 69.204,71

89

DESMONTE DE PUERTAS METÁLIC

2 días

sáb 30/08/25

lun 1/09/25

79CC+1 \$ 88.345,69

90

DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCI

2 días

mar 2/09/25

mié 3/09/25

79CC+3 \$ 145.769,84

91

DEMOLICIÓN MUROS 0.15M

3 días

mié 3/09/25

vie 5/09/25

79CC+4 \$ 418.055,18

94

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0 días

sáb 30/08/25

sáb 30/08/25

\$ 0,00

97

CIMENTACIÓN

0 días

sáb 30/08/25

sáb 30/08/25

\$ 0,00

98

NIVELACIÓN, COMFORMACIÓN Y C

0 días

sáb 30/08/25

sáb 30/08/25

\$ 0,00

102

INSTALACIONES ELECTRICAS

3 días

vie 19/09/25

lun 22/09/25

\$ 818.070,19

103

TOMA CORRIENTE DOBLE MONOF

1 día

vie 19/09/25

sáb 20/09/25

141 \$ 87.510,87

104

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120

1 día

vie 19/09/25

sáb 20/09/25

103CC \$ 73.020,58

105

LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA

2 días

sáb 20/09/25

lun 22/09/25

104 \$ 657.538,74

106


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS


17 días

mié 10/09/25

sáb 27/09/25

\$ 6

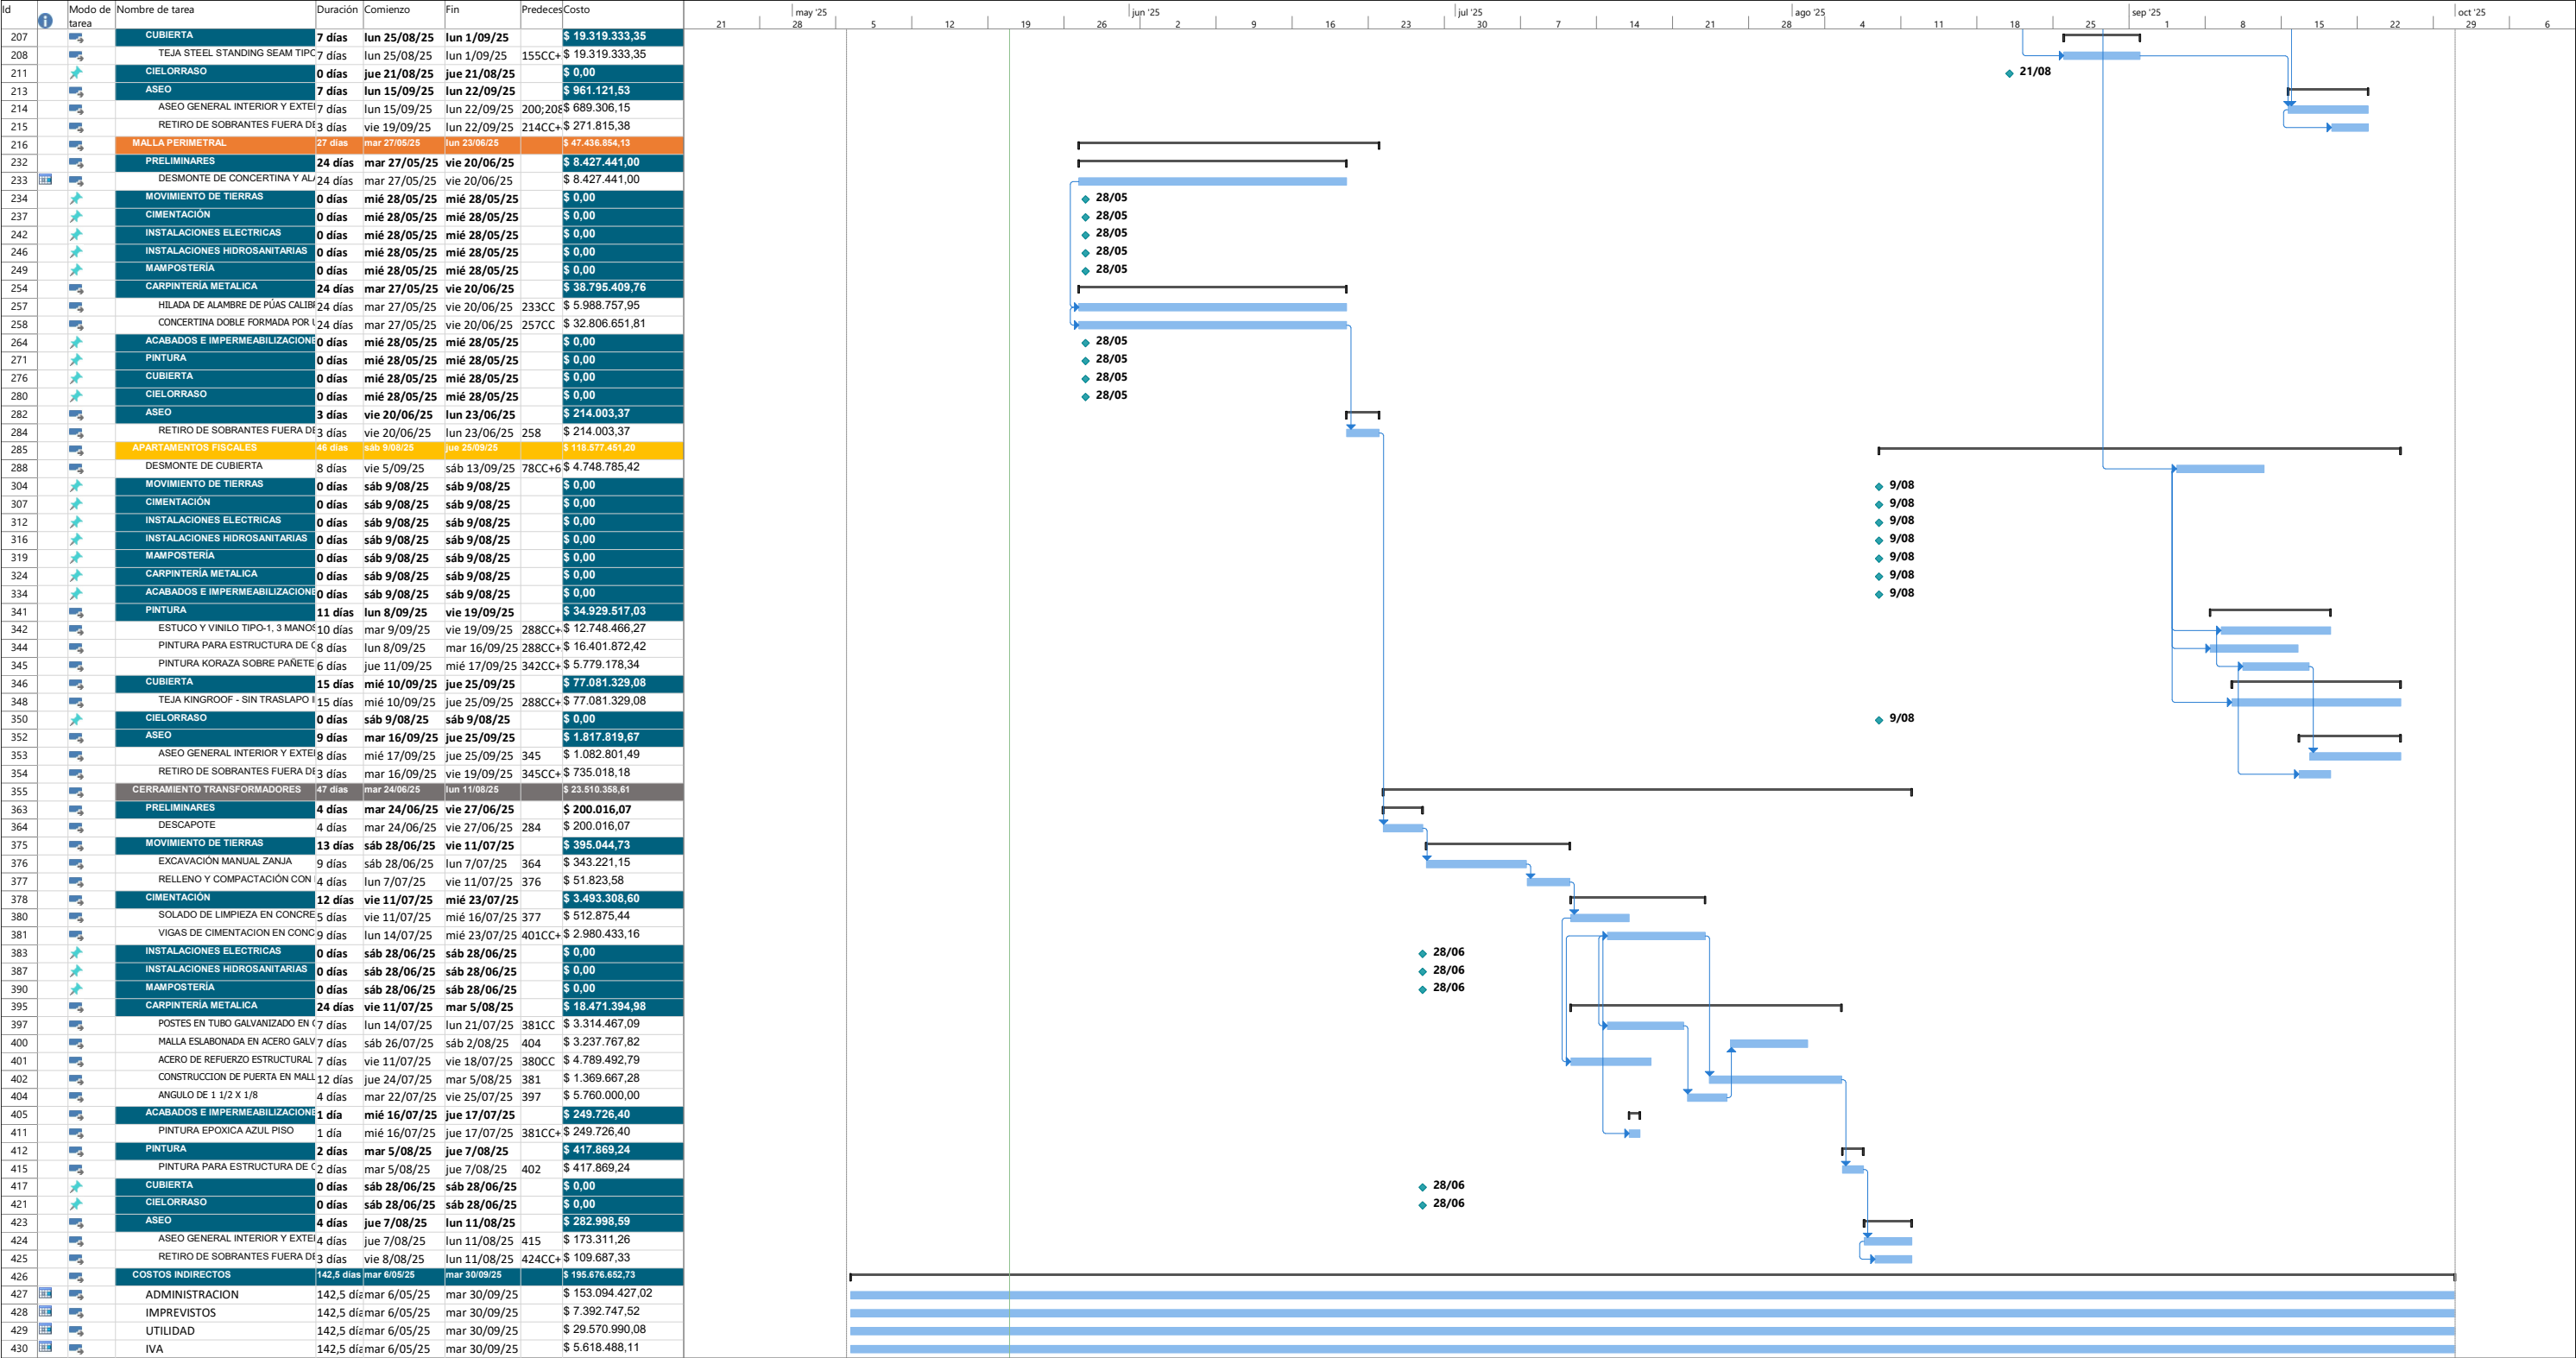



6

13

20

27

nov '25

3

10

17

24

dic '25

1

8

15

22

ene '26

29

5

12

19

26

feb '26

2

9

16

23

mar '26

2

9

16

23

abr '26

30

6

13

20

27

may '26

4

11

18

25

Proyecto: PROGRAMACION GE

Fecha: mié 21/05/25

Tarea

División

Hito

.....

Resumen

◆

Resumen del proyecto

▬

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

Tarea manual

▬

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

▬

solo fin

┌

Tareas externas

└

Hito externo

Fecha límite

◆

Progreso

⬇

Progreso manual

R/L ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ

GRUPO MSG SAS

2025

Página 4

ARQ.JHONTAN VELASCO ALBARRACIN

RÉSIDENTE DE OBRA

GRUPO MSG SAS
