



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal # 19 al marzo 30, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

PARQUE: Localidad: Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRO, Y LA REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRO."

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRO 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R. #2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						
Valores Iniciales								
Costo Directo		9.383.224.371,00						
A.L.U. (36,49%)		\$ 3.423.936.573,00						
Sub Total		12.807.162.944,00						
GASTOS REEMBOLSABLES/COMPLEMENTARIOS								
Total Inicial		12.807.162.944,00						
Adición No.								
Total Final		12.807.162.944,00						
Anticipo: (40% Sobre costo directo)		3.753.289.748,00						
Total		3.753.289.748,00						
Acumulado								

3. Contrato de Interventoría

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRO", GRUPO 1 Y GRUPO 2

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						
Valores Iniciales								
Valor Contrato:		1.770.650.532,00						
Iva (19%)		336.429.301,00						
Sub Total		2.107.109.833,00						
Adición:								
Total Final		2.107.109.833,00						
Reprogramación:								
TOTAL		2.107.109.833,00						
Acumulado								

Programación: (IVA) El Contratista no ha entregado todavía la programación de obra para su respectiva revisión y aprobación.

Semanal No.19 Fecha de corte: marzo 30, 2025



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

19

al marzo 30, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha subastado la programación semanal del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación. Luego de la mesa de trabajo realizada con el profesional de costos del contratista el día 27 de febrero, el contratista remitió las observaciones con el comunicado bel-mp-aem-167-26 del 14 de marzo, a lo cual se revisa y no se aprueba por la intervención, ya que no cumple con el pliego de condiciones y se remiten nuevas observaciones con los comunicados drd-4080-g2-2024-305 y drd-4080-g2-2024-309 del 17 y 18 de marzo respectivamente, a lo anterior el contratista no ha subastado dichas observaciones

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

De igual manera, las situaciones de orden técnico que se presentaron en el periodo correspondiente al informe semanal fueron las siguientes:

N.	DESCRIPCIÓN	MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA
1	Programaciones y presupuestos	Se ha requerido de forma oportuna al contratista por medio de comunicados (DRD-4080-G2-2024-305 del 17 de marzo y DRD-4080-G2-2024-309 del 18 de marzo) y en contextos de obra la entrega de la documentación requerida en el anexo técnico contractual, prueba de ello se encuentra la trazabilidad en la correspondencia enviada y en las actas de comité de obra y el presunto incumplimiento, igualmente se informa que mediante el comunicado DRD-4080-G2-2024-320 del 21 de marzo se remiten observaciones de los presupuestos allegados
2	Inicio de actividades en los parque ya priorizados y viabilizados por la entidad además de culminación de las obras de emergencias.	Mediante el comunicado DRD-4080-G2-2024-307 del 17 de marzo la interventoría envía un apremio por incumplimiento en el inicio de obra y culminación de frentes de obra activos, que a la fecha el contratista no cuenta con personal y material de obra
3	Desviación marcada entre el programado y el ejecutado	El porcentaje de seguimiento programado con el cual se realiza el seguimiento, se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado subastado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación. El porcentaje de seguimiento indicado se basa en la equivalencia de los días transcurridos desde el inicio, puesto que el contratista a la fecha no ha entregado la programación general del proyecto y por lo tanto no se ha dado aprobación.



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONSORCIO SANTA TERESA 28

Interventor:

marzo 30, 2025

19

Reporte Semanal

marzo 24, 2025

11. OBSERVACIONES POR PARQUES:

Informe Semanal Técnico 24 de marzo al 30 marzo 2025

SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Durante la presente semana se realizaron las siguientes actividades:

Se realiza comité de obra con presencia de todos los componentes de parte de la entidad, interventoría y el contratista, el 25 de marzo del 2025.

PARQUE NACIONAL:	Se realiza fundida de la pista zona rotonda. En el sendero de la vigía se avanza realizando limpieza. Continúa la instalación de barranda 58 ML. Instalados con observaciones. Zona rotonda no se evidencia avance. Se avanza en la fundición de sendero de la vigía.
PARQUE TIMIZA:	La interventoría reporta la ausencia de personal en obra.
PARQUE PLAJOS:	El contratista realiza el suministro de módulos antiautomóviles, el contratista continúa con trabajos en baños de hombres y mujeres. Además de esto se recomienda al contratista realizar la disposición del material de excavación lleva más de una semana en sitio de acople, se encuentran realizando fundida de pilotes se recomienda al contratista darle el curado apropiado a las muestras tomadas el día 21 de marzo ya que aún se encuentran en las cámaras y al sol, llegaron módulos antiautomóviles y 30 pilotes del cerramiento.
PARQUE TIBANICA	Se avanza con la aplicación de pintura en biosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73.
PARQUE PATIO BONITO:	Se inicia con emboquillado en la piscina de niños.
PARQUE PORVENIR	El contratista suministra material (ladrillo). La interventoría reporta Sin personal en la zona de sendero de la rotonda, y no se avanza con ninguna actividad en el sector de los módulos de baños.
PARQUE LA ESPERANZA	Inicio de mantenimiento de máquinas Geocompactas.
PARQUE SAN CRISTOBAL:	Se realiza visita del contratista para atender emergencia de tubería pesada en calle san Cristóbal se tomaron medidas y se está a la espera del material para los arreglos correspondiente, se avanza con mantenimiento de luminarias en baños.
PARQUE NUEVO MILENIO	Recibo de las luminarias de la cancha sintética. La interventoría reporta que el contratista no ha instalado la puerta en la cancha.
PARQUE CAYETANO	Se avanza con mantenimiento de registros y push de sanitarios.
PARQUE VALLES DE CAFAM	Se avanza en la instalación de adoquín en sendero. Se realiza avance en limpiar las barrandas de cerramiento de juegos infantiles.
PARQUE COUNTRY	Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior retiro. Se solicita ajustar y arreglar la palisombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio.
PARQUE LA ANDREA	Se avanza con Lijado de barranda de painaje.
PARQUE GILMA JIMENEZ	Se terminan las actividades de cambio de push, grifería lavamanos push en prismos, painaje y bmx, quedan pendientes detalles de acabado. La interventoría recuerda y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX.
PARQUE PRO	Actividad: lavado de gradavías.
PARQUE UCAD:	Se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización.
PARQUE PALESTINA:	La interventoría requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los biosaludables y zona infantil.



PARQUE OLAYA	: La interventoría requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de las puertas de la cancha
PARQUE CIUDAD MONTES	: La interventoría requiere al contratista avanzar con el mantenimiento del arieteiro
Correspondencia Enviada por la interventoría durante el periodo: Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-321 al contratista el día 25 de marzo del 2025 con el asunto: Respuesta BEL-NPI-ADM-081-25- Revisión Informe Calidad N°4 V.O Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-322 al IDRD el día 25 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión pronunciamiento solicitud de aclaración prueba por informe PAS COP 4080 de 2024 Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-323 al contratista el día 26 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión observaciones a presupuestos allegados Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-324 al contratista el día 26 de marzo del 2025 con el asunto: Remisión solicitud análisis precios unitarios NP Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-325 al contratista el día 26 de marzo del 2025 con el asunto: REMISION ORDENES DE DESEMBOLO N° 11 Y 16 Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-326 al contratista el día 26 de marzo del 2025 con el asunto: SOLICITUD LEGALIZACION ORDENES DE OPERACION Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-327 al contratista el día 26 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento SST- Documentos de ingreso personal Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-328 al contratista el día 27 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento SST- Documentos de ingreso personal Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-329 al contratista el día 27 de marzo del 2025 con el asunto: Observaciones memoria candidaturas parques La Guirana y El Poverit Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-330 al contratista el día 27 de marzo del 2025 con el asunto: Observaciones memoria candidaturas parques La Guirana y El Poverit Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-331 al IDRD el día 27 de marzo del 2025 con el asunto: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 18 Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-332 al contratista el día 28 de marzo del 2025 con el asunto: Requerimiento proyección amortización del anticipo Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-333 al contratista el día 28 de marzo del 2025 con el asunto: Apremio por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-334 al contratista el día 28 de marzo del 2025 con el asunto: Relebración - Requerimiento remisión soporte de pago rendimientos financieros generados de los recursos del anticipo - mas de enero de 2025 Se envió comunicado IDRD-0380-G2-2024-335 al contratista el día 28 de marzo del 2025 con el asunto: Relebración - Requerimiento remisión soporte de pago rendimientos financieros generados de los recursos del anticipo - mas de enero de 2025	
SEGUIMIENTO TECNICO ELECTRICO: 1. Tendido de cables en la zona de la cancha. -Continúa revisión corte circuito en acomida en zona de senderos. -Cambio de contactores en mal estado. 2. San Cristóbal -Mantenimiento de luminarias en baños de Códaco -Mantenimiento de luminarias en pasillos de Códaco -Mantenimiento de luminarias en baños de Piedras 3. Nuevo Milenio -Instalación de tablero de distribución. -Instalación de control de iluminación. -Instalación de cableado entre tableros. 4. Nuevo Urama -Instalación de tablero de distribución. -Instalación de control de iluminación. -Instalación de cableado entre tableros. 5. Gorgonzola -Terminación mantenimiento de tablero eléctrico -Cambio de contactor. 6. Milania Tular -Se realiza instalación del cable que va alimentando las luminarias de la cancha de fútbol.	

INFORME SEMANAL ELECTRICO

Procedimiento de Seguimiento de la Gestión de la Unidad Administrativa Especial del Distrito Capital de Bogotá

<div><div><div><div></div><div>Bogotá</div><div>BOGOTÁ</div><div>Municipio de Bogotá</div></div><div>INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE</div></div><div><div>Reporte Semanal</div><div># 19</div><div>Interventor:</div><div>marzo 24, 2025</div><div>marzo 30, 2025</div><div>CONSORCIO SANTA TERESA 28</div></div></div>	
INFORME SEMANAL CALIDAD	
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CALIDAD: Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité de obra Se envían observaciones del informe N°4 V.O con el oficio 321, el día 25 03 2025, las cuales a la fecha no han sido atendidas por el contratista Se realiza la solicitud de la entrega de las fichas técnicas de los juegos a instalar los cuales no han sido entregados por el contratista Se realiza nuevamente la solicitud de entrega de materiales lo cual ha sido aportado por el contratista Se ha realizado la entrega de las actas de inspección realizadas las cuales cuentan con fotos errores No se ha recibido el informe de avance del Plan A-Acceso NO se ha realizado la entrega de los certificados de ascensores	
INFORME SEMANAL SST Y AMBIENTAL	
SEGUIMIENTO GESTIÓN SST: Durante la semana objeto de reporte se participa en el comité de obra El día 27-03-2025 se emitió el oficio 324-325, solicitando al contratista el ingreso de personal operativo para actividades de soldadura. En los frentes de obra activos se evidencia el uso de dotación institucional y EPP por cuenta del personal operativo.	
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: durante el periodo de reporte el contratista entrega la trazabilidad RCD en su segunda versión con los ajustes solicitados a los meses de noviembre de 2024 a febrero de 2025, a partir de lo cual se procede con la revisión de registros y soportes, generando las respectivas observaciones por parte de esta interventoría, quedando como plazo de entrega el día 31-03-2025.	
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SOCIAL: El día 27-03-2025 se diligenció el oficio 324-325, solicitando al contratista que presente un plan de gestión social para el desarrollo de la obra 27 Marzo se recibe el oficio de respuesta del contratista, en el cual se remite a la entidad quien remite observaciones las cuales se subsanan por el contratista 27 Marzo se copia al drive los soportes de reunión de avance del parque Páto Bamba	
INFORME SEMANAL SOCIAL	
MANEJO DEL ANTICIPO:	
Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato N° IDRD-SG-4060-2024 Mediante oficio N° IDRD-4060-GS-2024-325 se ordena a continuación: Mediante oficio N° IDRD-4060-GS-2024-325 el 26 de marzo se da aprobación a los órdenes de desembolso No. 11 y 16. Mediante oficio No. IDRD-4060-GS-2024-326 la interventoría solicita legalización de facturas de los órdenes aprobados a la fecha	

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

19

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

marzo 24, 2025

al

marzo 30, 2025

<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 
<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 
<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 	<p>Parque Nacional Se realiza fundida de la placa zona rotunda</p> 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

#19

marzo 30, 2025

Interventor:

CONSORCIO SANTA TERESA 28

<p>PARQUE PUJOS</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>		<p>PARQUE TIBANICA</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>	
<p>PARQUE PUJOS</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>		<p>PARQUE TIBANICA</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>	
<p>PARQUE PUJOS</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>		<p>PARQUE TIBANICA</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>	
<p>PARQUE PUJOS</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>		<p>PARQUE TIBANICA</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>	
<p>PARQUE PUJOS</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>		<p>PARQUE TIBANICA</p> <p>Se avanza con la aplicación de pintura en bosaludables en la zona cerca al módulo de administración. Remates de pintura en la zona de la DG 73</p>	

Informe Semanal


marzo 24, 2025

19

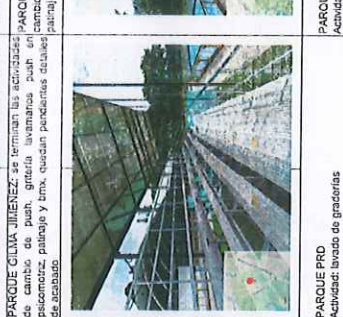
al



marzo 30, 2025

Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

				
<p>PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la instalación de adoquín en sendero Se realiza avance en fijar las barandas de cerramiento de juegos infantiles</p>	<p>PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la instalación de adoquín en sendero Se realiza avance en fijar las barandas de cerramiento de juegos infantiles</p>	<p>PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la instalación de adoquín en sendero Se realiza avance en fijar las barandas de cerramiento de juegos infantiles</p>	<p>PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la instalación de adoquín en sendero Se realiza avance en fijar las barandas de cerramiento de juegos infantiles</p>	<p>PARQUE VALLES DE CAFAM Se avanza en la instalación de adoquín en sendero Se realiza avance en fijar las barandas de cerramiento de juegos infantiles</p>
				
<p>PARQUE COUNTRY Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior relleno. Se solicita ajuste y arreglo la polsombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio</p>	<p>PARQUE COUNTRY Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior relleno. Se solicita ajuste y arreglo la polsombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio</p>	<p>PARQUE COUNTRY Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior relleno. Se solicita ajuste y arreglo la polsombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio</p>	<p>PARQUE COUNTRY Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior relleno. Se solicita ajuste y arreglo la polsombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio</p>	<p>PARQUE COUNTRY Actividad se realiza movimiento de tierra en zona verde para su posterior relleno. Se solicita ajuste y arreglo la polsombra instalada, en bodega cuentan con Dos roles para este cambio</p>
				
<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza Continúa la instalación de baranda 58 ML instalados con observaciones Zona rodeada no se evidencia avance</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza Continúa la instalación de baranda 58 ML instalados con observaciones Zona rodeada no se evidencia avance</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza Continúa la instalación de baranda 58 ML instalados con observaciones Zona rodeada no se evidencia avance</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza Continúa la instalación de baranda 58 ML instalados con observaciones Zona rodeada no se evidencia avance</p>	<p>PARQUE NACIONAL En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza Continúa la instalación de baranda 58 ML instalados con observaciones Zona rodeada no se evidencia avance</p>



				
<p>PARQUE NACIONAL</p> <p>En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza. Continúa la instalación de baranda 58 ML. Instalados con observaciones. Zona residual no se evidencia avance.</p>	<p>PARQUE NACIONAL</p> <p>En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza. Continúa la instalación de baranda 58 ML. Instalados con observaciones. Zona residual no se evidencia avance.</p>	<p>PARQUE NACIONAL</p> <p>En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza. Continúa la instalación de baranda 58 ML. Instalados con observaciones. Zona residual no se evidencia avance.</p>	<p>PARQUE NACIONAL</p> <p>En el sendero de la virgen se avanza realizando limpieza. Continúa la instalación de baranda 58 ML. Instalados con observaciones. Zona residual no se evidencia avance.</p>	<p>PARQUE LA ANDREA</p> <p>Se avanza con lijado de baranda de pintura.</p>
				
<p>PARQUE LA ANDREA</p> <p>Se avanza con lijado de baranda de pintura.</p>	<p>PARQUE GILMA JIMENEZ</p> <p>Se terminan las actividades de cambio de push, grútera lavamano push en pascomotz, parque y bmx, quedan pendientes detalles de acabado.</p>	<p>PARQUE GILMA JIMENEZ</p> <p>Se terminan las actividades de cambio de push, grútera lavamano push en pascomotz, parque y bmx, quedan pendientes detalles de acabado.</p>	<p>PARQUE GILMA JIMENEZ</p> <p>Se terminan las actividades de cambio de push, grútera lavamano push en pascomotz, parque y bmx, quedan pendientes detalles de acabado.</p>	<p>PARQUE GILMA JIMENEZ</p> <p>Se terminan las actividades de cambio de push, grútera lavamano push en pascomotz, parque y bmx, quedan pendientes detalles de acabado.</p>
				
<p>PARQUE SAN CRISTOBAL: se avanza con mantenimiento de luminarias en baños.</p>	<p>PARQUE SAN CRISTOBAL: se avanza con mantenimiento de luminarias en baños.</p>	<p>PARQUE SAN CRISTOBAL: se avanza con mantenimiento de luminarias en baños.</p>	<p>PARQUE PRO</p> <p>Actividad: lavado de graderías.</p>	<p>PARQUE PRO</p> <p>Actividad: lavado de graderías.</p>

Instituto Distrital de Recreación y Deporte				Interventor:		CONSORCIO SANTA TERESA 28	
Reporte Semanal		# 19		marzo 30, 2025		al	
marzo 24, 2025							
							
PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización	PARQUE UCAD: se avanza con la aplicación e instalación de impermeabilización
							
PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande	PARQUE PATO BONITO: se avanza con la instalación de enchape en las lida piscina grande
							
PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil	PARQUE PALESTINA: La intervención requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de los bioalutables y zona infantil
							
PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX	PARQUE GILMA JIMENEZ: La intervención requiere y requiere al contratista avanzar con el mantenimiento de la pista BMX
PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario	PARQUE LA SERENA: se reporta emergencia en cuanto a la cubierta en baño sanitario
PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen	PARQUE NACIONAL: Se avanza en la fundición de sendero de la virgen



IDRD-4080-G2-2024-349

Bogotá D. C., 4 de abril de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad



Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 19 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de marzo al 30 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,


RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (13) folios
Con copia: N/A
Elaboró: RRLJ
Revisó: N/A

