

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 19.12.22

ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 04

CONTRATO No. 093 - 2025

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
CONTRATISTA	JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
C.C O NIT	78.744.093
DOMICILIO	CALLE 46 No. 16ª-38 B. INSCREDIAL
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 16.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
ANTICIPO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00150
FECHA ACTA INICIO	08 de marzo de 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 03

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron el Señor **BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ**, en calidad de SUPERVISOR del presente contrato y el contratista **JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO** para suscribir la presente acta e Informe de Supervisión Parcial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Del 08 de marzo al 31 de marzo de 2025	\$ 3.066.667
02	Del 01 de abril al 30 de abril de 2025	\$ 4.000.000
03	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025	\$ 4.000.000
04	Del 01 de junio al 30 de junio de 2025	\$ 4.000.000
	Saldo por Pagar	\$ 933.333
	TOTAL CONTRATO	\$ 16.000.000

Valor de la presente acta: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000).



2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 19.12.22

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

Fecha de pago:	13/06/2025
Periodo cotizado:	Mayo 2025
Planilla No.	7972082907
IBC	\$ 1.600.000
Valor Total pago	\$ 495.000

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar y digitalizar levantamientos arquitectónicos de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Barrancabermeja	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS 1- OLAYA HERRERA-COMUNA 2 2- LA LIBERTAD – COMUNA 2 3- SANTA ISABEL-COMUNA 3 4- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 5- LA FLORESTA – COMUNA 3	REGISTRO FOTOGRÁFICO, PLANOS ARQUITECTÓNICOS



 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL		F: 31.PO.GJC Versión: 0.9 Fecha: 19.12.22
2	Realizar apoyo técnico en la proyección de los presupuestos y cantidades de obra, para soportar la Intervención, Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos del Distrito de Barrancabermeja	INFORME DE CANTIDADES DE OBRA. PARA LAS REPARACIONES MENORES DE LAS POLIDEPORTIVAS: 1-OLAYA HERRERA-COMUNA 2 2- LA LIBERTAD –COMUNA 2 3-SANTA ISABEL- COMUNA 2 4- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 5-LA FLORESTA –COMUNA 3 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 5 Y 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS 1- LA LIBERTAD – COMUNA FECHA 6 DE JUNIO 2025 2- SANTA ISABEL- COMUNA 2 FECHA 6 DE JUNIO 2025 3- SIMÓN BOLÍVAR- COMUNA 5 - FECHA 5 DE JUNIO 2025 2-DESCRIPCION ACTIVIDAD: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EL DIA 11 DE JUNIO 2025 PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE VENIA REALIZANDO EL CONTRATISTA MIS INGENIERIA AL CONTRATO DE OBRA 0592-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0593-2024 ACOMPAÑADOS CON LA INTERVENTORIA Y EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA INFORMES DE CANTIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS POLIDEPORTIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACTA DE REUNION REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE REUNION

[Handwritten signature]

3	Realizar apoyo en la planeacion, ejecución y seguimiento del mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Barrancabermeja	VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 1- SANTA ISABEL-COMUNA 2 2- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 3 – 16 DEL MES DE JUNIO DONDE SE REVISAN LAS PROGRAMACIONES DEL MES	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y COPIA DE ACTAS DE REUNIÓN
4	Realizar las demás actividades relacionadas con su objeto contractual y asignadas por el supervisor	N/A	N/A


Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Barrancabermeja, 04 JUL. 2025

BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ
Supervisor
Profesional Universitario Grado 03


JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
78.744.093 de Montería
El contratista

Actividad	Responsable	Firma
Reviso Aspectos técnicos	Hector Sierra T.	
Revisó aspectos administrativos y financieros	CAROLINA P. OSPINO	
Revisó aspectos jurídicos	N/A	


	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17



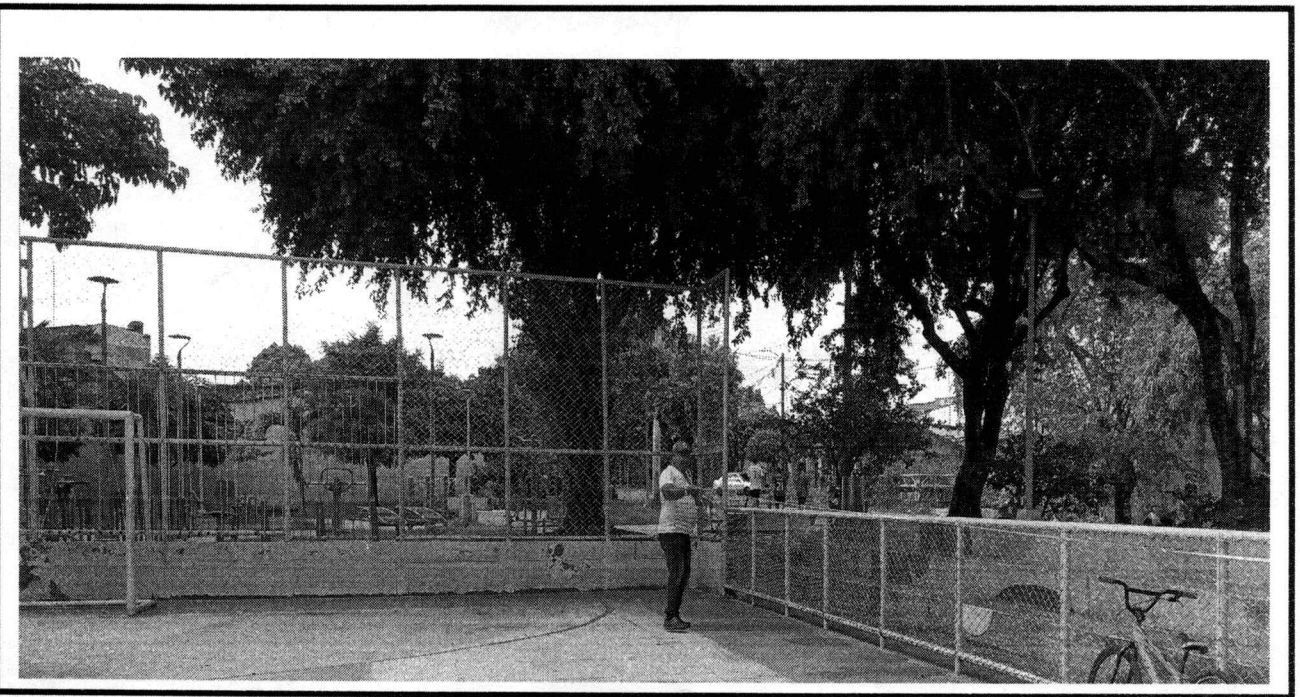
1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS
1-OLAYA HERRERA-COMUNA 2
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



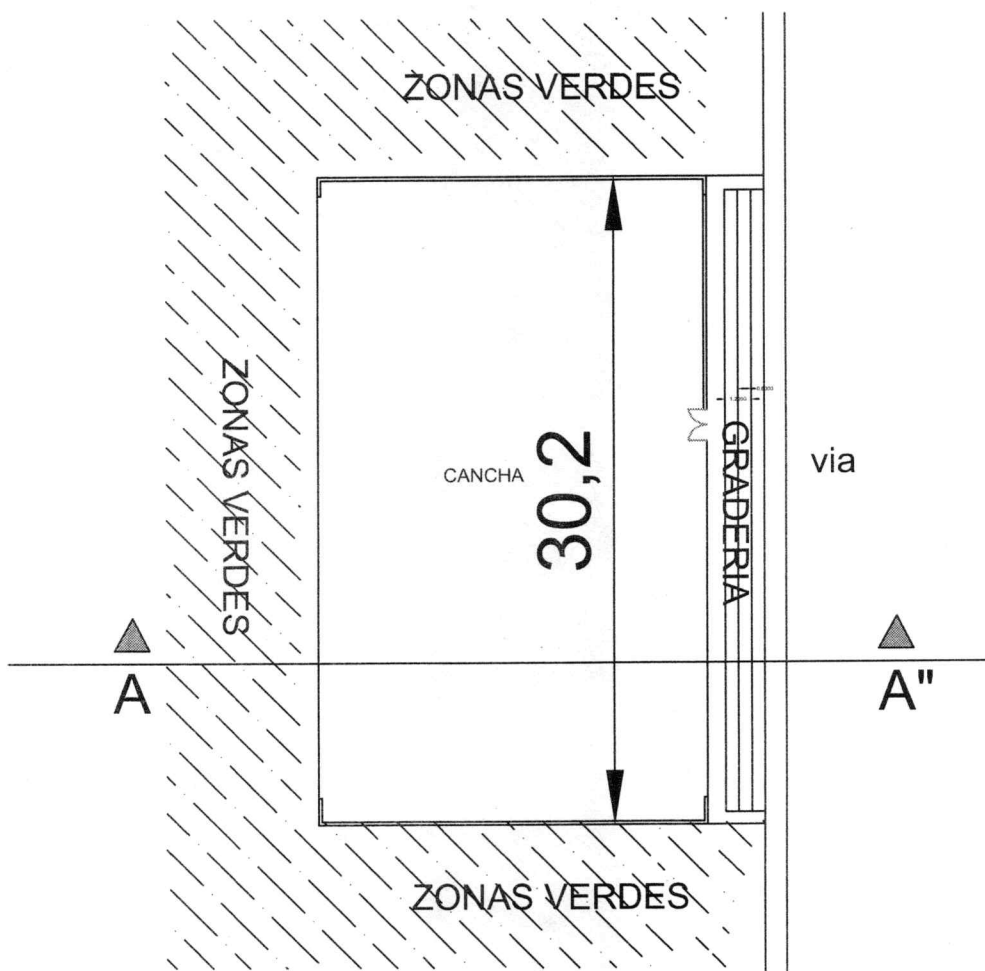1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS
1-OLAYA HERRERA-COMUNA 2
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025




PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO OLAYA HERRERA
COMUNA 2



CORTE A-A"

 inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE INDERBA		OBSERVACIONES:	BIBLIOMETRIA	
	CONTENIDO: PLANTAS ARQUITECTONICAS POLIDEPORTIVO OLAYA HERRERA - COMUNA		FECHA:			ESCALA INDICADA	
	ELABORADO: ARQUITECTO JESUS ZAPPA MARTELO		ARG. LIDER: ARQUITECTO HECTOR SIERRA			PLANCHAS:	
	DIRECTOR: HENRY CORREA						

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA		F: 47.PO.GJC
	EVIDENCIA FOTOGRAFICA		Versión: 0.1
			Fecha: 02.05.17

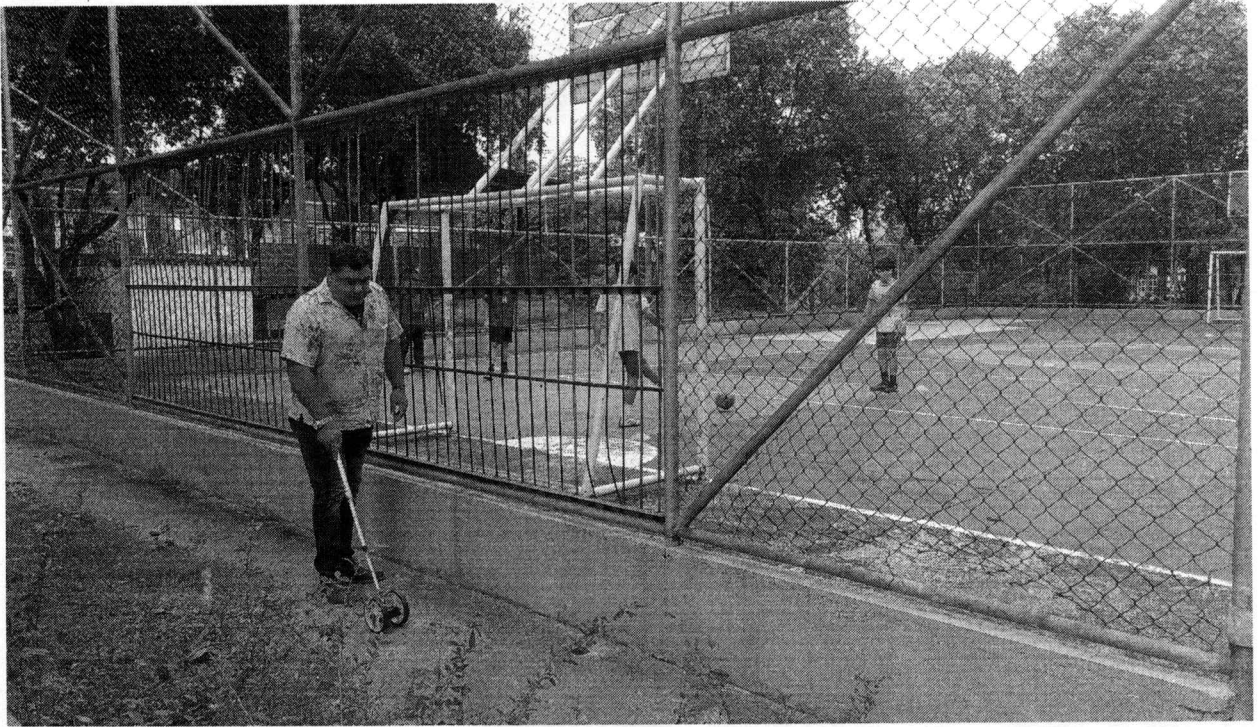


1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 2- LA LIBERTAD –COMUNA 2

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

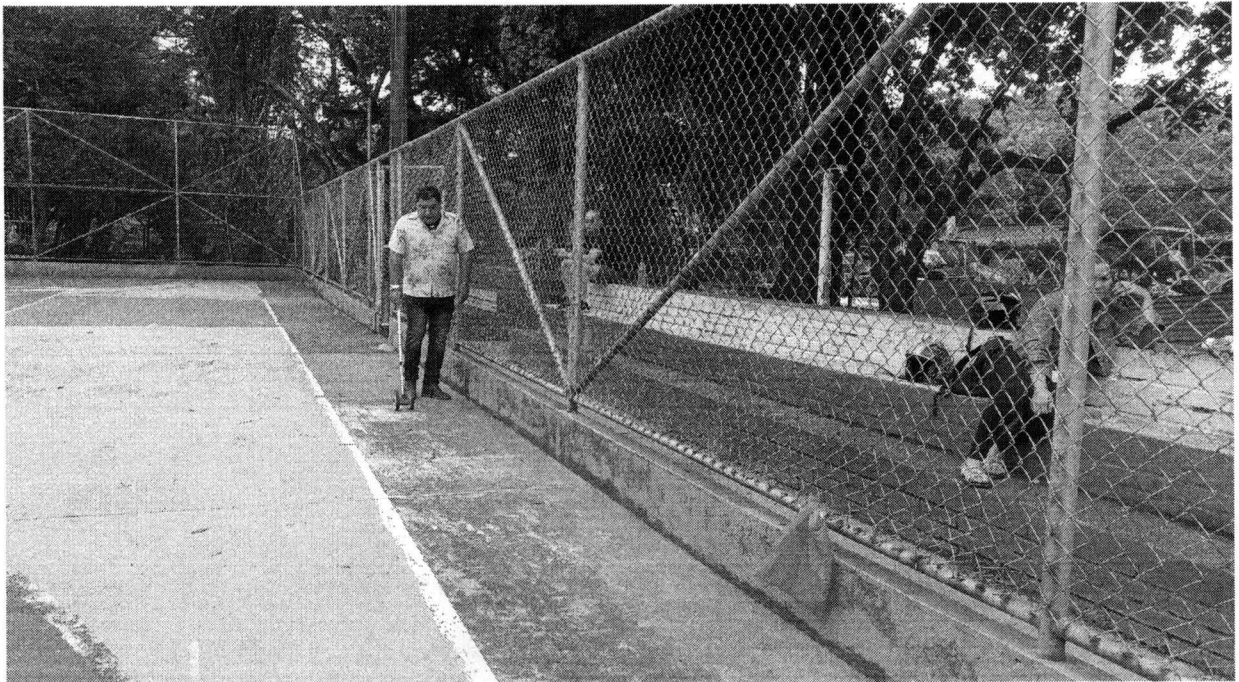FECHA O PERIODO : : 1 de junio al 30 de junio del 2025




1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 2- LA LIBERTAD –COMUNA 2


GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

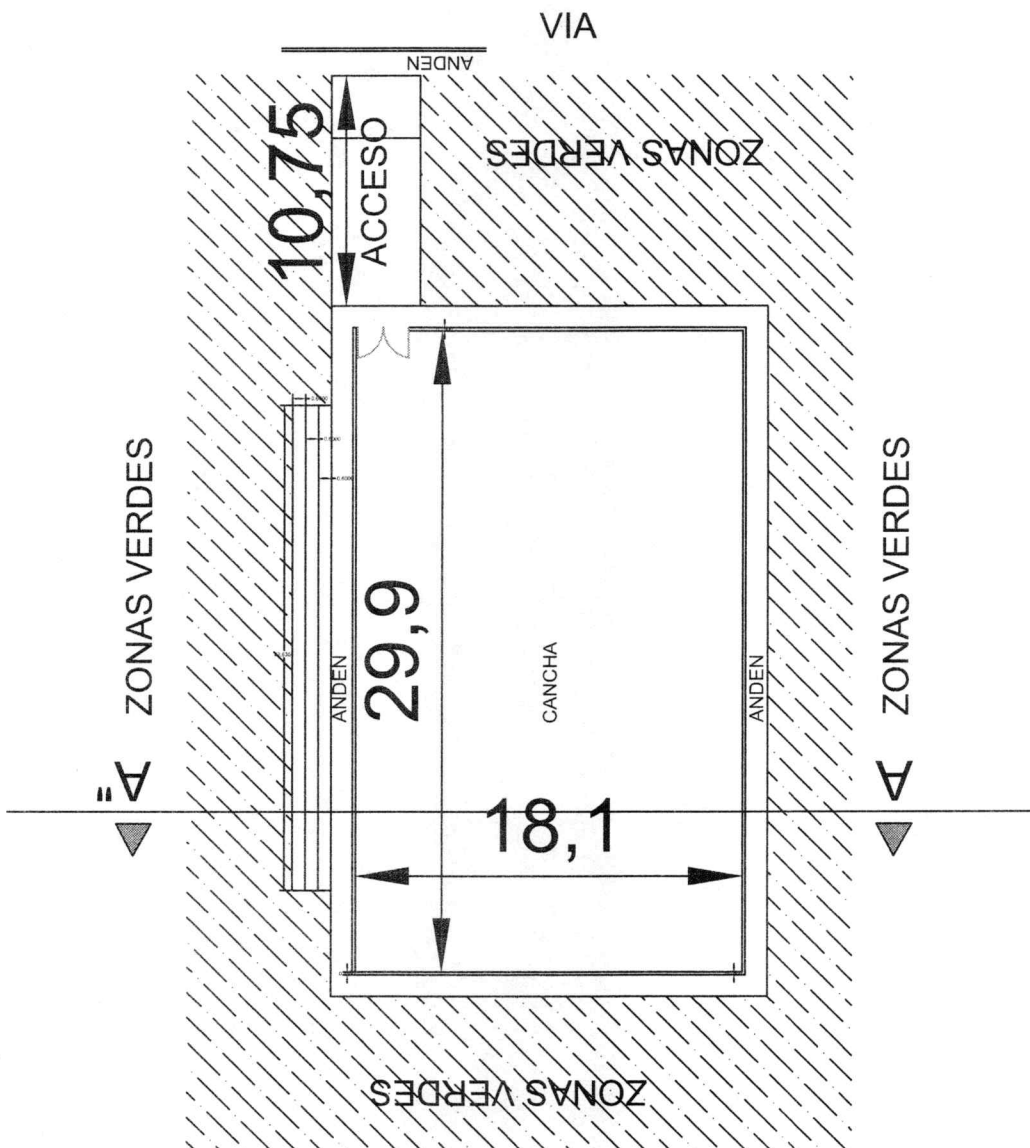FECHA O PERIODO: : 1 de junio al 30 de junio del 2025




PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD
COMUNA - 2
18,1




CORTE A-A"


 Inderba	INSTITUTO PARA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE INDERBA		OBSERVACIONES:	BIBLIOPLENOMETRIA:	
	CONTIENE: PLANTAS ARQUITECTONICAS POLIDEPORTIVO LA LIBERTAD - COMUNA 2		FECHA:				ESCALA INDICADA
	ELABORO: ARQUITECTO JESUS ZAPPA MARTELO		ARO. LIDER: ARQUITECTO HECTOR SIERRA				PLANCHAS:
	DIRECTOR: HENRY CORREA						

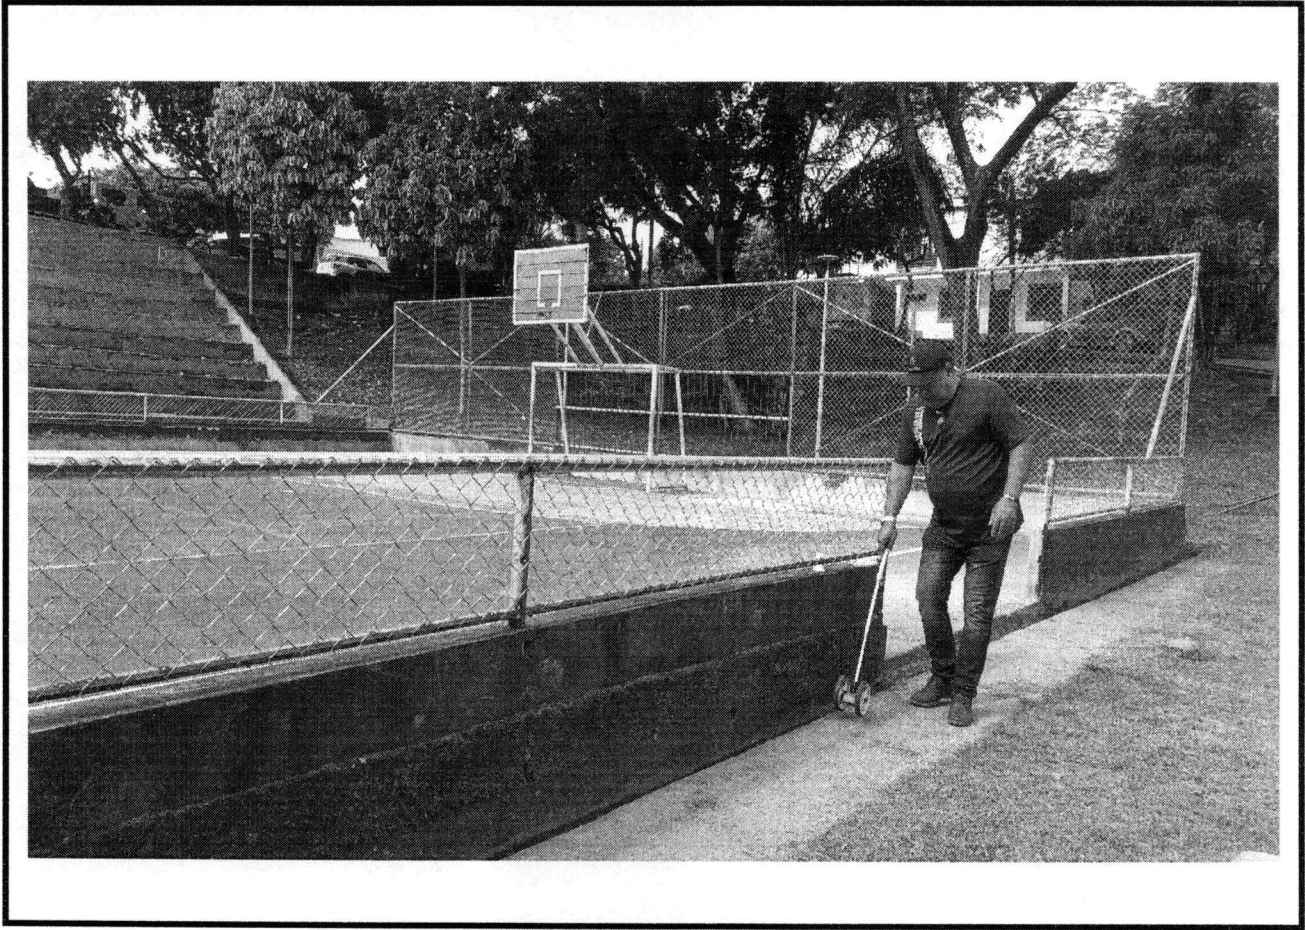

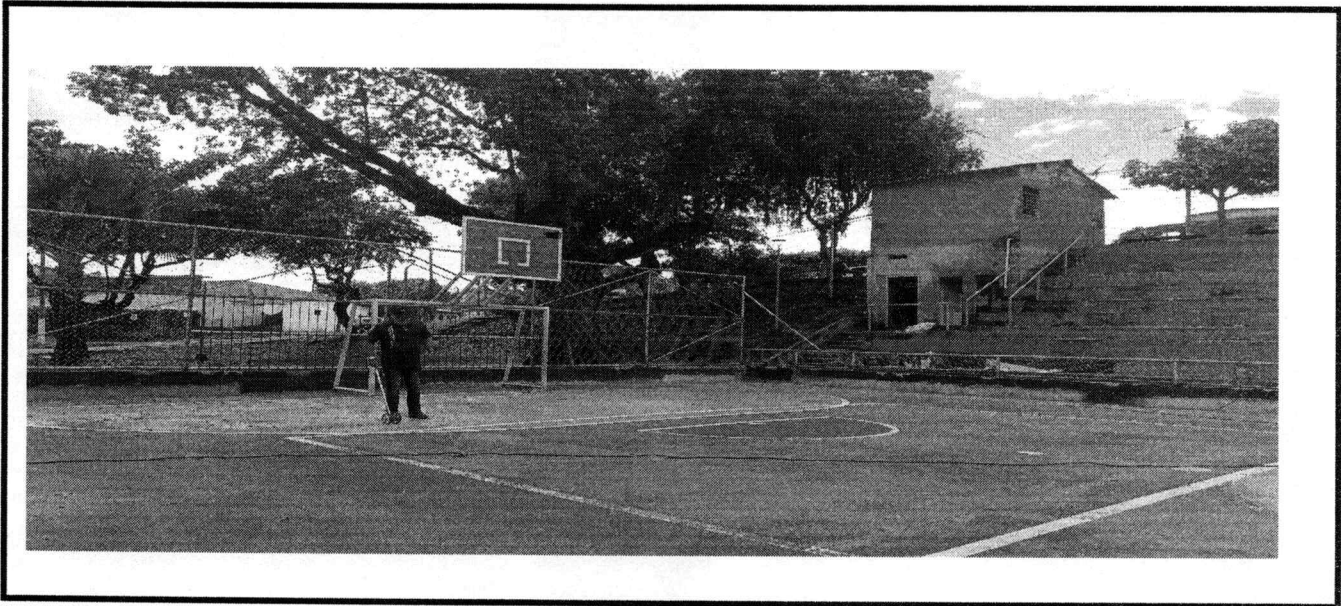
1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 3-SANTA ISABEL- COMUNA 3
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO :: 1 de junio al 30 de junio del 2025



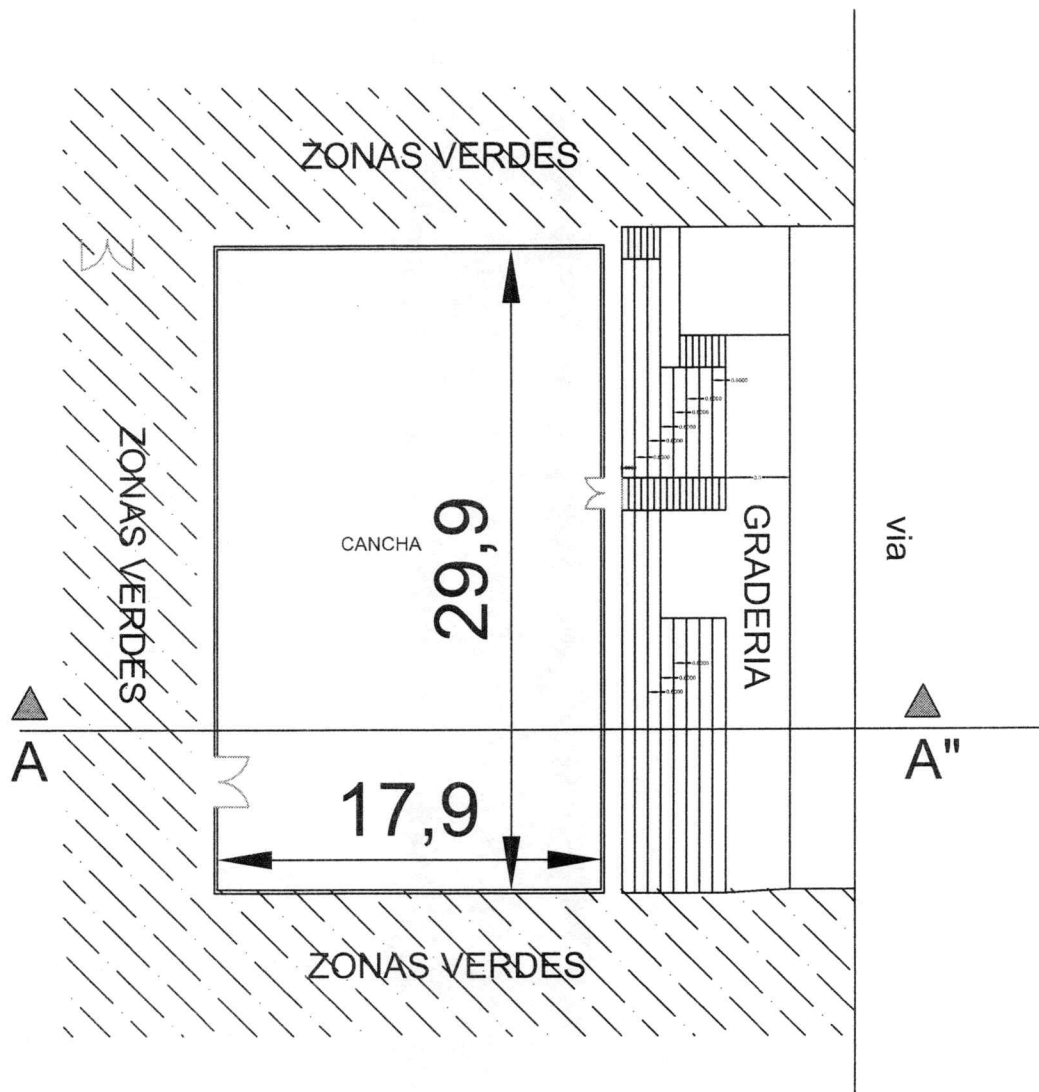1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 3-SANTA ISABEL- COMUNA 3
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO :: 1 de junio al 30 de junio del 2025



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO SANTA ISABEL
COMUNA - 3



CORTE A-A"

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE INDERBA		OBSERVACIONES:	BIBLIOLENGUETRIA:	
	DIRECTOR: HENRY CORREA			CONTIENE: PLANTAS ARQUITECTONICAS POLIDEPORTIVO SANTA ISABEL - COMUNA 3			FECHA:	ESCALA: INDICADA
				ELABORO: ARQUITECTO JESUS ZAPPA MARTELO			ARQ. USER: ARQUITECTO HECTOR SIENRA	PLANCHAS:

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

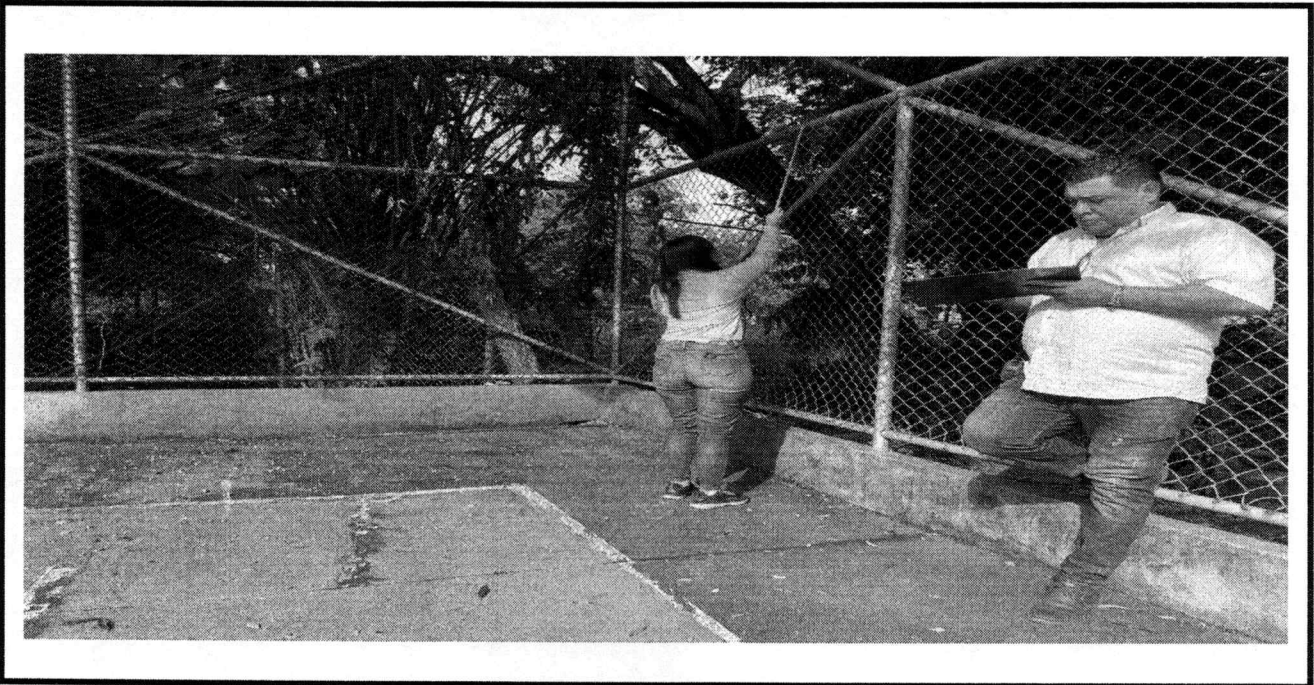


1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 4- **SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5**

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025




1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 4- **SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5**


GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

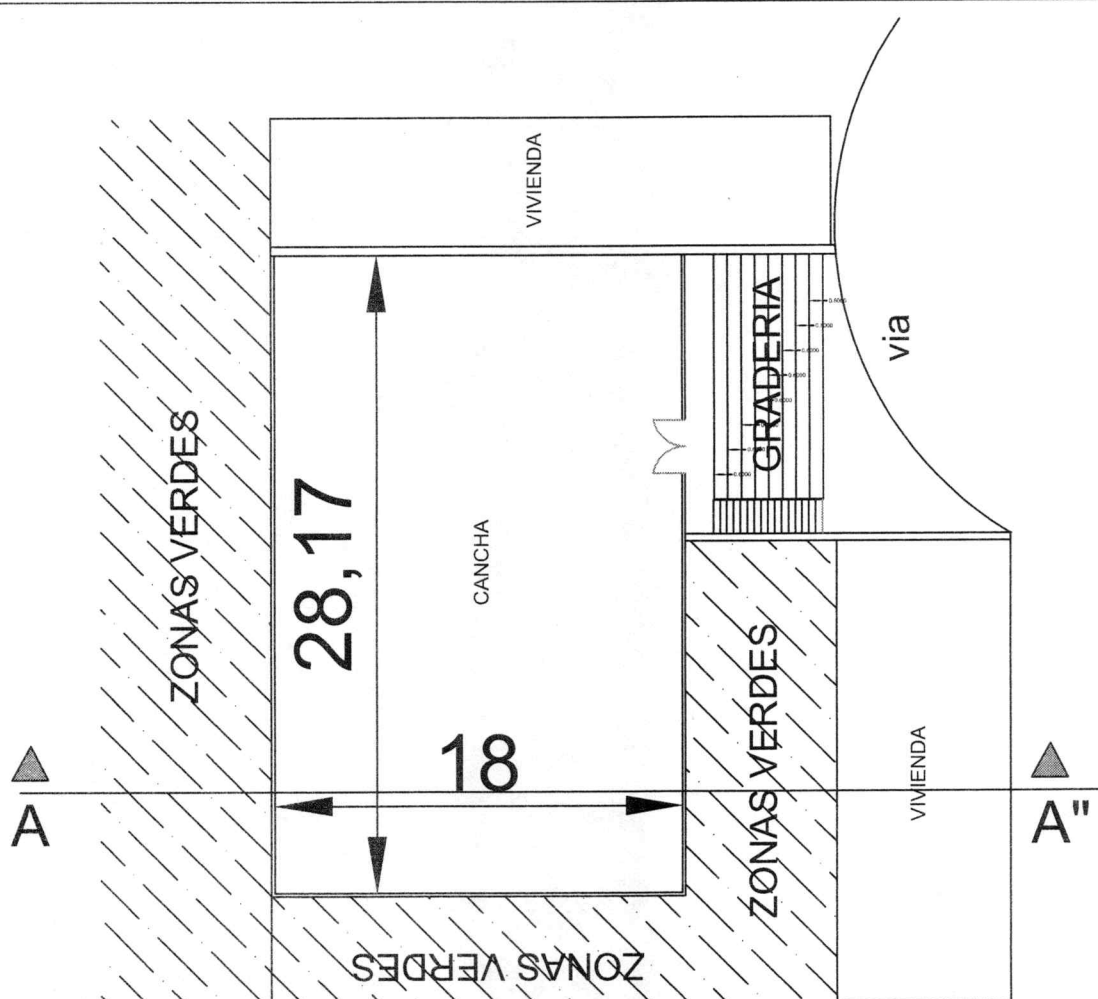FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO SIMON BOLIVAR
COMUNA 5



CORTE A-A'

	INSTITUTO PARA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE INDERBA		OBSERVACIONES:	BIBLIOPLENIMETRIA
		CONTIENE: PLANTAS ARQUITECTONICAS POLIDEPORTIVO SIMON BOLIVAR - COMUNA 5	FECHA:		
		ELABORO: ARQUITECTO JESUS ZAPPA MARTELO	ARG. LIDER: ARQUITECTO HECTOR SIERRA		
		DIRECTOR: HENRY CORREA			
					ESCALA: INDICADA
					PLANCHAS:



INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

F: 47.PO.GJC

Versión: 0.1

Fecha: 02.05.17

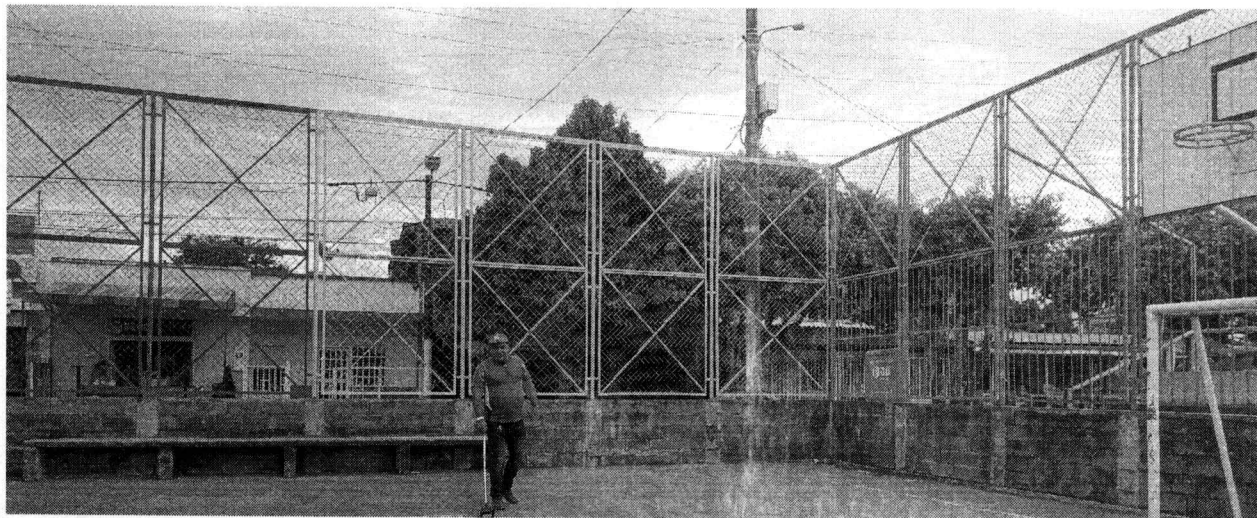


1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 5- LA FLORESTA –COMUNA 3

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025




1 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS- 5- LA FLORESTA –COMUNA 3


GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

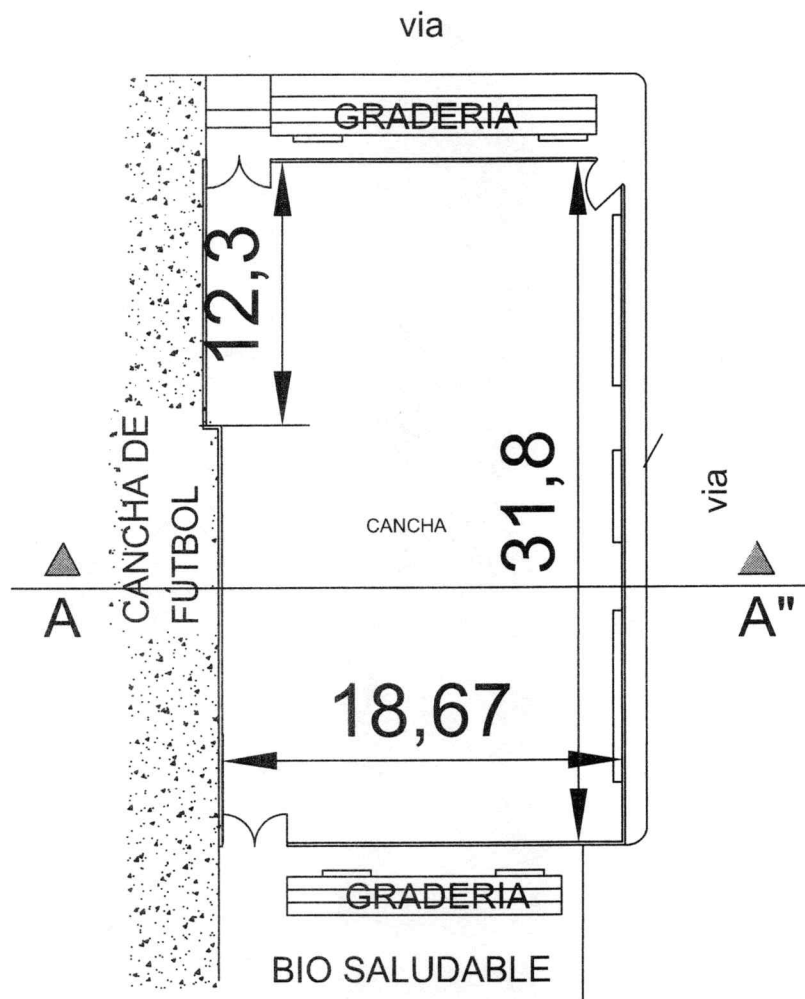FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A''

 Inderba	INSTITUTO PARA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE INDERBA		OBSERVACIONES:	BIBLIOMETRIA
	CONTIENE PLANTAS ARQUITECTONICAS POLIDEPORTIVO FLORESTA - COMUNA 3		FECHA:			ESCALA INDICADA
	ELABORO ARQUITECTO JESUS ZAPPA MARTELO		ANIL USER ARQUITECTO HECTOR MIERRA			PLANCHA:
	DIRECTOR HENRY CORREA					

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 31.PO.GJC
	INFORME DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 0.9
		Fecha: 20.12.25

N°	OBJETO	UND	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD PARA MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
1	MURO BAJO ,58 CM	M2	160	160	PINTURA
2	MALLA	M2	160	10	REPARACION Y PINTURA
3	ESTRUCTURA METALICA DE MALLA DE CERRAMIENTO	GL	1	1	PINTURA
4	TABLEROS Y ARO	UND	2	2	NUEVOS
5	ILUMINACION - POSTES	UND	4	0	0
6	AREA DE CANCHA (PISO)	M2	543	543	PINTURA Y DEMARCACION
7	AREA DE REFURZO CON VARILLAS DE 1/2" LISA- CON SEPARACION CADA 11 CM	M2	45	3	REPARAR Y PINTURA
8	LOSAS DE PISO	M2	543	0	0
9	ARREGLO DE PORTERIA	UND	2	1	REEMPLAZO DE PEDAZOZ DAÑADOS INCLUYE PINTURA
10	PASADOR DE PORTON	UND	1	0	INSTALAR PASADOR DE PORTON - PINTADO

Informe realizado por:	Arq. Jesus Rafael zappa martelo	
Fecha:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Nombre de la polideportiva:	POLIDEPORTIVAS 1-OLAYA HERRERA-	
Comuna:	2	

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 31.PO.GJC
	INFORME DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 0.9
		Fecha: 20.12.25

N°	OBJETO	UND	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD PARA MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
1	MURO BAJO ,58 CM	M2	142.60	142.60	PINTURA
2	MALLA	M2	160	160	REPARACION Y PINTURA
3	ESTRUCTURA METALICA DE MALLA DE CERRAMIENTO	GL	1	1	PINTURA
4	TABLEROS Y ARO	UND	2	2	NUEVOS
5	ILUMINACION - POSTES	UND	4	0	0
6	AREA DE CANCHA (PISO)	M2	541.52	541.52	PINTURA Y DEMARCACION
7	AREA DE REFURZO CON VARILLAS DE 1/2" LISA- CON SEPARACION CADA 11 CM	M2	45	3	REPARAR Y PINTURA
8	LOSAS DE PISO	M2	541.52	0	0
9	ARREGLO DE PORTERIA	UND	2	1	REEMPLAZO DE PEDAZOZ DAÑADOS INCLUYE PINTURA
10	PASADOR DE PORTON	UND	1	1	INSTALAR PASADOR DE PORTON - PINTADO

Informe realizado por:	Arq. Jesus Rafael zappa martelo	
Fecha:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Nombre de la polideportiva:	POLIDEPORTIVAS 2- LA LIBERTAD	
Comuna:	2	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 20.12.25
INFORME DE CANTIDADES DE OBRA		

N°	OBJETO	UND	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD PARA MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
1	MURO BAJO ,58 CM	M2	135	135	PINTURA
2	MALLA	M2	170	30	REPARACION Y PINTURA
3	ESTRUCTURA METALICA DE MALLA DE CERRAMIENTO	GL	1	1	PINTURA
4	TABLEROS Y ARO	UND	2	2	NUEVOS
5	ILUMINACION - POSTES	UND	4	0	0
6	AREA DE CANCHA (PISO)	M2	535.2	535.2	PINTURA Y DEMARCACION
7	AREA DE REFURZO CON VARILLAS DE 1/2" LISA- CON SEPARACION CADA 11 CM	M2	45	3	REPARAR Y PINTURA
8	LOSAS DE PISO	M2	535.2	0	0
9	ARREGLO DE PORTERIA	UND	2	1	REPLAZO DE PEDAZOZ DAÑADOS INCLUYE PINTURA
10	PASADOR DE PORTON	UND	1	0	INSTALAR PASADOR DE PORTON - PINTADO

Informe realizado por:	Arq. Jesus Rafael zappa martelo	
Fecha:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Nombre de la polideportiva:	POLIDEPORTIVAS 3-SANTA ISABEL	
Comuna:	3	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 20.12.25
INFORME DE CANTIDADES DE OBRA		

N°	OBJETO	UND	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD PARA MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
1	MURO BAJO ,58 CM	M2	142.60	142.60	PINTURA
2	MALLA	M2	180	180	REPARACION Y PINTURA
3	ESTRUCTURA METALICA DE MALLA DE CERRAMIENTO	GL	1	1	PINTURA
4	TABLEROS Y ARO	UND	2	2	NUEVOS
5	ILUMINACION - POSTES	UND	4	0	0
6	AREA DE CANCHA (PISO)	M2	324.5	324.5	PINTURA Y DEMARCACION
7	AREA DE REFURZO CON VARILLAS DE 1/2" LISA- CON SEPARACION CADA 11 CM	M2	49	20	REPARAR Y PINTURA
8	LOSAS DE PISO	M2	324.5	0	0
9	ARREGLO DE PORTERIA	UND	2	1	REEMPLAZO DE PEDAZOZ DAÑADOS INCLUYE PINTURA
10	PASADOR DE PORTON	UND	1	1	INSTALAR PASADOR DE PORTON - PINTADO

Informe realizado por:	Arq. Jesus Rafael zappa martelo	
Fecha:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Nombre de la polideportiva:	POLIDEPORTIVAS 4- SIMÓN BOLÍVAR	
Comuna:	5	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA INFORME DE CANTIDADES DE OBRA	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 20.12.25

N°	OBJETO	UND	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD PARA MANTENIMIENTO	ACTIVIDAD
1	MURO BAJO ,58 CM	M2	139	139	PINTURA
2	MALLA	M2	140	15	REPARACION Y PINTURA
3	ESTRUCTURA METALICA DE MALLA DE CERRAMIENTO	GL	1	1	PINTURA
4	TABLEROS Y ARO	UND	2	2	NUEVOS
5	ILUMINACION - POSTES	UND	4	0	0
6	AREA DE CANCHA (PISO)	M2	591	591	PINTURA Y DEMARCACION
7	AREA DE REFURZO CON VARILLAS DE 1/2" LISA- CON SEPARACION CADA 11 CM	M2	45	3	REPARAR Y PINTURA
8	LOSAS DE PISO	M2	591	0	0
9	ARREGLO DE PORTERIA	UND	2	1	REPLAZO DE PEDAZOZ DAÑADOS INCLUYE PINTURA
10	PASADOR DE PORTON	UND	1	0	INSTALAR PASADOR DE PORTON - PINTADO

Informe realizado por:	Arq. Jesus Rafael zappa martelo	
Fecha:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Nombre de la polideportiva:	POLIDEPORTIVAS 5-LA FLORESTA	
Comuna:	3	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17



2 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS
1- LA LIBERTAD –COMUNA 2 – CONTRATO DE OBRA N°243-2025

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



2 - DESCRIPCION ACTIVIDAD: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS
1- LA LIBERTAD –COMUNA 2 – CONTRATO DE OBRA N°243-2025

GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO

FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025









	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F 08 PO 00
	ACTA DE REUNION	Versión 05
		Fecha 02 05 17

ACTA No.


Fecha: 06 de junio de 2025	Lugar: Polideportiva Libertad
Proyecto / tema : Adecuación polideportiva Libertad	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 9:00 a.m.	Hora Terminación: 9:30 a.m.

ORDEN DEL DIA
- Socialización de proyecto de adecuación de polideportiva La Libertad.


DESARROLLO
- se socializa con la comunidad las actividades a realizar: mantenimiento de cerramiento, pintura de muros perimetrales, pintura y demarcación de cancha, mantenimiento de arcos e instalación de tableros.

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alexander Martinez G	Comunidad	
JUZ ESTELA MANGUE	Comunidad	
Pedro Gutierrez Caballero	Comunidad	
Doris Pize Pizino	Comunidad	
Juz del e Parra	Comunidad	
Eriberto Marquez R	Comunidad	
Rosalba Vailbuna	Comunidad	
Romiro Pereiro	Comunidad	
Daiceline Aereo Aereo	Comunidad	
Dany Salas Vares	Comunidad	
Jesus Zappa M.	ARE INTRA WR	
Johanni Suarez Gomez	Contratista	
Nazly Duran Meneses	Ing. Interventoría	Nazly Duran M.
Osvaldo Rojas Araya	API INF. Interba	

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

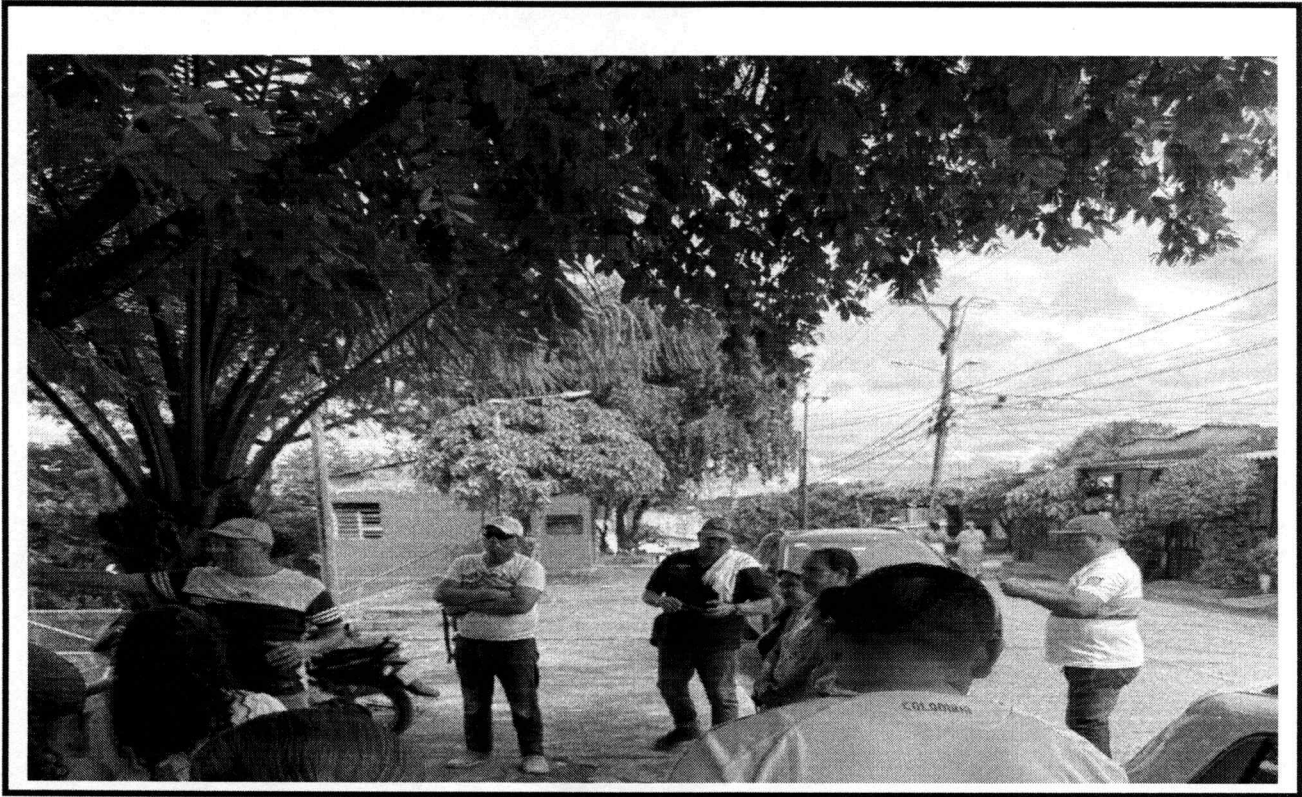

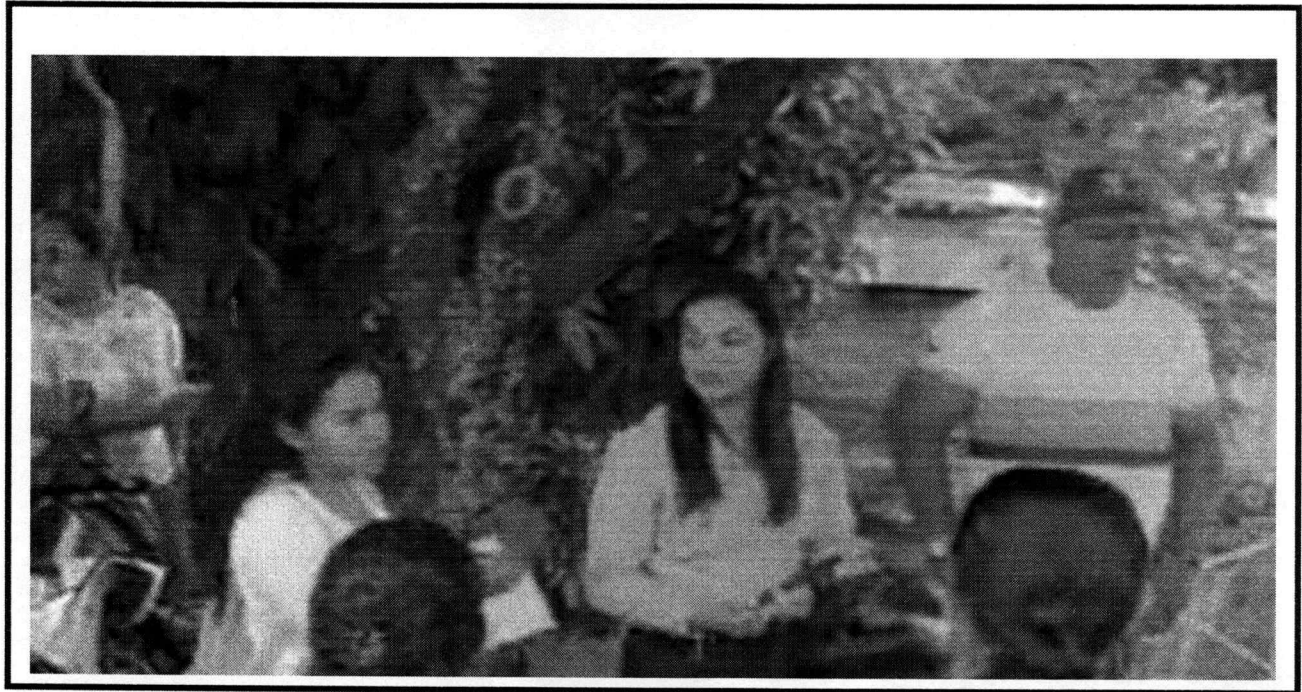2- DESCRIPCION ACTIVIDAD: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS 2-SANTA ISABEL- COMUNA 2 – CONTRATO DE OBRA N°243-2025
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



2- DESCRIPCION ACTIVIDAD: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS 2-SANTA ISABEL- COMUNA 2 – CONTRATO DE OBRA N°243-2025
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE REUNION	F.08.PO GD
		Versión: 0.5
		Fecha: 02.05.17

ACTA No.

Fecha: 06 de junio de 2025	Lugar: Polideportiva Santa Isabel
Proyecto / tema : Adecuación Polideportiva Santa Isabel	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 10:00 a.m.	Hora Terminación: 10:30 a.m.






ORDEN DEL DIA

- socialización de proyecto de adecuación de Polideportiva de Santa Isabel.

DESARROLLO

- se socializa con la comunidad las actividades a ejecutar: mantenimiento de cerramiento, cambio de tubería deteriorada, instalación de puertas de acceso, mantenimiento de arcos, instalación de tableros, resane de muro perimetral y pintura, resane de graderías con mortero en contrahuella; el contratista se compromete a trabajar las dilataciones de la huella de la gradería cortando, instalando corbón y aplicando producto.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martina Cassaleth	Lider	
Claudia Helena Valencia p.	Lider	
Barbara Elena Rood	Lider	
Edgar Lopez	Lider	
Joaquin Jarames	Lider	
ENRIQUE POLO CARO	VEGINO	
Guillermo Guadalupe	LIDER	
Alexander Pineda M.	Lider	
Armen G. Arundano	Conciliadora	
Ana Brum Yajaira	Lider	
Hauricio Mendez	Comunidad-Edil	
Oswaldo Pineda Lopez	MT. Rep. INVELO	
JESUS ZAPPA	ADQ. INFRA. EDUA	
Nazly Duran Heneses	Interventoria	
Yolanda Suarez	Contratista	
Guillermina Quintero	Comunidad	

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F 08 PO GD
	ACTA DE REUNION	Versión: 0.5
		Fecha: 02.05.17

ACTA No.

Fecha: 05 de Junio de 2025	Lugar: Simón Bolívar
Proyecto / tema: Adecuación Polideportiva.	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 4:00 pm	Hora Terminación:







ORDEN DEL DIA

- Socialización de proyecto de adecuación de polideportiva del Barrio San Simón Bolívar.


DESARROLLO

- Se informa a la comunidad las actividades a ejecutar en la polideportiva las cuales incluyen mantenimiento de cerramiento, pintura de cancha, demarcación, instalación de tableros y pintura de muros perimetrales.
- Se aclara el alcance de la intervención y que las graderías y pasamos externos NO se encuentran dentro de la ejecución.


ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ricardo Caceres Codeno	Presidente JAC	
Gonzalo Guzmán Dini	FISCAL	
Bernardo Contreras		
Joaquín Herrera		
Hipólito LUIS MESA		
Mano Díaz		
Johana Saura P.		
Jess Zappa	ATA Inderba	
Nazly Durán Heróles		Nazly Durán

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

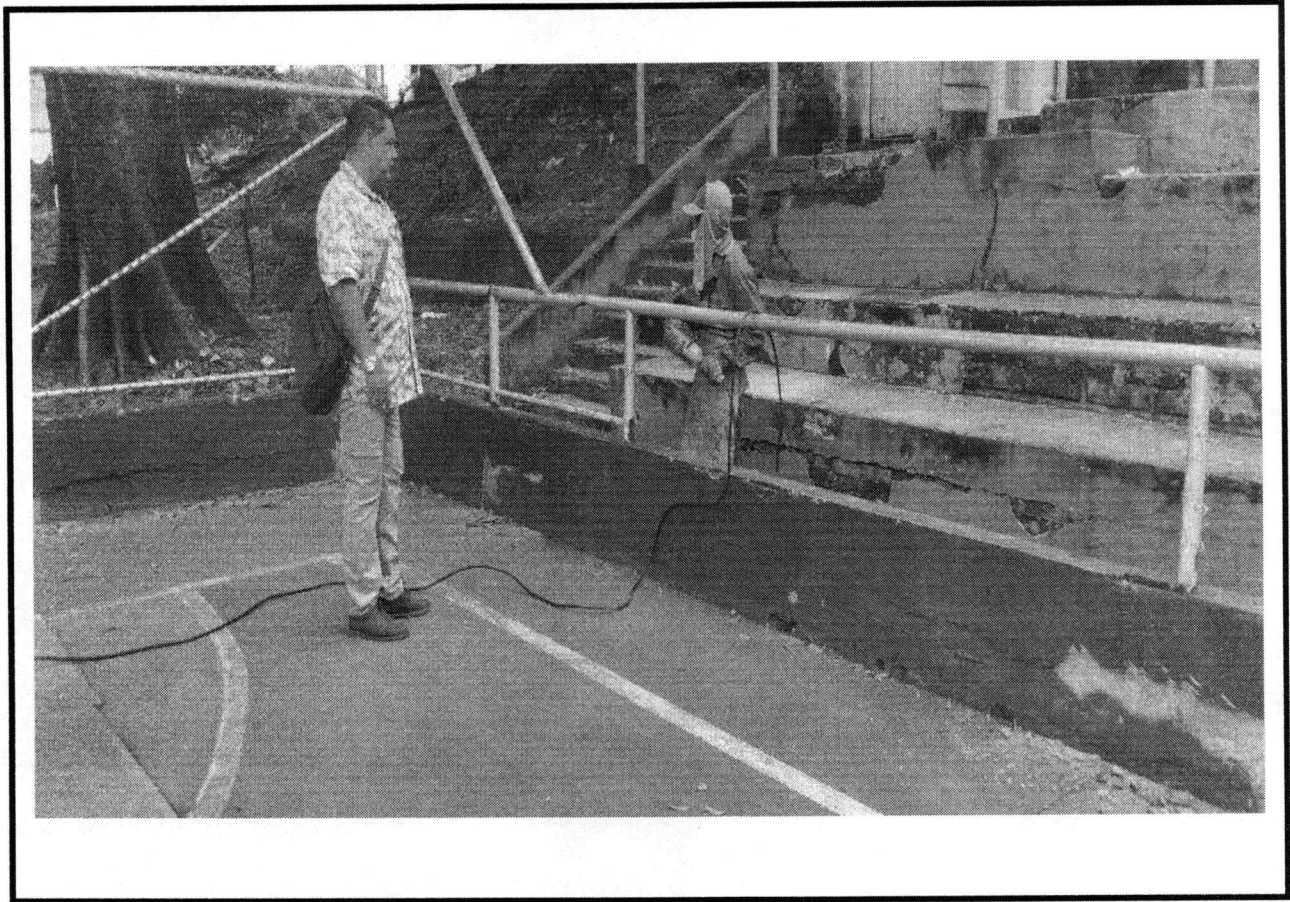


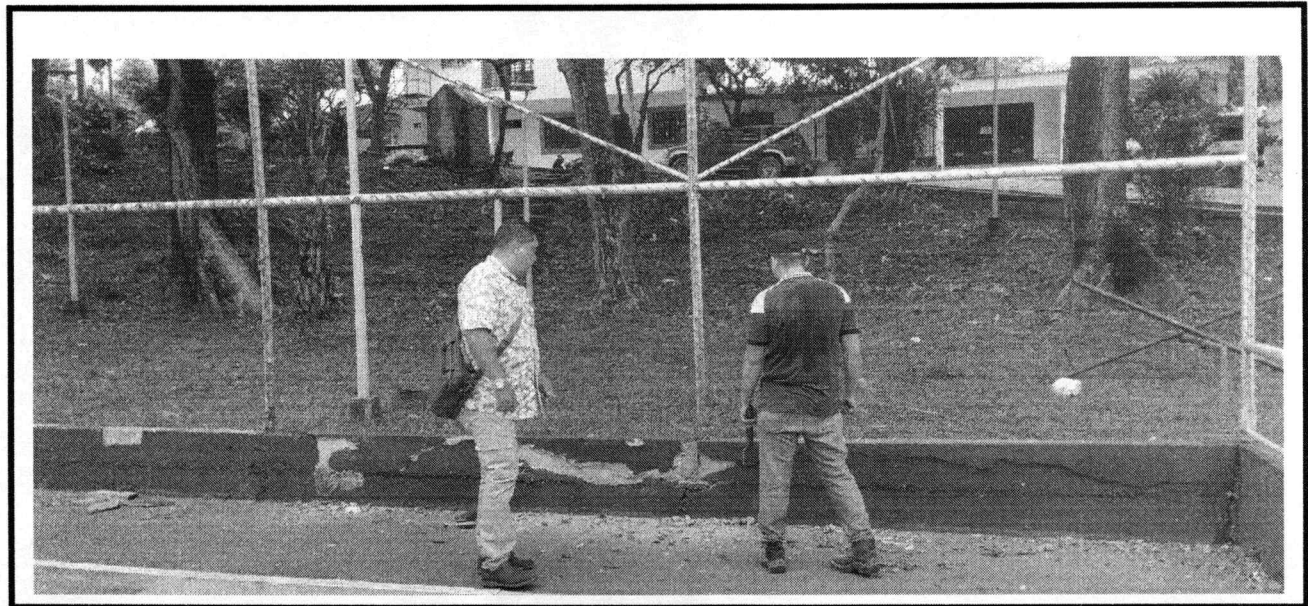3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 1-SANTA ISABEL- COMUNA 2
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025




3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 1-SANTA ISABEL- COMUNA 2
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

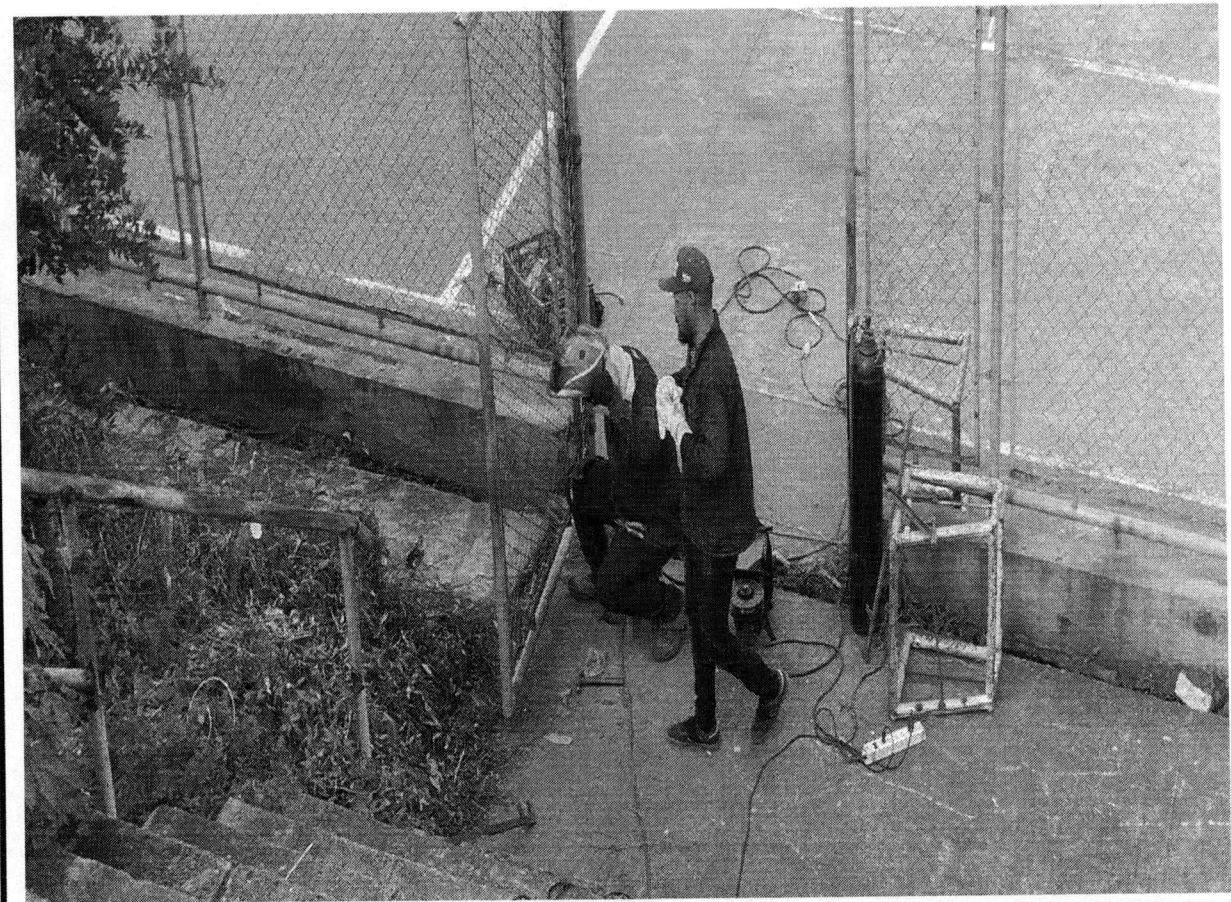


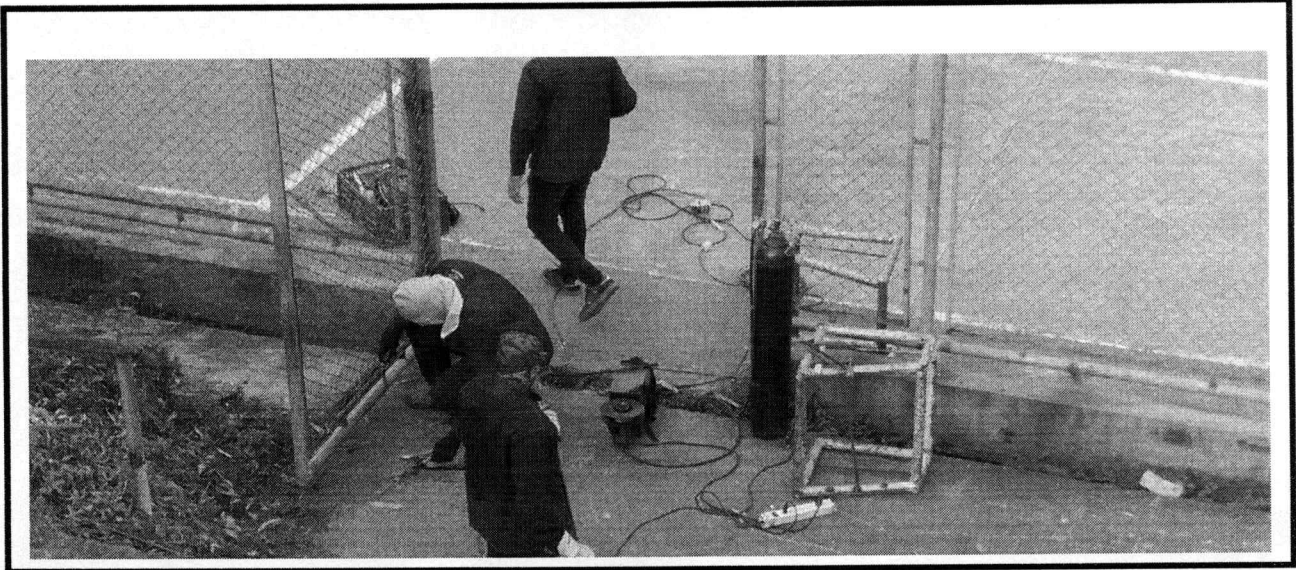3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 2- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 2- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA	F: 47.PO.GJC
		Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

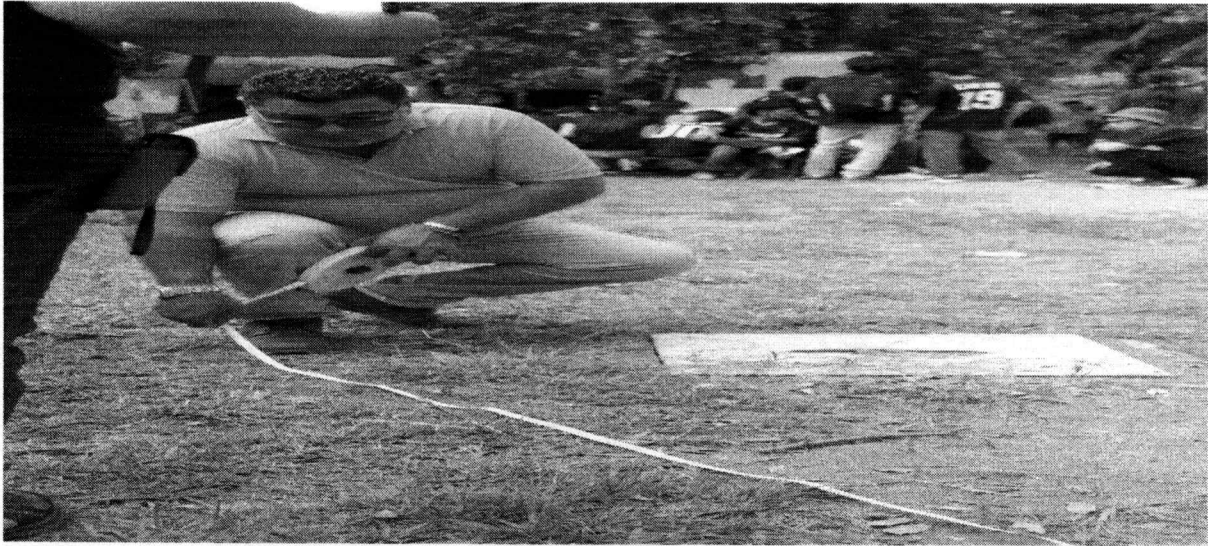

2- DESCRIPCION ACTIVIDAD: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EL DIA 11 DE JUNIO 2025 PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE VENIA REALIZANDO EL CONTRATISTA MIS INGENIERIA AL CONTRATO DE OBRA 0592-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0593-2024 ACOMPAÑADOS CON LA INTERVENTORIA Y EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



2-DESCRIPCION ACTIVIDAD: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EL DIA 11 DE JUNIO 2025 PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE VENIA REALIZANDO EL CONTRATISTA MIS INGENIERIA AL CONTRATO DE OBRA 0592-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0593-2024 ACOMPAÑADOS CON LA INTERVENTORIA Y EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025






 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F:08.PO.GD
	ACTA DE REUNION	Versión: 0.5
		Fecha: 02.05.17

ACTA No.


Fecha: 11/06/2025	Lugar: Inderba
Proyecto / tema : Reunión Temas varios	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 10:15 AM	Hora Terminación: 01:20 PM

ORDEN DEL DIA
1. Visita de Obra Contrato No. 0592-24 e Interventoría No. 0593-24
2. Verificación en la ejecución de cantidades de Obra del Acta Parcial No. 2 y avance general del Contrato


DESARROLLO
1. El día de hoy realizamos un recorrido por las instalaciones del Parque Recreacional tomando medidas y revisando todos los puntos relacionados en esta Segunda Acta parcial del Contrato 0592-204
2. Se verificaron medidas generales de todo el contrato ejecutado, revisando todos los ítems contratados que ya fueron ejecutados y también los que se encuentran en ejecución actualmente.
3. En el acta parcial dos se evidenciaron mayores cantidades a las ejecutadas por tal motivo se les solicita la corrección de las memorias para cobro.

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector Juan Sierra T.	LIDER INTER	
Cristhian Cortes Q	Ing Civil Infra	
Jesús R. ZAPPA M.	ARG APOYO	
David Ramirez Valdes	Aprobado Interventoria	
Daniel Andres Ardila	Apoio infra	
Daniela Rangel A	RL contrato 592	
Josson Villamizar	Director Educ	
William Cobos Mesa	CPS - Enderba	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 47.PO.GJC
	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	Versión: 0.1
		Fecha: 02.05.17

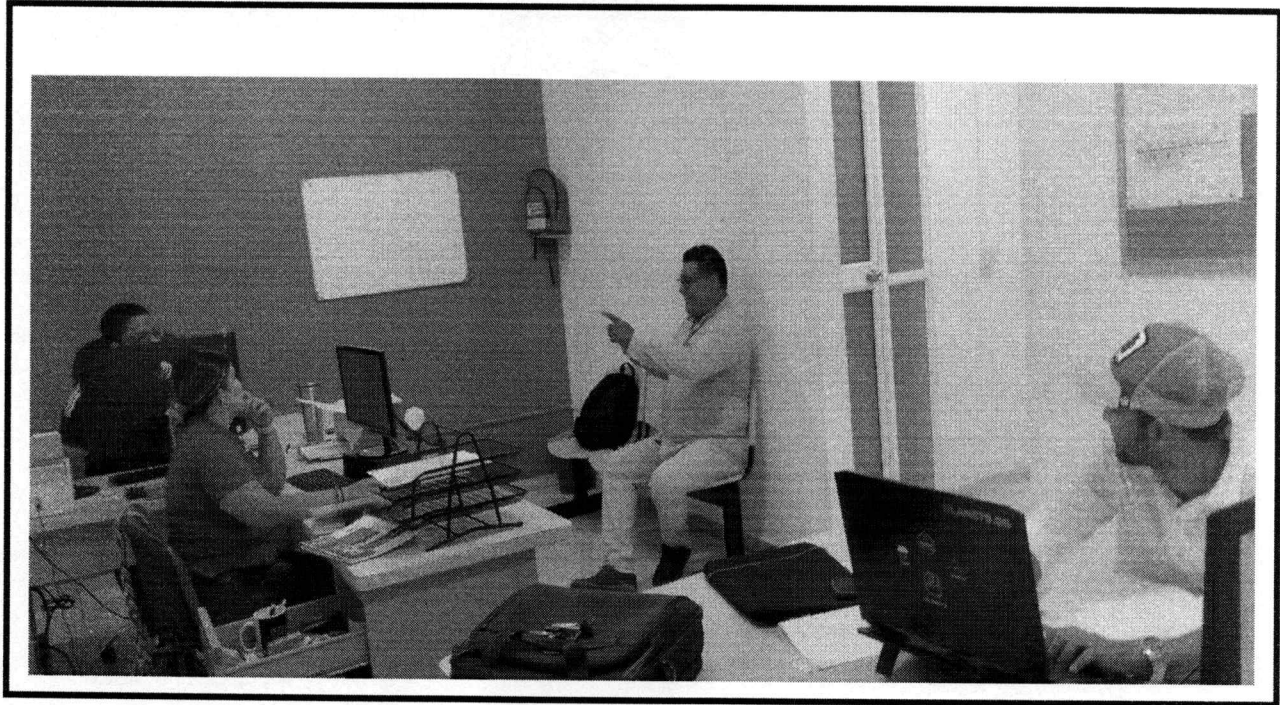

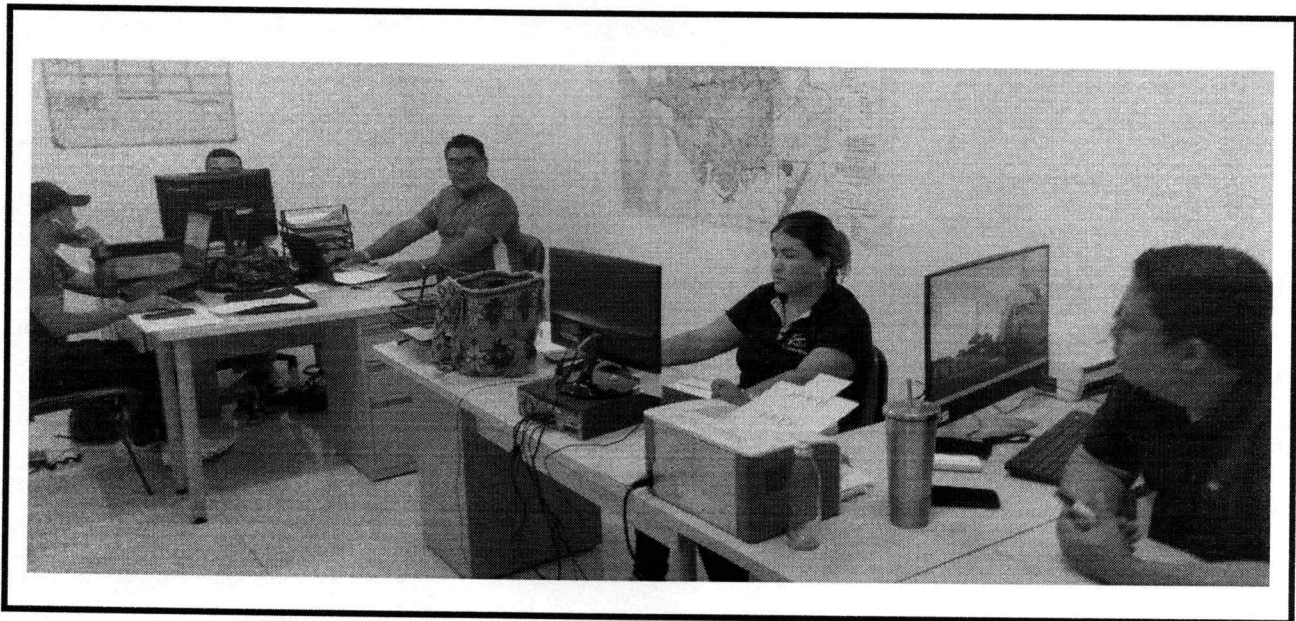3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 3 DE JUNIO 2025
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025



3- DESCRIPCION ACTIVIDAD: REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FECHA 126 DE JUNIO 2025
GRUPO/PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATISTA: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
FECHA O PERIODO : 1 de junio al 30 de junio del 2025

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA DE REUNION	F.O.B.P.O. C.O.
		Versión: 0.5
		Fecha: 02.05.17

ACTA No.

Fecha: 03/06/2025	Lugar: Inderba
Proyecto / tema: Reunión Temas varios	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 9:30 AM	Hora Terminación: 10:10 AM

ORDEN DEL DIA

- Revisión de actividades programadas - Asignación de Actividades
--

DESARROLLO

- Para el día 04 de junio queda programado el recorrido para hacer acta de entrega del contrato 590 y verificar las actividades terminadas. - Programación de actividades con el equipo de mantenimiento en los siguientes escenarios: BMX, piscinas, estadio de fútbol. - Solicitar a FUNTEL un diagnóstico de la bomba sumergible del cuarto de máquinas de piscinas - Visita técnica a las polideportivas para el inicio del contrato N. 259 y 243 del 2025, el arquitecto Jesús Zappa empezó la digitalización de las siguientes polideportivas: Libertad, Floresta, Santa Isabel y Simón Bolívar.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesús B. ZAPPA M.	Agg APOYO	
Victor J. SERRA J.	Lider INIRCA	
Yael Andrea Aguilera Cordero	Agg Infraestructura	
Cristian Cortes	Ing civil	
Osvaldo Pardo Sampa	Agg Infraestructura	
David Arslan	Agg Infraestructura	





 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F.08.PO.GD
	ACTA DE REUNION	Versión: 0.5
		Fecha: 02.05.17

ACTA No.

Fecha: 16/06/2025	Lugar: Inderba
Proyecto / tema : Reunión Temas varios	Dependencia: Infraestructura Deportiva
Hora Inicio: 10:15 AM	Hora Terminación: 01:20 PM


ORDEN DEL DIA
1. Revisión de actividades programadas 2. Programación de nuevas actividades

DESARROLLO
1. Seguimiento a los Contratos de Vigilancia y Aseo (Mantenimiento y Grama) – Responsables Oswaldo Pájaro, Cristhian Cortes y Hector Sierra. 2. Enviar correo a Veolia para apoyo de poda y rocería en los escenarios deportivos (Andrea). 3. Dentro de las carpetas de los contratos 2024- 2025 anexar documentos: - Acta parcial No.1 - Acta parcial No.2 - Acta modificatoria - Evidencia fotográfica 4. Inventario almacén programado para el día 17 de junio (Oswaldo pájaro). 5. Solicitar informe al ingeniero William Cobos de la vista realizada el jueves del contrato 592-24 6. Hacer seguimiento de todas las actas realizadas (Andrea). 7. Enviar correo a aguas de Barrancabermeja para visita técnica el día 17 de junio (Cristhian y Andrea). 8. Reunión programada en el concejo municipal el viernes 20 de junio a las 8 AM (Cristhian Cortes y Hector Sierra). 9. Visitas a polideportiva Olaya Herrera y Barrio Gaitán: nota de actividades y evidencia fotográfica (Daniel) 10. Enviar correo a iluminaciones Yariguíes solicitando la instalación de luminarias en la pista de patinaje del corregimiento el centro. (Andrea) 11. Enviar coreo a iluminaciones Yariguíes solicitando el cambio de postes de luz del barrio galán. (Andrea) 12. Enviar a dirección correos con los proyectos de gimnasios bio saludables, cotraeco y estadio de beisbol (Cristhian Y Hector Sierra)

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hector Juan Sierra T.	LIDER INFRA	
Daniel Ardila	Apoyo Infra.	
Oswaldo Pajaro Amayo	Apoyo Infra	
JESUS ZAPPA M.	ARG APOYO	
Yuley Arletta Aguilera Corderas	Apoyo INFRA	Yuley Arletta C.
Cristhian Camilo Cortes Q	Ing Civil Infu	

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CUENTA DE COBRO	F:07.PO.GF
		Versión: 0.6
		Fecha: 30.04.2025

INDERBA NIT 829.000.477-7 DEBE A: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO CC. 78.744.093 de Montería	
LA SUMA DE:	\$ 4.000.000 ✓
Contrato No:	093-2025 ✓
Por concepto de:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Correspondiente al periodo:	Del 01 de junio al 30 de junio de 2025 ✓
Cordialmente,  Firma contratista	
NOTA 1: Retención en la fuente a título de renta. Bajo la gravedad del juramento solicito se aplique de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional. NOTA2: Adjunto Planilla de pago de seguridad social No. 7972082907 bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la totalidad de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial, en los términos establecidos en el artículo 89 de la ley 2277 de 2022. NOTA3: Retención en la fuente a título de ICA. Bajo la gravedad del juramento manifiesto: Que soy una persona natural que SI (X) o NO () cumplo con la siguiente condición: 1) Ejercer una profesión liberal de acuerdo al artículo 25 del decreto nacional 3050 de 1997 y que por el año gravable anterior 2024 o en el transcurso del año gravable, mis ingresos <u>son inferiores a</u> Mil Setecientos Cincuenta UVT (1.750) o \$87.148.250, lo anterior para dar aplicación al literal 7 del artículo 8 del acuerdo municipal 020 de 2024.	
Cuenta Ahorros No. 0550146200078641 Banco : DAVIVIENDA	
Teléfono: 324-6825007	
Se expide en Barrancabermeja, a los 04 JUL. 2025	

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 19.12.22

ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 04

CONTRATO No. 093 - 2025

CONTRATANTE	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA - INDERBA
NIT	829000477-7
CONTRATISTA	JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
C.C O NIT	78.744.093
DOMICILIO	CALLE 46 No. 16ª-38 B. INSCREDIAL
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	DIECISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 16.000.000)
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
ANTICIPO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00150
FECHA ACTA INICIO	08 de marzo de 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 03

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron el Señor **BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ**, en calidad de SUPERVISOR del presente contrato y el contratista **JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO** para suscribir la presente acta e Informe de Supervisión Parcial, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Del 08 de marzo al 31 de marzo de 2025	\$ 3.066.667
02	Del 01 de abril al 30 de abril de 2025	\$ 4.000.000
03	Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025	\$ 4.000.000
04	Del 01 de junio al 30 de junio de 2025	\$ 4.000.000
	Saldo por Pagar	\$ 933.333
	TOTAL CONTRATO	\$ 16.000.000

Valor de la presente acta: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000).



2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA ACTA E INFORME DE SUPERVISION PARCIAL	F: 31.PO.GJC
		Versión: 0.9
		Fecha: 19.12.22

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

Fecha de pago:	13/06/2025
Periodo cotizado:	Mayo 2025
Planilla No.	7972082907
IBC	\$ 1.600.000
Valor Total pago	\$ 495.000

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar y digitalizar levantamientos arquitectónicos de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Barrancabermeja	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE LAS POLIDEPORTIVAS 1- OLAYA HERRERA-COMUNA 2 2- LA LIBERTAD – COMUNA 2 3- SANTA ISABEL-COMUNA 3 4- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 5- LA FLORESTA – COMUNA 3	REGISTRO FOTOGRÁFICO, PLANOS ARQUITECTÓNICOS

2	Realizar apoyo técnico en la proyección de los presupuestos y cantidades de obra, para soportar la Intervención, Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos del Distrito de Barrancabermeja	INFORME DE CANTIDADES DE OBRA. PARA LAS REPARACIONES MENORES DE LAS POLIDEPORTIVAS: 1-OLAYA HERRERA-COMUNA 2 2- LA LIBERTAD –COMUNA 2 3-SANTA ISABEL- COMUNA 2 4- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 5-LA FLORESTA –COMUNA 3	
		REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL DIA 5 Y 6 DE JUNIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE INICIOS DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 CON LAS COMUNIDADES, DE LAS POLIDEPORTIVAS 1- LA LIBERTAD – COMUNA FECHA 6 DE JUNIO 2025 2- SANTA ISABEL- COMUNA 2 FECHA 6 DE JUNIO 2025 3- SIMÓN BOLÍVAR- COMUNA 5 - FECHA 5 DE JUNIO 2025	INFORMES DE CANTIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS POLIDEPORTIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, ACTA DE REUNION
		2-DESCRIPCION ACTIVIDAD: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA EL DIA 11 DE JUNIO 2025 PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE VENIA REALIZANDO EL CONTRATISTA MIS INGENIERIA AL CONTRATO DE OBRA 0592-2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA 0593-2024 ACOMPAÑADOS CON LA INTERVENTORIA Y EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE REUNION





3	Realizar apoyo en la planeacion, ejecución y seguimiento del mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Barrancabermeja	VISITAS DE OBRA PARA INSPECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO N° 243-2025 EL DIA 16 DE JUNIO 1- SANTA ISABEL-COMUNA 2 2- SIMÓN BOLÍVAR-COMUNA 5 REUNIONES SEMANALES DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 3 – 16 DEL MES DE JUNIO DONDE SE REVISAN LAS PROGRAMACIONES DEL MES	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y COPIA DE ACTAS DE REUNIÓN
4	Realizar las demás actividades relacionadas con su objeto contractual y asignadas por el supervisor	N/A	N/A



Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Barrancabermeja, 04 JUL. 2025


BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ
Supervisor
Profesional Universitario Grado 03


JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO
78.744.093 de Montería
El contratista

Actividad	Responsable	Firma
Reviso Aspectos técnicos	Hector Sierra T.	
Revisó aspectos administrativos y financieros	Claudia P. Ospino	
Revisó aspectos jurídicos	N/A	—

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CUENTA DE COBRO	F:07.PO.GF
		Versión: 0.6
		Fecha: 30.04.2025

INDERBA NIT 829.000.477-7 DEBE A: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO CC. 78.744.093 de Montería	
LA SUMA DE:	\$ 4.000.000
Contrato No:	093-2025
Por concepto de:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Correspondiente al periodo:	Del 01 de junio al 30 de junio de 2025
Cordialmente,  Firma contratista	
NOTA 1: Retención en la fuente a título de renta. Bajo la gravedad del juramento solicito se aplique de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional. NOTA2: Adjunto Planilla de pago de seguridad social No. 7972082907 bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la totalidad de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial, en los términos establecidos en el artículo 89 de la ley 2277 de 2022. NOTA3: Retención en la fuente a título de ICA. Bajo la gravedad del juramento manifiesto: Que soy una persona natural que SI (X) o NO () cumplo con la siguiente condición: 1) Ejercer una profesión liberal de acuerdo al artículo 25 del decreto nacional 3050 de 1997 y que por el año gravable anterior 2024 o en el transcurso del año gravable, mis ingresos son inferiores a Mil Setecientos Cincuenta UVT (1.750) o \$87.148.250, lo anterior para dar aplicación al literal 7 del artículo 8 del acuerdo municipal 020 de 2024.	
Cuenta Ahorros No. 0550146200078641 Banco : DAVIVIENDA	
Teléfono: 324-6825007	
Se expide en Barrancabermeja, a los 04 JUL. 2025	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA: MONTERIA CLL 11AN13-08 URB SA MARIA2 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JESUS RAFAEL ZAPPA MARTELO CORDOBA 7900000 INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	78744093	NÚMERO PLANILLA: 7972082907 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES: mayo AÑO: 2025 2025/06/13	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MORA: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	INDEPENDIENTES: 2025 1550747130

TOTAL APORTES A PENSIÓN											
APORTES VOLUNTARIOS			FSP			MORA			TOTALES		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES
231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000
SUBTOTALES:											\$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD											
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD			LICENCIA MATERNIDAD			SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:											\$ 200.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN			TOTALES		
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000	\$ 39.000	\$ 0
SUBTOTALES:											\$ 39.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES											
DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SURTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CONTRATANTE	REFERENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TIDE
1	CC 78744093	ZAPPA MARTELO JESUS RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.600.000			NO			
SUBTOTALES:											

TOTAL PAGADO: \$ 495.000
