



INFORME MENSUAL No. 3

07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO No. 497 DE 2024

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA LIMPIEZA Y
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS
AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**

PERIODO. 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2025

SUPERVISOR

WLADIMIR OROZCO LOZANO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

JUNIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2.1 LOCALIZACIÓN.....	4
2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR.....	9
3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	17
3.1 INFORMACIÓN GENERAL	17
3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO	19
3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	20
.....	20
4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	21
4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS	21
5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	30
5.1 INFORMACIÓN GENERAL	30
5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA	31
5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA	32
6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.....	33
6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	42
6.2 SEGUIMIENTO SST.....	45
6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL.....	47
6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL	49
6.5 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA	55
7 CONCLUSIONES.....	56
8 ANEXOS	58

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 3.1 Información General Contrato de Obra.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 3.2 Presupuesto de obra.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 5.1 Información General Contrato de Interventoría.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabla 5.2 Presupuesto Interventoría.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabla 5.3 Personal de la Interventoría.....</i>	<i>34</i>

INTRODUCCIÓN

La protección y gestión sostenible del recurso hídrico es hoy una de las mayores prioridades a nivel mundial, debido a la creciente escasez del agua, su contaminación y los efectos adversos generados por el cambio climático. En Colombia, y particularmente en el Departamento del Atlántico, estas problemáticas se han intensificado en los últimos años, evidenciando la urgencia de tomar medidas concretas para garantizar la disponibilidad del agua y preservar los ecosistemas asociados. En este contexto, el cuidado, ordenamiento y recuperación de cuerpos de agua como lagunas, embalses, arroyos y caños, se ha convertido en una labor fundamental liderada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Dentro del marco del Plan de Acción 2024–2027 “Por un Ambiente Sin Fronteras”, la CRA ha priorizado un conjunto de intervenciones estratégicas orientadas a la recuperación hídrica del Embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco, dos ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades de municipios como Luruaco, Manatí y Repelón. Estas acciones buscan mejorar la conectividad y el flujo hidrodinámico entre los cuerpos de agua mediante la limpieza y recuperación ambiental de arroyos y caños afluentes, como los arroyos Limón y Negro, así como los canales que conectan las compuertas de El Porvenir y Villa Rosa con el embalse El Guájaro.

Estas obras no solo tienen el objetivo de garantizar el almacenamiento y circulación del recurso hídrico, sino también de reducir significativamente los riesgos de inundaciones durante la temporada invernal y mitigar los efectos de las sequías, protegiendo la flora, fauna y comunidades aledañas. En este sentido, se adelantó el proceso de selección por licitación pública No. LP-2024-0005, mediante el cual fue adjudicado al Consorcio Alianza Ambiental el contrato de obra para la ejecución del proyecto denominado: “Realizar la limpieza y recuperación ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse El Guájaro en el Departamento del Atlántico”.

De manera paralela, a través del concurso de méritos abiertos No. CM-2024-008, se seleccionó al Consorcio Luruaco como interventor del proyecto, responsable de realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de las obras, velando por el cumplimiento de los objetivos, plazos, estándares de calidad y normativas ambientales vigentes.

Este documento presenta el Informe de Interventoría No. 3, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, en el cual se documentan los principales avances físicos y técnicos alcanzados, así como observaciones, hallazgos y demás aspectos relevantes relacionados con el desarrollo del contrato de obra.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Departamento del Atlántico, específicamente en los municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en donde se ejecutan intervenciones sobre cuerpos de agua que conforman la red hídrica que conducen tanto a la Laguna de Luruaco, como al Embalse El Guájaro. Estas intervenciones se orientan a mejorar la capacidad de conectividad y funcionalidad hidrodinámica de los caños y arroyos que confluyen en dichos cuerpos de agua.

De manera particular, se contempla la intervención del Arroyo Negro y el Arroyo Limón, ambos ubicados en el municipio de Luruaco, los cuales actúan como tributarios naturales de la Laguna de Luruaco durante los periodos de precipitación, siendo fundamentales para el equilibrio hídrico de dicho sistema lagunar.

Adicionalmente, se intervendrán los caños El Porvenir y Villa Rosa, localizados en jurisdicciones de los corregimientos de El Porvenir (Municipio de Manatí) y Villa Rosa (Municipio de Repelón), respectivamente. Estos canales cumplen una función clave en la regulación del flujo de aguas hacia el Embalse El Guájaro, por medio de estructuras hidráulicas como compuertas, cuya operación es esencial para el control de caudales, la prevención de inundaciones y la preservación ambiental del ecosistema hídrico regional.

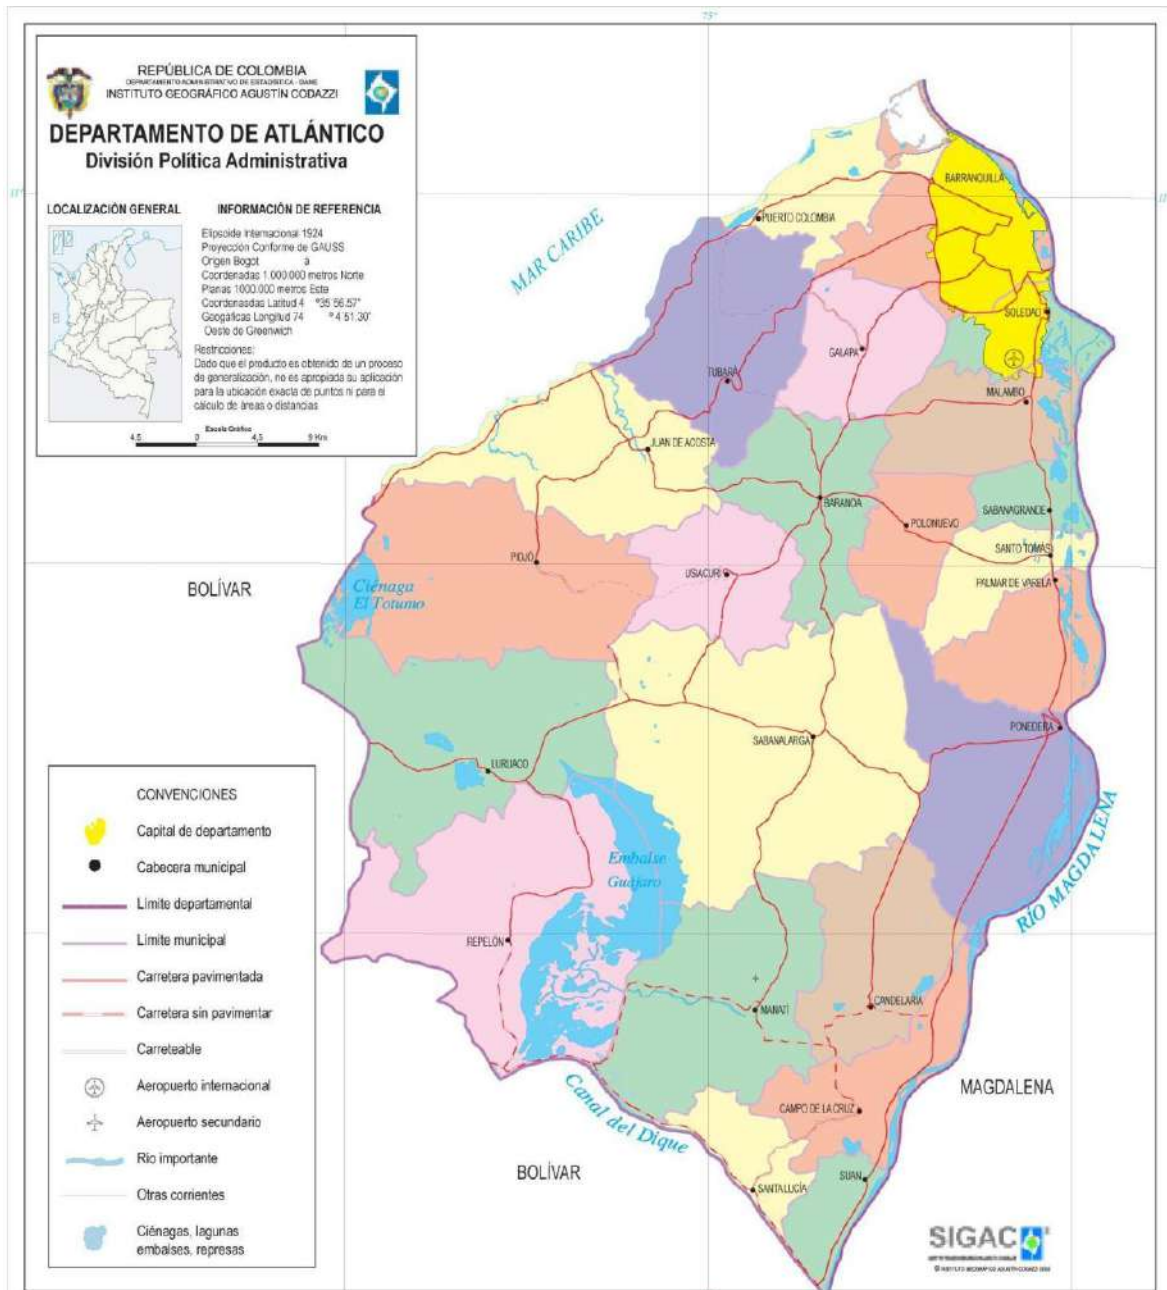


Figura 1. Localización del proyecto, Municipios de Luruaco, Manatí y Repelón, en el departamento del Atlántico.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

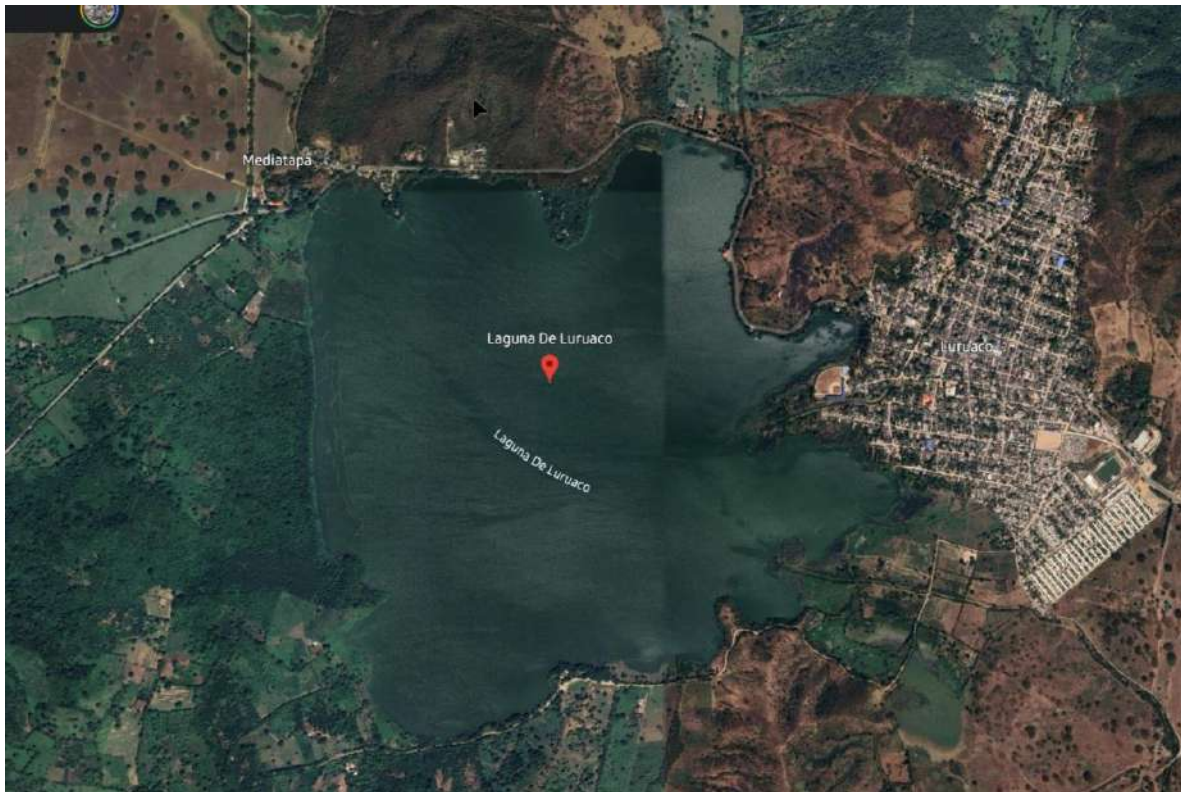


Figura 2. Localización Laguna de Luruaco. Fuente Google Earth



Figura 3. Localización Arroyo Limón, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.

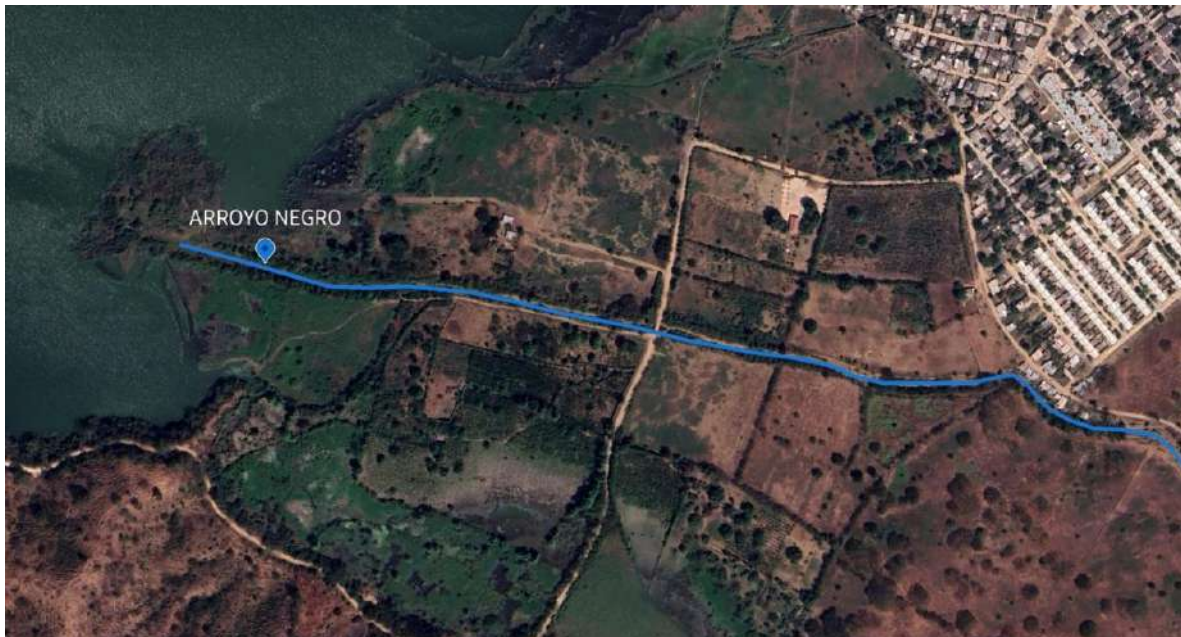


Figura 4. Localización Arroyo Negro, Municipio de Luruaco. Fuente: Google Earth.

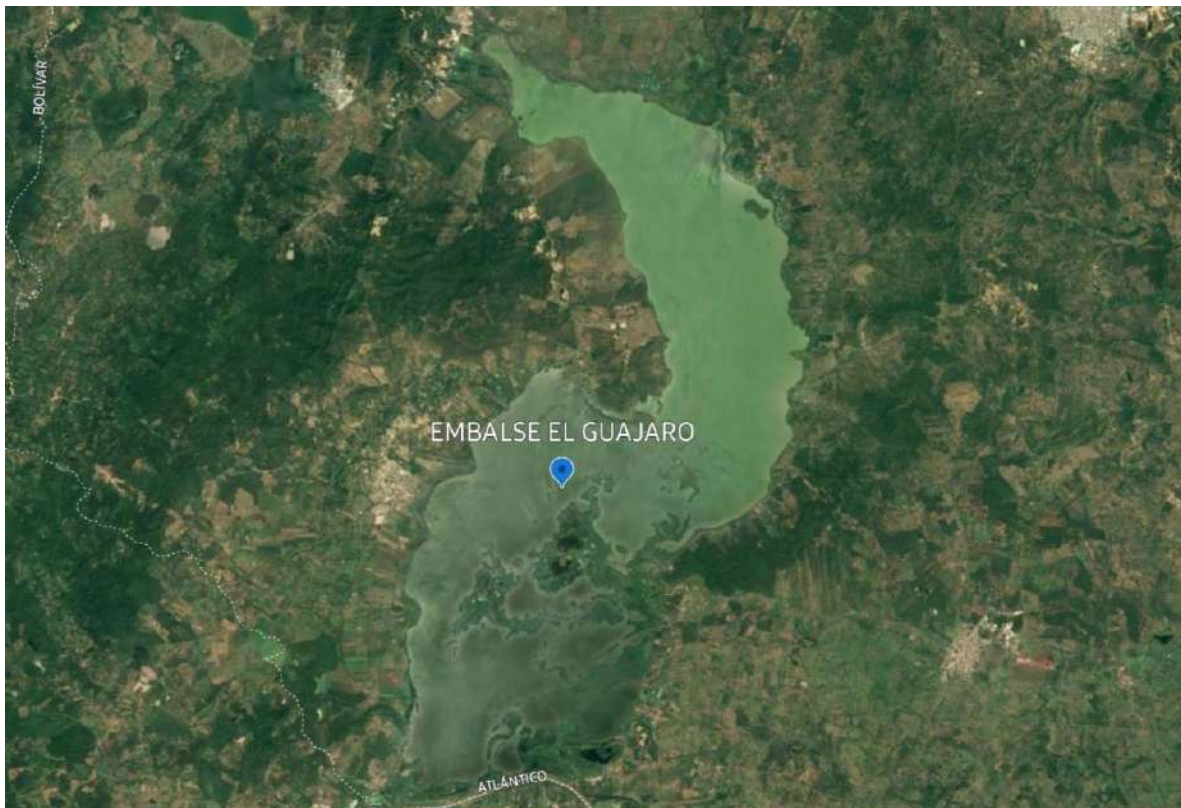


Figura 5. Localización Embalse el Guájaró. Fuente: Google Earth.



Figura 6. Localización Caño de Villa Rosa, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.



Figura 7. Localización Caño de El Porvenir, Embalse el Guájaro, Fuente: Google Earth.

2.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR

2.2.1. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (INCLUYE: TOPÓGRAFO, CADENEROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN)

Este ítem, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localización, es importante que la topografía, se rija por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto, a través de puntos fijos y BM existentes en donde se realizó el levantamiento inicial. El trazado se deberá ejecutar siguiendo estrictamente los planos, en donde se encuentra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. También se deberá tener en cuenta dentro de este ítem la demarcación de los puntos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será metros cuadrados (m^2) de localización, trazado y replanteo de comisión topográfica, cumpliendo con lo establecido en el presente documento.

2.2.2. LIMPIEZA PARA RECUPERACION AMBIENTAL

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de excavar y reconfigurar los taludes de los caños y/o arroyos afluentes al Embalse El Guájaro (Caño de Villa Rosa y Caño de las Compuertas El Porvenir) y la Laguna de Luruaco (Arroyo Negro y Arroyo Limón). Las secciones de excavación deben realizarse según lo indicado en las secciones transversales tipo que se presentan a continuación:

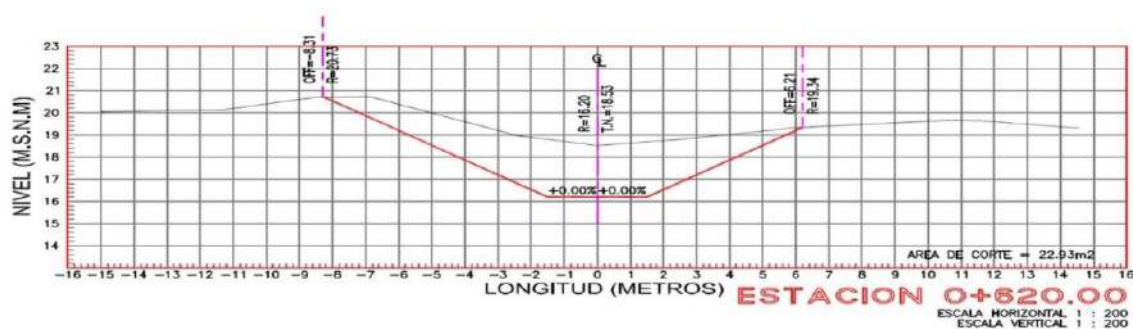


Figura 8. Sección transversal tipo

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación. Se deben garantizar los niveles y secciones de fondos de los arroyos y/o caños y anchos propuestos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico (m³), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.3. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Esta actividad corresponde a la disposición final del material retirado por limpieza para recuperación ambiental del caño y/o arroyo. El caso del hidrosistema El Guájaro y la Laguna de Luruaco presenta particularidades que permitirán al contratista, disponer el material producto de la limpieza en zonas que han sido intervenidas por extracción de materiales a fin de realizar la recuperación geomorfológica del terreno (Canteras) previa autorización por parte de la entidad ambiental en jurisdicción, igualmente el contratista podrá disponer el material en rellenos sanitarios certificados o escombreras autorizadas por la entidad ambiental en jurisdicción. Dicha disposición se llevará a cabo al momento de cumplir con los requisitos ambientales y resultados de análisis de laboratorio acreditados por el IDEAM del material producto de la limpieza para la recuperación ambiental.

De igual forma, dentro del desarrollo del contrato, para optimizar las actividades de limpieza, retiro y disposición, y cumplir cabalmente con el objeto del contrato, el Contratista de Obra podrá analizar otras alternativas de disposición del material. Para este fin, a su cuenta y riego, deberá realizar los estudios técnicos y ambientales y trámites pertinentes a través de la Autoridad Ambiental, para lograr las modificaciones y/o ajustes de los permisos y/o Planes de Manejo correspondientes, cumpliendo con toda la normatividad vigente.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico por Kilometro (m³-Km), incluye todo lo necesario para el retiro y disposición final de los residuos producto de la limpieza para recuperación ambiental de los caños y/o arroyos sujetos de intervención en el proyecto.

2.2.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Toma de muestras, almacenamiento, procesamiento, embalaje y cadena de custodia para los análisis de calidad de agua del embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco.

La toma de las muestras de agua se deberá realizar de la siguiente manera:

- Preparación del muestreo.
- Preparación de los envases para la toma de muestra.
- Preparación de las hojas de cadena de custodia.
- Coordinación para el transporte de las muestras.
- Preparación del equipo de muestreo (guantes, GPS, cámara fotográfica, coolers, etc.)
- Preparación del equipo de análisis In Situ.
- Preparación de los equipos de seguridad (flotadores, gafas).
- Organización de la logística para la campaña de muestreo (transporte terrestre y lancha).

El procedimiento para la toma de muestras se llevará a cabo con el llenado del recipiente de muestreo con una porción de agua del cuerpo hídrico muestreado de entre 250 y 500 centímetros cúbicos. La toma de muestras se realizará sumergiendo el envase de forma contraria al flujo, evitando la inclusión de aire por flujo turbulento. Se hará el registro de localización del punto de muestreo real con GPS y se caracterizará el sitio con fotografías. Se procederá a realizar la identificación de la muestra. Los recipientes para muestras microbiológicas se llenarán hasta $\frac{3}{4}$ (tres cuartas partes) de su capacidad para permitir la aireación y asegurar la supervivencia de los microorganismos a ser cuantificados.

Después de que las muestras han sido envasadas y preservadas (si lo requieren) se sellarán las botellas, secando la parte superior de la botella con papel absorbente o un trapo limpio y se pondrán varias vueltas de cinta de enmascarar (masking tape) alrededor de la tapa y la boca del recipiente, para asegurar que la tapa no se afloje.

Las muestras serán preservadas en colores a -4° C y con los químicos adecuados, si los análisis lo ameritan. Se procederá a tapar herméticamente cada recipiente y rotularlo con la identificación de la muestra, fecha de muestreo, persona responsable, parámetros a analizar. Se deberá evitar el uso de hielo seco o aditivos al hielo para evitar que las muestras se congelen, lo que puede provocar que los recipientes se abran o se rompan y en determinados casos se puedan alterar las características de la muestra.

Para el transporte de las muestras se deberá verificar que el recipiente de almacenamiento contenga suficiente hielo para asegurar que la refrigeración se mantendrá hasta la llegada al laboratorio. Se deberá asegurar que las tapas de los recipientes estén bien cerradas, de tal manera que durante el viaje no se destapen. La persona responsable del muestreo debe mantener la custodia permanente de las muestras hasta que sean entregadas al laboratorio. En las instalaciones del laboratorio (el cual debe encontrarse debidamente certificado por el IDEAM) el responsable del muestreo debe entregarlas al responsable de recibirlas, junto con una copia de los registros de la cadena de custodia.

2.2.4.1. Análisis de Calidad del Agua

Para la toma de muestras de los parámetro fisicoquímicos y microbiológicos, para realizar el análisis de calidad del agua y determinar el estado del cuerpo de agua, se determinaron tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (Ver Figura 9 y 10 y precisados con coordenadas en la Tabla 2.2 y 2.3), donde se tomarán los parámetros fisicoquímicos por cada punto, se realizarán los muestreos en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada mes, una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

En cada muestreo se analizarán los parámetros fisicoquímicos descritos en la Tabla 1, que son necesarios para establecer los índices de calidad ICOMI, ICOMO, ICOSUS e ICOTRO:

Tabla 2.1. Parámetros Fisicoquímicos.

PARÁ METROS	
Temperatura	Sólidos totales
Salinidad	Sólidos suspendidos
Oxígeno disuelto	Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)
pH	Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Turbidez	Nitratos
Clorofila	Nitrógeno Total
Grasas y aceites	Alcalinidad
Ortofosfatos	Tensoactivos (SAAM)
Fósforo	Coliformes termotolerantes
Dureza	Coliformes totales



Figura 9. Ubicación Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

Tabla 2.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Tabla 2.3. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájar.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O



Figura 10. Ubicación Puntos de Muestreo Embalse El Guájaró.

2.2.5. ANÁLISIS DE PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS (FITOPLANCTON, ZOOPLANCTON, PERIFITON, MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS A MACRÓFITAS, ICTIOFAUNA (POR ADN METABARCODING)).

2.2.5.1. Fitoplancton y Zooplancton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del fitoplancton y zooplancton en cada punto de muestreo se deberán tomar muestras de agua de la zona fótica utilizando una botella de Van Dorn de 2,2 Lt. Las muestras se deberán depositar en frascos plásticos de 250 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para el análisis cualitativo y cuantitativo (Rice et al., 2017). Si la muestra contiene una elevada densidad y/o materia orgánica es conveniente diluir la muestra con agua del sitio de muestreo. Las muestras conservadas con Lugol/Etanol se deberán conservar protegidas de la luz y en un lugar fresco (<15°C). Para determinaciones cuantitativas, se tomará un mililitro (1ml) de la muestra, el cual será depositado en una cámara de conteo Sedgwick-Rafter que limita el área y volumen, y permite calcular las densidades poblacionales mediante cuantificación en bandas, después de un periodo de asentamiento (Rice et al., 2017).

2.2.5.2. Perifiton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del Perifiton las muestras deberán ser tomadas dependiendo de la disponibilidad de los sustratos naturales (Roca, Tronco, Macrófitas, Lodo) que se puedan encontrar en los cuerpos de agua de estudio. Estas muestras serán tomadas mediante un raspado con un cuadrante de área determinada (9 x 9 cm) en las zonas litorales del cuerpo de agua. Se deberán tomar muestras de cada sustrato posible y se depositarán en frascos plásticos de 100 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para su posterior análisis cualitativo y cuantitativo.

2.2.5.3. Macroinvertebrados bentónicos

En los cuerpos lénticos es común tomar muestras de bentos, mediante la utilización de un equipo adecuado (tomador de muestras tipo draga) que permita llegar hasta el fondo del cuerpo de agua tomando la muestra de material béntico. El sedimento se podrá tamizar directamente en campo, con un tamiz de 300 µm para disminuir la materia orgánica o sedimento dentro de la muestra o tamizar en el laboratorio certificado por el IDEAM al momento de procesar la muestra. El área para muestrear para que sea representativa deberá ser de

0.1m². El material se deberá envasar en frascos plásticos de 500 ml o 1L de boca ancha o en bolsas plásticas de cierre hermético, se narcotizarán y se fijará con abundante alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante y se debe rotular cada una de las muestras colectadas (Rice et al., 2017).

2.2.5.4. Macroinvertebrados asociados a Macrófitas

De acuerdo con la presencia de macrófitas en el cuerpo de agua en estudio se deberá realizar un transecto sobre el parche de las macrófitas de dimensiones conocidas (de ser posible mínimo 10 metros) y se deberá llevar a cabo un barrido con la red tipo D por debajo de las macrófitas, colectando los macroinvertebrados que se encuentren presentes en las raíces de las mismas. De no ser posible pasar la red tipo D por debajo de las macrófitas se puede sacar la planta del agua y sacudirla sobre a red D o Surber y de esta manera recuperar los macroinvertebrados que se encuentren asociados. Si no es posible demarcar transectos por la distribución de las macrófitas, se podrán demarcar áreas definidas con ayuda de un cuadrante o teniendo en cuenta el área de la red. Para preservar las muestras se deberá agregar alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante (APHA, 2017).

2.2.5.5. Ictiofauna

La caracterización de la ictiofauna se realizará mediante la utilización del enfoque de metabarcodin que permite documentar y/o caracterizar la diversidad de especies en el ecosistema y puede tener una mejor cobertura para identificar taxones raros dentro del ecosistema (Pavan-Kumar et al., 2015).

Todos los análisis de parámetros hidrobiológicos descritos se realizarán en tres (3) puntos de muestreo dentro del embalse El Guájaro y tres (3) puntos de muestreo dentro la Laguna de Luruaco (correspondientes a los establecidos en las Figuras 1 y 2 y precisados con coordenadas en la Tabla 2 y 3), donde se realizarán los muestreos por cada punto (en el embalse El Guájaro y la Laguna de Luruaco) previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de los parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada dos meses (de manera bimensual), una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 3.1 Información General Contrato de Obra.

CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		
PARTICIPANTES DEL CONSORCIO:	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA D&D S.A.S. - 85%		
	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. - 15 %		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MARIA VECINO VILLARREAL C.C. No. 72.162.008 de Barranquilla		
CONTRATO No.	492 de 2024		
OBJETO:	“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.		
VALOR TOTAL:	\$ 6,198,582,045.25		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES		
FECHA DE INICIO:	7 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 DE NOVIEMBRE DE 2025		
GARANTÍAS			
El Contratista CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 16331056 con la aseguradora SURA., y la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por lesiones, muerte y/o daños materiales a terceros derivada de cumplimiento No. 14071631 con la aseguradora SURA. A, continuación, se relacionan los valores asegurados del contrato No. 492 de 2024.			
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato	\$619.858.204,53	06/12/2024	06/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$309.929.102,26	06/12/2024	06/08/2028
Estabilidad de la obra	\$1.239.716.409,05	06/08/2025	06/08/2026
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	\$520,000,000.00	06/12/2024	06/08/2025

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0492 de 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2024 entre el Supervisor de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto de “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

3.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el presupuesto general para el desarrollo de las actividades que comprende el proyecto:

Tabla 3.2 Presupuesto de obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	Vr. TOTAL
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON				
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	\$ 3,790.00	\$ 58,820,800.00
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	7,069.95	\$ 20,780.00	\$ 146,913,561.00
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	\$ 1,300.00	\$ 143,378,586.00
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO				
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	\$ 3,790.00	\$ 72,768,000.00
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	17,672.26	\$ 20,780.00	\$ 367,229,562.80
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	\$ 1,300.00	\$ 388,259,552.20
3	CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA				
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	\$ 3,790.00	\$ 81,257,600.00
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	14,070.64	\$ 20,780.00	\$ 292,387,899.20
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	\$ 1,300.00	\$ 546,925,776.80
4	CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR				
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	\$ 3,790.00	\$ 166,153,600.00
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	M3	29,940.73	\$ 20,780.00	\$ 622,168,369.40
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	\$ 1,300.00	\$ 1,482,575,127.41
5	CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL				
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	\$ 1,131,000.00	\$ 61,074,000.00
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	\$ 2,869,000.00	\$ 86,070,000.00
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies ícticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	\$ 6,893,700.00	\$ 55,149,600.00
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	\$24,626,000.00	\$ 197,008,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 4,768,140,034.81
	Administración (22%)			0.22	\$ 1,048,990,807.66
	Imprevistos (3%)			0.03	\$ 143,044,201.04
	Utilidad (5%)			0.05	\$ 238,407,001.74
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			0.30	\$ 1,430,442,010.44
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 6,198,582,045.25

3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En la Tabla 3.4 se presenta el cronograma del proyecto, indicando las actividades asociadas, así como la duración de cada una de estas.

Tabla 3.4 Cronograma de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según acta de inicio 07 de marzo de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON	115 días	22/03/2025	14/07/2025
1.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	45 días	26/05/2025	9/07/2025
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	45 días	31/05/2025	14/07/2025
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO	80 días	7/03/2025	25/05/2025
2.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
2.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	60 días	22/03/2025	20/05/2025
2.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	60 días	27/03/2025	25/05/2025
3	CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA	118 días	7/03/2025	2/07/2025
3.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	7/03/2025	21/03/2025
3.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	98 días	22/03/2025	27/06/2025
3.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	98 días	27/03/2025	2/07/2025
4	CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR	231 días	22/03/2025	7/11/2025
4.01	Localizacion, Trazado y Replanteo	15 días	22/03/2025	5/04/2025
4.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	123 días	3/07/2025	2/11/2025
4.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	123 días	8/07/2025	7/11/2025
5	CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.02	Analisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	246 días	7/03/2025	7/11/2025
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	246 días	7/03/2025	7/11/2025
	TOTAL CONTRATO No. 492 DE 2024	246 días	7/03/2025	7/11/2025

3.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional del contratista actualizado:

Tabla 3.5 Personal Profesional y operativo del Contratista

No	Nombre Completo	Cedula	Cargo	Matricula
1	Roque Muñoz	91281627	Director de obra	68202087106STD
2	Javier Conrado	104235345	Residente de obra	08202-308050 ATL
3	Juan Miguel Hernandez	1118848009	Especialista Ambiental	08238349693 ATL
4	Sonia Gonzalez	1140885236	Residente ambiental	08238428833 ATL
5	Walter Barbosa	7226272	Biologo	2336 - 2007
6	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	021272-0515198 ATL
7	Kelly Florez	56067903	Supervisor SISO	1604 de 26 de marzo 2015
8	Marianela Torregrosa	1043028148	Residente Social	Ley 53 de 1977.
9	Humberto Escocia	1234888624	Conductor Camioneta FVO666	N/A
10	Jose Rodrigo Avila Arenas	19360273	Topografo	00-0472
11	Domingo González	11075728	Cadenero	N/A
12	Luis Guillermo Trespalacios	1038097776	Operador Retroexcavadora VOLVO 210	N/A
13	Oscar paredes	72144924	Operador Retroexcavadora VOLVO 240	N/A
14	Yesica Pino	102095293	Servicio General	N/A
15	Luis Eduardo Mizzar	72166813	Conductor Volqueta WEL 864	N/A
16	Jader Vital Acosta	92250208	Conductor Volqueta WEL 865	N/A
17	Ruben Moreno	72308083	Conductor Volqueta STS 224	N/A
18	Luis Ching	8742576	Conductor Volqueta STS 222	N/A
19	Rosa Castro	22598664	Servicio General	N/A

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2025 al 06 de junio de 2025:

Semana del 07 al 08 de mayo de 2025

Miércoles 07 de mayo

- Se presentó averíos en la retroexcavadora a causa de daños en la bomba hidráulica. Se suspenden las actividades de limpieza para recuperación ambiental.

Jueves 08 de Mayo

- Se realizó el mantenimiento y reparación de retroexcavadora, la cual quedó operativa al final de la jornada.

Semana del 09 al 15 de mayo de 2025

Viernes 09 de mayo

- Se realizaron las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa desde la abscisa K1+130 hasta la K1+220 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 10 de mayo

- Se continuó con la limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa desde la abscisa K1+220 hasta la K1+280 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Domingo 11 de mayo

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 12 de mayo

- Se continuó con la limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa desde la abscisa K1+280 hasta la K1+340 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 644 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Martes 13 de mayo

- Se realizó el control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+130 hasta la K1+340.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizó la movilización de una retroexcavadora VOLVO 210 al frente de obra de Caño El Porvenir.

Miércoles 14 de mayo

- Se dio inicio a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+730 hasta la K2+680 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210. El rendimiento de la excavadora se vio restringido debido a las condiciones topográficas (obstáculos) y por la calidad de soporte del suelo (blando) en este punto.
- Actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo

de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Jueves 15 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+680 hasta la K2+600 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210. El rendimiento de la excavadora se vio restringido debido a las condiciones topográficas (obstáculos) y por la calidad de soporte del suelo (blando) en este punto.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 16 al 22 de mayo de 2025

Viernes 16 de mayo

- Se continuó con la limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+600 hasta la K2+520 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.
- Se llevó a cabo el segundo monitoreo hidrobiológico e ictiofauna en el Embalse el Guajaro y la Laguna de Luruaco, con el Laboratorio SOLRA Ingeniería, quien será el encargado de emitir los reportes exigidos para el proyecto

Sábado 17 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+520 hasta la K2+460 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Domingo 18 de mayo

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 434 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
-

Lunes 19 de mayo

- Se continuó con las Actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+460 hasta la K2+400 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 20 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+400 hasta la K2+340 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Miércoles 21 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+340 hasta la K2+280 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Jueves 22 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+280 hasta la K2+200 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 23 al 29 de mayo de 2025

Viernes 23 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+200 hasta la K2+100 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizó el control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el caño El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+730 hasta la K2+200.

Sábado 24 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de Trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+100 hasta la K2+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³,

logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Domingo 25 de mayo

- No se realizaron actividades constructivas.

Lunes 26 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de Trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K2+020 hasta la K1+960 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 658 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Martes 27 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+960 hasta la K1+900 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Miércoles 28 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+900 hasta la K1+820 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa

Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Se realizó la cuarta campaña de monitoreo de calidad de aguas, mediante la toma de tres muestras puntuales en el Embalse el Guajáro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, las cuales fueron tomadas por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de la realización de los ensayos de laboratorio para la determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos para el proyecto.

Jueves 29 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+820 hasta la K1+740 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 30 de mayo al 06 de Junio de 2025

Viernes 30 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+740 hasta la K1+680 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizó el control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el caño El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+200 hasta la K1+740.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Sábado 31 de mayo

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+680 hasta la K1+620 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Domingo 01 de junio

- No se programaron actividades
-

Lunes 02 de junio

- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 518 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 03 de junio

- Se continuó con las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de Trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+620 hasta la K1+550 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 616 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Miércoles 04 de junio

- Se continuó con las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+550 hasta la K1+450 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Jueves 05 de junio

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+450 hasta la K1+400 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

Viernes 06 de junio

- Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo de Caño El Porvenir desde la abscisa K1+400 hasta la K1+340 mediante el empleo de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Se finalizaron las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Caño Villa Rosa, se utilizan 4 volquetas doble troque con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizó el control topográfico, en conjunto con la interventoría, de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el caño El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+740 hasta la K1+340.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y pre operacionales de equipos.

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 5.1 Información General Contrato de Interventoría.

CONTRATISTA:	COSORCIO LURUCACO ALFREDO JOSE MARTINEZ LEPESQUEUR 70% CONSULTORÍA TECNICA DE OBRAS S.A.S. 20% OBRAS E INTERVENTORÍAS COLOMBIA S.A.S. 10%			
CONTRATO No.	0497 DE 2024			
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".			
VALOR:	\$537.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES			
FECHA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025			
GARANTÍAS				
La interventoría CONSORCIO LURUACO Toma la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 21-44-101461195 con la aseguradora SURA. A continuación, se relacionan los valores asegurados y las vigencias.				
AMPAROS		VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			Iniciación	Terminación
Cumplimiento del contrato		\$53.700.000	30/12/2024	28/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		\$26.850.000	30/12/2024	31/08/2028
Calidad del servicio		\$107.400.000	30/12/2024	31/08/2026

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato No. 0497 DE 2024, fue suscrita el día 07 de marzo de 2025 entre el representante legal de la Interventoría y supervisor del contrato para realizar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS YIO ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"**.

5.2 PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, en la tabla 5.2. se presenta el presupuesto general de la interventoría:

Tabla 5.2 Presupuesto Interventoría.

DESCRIPCION	CANT.	MESES	DEDICACION	SUELDO	VALOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	8	50%	\$ 7.250.000	\$ 29.000.000
Residente de Interventoría	1	8	100%	\$ 4.150.000	\$ 33.200.000
Profesional Ambiental	1	8	40%	\$ 5.880.000	\$ 18.816.000
A.2 PERSONAL TECNICO					
Profesional SISO	1	8	100%	\$ 2.300.000	\$ 18.400.000
SUBTOTAL PERSONAL					\$ 99.416.000
FACTOR MULTIPLICADOR					2,40
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					\$ 238.598.400
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES	8	\$ 7.000.000	\$ 56.000.000	
Comisión Topográfica. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye bastón y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye bastón y trípode), Nivel de precisión (Incluye: bastón y trípode))	MES	8	\$ 10.083.663	\$ 80.669.304	
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA	30	\$ 1.131.800	\$ 33.954.000	
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictofauna - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar).	MUESTRA	12	\$ 2.869.900	\$ 34.438.800	
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES	8	\$ 950.000	\$ 7.600.000	
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					\$ 212.662.104
SUBTOTAL COSTOS BASICOS					\$ 451.260.504
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA-19%)					\$ 85.739.496
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					\$ 537.000.000

5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional de interventoría:

Tabla 5.3 Personal Profesional de la Interventoría

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN	CEDULA	MATRICULA
ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	10.766.786	2220212654 5 COR
RICARDO ANTONIO PEREZ EGUIS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	85.458.051	08202-76946 ATL
IVAN DARIO ARELLANA OCHOA	PROFESIONAL AMBIENTAL	Ingeniero Civil – magister en ingeniería y gestión ambiental	72.008.065	08202- 089216 ATL
MARIA CONTRERAS BARRANCO	PROFESIONAL SISO	Administrador integral de riesgos de seguridad y salud en el trabajo	1.143.443.933	Resolución No. 0384 de 05 de febrero de 20219
RICARDO BERRIO ARRIETA	TOPOGRAFO	Tecnólogo en Topografía	72.197.203	01-15827

Nota: se realizó la solicitud de cambio de personal del Director de Interventoría y del Residente de interventoría, la cual fue aprobada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, relacionándose en la tabla 5.3 los nuevos profesionales de la interventoría.

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Interventor:

Semana del 07 al 08 de mayo de 2025

Miércoles 07 de mayo

- Se reportan daños en la retroexcavadora, los cuales ocasionan la suspensión de actividades, se identificaron daños en la bomba hidráulica.

Jueves 08 de Mayo

- El contratista de obra realizó el mantenimiento y reparación de retroexcavadora, quedando operativa a finales de la jornada.

Semana del 09 al 15 de mayo de 2025

Viernes 09 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+130 hasta la K1+220 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos
- Revisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 10 de mayo

- Supervisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+220 hasta la K1+280 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Revisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Domingo 11 de mayo

- No se programaron actividades constructivas.

Lunes 12 de mayo

- Acompañamiento al contratista de obra en las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+280 hasta la K1+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240.
- Inspección de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 13 de mayo

- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con la el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+130 hasta la K1+340.
- Revisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Acompañamiento al contratista de obra en la actividad de movilización de una retroexcavadora VOLVO 210 al frente de obra del Caño El Porvenir.

Miércoles 14 de mayo

- Inspección a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+730 hasta la K2+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. El rendimiento y la operatividad de los equipos se vio restringida debido a las condiciones topográficas y del suelo en este punto.
- Revisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Jueves 15 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+680 hasta la K2+600 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. El rendimiento y la operatividad de los equipos se vio restringida debido a las condiciones topográficas y del suelo en este punto.
- Monitoreo y control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 16 al 22 de mayo de 2025

Viernes 16 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+600 hasta la K2+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Acompañamiento al contratista de obra en la toma de muestras para el segundo monitoreo hidrobiológico e ictiofauna en el Embalse el Guajaro y la Laguna de Luruaco, las cuales estuvieron a cargo del Laboratorio SOLRA Ingeniería, quien será el encargado de emitir los reportes exigidos para el proyecto.
- Inspección de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 17 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+520 hasta la K2+460 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³,

logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Domingo 18 de mayo

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 434 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Lunes 19 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+460 hasta la K2+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 20 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+400 hasta la K2+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 21 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+340 hasta la K2+280 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³,

logrando disponer un volumen de 644 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Jueves 22 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+280 hasta la K2+200 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 23 al 29 de mayo de 2025

Viernes 23 de mayo

- Chequeo de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+200 hasta la K2+100 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+730 hasta la K2+200.

Sábado 24 de mayo

- Monitoreo de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+100 hasta la K2+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 25 de mayo

- No se realizaron actividades constructivas

Lunes 26 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+020 hasta la K1+960 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 658 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Martes 27 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+960 hasta la K1+900 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Miércoles 28 de mayo

- Chequeo de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+900 hasta la K1+820 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Acompañamiento al contratista de obra en la toma de muestras para la cuarta campaña de monitoreo de calidad de aguas; se tomaron tres muestras puntuales en el Embalse el Guajáro, y tres muestras puntuales en la Laguna de Luruaco, las cuales fueron tomadas por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S, quien será el responsable de

la realización de los ensayos de laboratorio para la determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos para el proyecto. Así mismo, la interventoría realizó la toma de muestras en el Embalse El Guájaro y en la Laguna de Luruaco, las cuales serán analizadas por el laboratorio LABORMAR, quien se encuentra acreditado por el IDEAM.

Jueves 29 de mayo

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+820 hasta la K1+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Semana del 30 de mayo al 06 de Junio de 2025

Viernes 30 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+740 hasta la K1+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+200 hasta la K1+740.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Sábado 31 de mayo

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+680 hasta la K1+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³,

logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Domingo 01 de junio

- No se programaron actividades

Lunes 02 de junio

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 518 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 03 de junio

- Chequeo de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+620 hasta la K1+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 616 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Miércoles 04 de junio

- Revisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+550 hasta la K1+450 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Jueves 05 de junio

- Inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+450 hasta la K1+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.

- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

Viernes 06 de junio

- Chequeo de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+400 hasta la K1+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210.
- Control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa, las cuales finalizaron durante este día, mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³, logrando disponer un volumen de 630 m³ de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.
- Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+740 hasta la K1+340.
- Seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos

6.1 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los avances ejecutados por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, y con base en las cantidades de obra efectivamente desarrolladas, se procedió a la definición de los porcentajes de avance físico correspondientes al corte del periodo mencionado. Como resultado del análisis técnico realizado, se evidenció un avance físico acumulado del 49.16%, lo cual supera en 9.47 puntos porcentuales el 39.71% inicialmente programado para esta etapa del proyecto. Esta diferencia positiva refleja un ritmo de ejecución superior al previsto, lo que refleja un buen desempeño en la ejecución de las actividades y un adelanto significativo en la programación general del proyecto, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos.

A continuación, se presenta el cuadro que resume las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, en el cual se especifican los avances alcanzados en cada una de las actividades desarrolladas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA INFORME 3: 07-05-25 AL 06-06-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LIMON					
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	15,520.00	-	15,520.00	100%
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	7,069.95	-	-	-
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	110,291.22	-	-	-
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION ARROYO NEGRO					
2.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	19,200.00	-	19,200.00	100%
2.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	17,672.26	-	17,672.26	100%
2.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	298,661.19	-	298,661.19	100%
3	CAPÍTULO III - RECUPERACION CAÑO DE VILLA ROSA					
3.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	21,440.00	-	21,440.00	100%
3.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	14,070.64	2,053.35	14,070.64	100%
3.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	420,712.14	370,480.14	420,712.14	100%
4	CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO EL PORVENIR					
4.01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	43,840.00	43,840.00	43,840.00	100%

INFORME MENSUAL No. 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT EJECTADA INFORME 3: 07-05-25 AL 06-06-25	CANTIDADES ACUMULADAS	% AVANCE POR ACTIVIDAD
4.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	M3	29,940.73	12,116.88	12,116.88	40.46%
4.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	M3-KM	1,140,442.41	-	-	-
5	CAPÍTULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL					
5.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBOS), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Goliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales.	Muestra	54.00	-	6	11.11%
5.02	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna	Muestra	30.00	-	6	20%
5.03	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	Mes	8.00	1	3	38%
5.04	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	Mes	8.00	1	3	38%



Curva S del proyecto, % Programado vs % Ejecutado

De la anterior gráfica, se puede verificar que el contratista se encuentra por encima de los rangos establecidos, acorde a la programación de obra, con un avance de obra del 49.16% de avance del proyecto contra un 39.71% de lo programado.

6.2 SEGUIMIENTO SST

En el marco del desarrollo del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental adoptó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de uno de sus consorciados, la empresa TICOM, como base para la implementación del programa correspondiente durante la ejecución de las actividades constructivas del proyecto. Este sistema fue adaptado a las condiciones particulares de la obra, con el fin de garantizar la protección integral de la salud y la seguridad de los trabajadores que participan en las diferentes fases del proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, la interventoría realizó actividades de seguimiento y verificación en campo relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), evidenciando el desarrollo de acciones orientadas a la mitigación de riesgos laborales y al fortalecimiento de condiciones seguras en los frentes de obra. En este contexto, se constató la ejecución de jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, enfocadas en temas como prevención de riesgos laborales, procedimientos seguros de trabajo, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y protocolos de respuesta ante emergencias. Estas capacitaciones se llevaron a cabo mediante charlas informativas realizadas diariamente antes del inicio de las labores, como parte de las estrategias de sensibilización y promoción de la cultura de seguridad en el entorno laboral. A continuación, se detallan las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo:

CHARLAS SST		
Fecha	Tema	Responsable
8/05/2025	Prevención lesiones en la columna	Kelly Florez
10/05/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Florez
13/05/2025	Autoreportes de actos y condiciones inseguras	Kelly Florez
15/05/2025	La importancia del ATS	Kelly Florez
16/05/2025	Identificación de peligro y evaluación del riesgo	Kelly Florez
19/05/2025	Cuando es un accidente de trabajo	Kelly Florez
20/05/2025	Manejo y prevención del estrés en el trabajo	Kelly Florez
21/05/2025	Velocidad moderada	Kelly Florez
23/05/2025	Agotamiento por calor	Kelly Florez
24/05/2025	No utilizar vocinas, pitos, durante la ejecución de las actividades	Kelly Florez
26/05/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Florez
27/05/2025	Enfermedades de transmisión sexual	Kelly Florez
29/05/2025	Autocuidado	Kelly Florez
31/05/2025	Peatones en la vía	Kelly Florez
3/06/2025	Importancia del kits de emergencia (botiquín, camilla, extintor)	Kelly Florez

CAPACITACIONES SST		
Fecha	Tema	Responsable
22/05/2025	Riesgo biomecanico	Kelly Florez
6/06/2025	Primeros auxilios, evacuación	Kelly Florez

Paralelamente, el contratista adelantó la instalación y adecuación de elementos de seguridad con el fin de prevenir accidentes laborales y garantizar condiciones seguras en las zonas operativas y áreas auxiliares. Entre las acciones destacadas se encuentra la implementación de señalización en los frentes de trabajo y campamentos, así como la dotación de elementos básicos de atención primaria, tales como botiquines de primeros auxilios, camillas de emergencia, extintores portátiles, entre otros insumos necesarios para una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la ejecución de las actividades constructivas.

Asimismo, se llevaron a cabo inspecciones periódicas en los diferentes frentes de obra, con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial establecidas en el SG-SST y asegurar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal operativo. Estas inspecciones permitieron identificar desviaciones, formular observaciones y adoptar medidas correctivas de manera inmediata, promoviendo así la mejora continua del sistema de gestión en campo.

A continuación, se detallan las inspecciones realizadas y los aspectos evaluados en cada una de ellas:

- Inspecciones planeadas
- Inspección de extintores
- Inspección de botiquín
- Inspección de camillas
- Inspección al estado y uso de EPP
- Inspección punto ecológico
- Observación inspecciones planeadas
- Inspección detallada de equipos
- Inspección orden y aseo

En el Anexo No. 6 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período del 07 de mayo de 2025 al 06 de junio de 2025.

6.3 SEGUIMIENTO SOCIAL

En cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del componente de gestión social del contrato de obra No. 492 de 2024, el Consorcio Alianza Ambiental ha dispuesto la habilitación de un punto de atención por cada frente de trabajo, ubicado dentro de los respectivos campamentos de obra, con el propósito de atender las quejas, sugerencias, peticiones y demás manifestaciones (PQRs) presentadas por los miembros de la comunidad pertenecientes al área de influencia directa del proyecto. Estos puntos permiten canalizar de manera eficiente la comunicación entre la comunidad y el equipo técnico-social del proyecto, garantizando trazabilidad y oportuna atención a los requerimientos ciudadanos.

6.3.1. Jornadas de Socialización del Proyecto

A la fecha, el Consorcio Alianza Ambiental, con el acompañamiento de la interventoría, realizó diversas jornadas de socialización del proyecto en los municipios y corregimientos que hacen parte del área de influencia directa del proyecto. Estas actividades tuvieron como finalidad principal brindar información clara y detallada a la comunidad sobre los aspectos técnicos, duración, cronograma y fases constructivas del proyecto.

Las jornadas se desarrollaron en las siguientes fechas y lugares:

- 13 de marzo de 2025: Socialización en el municipio de Luruaco, llevada a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
- 17 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de Villa Rosa, desarrollada en las instalaciones de ASOPACOVIR.
- 18 de marzo de 2025: Socialización en el corregimiento de El Porvenir, realizada en el Estadero “Las Brisas del Guaro”.

Durante estas jornadas se resolvieron inquietudes de los asistentes y se fortaleció el vínculo institucional con la comunidad, en aras de garantizar la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución del proyecto.

6.3.1. Levantamiento de Actas de Vecindad

Como parte de las actividades preliminares a la ejecución de las obras, y con el objetivo de establecer una línea base del estado físico de los inmuebles colindantes a las zonas de intervención, se desarrolló el proceso de levantamiento

de actas de vecindad. Este proceso fue liderado por el Consorcio Alianza Ambiental con el apoyo técnico de la interventoría, y consistió en la verificación y registro del estado actual de predios, viviendas, estructuras, locales comerciales y parcelas ubicadas en el perímetro del área de influencia directa del proyecto.

Cada visita fue documentada mediante actas suscritas por las partes, incluyendo registros fotográficos y observaciones técnicas, lo que permitirá, en caso de ser requerido, realizar comparaciones posteriores para la evaluación de posibles afectaciones. Esta actividad es de vital importancia para garantizar la protección de bienes privados, la transparencia en el proceso constructivo y la adecuada atención de eventuales reclamaciones por parte de terceros.

<i>Fechas</i>	<i>Detalle</i>	<i>Cantidad</i>
Del 10-03-2025 al 11-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Negro - Luruaco	28
11-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
11-03-2025	Actas de lote Inicial Arroyo Negro - Luruaco	2
Del 19-03-2025 al 22-03-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Limón - Luruaco	58
21-03-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Limón - Luruaco	3
25-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño Villa Rosa - Repelón	1
Del 25-03-2025 al 26-03-2025	Actas de vecindad Inicial Caño El Porvenir - Manatí	28
25-03-2025	Actas de entorno Inicial Caño El Porvenir - Manatí	1
26-03-2025	Actas de lote Inicial Caño El Porvenir - Manatí	4
Total		127

En el Anexo No. 7 se presenta el seguimiento a la implementación del programa de Gestión Social, correspondiente al período del 07 de mayo de 2025 al 06 de junio de 2025.

6.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

6.4.1. Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El Consorcio Alianza Ambiental formuló un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el propósito de establecer las medidas de manejo para los componentes del medio biótico, abiótico y socioeconómico, orientadas a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos generados por las actividades operativas del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, la interventoría llevó a cabo el seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en los distintos programas que integran el PMA, constatando la ejecución de acciones enfocadas en la protección y conservación del entorno. En relación con el manejo de residuos sólidos, se verificó el uso y control de puntos ecológicos dispuestos en los frentes de obra, destinados a la correcta clasificación, almacenamiento temporal y posterior disposición de los residuos generados tanto por las actividades constructivas como por el personal vinculado al proyecto.

Respecto al control de emisiones y material particulado, se evidenció el cubrimiento con carpas de las volquetas encargadas del transporte de materiales provenientes de las labores de limpieza para recuperación ambiental, con destino al sitio de disposición final autorizado, con el fin de evitar la dispersión de partículas en las vías. Adicionalmente, se implementaron rutinas periódicas de humectación en las vías de acceso al área de influencia directa del proyecto, como medida de mitigación para reducir la emisión de polvo y preservar la calidad del aire, en cumplimiento con lo estipulado en el PMA.

Asimismo, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal técnico y operativo involucrado en el desarrollo del proyecto. Estas actividades formativas abordaron temáticas relevantes como el manejo adecuado de residuos sólidos, el uso eficiente del recurso hídrico, la conservación de la biodiversidad y el manejo responsable de insumos y materiales. A continuación, se detallan las charlas ambientales realizadas por el contratista durante el periodo reportado:

CHARLAS AMBIENTALES		
Fecha	Tema	Responsable
7/05/2025	Prohibido la tala de árboles	Sonia González
9/05/2025	Medidas para la protección y conservación de hábitat	Sonia González
12/05/2025	Importancia de separar los residuos sólidos	Sonia González
14/05/2025	Para que son las canecas negras, blancas y verdes	Sonia González
17/05/2025	Manejo y disposición final de los residuos líquidos	Sonia González
28/05/2025	Cuales son los tipos de suelo	Sonia González
30/05/2025	Como identificar fauna en campo	Sonia González
4/06/2025	Código de los colores de las canecas	Sonia González
5/06/2025	Prohibido la caza de animales	Sonia González

6.4.2. Monitoreo de Calidad de Agua

Primera campaña de monitoreo:

El día 13 de marzo de 2025, tanto el Consorcio Alianza Ambiental como el Consorcio Luruaco realizaron actividades de tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro. En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico capacitado, siguiendo los protocolos establecidos para la recolección, preservación y transporte de muestras de agua, conforme a la normatividad ambiental vigente. Cada punto de muestreo fue debidamente georreferenciado, y a continuación se presentan las coordenadas geográficas correspondientes para su trazabilidad y análisis comparativo en etapas futuras del proyecto:

Tabla 6.1. Coordenadas Puntos de Muestreo Laguna de Luruaco.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO LAGUNA DE LURUACO		
ESTACION	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto No. 1	10°36'11.40"N	75° 9'2.73"O
Punto No. 2	10°36'25.56"N	75° 9'7.28"O
Punto No. 3	10°36'17.69"N	75° 9'24.46"O

Tabla 6.2. Coordenadas Puntos de Muestreo Embalse El Guájaro.

COORDENADAS ESTACIONES MONITOREO EMBALSE EL GUAJARO		
ESTACION	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto No. 1	10°25'38.56"N	75° 4'43.81"O
Punto No. 2	10°24'48.32"N	75° 7'2.48"O
Punto No. 3	10°25'33.09"N	75° 6'6.16"O

El propósito de esta actividad fue establecer una línea base de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua previo al desarrollo de las actividades operativas, permitiendo identificar la condición inicial de los cuerpos de agua y evaluar, en etapas posteriores, cualquier variación atribuible a la ejecución del proyecto. En el Anexo 9.1 se presenta el informe y resultados de laboratorio del monitoreo No. 1 de calidad de aguas presentado por el contratista de obra.

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos fue realizado por el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., para el contratista de obra, y por el laboratorio LABORMAR para la interventoría, los cuales mediante distintos ensayos establecieron los siguientes parámetros:

Parámetros fisicoquímicos:

- Temperatura
- Salinidad
- Oxígeno Disuelto
- pH
- Turbidez
- Clorofila
- Sólidos Totales
- Sólidos Suspendidos
- Demanda Biológica de Oxígeno (DBO₅)
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Nitratos
- Nitrógeno Total
- Grasas y Aceites
- Ortofosfatos
- Fósforo
- Dureza
- Alcalinidad
- Tensoactivos Aniónicos (SAAM)

Parámetros microbiológicos:

- Coliformes Termotolerantes
- Coliformes Totales

En el Anexo 9.2., se presenta el informe y resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, correspondientes al Monitoreo No. 1, de las tomas de muestras realizadas por la interventoría.

Segunda campaña de monitoreo:

El día 04 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del segundo monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Tercera campaña de Monitoreo:

El día 28 de abril de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del tercer monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Cuarta campaña de monitoreo:

El día 28 de mayo de 2025 el consorcio alianza ambiental realizó la toma de muestras del cuarto monitoreo de calidad de aguas con la finalidad de caracterizar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de los cuerpos de agua en estudio, una vez puesta en marcha las actividades de limpieza para recuperación ambiental. Actualmente el Laboratorio para La Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., se encuentra en proceso de análisis y ensayos de laboratorio que permitirán la cuantificación de los parámetros de estudios mencionados anteriormente.

Así mismo, la interventoría realizó las tomas de muestras puntuales en los cuerpos de agua de la Laguna de Luruaco y el Embalse del Guájaro (monitoreo de interventoría No. 2). En cada uno de estos cuerpos hídricos se recolectaron tres muestras independientes, como parte del programa de seguimiento y evaluación de la calidad del recurso hídrico. Las muestras fueron tomadas por personal técnico del Laboratorio LABORMAR, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM

y será el encargado de realizar los ensayos correspondientes para determinar las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de dichas muestras y de este modo contar con insumos que permitan establecer las condiciones de calidad de agua durante la ejecución del proyecto.

6.4.3. Monitoreo Hidrobiológico

Primer monitoreo Hidrobiológico:

El día 20 de marzo de 2025, el Contratista de obra (Consortio Alianza Ambiental), y la interventoría (Consortio Luruaco) en el marco de las actividades de monitoreo ambiental asociadas al proyecto, realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos.

La actividad se desarrolló conforme a los protocolos establecidos en la normatividad ambiental vigente y bajo los lineamientos metodológicos reconocidos para el muestreo en cuerpos de agua continentales. La recolección se efectuó en puntos previamente georreferenciados y representativos del ecosistema objeto de estudio, garantizando así la validez y representatividad de los datos obtenidos.

Los parámetros hidrobiológicos seleccionados para el análisis incluyen las siguientes comunidades biológicas, consideradas bioindicadores clave del estado ecológico del recurso hídrico:

- Fitoplancton: organismos fotosintéticos microscópicos suspendidos en la columna de agua, evaluados por su composición, densidad y biomasa.
- Zooplancton: pequeños organismos heterótrofos de vida libre, fundamentales en las cadenas tróficas acuáticas.
- Perifiton: comunidad biológica adherida a sustratos sumergidos, utilizada como indicador sensible de cambios en la calidad del agua.
- Macroinvertebrados bentónicos: organismos asociados al sedimento del fondo, utilizados como indicadores del estado trófico y de perturbaciones antrópicas.
- Macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas: cuya presencia y diversidad permite inferencias sobre la estructura del hábitat y las condiciones físico-químicas locales.
- Ictiofauna: peces presentes en el ecosistema, evaluados por su diversidad, abundancia, biomasa y composición específica.

En el informe de actividades de Interventoría No. 2, en el Anexo 10, se presentaron los resultados, tanto del contratista de obra como de la interventoría,

obtenidos para los componentes evaluados: fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos, macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas e ictiofauna. Dicho informe contiene información detallada sobre la composición, abundancia y distribución de estos grupos en los dos cuerpos de agua objeto de estudio: el embalse El Guájaro y la laguna de Luruaco. Estos resultados permiten analizar el estado ecológico actual de ambos ecosistemas acuáticos.

Segundo Monitoreo Hidrobiológico:

El día 16 de mayo de 2025, el Contratista de obra (Consortio Alianza Ambiental), realizaron la toma de muestras biológicas con fines de análisis de calidad del recurso hídrico, específicamente enfocados en la evaluación de parámetros hidrobiológicos. Las muestras se realizaron tanto en la Laguna de Luruaco, como en la Zona baja del Embalse El Guájaro. Actualmente, El laboratorio SOLRA Ingeniería se encuentra en proceso de análisis de las muestras tomadas para establecer y analizar los parámetros requeridos.

6.4.4. Monitoreo Biológico-pesquero

Durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2025, en el marco de las actividades programadas dentro del componente de seguimiento ambiental, se llevó a cabo el Monitoreo Biológico – Pesquero en los cuerpos de agua del Embalse El Guájaro (zona baja) y la Laguna de Luruaco.

La actividad consistió en el registro y análisis de las especies ícticas presentes en estos ecosistemas, utilizando como base las faenas de pesca realizadas por pescadores locales mediante métodos de pesca artesanal debidamente autorizados. Este enfoque participativo permitió obtener información representativa y actualizada sobre el recurso pesquero, a través de la aplicación de encuestas estructuradas y la recolección de datos en campo.

Las capturas obtenidas por los pescadores fueron utilizadas como insumo para la identificación taxonómica de las especies, así como para la determinación de parámetros biométricos, tales como longitud, peso y talla. Adicionalmente, se evaluó el estado reproductivo de los especímenes capturados y se analizaron aspectos ecológicos relevantes, todo ello en concordancia con los objetivos establecidos para el monitoreo.

El propósito principal de esta actividad fue generar una línea base y actualizar la información disponible sobre la composición íctica de los sistemas lénticos monitoreados, proporcionando datos fundamentales para la formulación de

estrategias de manejo y conservación de los recursos pesqueros. Asimismo, los resultados obtenidos contribuirán al análisis de posibles impactos ambientales que pudieran estar afectando a estas comunidades biológicas.

La información detallada del seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente al período del 07 de mayo al 06 de junio de 2025, se encuentra consignada en el Anexo No. 11.

6.5 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DE OBRA

A corte del 06 de junio de 2025, se realizaron los siguientes pagos al contratista de obra Consorcio Alianza Ambiental:

Acta	Periodo	Valor
Acta No. 1	07-03-2025 a 06-04-2025	\$1.094.325.094,22

7 CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025, la interventoría, Consorcio Luruaco, llevó a cabo el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Alianza Ambiental, en concordancia con la programación de obra aprobada. Como resultado de esta labor de supervisión, se evidenció un avance físico acumulado del 49,16%, correspondiente a la ejecución de actividades contempladas dentro del cronograma vigente para el periodo evaluado.

En relación con las actividades de obra, se culminaron las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa, abarcando el tramo comprendido entre las abscisas K1+130 y K1+340. El material extraído fue cargado y transportado hacia la Cantera Maná, sitio autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), mediante la operatividad de un frente de trabajo compuesto por cuatro volquetas doble troque con capacidad de 14 m³ cada una. El control volumétrico de los residuos transportados se realizó mediante planillas diligenciadas por el personal técnico en campo y respaldadas con registros fotográficos.

Una vez finalizadas las actividades en el frente de Villa Rosa, se realizó el traslado de equipos hacia el frente de Caño El Provenir, donde se dio inicio a las labores de limpieza para recuperación ambiental en el tramo comprendido entre las abscisas K2+730 y K1+340. Estas actividades se desarrollaron mediante la operación de una retroexcavadora Volvo 210, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de trabajo y la continuidad operativa del proyecto.

En el componente ambiental, el día 28 de mayo de 2025 se realizaron tomas puntuales de muestras de agua en la Laguna de Luruaco y el Embalse El Guájaro, con un total de tres muestras por cuerpo de agua. Estas actividades tuvieron como propósito establecer una línea base de calidad del recurso hídrico y verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos contractualmente. El análisis físico-químico y microbiológico de dichas muestras será realizado por el Laboratorio para la Industria y el Medio Ambiente – LIMA S.A.S., contratado por el Consorcio Alianza Ambiental. Simultáneamente, la interventoría llevó a cabo la toma de muestras correspondientes al segundo monitoreo de calidad de aguas, cuyos ensayos estarán a cargo del laboratorio LABORMAR, de acuerdo con los parámetros establecidos.

En el marco del seguimiento al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó visitas de campo para evaluar la implementación del programa de seguridad establecido por el contratista. Durante estas actividades, se verificó la ejecución de charlas orientadas a la prevención de riesgos laborales,

el diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y formatos preoperacionales para maquinaria y equipos, así como el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal operativo.

Adicionalmente, se realizó la verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), evidenciándose la implementación de acciones orientadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas. Entre las medidas observadas se destacan la señalización adecuada de las zonas intervenidas, el manejo y disposición correcta de residuos sólidos, y la realización de charlas dirigidas al personal sobre la protección de cuerpos de agua y la conservación de la cobertura vegetal no intervenida. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad ambiental en el desarrollo del proyecto.




8 ANEXOS

ANEXO 1: ACTAS DE COMITÉ SEMANALES
ANEXO 2: INFORMES SEMANALES
ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 4: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
ANEXO 5: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 6: SEGUIMIENTO SST
ANEXO 7: SEGUIMIENTO SOCIAL
ANEXO 8: SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ANEXO 9: INFORME MONITOREO BIOLÓGICO PESQUERO
ANEXO 10: BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 11: SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA
ANEXO 12: PLANOS Y CARTERAS TOPOGRÁFICAS
ANEXO 13. CERTIFICADO Y REGISTROS DE DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ SEMANALES

 CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	009
FECHA:	9/05/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO
Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo. Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO

	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		

IV. TEMAS TRATADOS

La interventoría realizó un recorrido de inspección de las actividades de retiro y disposición campo en el frente de arroyo negro y se evidenció la presencia de material suelto en sitio los cuales requieren ser dispuestos en cantera, por lo que se le solicita al contratista el retiro del mismo.

La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+560 hasta la K0+880.

El contratista informa que sigue con la limpieza en el frente Caño Villa Rosa municipio de Repelón del K0+880 al K1+100 mediante retroexcavadora, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con ocho (8) volquetas doble troques de 14m³ hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

El contratista indica que la retroexcavadora estuvo varada por daños en la bomba hidráulica.

La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

La interventoría señala los porcentajes de obra:

Programado 28,22%

Ejecutado 32,63%

V. COMPROMISOS



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 16/05/2025.

 CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	010
FECHA:	16/05/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO
Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo. Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO

	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		

IV. TEMAS TRATADOS

La interventoría realizó un recorrido de inspección de las actividades de retiro y disposición campo en el frente de Caño Villa Rosa.

La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+130 hasta la K1+340.

El contratista informa que sigue con la limpieza en el frente Caño Villa Rosa municipio de Repelón del K1+130 al K1+340 mediante retroexcavadora, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m3 hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

El contratista realizó la movilización de retroexcavadora VOLVO 210 al frente del Caño El Porvenir.

La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

El contratista inició con la limpieza en el frente Caño El Porvenir municipio de Repelón del K2+730 al K2+600 mediante retroexcavadora VOLVO 210, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m3 hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

La interventoría señala los porcentajes de obra:

Programado 31,56%

Ejecutado 35,87%

V. COMPROMISOS



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 23/05/2025.

 CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	011
FECHA:	23/05/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO
Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo. Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO

	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		

IV. TEMAS TRATADOS

La interventoría realizó supervisión junto con el contratista de las actividades de retiro y disposición de residuos en el frente de trabajo del Caño Villa Rosa.

El contratista informa que sigue con la limpieza en el frente Caño El Porvenir municipio de Repelón del K2+600 al K2+200 mediante retroexcavadora, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m3 hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

La interventoría señala los porcentajes de obra:

Programado 34,90%

Ejecutado 40,16%

V. COMPROMISOS



COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	30/05/25	Contratista

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 30/05/2025.

 CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	012
FECHA:	30/05/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	

II. OBJETO
Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo. Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Controles topográficos	Contratista - Interventoría	23-05-25

	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		

IV. TEMAS TRATADOS

La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+730 hasta la K2+200.

El contratista informa que continúa con la limpieza en el frente Caño El Porvenir municipio de Repelón del K2+200 al K1+740 mediante retroexcavadora VOLVO 210, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m³ hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m³.

La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

La interventoría señala los porcentajes de obra:

Programado 37,61%

Ejecutado 44,0%

V. COMPROMISOS




COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 6/06/2025.

 CONSORCIO LURUACO	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico

ACTA DE COMITÉ No.	013
FECHA:	6/06/2025
CONTRATO DE OBRA No.	0492 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0497 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Roque Muñoz Barrera	Director de Obra	
Ricardo Pérez Eguis	Residente de Interventoría	
Javier Coronado	Residente de Obra	
Alfredo Lepesqueur	Director de Interventoría	

II. OBJETO
Alcance y control a los adelantos de obra en los frentes de trabajo. Verificación de las actividades ejecutadas

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Controles topográficos	Contratista – Interventoría	30-05-25

	ACTA DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRA		

IV. TEMAS TRATADOS

La interventoría realizó supervisión junto con el contratista de las actividades de retiro y disposición de residuos en el frente de trabajo del Caño Villa Rosa.

El contratista informa que sigue con la limpieza en el frente Caño El Porvenir municipio de Repelón del K1+740 al K1+400 mediante retroexcavadora, el material fue repaleado para retiro y disposición final realizado con cuatro (4) volquetas doble troques de 14m3 hacia la Cantera Maná autorizada por la CRA.

Se realizó de forma conjunta controles topográficos de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+200 hasta la K1+740

La interventoría hizo seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

La interventoría señala los porcentajes de obra:

Programado 39,71%

Ejecutado 48,45%

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Controles topográficos	Contratista	13-06-25

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa reunión para el próximo viernes 13/06/2025.

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001			
						Fecha Aprobación	2020-11-24		
FECHA		9 DE MAYO DE 2025		PERIODO No.	9	DEL	2/05/2025	AL	8/05/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		497 DE 2024		CONTRATO No.:		492 DE 2024			
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES			
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:				PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:					
FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025			
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO ACTUALIZADO:		245		PLAZO ACTUALIZADO:		245			
PLAZO TRANSCURRIDO:		62 EQUIVALE AL 25,31%		PLAZO TRANSCURRIDO:		62 EQUIVALE AL 25,31%			
VALOR INICIAL :		\$ 2.463.185.760,00		VALOR INICIAL :		\$ 6.198.582.045,25			
VALOR ADICIÓN(ES):				VALOR ADICIÓN(ES):					
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 6.198.582.045,25			
VALOR PAGADO:				VALOR PAGADO:					
VALOR POR PAGAR:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 6.198.582.045,25			
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:		CONSORCIO LURUACO			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO			
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			7/03/2025					
1	CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN								
1.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025					
1.2	Limpieza para recuperación ambiental			9/07/2025					
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			14/07/2025					
2	CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO								
2.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	10/03/2025				
2.2	Limpieza para recuperación ambiental			20/05/2025	10/04/2025				
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			25/05/2025	1/05/2025				
3	CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA								
3.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	17/03/2025				
3.2	Limpieza para recuperación ambiental			27/06/2025					
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			2/07/2025					
4	CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR								
4.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025	19/03/2025				
4.2	Limpieza para recuperación ambiental			2/11/2025					
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			7/11/2025					
5	CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL								
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno			7/11/2025					
5.2	Análisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiologicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna			7/11/2025					
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores			7/11/2025					
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental			7/11/2025					
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS				7/11/2025					
Plazo del proyecto en días				245					
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 1.748.978.634,65	28,22%	4,01%			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 1.997.802.993,18	32,23%				
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS									
NA									
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA									
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA			
NA									
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES									
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.									

FECHA 9 DE MAYO DE 2025

PERIODO No. 9

DEL

2/05/2025

AL

8/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 02 de mayo. La interventoría realizó un recorrido de inspección de las actividades de retiro y disposición campo en el frente de arroyo negro y se evidenció la presencia de material suelto en sitio los cuales requieren ser dispuestos en cantera. Se solicita al contratista el retiro del mismo. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+560 hasta la K0+880 Por parte de la Interventoría, se supervisó la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+880 hasta la K0+940 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó por parte de la interventoría, la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1092 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 03 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+940 hasta la K1+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría inspeccionó el inicio de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1246 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Domingo 04 de mayo. Se continuó con las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Arroyo Negro mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1246 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Lunes 05 de mayo. Se continuó con la revisión en la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+000 hasta la K1+060 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 350 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Una vez finalizadas las actividades de descarga de material procedente del Arroyo Negro en la Cantera Maná, se dirigieron las volquetas al frente de obra del Caño de Villa Rosa, dando inicio a las actividades de retiro y disposición final de residuos, mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 924 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 06 de mayo. La Interventoría, realizó la supervisión en la ejecución de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+060 hasta la K1+130 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Se continuó con la supervisión de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de villa rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 8 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1260 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+880 hasta la K1+130

Miércoles 07 de mayo. Interventoría verificó daño de Retroexcavadora la cual se encontró varada por daños en la bomba hidráulica.

Jueves 08 de Mayo. Se realiza mantenimiento y reparación de retroexcavadora.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 32,23%, superando el avance programado en un 4,01% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa.



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+880 A K0+940



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K0+940 A K1+000



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+000 A K1+060



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+060 A K1+100



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



RETIRO DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA

Hernando Sandoval Ruiz
FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENCIÓN O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001	
						Fecha Aprobación	2020-11-24
FECHA		16 DE MAYO DE 2025		PERIODO No.	10	DEL	9/05/2025
						AL	15/05/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO					
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:		497 DE 2024		CONTRATO No.:		492 DE 2024	
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:				PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025	
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:			
PLAZO ACTUALIZADO:		245		PLAZO ACTUALIZADO:		245	
PLAZO TRANSCURRIDO:		69 EQUIVALE AL 28,16%		PLAZO TRANSCURRIDO:		69 EQUIVALE AL 28,16%	
VALOR INICIAL :		\$ 2.463.185.760,00		VALOR INICIAL :		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR ADICION(ES):		2.463.185.760,00		VALOR ADICION(ES):		6.198.582.045,25	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR PAGADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR PAGADO:		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR POR PAGAR:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 6.198.582.045,25	
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:		CONSORCIO LURUACO	
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.							
2. CONTROL DE HITOS.							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			7/03/2025			
1	CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN						
1.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025			
1.2	Limpieza para recuperación ambiental			9/07/2025			
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			14/07/2025			
2	CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO						
2.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	10/03/2025		
2.2	Limpieza para recuperación ambiental			20/05/2025	10/04/2025		
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			25/05/2025	1/05/2025		
3	CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA						
3.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	17/03/2025		
3.2	Limpieza para recuperación ambiental			27/06/2025			
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			2/07/2025			
4	CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR						
4.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025	19/03/2025		
4.2	Limpieza para recuperación ambiental			2/11/2025			
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			7/11/2025			
5	CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL						
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno			7/11/2025			
5.2	Análisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiológicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna			7/11/2025			
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores			7/11/2025			
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental			7/11/2025			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS				7/11/2025			
Plazo del proyecto en días				245			
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 1.956.268.333,18	31,56%	4,31%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 2.223.431.379,63	35,87%		
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
NA							
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA							
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA	
NA							
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES							
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa e inició actividades de limpieza en el Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.							

FECHA 16 DE MAYO DE 2025

PERIODO No.

10

DEL

9/05/2025

AL

15/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa e inició actividades de limpieza en el Caño El Porvenir.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 09 de mayo. La interventoría continuó supervisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+130 hasta la K1+220 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K0+940 hasta la K1+000 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría inspeccionó el inicio de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Sábado 10 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+220 hasta la K1+280 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 11 de mayo. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 12 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño de Villa Rosa desde la abscisa K1+280 hasta la K1+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 240. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 644 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 13 de mayo. La interventoría realizó controles topográficos junto con el contratista de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el Caño Villa Rosa, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+130 hasta la K1+340. La Interventoría inspeccionó el inicio de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. El contratista realizó la movilización de una retroexcavadora VOLVO 210 al frente de obra del Caño El Porvenir.

Miércoles 14 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión en el inicio de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+730 hasta la K2+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210, el rendimiento y la operatividad de los equipos se vió restringida debido a las condiciones topográficas y del suelo en este punto. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 644 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 15 de Mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+680 hasta la K2+600 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210, el rendimiento y la operatividad de los equipos se vió restringida debido a las condiciones topográficas y del suelo en este punto. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 35,87%, superando el avance programado en un 4,31% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa e inicio de actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir.



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+130 A K1+220



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+220 A K1+280



LIMPIEZA CAÑO VILLA ROSA K1+280 A K1+340



LIMPIEZA DE CAÑO VILLA ROSA



REPALEO DE MATERIAL DE SEDIMENTOS



REPALEO DE MATERIAL DE SEDIMENTOS



RETIRO DE MATERIAL DE SEDIMENTOS



RETIRO DE MATERIAL DE SEDIMENTOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001			
						Fecha Aprobación	2020-11-24		
FECHA		23 DE MAYO DE 2025		PERIODO No.	11	DEL	16/05/2025	AL	22/05/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO							
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		497 DE 2024		CONTRATO No.:		492 DE 2024			
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES			
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:				PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:					
FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025			
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO ACTUALIZADO:		245		PLAZO ACTUALIZADO:		245			
PLAZO TRANSCURRIDO:		76		PLAZO TRANSCURRIDO:		76		EQUIVALE AL 31,02%	
VALOR INICIAL :		\$ 2.463.185.760,00		VALOR INICIAL :		\$ 6.198.582.045,25			
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):					
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 6.198.582.045,25			
VALOR PAGADO:				VALOR PAGADO:					
VALOR POR PAGAR:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 6.198.582.045,25			
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:		CONSORCIO LURUACO			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.									
2. CONTROL DE HITOS.									
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO			
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			7/03/2025					
1	CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN								
1.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025					
1.2	Limpieza para recuperación ambiental			9/07/2025					
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			14/07/2025					
2	CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO								
2.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	10/03/2025				
2.2	Limpieza para recuperación ambiental			20/05/2025	10/04/2025				
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			25/05/2025	1/05/2025				
3	CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA								
3.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	17/03/2025				
3.2	Limpieza para recuperación ambiental			27/06/2025					
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			2/07/2025					
4	CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR								
4.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025	19/03/2025				
4.2	Limpieza para recuperación ambiental			2/11/2025					
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			7/11/2025					
5	CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL								
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno			7/11/2025					
5.2	Análisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiológicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna			7/11/2025					
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores			7/11/2025					
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental			7/11/2025					
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS				7/11/2025					
Plazo del proyecto en días				245					
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 2.163.558.031,71	34,90%	5,26%			
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 2.489.350.549,37	40,16%				
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS									
NA									
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA									
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA			
NA									
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES									
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa e inició actividades de limpieza en el Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.									

FECHA 23 DE MAYO DE 2025

PERIODO No.

11

DEL

16/05/2025

AL

22/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el Caño El Porvenir.

6.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 16 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+600 hasta la K2+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 644 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 17 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+520 hasta la K2+460 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 18 de mayo. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 434 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Lunes 19 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+460 hasta la K2+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 20 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+400 hasta la K2+340 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 21 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+340 hasta la K2+280 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 644 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Jueves 22 de Mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+280 hasta la K2+200 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 40,16%, superando el avance programado en un 5,26% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+600 A K2+520



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+520 A K2+460



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+460 A K2+400



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+400 A K2+340



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+340 A K2+280



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+280 A K2+200



RETIRO DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENCIÓN O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001	
						Fecha Aprobación	2020-11-24
FECHA		30 DE MAYO DE 2025		PERIODO No.	12	DEL	23/05/2025 AL 29/05/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO					
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:		497 DE 2024		CONTRATO No.:		492 DE 2024	
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:				PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025	
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:			
PLAZO ACTUALIZADO:		245		PLAZO ACTUALIZADO:		245	
PLAZO TRANSCURRIDO:		83 EQUIVALE AL 33,88%		PLAZO TRANSCURRIDO:		83 EQUIVALE AL 33,88%	
VALOR INICIAL :		\$ 2.463.185.760,00		VALOR INICIAL :		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR ADICION(ES):		2.463.185.760,00		VALOR ADICION(ES):		6.198.582.045,25	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR PAGADO:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR PAGADO:		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR POR PAGAR:		\$ 2.463.185.760,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 6.198.582.045,25	
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:		CONSORCIO LURUACO	
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.							
2. CONTROL DE HITOS.							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			7/03/2025			
1	CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN						
1.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025			
1.2	Limpieza para recuperación ambiental			9/07/2025			
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			14/07/2025			
2	CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO						
2.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	10/03/2025		
2.2	Limpieza para recuperación ambiental			20/05/2025	10/04/2025		
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			25/05/2025	1/05/2025		
3	CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA						
3.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	17/03/2025		
3.2	Limpieza para recuperación ambiental			27/06/2025			
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			2/07/2025			
4	CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR						
4.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025	19/03/2025		
4.2	Limpieza para recuperación ambiental			2/11/2025			
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			7/11/2025			
5	CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL						
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno			7/11/2025			
5.2	Análisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiológicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna			7/11/2025			
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores			7/11/2025			
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental			7/11/2025			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS				7/11/2025			
Plazo del proyecto en días				245			
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 2.331.064.527,60	37,61%	6,39%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 2.727.376.099,91	44,00%		
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
NA							
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA							
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA	
NA							
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES							
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa e inició actividades de limpieza en el Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.							

FECHA 30 DE MAYO DE 2025

PERIODO No. 12

DEL

23/05/2025

AL

29/05/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el Caño El Porvenir.

6.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 23 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+200 hasta la K2+100 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realizaron controles topográficos de forma conjunta de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+730 hasta la K2+200.

Sábado 24 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+100 hasta la K2+020 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 25 de mayo. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 26 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K2+020 hasta la K1+960 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 658 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Martes 27 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+960 hasta la K1+900 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Miércoles 28 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+900 hasta la K1+820 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Jueves 29 de Mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+820 hasta la K1+740 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 44%, superando el avance programado en un 6,39% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+200 A K2+100



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+100 A K2+020



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K2+020 A K1+960



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+960 A K1+900



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+900 A K1+820



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS EN CANTERA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNÁNDO SANDOVAL RUIZ

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001	
						Fecha Aprobación	2020-11-24
FECHA		6 DE JUNIO DE 2025		PERIODO No.	13	DEL	30/05/2025 AL 5/06/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO					
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:		497 DE 2024		CONTRATO No.:		492 DE 2024	
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		OCHO (8) MESES	
PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:				PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025		FECHA DE INICIACIÓN		MARZO 7 DE 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		NOVIEMBRE 6 DE 2025	
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:			
PLAZO ACTUALIZADO:		245		PLAZO ACTUALIZADO:		245	
PLAZO TRANSCURRIDO:		90 EQUIVALE AL 36.73%		PLAZO TRANSCURRIDO:		90 EQUIVALE AL 36.73%	
VALOR INICIAL :		\$ 537.000.000,00		VALOR INICIAL :		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 537.000.000,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 6.198.582.045,25	
VALOR PAGADO:				VALOR PAGADO:		\$ 1.094.235.094,20	
VALOR POR PAGAR:		\$ 537.000.000,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 5.104.346.951,05	
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO		INTERVENTOR:		CONSORCIO LURUACO	
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.							
2. CONTROL DE HITOS.							
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	
0	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			7/03/2025			
1	CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMÓN						
1.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025			
1.2	Limpieza para recuperación ambiental			9/07/2025			
1.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			14/07/2025			
2	CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO						
2.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	10/03/2025		
2.2	Limpieza para recuperación ambiental			20/05/2025	10/04/2025		
2.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			25/05/2025	1/05/2025		
3	CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA						
3.1	Localización, Trazado y Replanteo			21/03/2025	17/03/2025		
3.2	Limpieza para recuperación ambiental			27/06/2025			
3.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			2/07/2025			
4	CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR						
4.1	Localización, Trazado y Replanteo			5/04/2025	19/03/2025		
4.2	Limpieza para recuperación ambiental			2/11/2025			
4.3	Retiro y Disposición Final de Residuos			7/11/2025			
5	CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL						
5.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno			7/11/2025			
5.2	Análisis de Calidad del Agua Parametros Hidrobiológicos (Parametros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna			7/11/2025			
5.3	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores			7/11/2025			
5.4	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental			7/11/2025			
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS				7/11/2025			
Plazo del proyecto en días				245			
No.	INDICADORES			VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.			\$ 2.461.764.993,22	39,71%	8,74%	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.			\$ 3.003.213.000,92	48,45%		
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							
NA							
4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA							
ACTIVIDAD				RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA	
NA							
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES							
6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: La Interventoría durante esta semana supervisó la ejecución de las actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente del Caño Villa Rosa y actividades de limpieza en el Caño El Porvenir. En términos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.							

FECHA 6 DE JUNIO DE 2025

PERIODO No.

13

DEL

30/05/2025

AL

5/06/2025

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales tales como limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el Caño El Porvenir.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Viernes 30 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+740 hasta la K1+680 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realizaron controles topográficos de forma conjunta de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el caño de El Porvenir, en el tramo comprendido entre las abscisas K2+200 hasta la K1+740. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Sábado 31 de mayo. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+680 hasta la K1+620 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Domingo 1 de junio. No se programaron actividades constructivas.

Lunes 2 de junio. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 518 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Martes 3 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+620 hasta la K1+550 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 616 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo.

Miércoles 4 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+550 hasta la K1+450 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

Jueves 5 de junio. Se continuó por parte de la Interventoría con la supervisión de la ejecución de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Caño El Porvenir desde la abscisa K1+450 hasta la K1+400 mediante la operatividad de una retroexcavadora VOLVO 210. La Interventoría inspeccionó las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo del Caño de Villa Rosa mediante la implementación de un frente de trabajo de 4 volquetas doble troque, con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 630 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Así mismo siguió con el seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.

En resumen, el contratista alcanzó un avance del 48,45%, superando el avance programado en un 6,39% realizando actividades de limpieza, retiro y disposición de sedimentos en el frente Caño Villa Rosa y continuó actividades de limpieza en el frente Caño El Porvenir



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+680 A K1+620



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+620 A K1+550



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+550 A K1+450



LIMPIEZA CAÑO PORVENIR K1+450 A K1+400



CONTROLES TOPOGRÁFICOS



CONTROLES TOPOGRÁFICOS



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA



DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS CAÑO VILLA ROSA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENCIÓN O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ

ANEXO 3. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ESTADO INICIAL FRENTE CAÑO EL PROVENIR, PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO



Frente Caño EL Porvenir, antes de las actividades de limpieza.



Frente Caño EL Porvenir, antes de las actividades de limpieza.

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS FRENTE DE OBRA CAÑO EL PORVENIR



Movilización de Equipos – Retroexcavadora VOLVO 210.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PARA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RETIRO DE RESIDUOS - FRENTE CAÑO EL PORVENIR



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+730 a k2+630.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+630 a k2+530.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+530 a k2+430.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+530 a k2+430.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+430 a k2+330.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+330 a k2+200.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+200 a k2+000.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K2+000 a k1+800.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K1+800 a k1+600.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K1+600 a k1+500.



Limpieza para recuperación ambiental Caño El Porvenir K1+500 a k1+340.

CONTROLES TOPOGRAFICOS – FRENTE CAÑO DE VILLA ROSA



Actividades de controles topográficos durante la ejecución de las actividades de limpieza para la recuperación ambiental.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PARA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y RETIRO DE RESIDUOS - FRENTE CAÑO DE VILLA ROSA



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+130 a k1+200.



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+200 a k1+340.



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+200 a k1+340.



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+200 a k1+340.



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+200 a k1+340.



Limpieza para recuperación ambiental Caño Villa Rosa K1+30 a k1+340.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA – FRENTE CAÑO DE VILLA ROSA



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.



Actividades de Disposición final de Residuos en Cantera Mana.

**ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA**

PAGADO 19/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	Dirección	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA	Identificación	CC 72162008
Total Afiliados	5	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IGE	LMA	AVG	AVP	VCT	IRG	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1091662627	JASNEY MOTTA PEREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.714.285	\$ 754.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 4.714.285	\$ 188.600	6,960	\$ 4.714.285	\$ 328.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 4.714.285	\$ 188.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.459.700
CC 1118848009	JUAN MIGUEL HERNANDEZ RANGEL	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 56067903	KELLYS YOHANA FLOREZ ACOSTA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.920.000	\$ 307.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.920.000	\$ 76.800	6,960	\$ 1.920.000	\$ 133.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.920.000	\$ 76.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 594.500
CC 72226272	WALTER ANTONIO BARBOSA ORTEGA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 5.657.142	\$ 905.200	(CCFC55) EPS CAJACOPI	\$ 5.657.142	\$ 226.300	6,960	\$ 5.657.142	\$ 393.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 5.657.142	\$ 226.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.751.600
CC 91281627	ROQUE MAURICIO MUÑOZ BARRERA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 9.252.750	\$ 1.573.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 9.252.750	\$ 370.200	6,960	\$ 9.252.750	\$ 644.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 9.252.750	\$ 370.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.957.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 22.967.677	\$ 22.967.677	\$ 22.967.677	\$ 22.967.677	\$ 3.767.600	\$ 918.900	\$ 1.598.800	\$ 918.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.204.200	\$ 28.800	\$ 7.233.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



PAGADA 2025-05-21 14:22:32.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM						
Documento	NI 830509276			Dirección	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	7
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO			Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA			Identificación	CC 72162008		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140885236		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ LOPEZ SONIA CAROLINA	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														0	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000	\$ 146.200	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

[illegible]

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-21, 04:09:16 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 78042903
Periodo Cotización 202504 Periodo Servicio 202505

PAGADA 2025-05-21 14:18:26.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM				
Documento	NI 830509276			Dirección	METROPARQUE BODM1-24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3288603
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	SUCURSAL
				Total Afiliados	2
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO			Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA			Identificación	CC 72162008

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1042351345		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CONRADO GOMEZ JAVIER ENRIQUE	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMILAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 728.100	\$ 0	\$ 0	\$ 182.100	\$ 242.800	\$ 184.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte: 2025-05-24, 03:10:31 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

77774049

Periodo Cotización:

abril de 2025

Periodo Servicio:

mayo de 2025

PAGADO 09/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MACROEQUIPOS LAND SAS	Nombre Sucursal	EQUIPOS	Código Sucursal	OP001
Documento	NI901301115	Dirección	CRV 22 #1 - 22 METROPARQUE BOD M1 - 22		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3228603		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA	Identificación	CC 72162008		
Total Afiliados	28	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IVT	Disa AFP	Disa EPS	Disa AFP	Disa EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1038097776	LUIS GUILLERMO TRESPALACIOS ACEVEDO	01	00																0	30	30	30	2	30301	PORVENIR	\$ 2.010.000	\$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.010.000	\$ 80.400	6,960	\$ 2.010.000	\$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.010.000	\$ 80.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 622.300	
CC 1043004442	ANTONIO LUIS CABARCAS MENDOZA	01	00	X															0	10	10	10	2	30301	PORVENIR	\$ 913.333	\$ 148.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 913.333	\$ 36.600	6,960	\$ 913.333	\$ 63.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 913.333	\$ 36.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.000	
CC 1043017263	CESAR ANTONIO CABARCAS MENDOZA	01	00																0	30	30	30	2	30301	PORVENIR	\$ 2.740.000	\$ 438.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.740.000	\$ 109.600	6,960	\$ 2.740.000	\$ 190.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.740.000	\$ 109.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 848.400	
CC 1045235310	JESUS ALBERTO JULIO JIMENEZ	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 2.420.000	\$ 387.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.420.000	\$ 96.800	6,960	\$ 2.420.000	\$ 168.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.420.000	\$ 96.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 749.300	
CC 11075728	DOMINGO EMIGDIO GONZALEZ ALEAN	01	00																0	30	30	30	2	30201	PROTECCION	\$ 2.110.000	\$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.110.000	\$ 84.400	6,960	\$ 2.110.000	\$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.110.000	\$ 84.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.3300	
CC 1143361261	JEIDER ALBERTO AYOLA ORTEGA	01	00																0	30	30	30	2	30301	PORVENIR	\$ 2.010.000	\$ 321.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.010.000	\$ 80.400	6,960	\$ 2.010.000	\$ 139.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.010.000	\$ 80.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 622.300	
CC 1234888624	HUMBERTO JUNIOR ESCORCIA VELASCO	01	00																0	30	30	30	2	30301	PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900	
CC 17952061	JOSE LUIS VILORIA USTARIS	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 2.560.000	\$ 409.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.560.000	\$ 102.400	6,960	\$ 2.560.000	\$ 178.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.560.000	\$ 102.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 792.600	
CC 3738929	ROBINSON FARITH GOENAGA GOENAGA	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 1.730.000	\$ 276.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.730.000	\$ 69.200	6,960	\$ 1.730.000	\$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.730.000	\$ 69.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 535.700	
CC 3821255	JHON CARLOS TROCONIS GOMEZ	01	00																0	28	28	28	2	30301	PORVENIR	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.328.600	\$ 53.200	6,960	\$ 1.328.600	\$ 92.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.500	
CC 3821255	JHON CARLOS TROCONIS GOMEZ	01	00													X			0	2	2	2	2	2	30301	PORVENIR	\$ 94.901	\$ 15.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 94.901	\$ 3.800	0,000	\$ 94.901	\$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 72014572	ALVARO ENRIQUE SILVERA HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	2	30301	PORVENIR	\$ 2.620.000	\$ 419.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.620.000	\$ 104.800	6,960	\$ 2.620.000	\$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.620.000	\$ 104.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 811.200	
CC 72144924	OSCAR DE JESUS PAREDES DURANGO	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 2.640.000	\$ 422.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.640.000	\$ 105.600	6,960	\$ 2.640.000	\$ 183.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.640.000	\$ 105.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 817.400	
CC 72154403	EDGAR JOSE GARCIA MORALES	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 2.620.000	\$ 419.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 2.620.000	\$ 104.800	6,960	\$ 2.620.000	\$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.620.000	\$ 104.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 811.200	
CC 72157900	ROBERTO CARLOS ROMERO FELIZZOLA	01	00																0	30	30	30	2	30301	COLPENSIONES	\$ 2.110.000	\$ 337.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.110.000	\$ 84.400	6,960	\$ 2.110.000	\$ 146.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.110.000	\$ 84.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.3300	
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00																0	25	25	25	2	30201	PROTECCION	\$ 1.441.667	\$ 230.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.441.667	\$ 57.700	6,960	\$ 1.441.667	\$ 100.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.441.667	\$ 57.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.500	
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00													L			0	3	3	3	3	2	30201	PROTECCION	\$ 173.000	\$ 27.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 173.000	\$ 7.000	0,000	\$ 173.000	\$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 173.000	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.700
CC 72166813	LUIS EDUARDO MIZZAR MEZA	01	00													L			0	2	2	2	2	2	30201	PROTECCION	\$ 115.333	\$ 18.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 115.333	\$ 4.700	0,000	\$ 115.333	\$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 115.333	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.900
CC 72193076	DAVIDGOMEZ ARRIETA	01	00	X															0	10	10	10	10	2	30301	PORVENIR	\$ 600.000	\$ 96.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 600.000	\$ 24.000	6,960	\$ 600.000	\$ 41.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 600.000	\$ 24.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.800

Pagado: 09/05/2025				Empresa NI901301115 MACROEQUIPOS LAND SAS										Planilla Nro: 77774049						Periodo Cotización: abril de 2025						Periodo Servicio: mayo de 2025											
II. DETALLE DEL APORTANTE																																					
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	WST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	IBS	Aporte	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total						
CC 72202834	EDINSON ALONSO ABREU BLANCO	01	00														0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.560.000	\$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.560.000	\$ 62.400	6,960	\$ 1.560.000	\$ 108.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.560.000	\$ 62.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.000
CC 72238056	FREDDYS ARMANDO VALDEZ ESCORCIA	01	00														0	29	29	29	(231001) COLFONDOS	\$ 1.672.333	\$ 267.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.672.333	\$ 66.900	6,960	\$ 1.672.333	\$ 116.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.672.333	\$ 66.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.800
CC 72238056	FREDDYS ARMANDO VALDEZ ESCORCIA	01	00										X				0	1	1	1	(231001) COLFONDOS	\$ 57.668	\$ 9.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 57.668	\$ 2.400	0,000	\$ 57.668	\$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.700
CC 72239235	VICTOR MANUEL DIAZ ZABALA	01	00														0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.000	\$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.000	\$ 70.000	6,960	\$ 1.750.000	\$ 121.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.750.000	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800
CC 72241348	HICLES ABEL BALLESTEROS SERNA	01	00														0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 72244084	GASPAR ARAEL CALVO HERRERA	01	00														0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.620.000	\$ 419.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.620.000	\$ 104.800	6,960	\$ 2.620.000	\$ 182.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.620.000	\$ 104.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 811.200
CC 72244085	JOSE DARIO MORENO QUINTERO	01	00														0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.870.000	\$ 459.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.870.000	\$ 114.800	6,960	\$ 2.870.000	\$ 199.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.870.000	\$ 114.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 888.600
CC 72308083	RUBEN LEONIDAS MORENO QUINTERO	01	00														0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.440.000	\$ 390.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.440.000	\$ 97.600	6,960	\$ 2.440.000	\$ 169.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 2.440.000	\$ 97.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 755.500
CC 8568575	MARIO ALBERTO OROZCO BUSTILLO	01	00														0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.635.200	\$ 261.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.635.200	\$ 65.500	6,960	\$ 1.635.200	\$ 113.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.635.200	\$ 65.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.600
CC 8729191	LUIS CARLOS MOLINA BROCHERO	01	00														0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.050.000	\$ 488.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.050.000	\$ 122.000	6,960	\$ 3.050.000	\$ 212.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 3.050.000	\$ 122.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 944.300
CC 8742576	LUIS ALBERTO CHING CACERES	01	00														0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	\$ 422.000	\$ 67.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 422.000	\$ 16.900	6,960	\$ 422.000	\$ 29.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 422.000	\$ 16.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.800
CC 8742576	LUIS ALBERTO CHING CACERES	01	00												X		0	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.688.000	\$ 270.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.688.000	\$ 67.600	0,000	\$ 1.688.000	\$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.688.000	\$ 67.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.300
CC 92250208	JADER JOSE VITAL ACOSTA	01	00														0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.730.000	\$ 276.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.730.000	\$ 69.200	6,960	\$ 1.730.000	\$ 120.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.730.000	\$ 69.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 535.700
PT 5680432	TOMAS ALFONZO SARABIA FLORES	01	00	X													0	24	24	24	(230301) PORVENIR	\$ 1.138.800	\$ 182.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.138.800	\$ 45.600	6,960	\$ 1.138.800	\$ 79.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$ 1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 352.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 55.717.835	\$ 55.717.835	\$ 55.717.835	\$ 55.565.266	\$ 8.915.500	\$ 2.229.500	\$ 3.731.000	\$ 2.223.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.099.300	\$ 22.800	\$ 17.122.100

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL 01		
Documento	NI901893943	Dirección	CR 53 #110 BC - 00 BC EMPRESARIAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3853677
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA	Identificación	CC 72162008
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1043028148	MARIANELA TORREGROZA CHARRIS	59	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 178.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.900	\$ 2.500	\$ 507.400



enlace

operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-20, 01:56:21 PM

Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 77358726

Periodo Cotización: marzo de 2025

Periodo Servicio: marzo de 2025

PAGADO 23/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TICOM	Nombre Sucursal	OFICINAS BQUILLA	Código Sucursal	AD001
Documento	NI830509276	Dirección	METROPARQUE BODM1-24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3288603		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal	VECINO VILLAREAL JOSEMARIA MARIA	Identificación	CC 72162008		
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	VSP	COB	SLM	IGE	IGA	VAC	AVP	VCT	IRP	Disa AFP	Disa EPS	Disa ARP	Disa CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1043028148	MARIANELA TORREGROZA CHARRIS	59	00	X															0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 178.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes IC BF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.900	\$ 800	\$ 505.700

ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565679537	9487583278	E	2025/06/06	2025/06/19	BANCOLOMBIA	13	\$3,880,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (4 Afiliados)					\$12,427,000	\$1,988,400			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$865,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: REPELON (4 Afiliados)					\$12,427,000	\$1,988,400			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$865,000		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)					\$12,427,000	\$1,988,400			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$865,000		\$0	\$0
1	CC 72008065	ARELLANA IVAN	231001	30	\$2,352,000	\$376,400	EPS005	30	\$2,352,000	\$94,100	CCF06	30	\$2,352,000	\$94,100	14-11	30	\$2,352,000	\$163,700	30	\$0	\$0
2	CC 1143443933	CONTRERAS MARIA	231001	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF06	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$160,100	30	\$0	\$0
3	CC 10766786	LEPESQUEUR ALFREDO	230301	30	\$3,625,000	\$580,000	EPS002	30	\$3,625,000	\$145,000	CCF06	30	\$3,625,000	\$145,000	14-11	30	\$3,625,000	\$252,300	30	\$0	\$0
4	CC 85458051	PEREZ RICARDO	230301	30	\$4,150,000	\$664,000	EPS037	30	\$4,150,000	\$166,000	CCF06	30	\$4,150,000	\$166,000	14-11	30	\$4,150,000	\$288,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$12,427,000	\$1,988,400			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$497,100			\$12,427,000	\$865,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901901819	1	CONSORCIO LURUACO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 6 # 65-24 OFICINA 330	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7819817	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1565679537	9487583278	E	2025/06/06	2025/06/19	BANCOLOMBIA	13	\$3,880,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,988,400	\$16,800	\$0	\$2,005,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$744,400	\$6,300	\$0	\$750,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$1,244,000	\$10,500	\$0	\$1,254,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$865,000	\$7,300	\$0	\$872,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$865,000	\$7,300	\$0	\$872,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$497,100	\$4,200	\$0	\$501,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	\$497,100	\$4,200	\$0	\$501,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	\$497,100	\$4,300	\$0	\$501,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$92,000	\$800	\$0	\$92,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$166,000	\$1,400	\$0	\$167,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$145,000	\$1,300	\$0	\$146,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$94,100	\$800	\$0	\$94,900	
TOTAL				4	\$3,847,600	\$32,600	\$0	\$3,880,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72197203		BERRIO ARRIETA RICARDO ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 b n 13 - 73	GALAPA-ATLANTICO	3013182279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-04	85224113		9485224113	I	2025/05/05	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	\$453,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
1	CC 72197203	BERRIO RICARDO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72197203		BERRIO ARRIETA RICARDO ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 b n 13 - 73	GALAPA-ATLANTICO	3013182279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	85224113	9485224113	I	2025/05/05	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	44	\$453,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$6,600	\$0	\$234,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$6,600	\$0	\$234,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$1,000	\$0	\$35,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$1,000	\$0	\$35,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$5,100	\$0	\$183,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$5,100	\$0	\$183,100	
TOTAL				1	\$440,500	\$12,700	\$0	\$453,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 72197203		BERRIO ARRIETA RICARDO ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 b n 13 - 73	GALAPA-ATLANTICO	3013182279	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	87565436	9487565436	I	2025/06/04	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	14	\$444,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	
1	CC	72197203	BERRIO RICARDO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72197203		BERRIO ARRIETA RICARDO ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 b n 13 - 73	GALAPA-ATLANTICO	3013182279	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	87565436	9487565436	I	2025/06/04	2025/06/18	BANCO AV VILLAS	14	\$444,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$2,100	\$0	\$229,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$2,100	\$0	\$229,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$400	\$0	\$35,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$400	\$0	\$35,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,700	\$0	\$179,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$1,700	\$0	\$179,700	
TOTAL				1	\$440,500	\$4,200	\$0	\$444,700	

ANEXO 6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO LURUACO		Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025								
FECHA: 10/05/2025										RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA CONTRERAS										
LUGAR:		REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO																		
PROYECTO:																				
SEMANA DEL 5 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2025		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X				X				X		No se han reportado eventualidades	
¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X				X					X			X		
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	x			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	x			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	x			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	x			X			X			X			X			X			
¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	x			X			X			X			X			X				

Firma del contratista Kelly Flores

CC: Firma del Inspector HSE [Firma]

Fecha: 04/04/2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

El Consorcio Alianza Ambiental demuestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, implementando prácticas efectivas que incluyen:

1. Realizar inspecciones regulares de seguridad en el lugar de trabajo.
2. Implementar un sistema de reporte de incidentes y accidentes.
3. Proporcionar capacitación continua en primeros auxilios y respuesta a emergencias
4. Fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo.
5. Realizar evaluaciones de riesgos y implementar medidas de control.
6. Garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad y salud laboral
7. Promover la participación activa de los trabajadores en la identificación y solución de problemas de seguridad y salud

Estas recomendaciones pueden ayudar a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo en el Consorcio Alianza Ambiental

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST		CONSORCIO LURUACO		Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025												
FECHA: 17/05/2025		RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA CONTRERAS														
LUGAR:																
PROYECTO:		REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO														
SEMANA DEL 12 AL 17 DE MAYO 2025		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES:		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X		
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X		
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X		
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X		
	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X		
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X		
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X		
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X		
	¿Existe un documentos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X		
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X		
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X		
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X		
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?		X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?		X			X			X			X			X	
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X		
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X		
EPP	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?		X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X		
INSPECCIONES	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?		X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X		
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X		
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X		
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X		
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X		
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X		
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X		
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados?	X			X			X			X			X		
Firma del contratista <u>Kelly Flores</u> CC: _____		Firma del Inspector HSE _____ Fecha 17/05/2025														
El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.																
OBSERVACIONES GENERALES: El Consorcio Alianza Ambiental demuestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud laboral mediante la implementación efectiva de un sistema de gestión integral, que incluye: Documentación precisa de procedimientos preoperacionales y Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) Protección Personal (EPP) Capacitación y concientización continua para los trabajadores Esto refleja la prioridad que otorga el Consorcio a la protección de sus empleados, recordando que la seguridad e nuestros trabajadores es prioridad para todos																

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO LURUACO			Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025												
FECHA: 24/05/2025										RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA CONTRERAS															
LUGAR:		REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO																							
PROYECTO:																									
SEMANA DEL 19 AL 24 DE MAYO 2025										LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES:			
										SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		SI	NO	NA
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X								X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X								X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X								X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X								X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X								X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X								X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X								X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X								X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?								X							X						X			
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?								X							X						X			
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X								X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X								X			X			X			X			X			
EPP	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?								X							X						X			
	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X								X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?								X						X							X			
INSPECCIONES	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X								X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X								X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X								X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X								X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X								X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados	X								X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas Informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X								X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flores

CC: Firma del Inspector HSE [Firma]

Fecha: 24/05/2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

El Consorcio Alianza Ambiental muestra un sólido compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, implementando medidas efectivas como: Capacitación continua para trabajadores, Uso correcto de EPP, Documentación precisa de procedimientos y AST Esto, demuestra su prioridad por la protección y bienestar laboral, recordando el orden y el aseo para un ambiente saludable y uso constante de mascarilla así evitamos la enfermedades

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO LURUACO		Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025								
FECHA: 31/05/2025										RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA CONTRERAS										
LUGAR:		REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO																		
PROYECTO:																				
SEMANA DEL 26 AL 31 DE MAYO 2025		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades	
¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X		
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flores

CC: Firma del Inspector HSE [Firma]

Fecha: 31/05/2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

I Consorcio Alianza Ambiental destaca por su compromiso con la seguridad y salud laboral, evidenciado a través de:

- Capacitación y formación continua para trabajadores
- Implementación efectiva de protocolos de seguridad

Esto refleja su dedicación a proteger la integridad y bienestar de su equipo.

documentación precisa

Uso adecuado de EPP y

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO LURUACO			Código - F - 1 Versión: 01 Fecha aprobación: 15/01/2025							
FECHA: 7/06/2025										RESPONSABLE: MARIA ALEJANDRA CONTRERAS										
LUGAR:		REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO																		
PROYECTO:																				
SEMANA DEL 2 AL 7 DE JUNIO 2025		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha sociabilizado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documentos para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documentos para la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencias las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral ?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades	
¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X		
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?			X			X			X			X			X			X	No se han reportado eventualidades
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?			X			X			X			X			X			X	
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puesto de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamento se encuentran debidamente señalizados y organizados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			

Firma del contratista Kelly Flores

CC: Firma del Inspector HSE [Firma]

Fecha: 6/06/2025

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

El Consorcio Alianza Ambiental demuestra un fuerte compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, implementando prácticas efectivas que incluyen:
 - Capacitación continua para trabajadores
 - Uso adecuado de EPP Y mascarilla respiratoria
 - Documentación precisa y AST es cada actividad realizada
 Esto muestra su prioridad por la protección y bienestar de su equipo ya que para nosotros es importante

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

INFORME MENSUAL No. 03

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL DE OBRA No. 3

DEL 07 MAYO DE 2025 AL 06 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 492 DE 2024:

**“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS
AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”**

Contratista:

CONSORCIO ALINZA AMBIENTAL.

Interventoría:

CONSORCIO LURUACO

Contratante:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTTICO - C.R.A

Supervisor:

Arq. Wladimir Orozco

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO	3
2.1. Localización General	3
2.2. Localización Especifica	4
3. ADECUACION DE AREAS	5
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.....	5
4.1. INDUCCION AL PERSONAL	5
4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6
4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.....	11
5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL	12
5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO.....	12
6. INSPECCIONES PLANEADAS	12
7. REPORTE Y ESTADISTICAS	20
8. CONCLUSIONES	23

1. OBJETIVOS

Establecer los requerimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como complemento para las actividades de mejoramiento del contrato de obra N° 492 “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DEL LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. En procesos, permitiendo desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes, permitiendo incrementar la salud física, mental, social del trabajador y conservación del medio ambiente.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. Localización General

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Atlántico, en los municipios de Luruaco, Repelón y Manatí.



Ilustración 1 Localización general del proyecto

2.2. Localización Específica

El proyecto comprende de manera específica a los arroyos Negro y Limón en el municipio de Luruaco. El caño de Villa Rosa, corregimiento de Villa Rosa, municipio de Repelón y el caño El Porvenir, corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), municipio de Manatí.

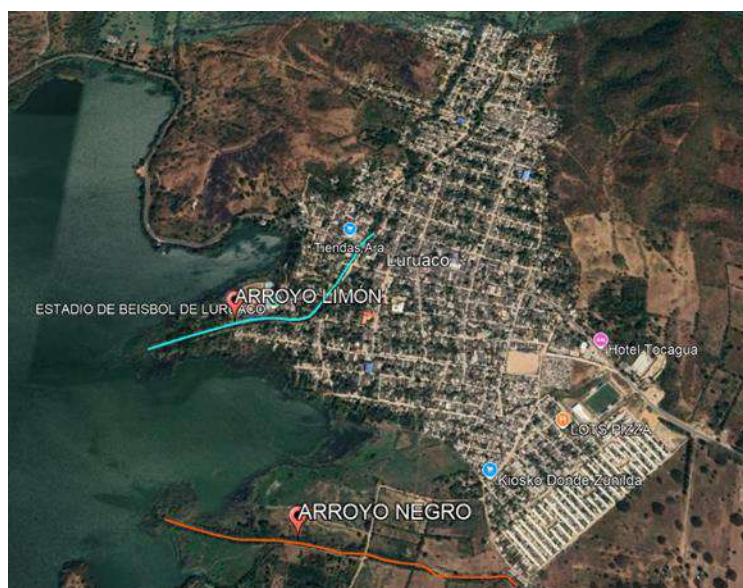


Ilustración 2 Localización arroyo Negro y arroyo Limón, municipio de Luruaco.



Ilustración 3 Localización caño de Villa Rosa, Corregimiento de Villa Rosa, Repelón y caño El Porvenir, Corregimiento de El Porvenir (Las Compuertas), Manatí

3. ADECUACION DE AREAS

Se cuenta en el campamento temporal de la obra en el frente que se está interviniendo del caño villa rosa, en el cual se instaló un kit de emergencia (botiquín, extintor y camilla), un kit antiderrame y un punto ecológico acorde a las necesidades de la obra.

Se cuenta con punto de hidratación para el personal



Ilustración 4 Campamento temporal en el frente arroyo negro

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo 07 mayo al 06 de junio del 2025, se realizaron las siguientes actividades en pro del bienestar laboral y manteniendo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

4.1. INDUCCION AL PERSONAL

Durante el periodo del 07 mayo al 06 de junio del 2025, se llevó a cabo la inducción tanto al personal directo como subcontractistas. Se relacionan de la siguiente manera:

Listado del personal que realizó la inducción

Tabla 1 Consorcio Alianza Ambiental

Nombre	Cedula	Genero	Cargo	Dirección	Fecha de ingreso
Yesica Pino	102095293	F	Servicio General	Repelón	07-05-2025
Luis Ching	8742576	M	Conductor	Barranquilla	09-05-2025
Rosa Castro	22598664	F	Servicio General	Repelón	20-05-2025

Se adjuntan los registros de inducción

4.2. CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se siguen llevando Durante el periodo del 07 mayo al 06 de junio del 2025, las charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental, con la participación de todos los trabajadores directos y subcontratista, generando la cultura de autocuidado y concienciación en la prevención ambiental.

Se da cumplimiento al cronograma de charlas y capacitación establecido dentro de las instalaciones del campamento a todo el personal, con el objetivo en la prevención de accidentes labores y enfermedades derivadas de sus actividades fortaleciendo las costumbres, hábitos y la cultura de seguridad en la ejecución de la obra. Donde recordamos el autocuidado y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, temas ambientales y sociales.

Se dictaron un total de 24 charlas a todo el personal.

Tabla 2 Listado de charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha	Tema	Responsable
07/05/2025	Prohibido la tala de árboles	Sonia González
08/05/2025	Prevención lesiones en la columna	Kelly Flórez
09/05/2025	Medidas para la protección y conservación de hábitat	Sonia González
10/05/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Flórez
12/05/2025	Importancia de separar los residuos sólidos	Sonia González

13/05/2025	Autoreportes de actos y condiciones inseguras	Kelly Flórez
14/05/2025	Para que son las canecas negras, blancas y verdes	Sonia González
15/05/2025	La importancia del ATS	Kelly Flórez
16/05/2025	Identificación de peligro y evaluación del riesgo	Kelly Flórez
17/05/2025	Manejo y disposición final de los residuos líquidos	Sonia González
19/05/2025	Cuando es un accidente de trabajo	Kelly Flórez
20/05/2025	Manejo y prevención del estrés en el trabajo	Kelly Flórez
21/05/2025	Velocidad moderada	Kelly Flórez
23/05/2025	Agotamiento por calor	Kelly Flórez
24/05/2025	No utilizar bocinas, pitos, durante la ejecución de las actividades	Kelly Flórez
26/05/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Flórez
27/05/2025	Enfermedades de transmisión sexual	Kelly Flórez
28/05/2025	Cuáles son los tipos de suelo	Sonia González
29/05/2025	Autocuidado	Kelly Flórez
30/05/2025	Como identificar fauna en campo.	Sonia González
31/05/2025	Peatones en la vía	Kelly Flórez
03/06/2025	Importancia del kits de emergencia (botiquín, camilla, extintor)	Kelly Flórez
04/06/2025	Código de los colores de las canecas	Sonia González
05/06/2025	Prohibido la caza de animales	Sonia González





CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

INFORME MANUAL No. 03





Ilustración 5 Charlas de seguridad y salud en el trabajo

Se adjuntan los registros de las charlas

Tabla 3 Listado de capacitaciones

Fecha	Tema	Responsable
22/05/2025	Riesgo biomecánico	Kelly Flórez
06/06/2025	Primeros auxilios, evacuación	Kelly Flórez



Ilustración 6 Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo

Se adjuntan registros de actividad de formación.

4.3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el periodo del 07 mayo al 06 de junio del 2025, el personal hace buen uso de los EPP que se les entrega para llevar a cabo las actividades diarias asignadas de manera segura cuidando siempre del bienestar de los trabajadores en cumplimiento con la normatividad legal vigente, esto con la finalidad de prevenir cualquier incidente o accidente de trabajo.

Los EPP utilizados en obra por el personal son:

- Casco de seguridad
- Guantes de nitrilo según lo amerite
- Gafas de seguridad
- Tapa bocas según lo amerite
- Protectores auditivos según lo amerite

5. PERMISOS DE TRABAJO GENERAL

Se siguen llevando del 07 mayo al 06 de junio del 2025 a cabo las actividades de topografía, limpieza y adecuación de terreno, excavación con retro excavadoras en obra, cargue y descargue de material, actas de vecindad, atención a la comunidad entre muchas otras, se realiza la apertura de AST para todas las áreas.

5.1. ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Durante el periodo del 07 mayo al 06 de junio del 2025 el personal tanto directo como subcontratista sigue realizando el diligenciamiento del análisis seguro de trabajo; esto se lleva a cabo todos los días antes de iniciar las actividades propios de cada trabajador, esto se realiza de manera preventiva y así cada miembro este consciente de cuáles son sus riesgos de las tareas asignadas y sus controles operacionales.

Se adjuntan los registros de los AST



Ilustración 8. Diligenciamiento AST

6. INSPECCIONES PLANEADAS

Durante el periodo del 07 mayo al 06 de junio del 2025, se siguen llevando a cabo mensualmente las inspecciones programadas en todas las áreas de la obra teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo debido a las actividades que se desarrollan en el avance de la obra, esto es ejecutado por el supervisor SST con la finalidad de identificar de acuerdo a los resultados obtenidos los controles operacionales a implementar para un ambiente seguro. En estas inspecciones se tienen en cuenta el estado

de los equipos, kit de emergencia, estado de los EPP, punto ecológico, orden y aseo entre otros factores posibles de encontrar.

Dentro de las inspecciones mensuales tenemos:

- **Inspección kit de emergencia (botiquín, camilla y extintores)**

Durante el periodo del 7 de mayo al 6 de junio del 2025, se llevó a cabo las inspecciones planeadas del kit de emergencia de los centros de trabajo donde se estén llevando las actividades evidenciado así el buen estado de los insumos camilla, botiquín y extintor.

Se cuenta con unos puntos emergencia en los diferentes frentes de trabajo y señalizado, las inspecciones se llevan a cabo mensualmente y así revisar su estado actual con fin de mantener siempre el suministro eficiente y con la dotación requerida para dar respuesta inmediata en caso de un evento y/o emergencia. Se adjunta registro inspección de camilla, botiquín y extintor.

- La inspección al botiquín tipo moral ubicado en la obra se encuentra dotado y con fechas vigentes para su uso.
- La inspección a la camilla se evidencia que se encuentra en buen estado en caso de presentarse una emergencia.
- La inspección del extintor evidencia que se está en buen estado y su fecha está vigente para su uso en caso de presentarse una emergencia.



Ilustración 9. Inspección kit de emergencia camilla, extintor y botiquín

Se adjuntan los registros de las inspecciones de botiquín, camilla y extintor

- Inspección kit antiderrame

En el periodo se cuenta con un kit antiderrame para atender las emergencias que se puedan presentar con derrames de sustancias peligrosas y así mitigar cualquier impacto ambiental, esta inspección se llevara a cabo de manera mensual por parte del supervisor SST de la obra.



Ilustración 7 Inspección kit antiderrame

Se adjuntan inspección de kit antiderrame.

- Inspección punto ecológico

Se sigue realizando las inspecciones de manera mensual a los puntos ecológicos que se encuentran en los diferentes frentes de la obra señalizados y distribuidos de la siguiente manera; 1 caneca blanca para la recolección de residuos aprovechables, 1 caneca negra para recolección de residuos no aprovechables y 1 caneca verdes para la recolección de los residuos ordinarios se encuentran en buen estado.

Se adjunta inspección de puntos ecológicos.





Ilustración 8 Inspección punto ecológico

- Inspección al estado y uso de los EPP

Durante el periodo del 07 de mayo al 06 de junio del 2025, se siguen llevando a cabo las inspecciones del estado y uso de los EPP a todo el personal propio como subcontratista para garantizar que todos los trabajadores cuenten con un elemento de protección personal en buen estado y apropiado por la labor, realizamos inspecciones donde identificamos el buen uso de estos elementos y la necesidad de una reposición/cambio de EPP a los trabajadores.



Ilustración 9 Registro fotografico de inspeccion del uso y estado de EPP

Se adjunta registro de inspección de EPP.

- **Inspección de orden y aseo**

Se siguen llevando a cabo jornadas de orden y aseo del periodo del 07 de mayo al 06 de junio del 2025, en las áreas intervenidas el cual es realizado por personal directo para prevenir incidentes y/o accidentes laborales, y así garantizar que el personal realice sus actividades en un ambiente que genere seguridad, se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de los residuos que se generen de las diferentes actividades, se cuenta con baños dentro las instalaciones con un buen aseo y orden para el uso del personal.

Se adjunta registro de inspección de orden y aseo.



Ilustración 10 Inspección orden y aseo

- **Inspección detallada vehículos y maquinaria**

Se lleva a cabo durante el periodo del 07 de mayo al 06 de junio del 2025, las inspecciones a los equipos y maquinaria que ejecutan actividades en la obra de manera mensual, el personal de seguridad revisa los pre operacionales que se diligencian diariamente por parte del personal de los conductores y operadores antes de iniciar con sus labores y así verificar que se encuentran en buen estado para el desarrollo de las actividades, se revisa si los equipos cuentan con los insumos de botiquín y extintor.

Se adjuntan pre operacionales e inspecciones detalladas de vehículos y maquinarias





Ilustración 11 Inspección detallada de vehículos y maquinaria

Se ejecutaron una total de 9 inspecciones durante el periodo de la ejecución de la obra, esto con el objetivo de evidenciar que se están cumpliendo con normas de seguridad establecida en la obra.

Tabla 4 Cronograma de inspecciones

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MAY			
	P	E	CE	CM
Inspeccion a extintores	1	1		
Inspeccion de Botiquin	1	1		
Inspeccion de camillas	1	1		
Inspeccion al estado de uso y Epp	1	1		
Inspeccion area de proyecto (Seguridad, orden y limpieza)	1	1		
Inspeccion punto ecologico	1	1		
Inspeccion kit antiderrame	1	1		
Observacion inspecciones planeadas	1	1		
Inspeccion detallada de equipos	1	1		
SUBTOTAL	9	9	0	0
TOTAL	100%			

7. REPORTE Y ESTADISTICAS

Durante el desarrollo del periodo del 07 de mayo al 06 de junio del 2025, de la obra no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, los trabajadores conocen la importancia que tiene el reporte de incidentes, por cuanto nos permite tomar medidas correctivas y preventivas, y así mejorar los controles operacionales eliminando los peligros y riesgos sobre las actividades críticas.

A la fecha no se han presentado accidentes laborales

Se formulan los siguientes indicadores:

Tabla 5 Indicadores de accidentabilidad

Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	$ISAT = (N^{\circ} \text{ Días perdidos y cargados por A.T en el periodo} / N \text{ HHT}) \times K$
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	$ILIAT = (IFIAT \times ISAT) / 1000$
Índice de Frecuencia de Incidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de I.T registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000).	$IFIT = (N^{\circ} \text{ Total de I.T.} / N^{\circ} \text{ HHT mensuales}) \times K$

Caracterización de accidentabilidad

Tabla 6 Tabla de indicadores

TABLA DE INDICADORES 2025									
MES	AREA	# DE EMPLEADOS	# DE AT	HHT	# DIAS AUSENCIA	TASA	IF	IS	ILI
Marzo	operativa	8	0	1,536	0	0,00%	0	0	0-
Abril	operativa	8	0	1,536	0	0,00%	0	0	0-
Mayo	operativa	8	0	1,536	0	0,00%	0	0	0-

Tabla 7 Indicador personal

COMPORTAMIENTO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL 2025	
	MAYO
PERSONAL	8
HORAS EXTRAS	0.0
TOTAL PERSONAL	9

Tabla 8 Horas hombre

COMPORTAMIENTO DIAS Y HORAS HOMBRES TRABAJADAS DURANTE EL 2025	
	MAYO
DÍAS HÁBILES MES	26
HORAS ORDINARIAS DÍA	8
DIAS HOMBRES TRABAJADAS	208
HORAS HOMBRES TRABAJADAS	1,664

Tabla 9 Ausentismo

COMPORTAMIENTO DE INCAPACIDADES Y DÍAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL DURANTE EL 2025	
	MAYO
No. INCAPACIDADES POR EG	0
DÍAS DE AUSENTISMO POR EG	0
HORAS DE AUSENTISMOS	0
AUSENTISMO POR EG	0.00%
TASA DE AUSENTISMO POR EG	0.00%


Se sigue manteniendo la meta del indicador establecida.

Indicador programa de capacitación

Tabla 10 Indicador programa de capacitación

Nombre del indicador	Formula	Periodicidad	Meta
Indicador Cumplimiento	$\frac{\# \text{ de Cap Porgramadas}}{\# \text{ de Cap Ejecutadas}} \times 100$	Trimestral	80%
Indicador Cobertura	$\frac{\# \text{ de asistentes a capacitación}}{\# \text{ total de trabajadores programados}} \times 100$	Trimestral	100%
Indicador Eficacia (las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones pueden ser: actividades, examen, supervision, talleres)	$\frac{\# \text{ trabajadores evaluados}}{\# \text{ de evaluaciones eficaces}} \times 100$	Trimestral	70%

INDICADOR		RESULTADO
# de Cap programada /	5	100%
# de Cap ejecutada X 100%	5	

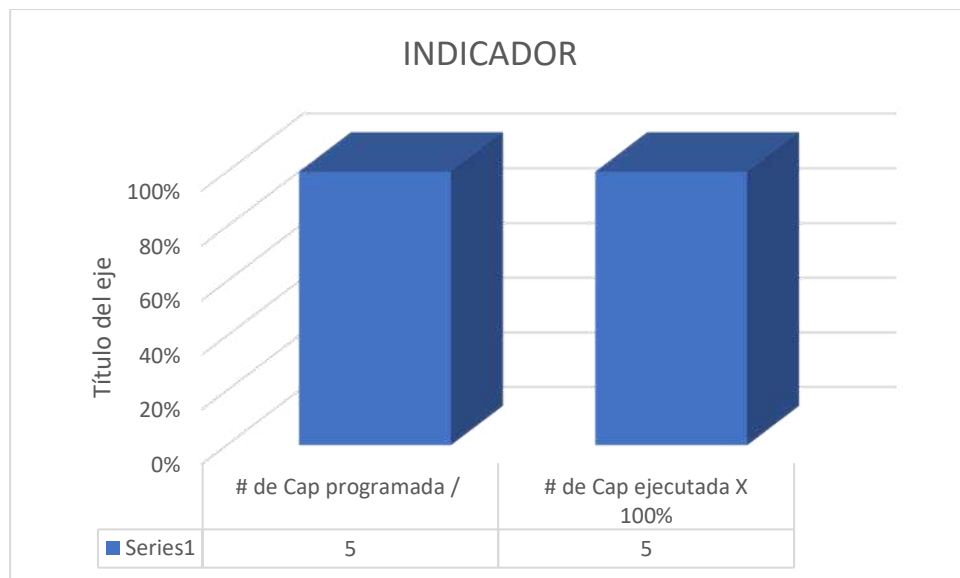

8. CONCLUSIONES

A la fecha el proyecto ha venido cumpliendo con el sistema de seguridad y salud en el trabajo manteniendo un buen desarrollo laboral y la prevención de accidentabilidad, cumpliendo así con lo programado por cada programa.

ANEXOS

ANEXO

INDUCCION



FORMATO DE INDUCCION

Versión No: 4

Fecha de Versión:

Junio 5/2014

Página 1 de 1

INDUCCIÓN: ☒

REINDUCCIÓN: ☐

NOMBRE: WIS ching

CARGO A DESEMPEÑAR/DO: Conductor

AREA/PROCESO/PROYECTO: CAA

FECHA: 9/05/2025

No	TEMA	SI
1	Generalidades de la empresa: Reseña histórica, Misión, Visión, Valores, Organigrama de la empresa y proyecto (si aplica), Descripción de los servicios, Políticas y objetivos organizacionales, Introducción a los sistemas de gestión de la organización.	X
2	Reglamento Interno de trabajo, de higiene y Seguridad Industrial	X
3	Aspectos legales	X
4	Copasst y comité de convivencia	X
5	Manual de Funciones, Responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad del Cargo.	X
6	Procesos y procedimientos en los cuales es responsable el cargo o es participe.	X
7	Peligros y riesgos asociados al cargo y controles operacionales relacionados. (Normas y procedimientos).	X
8	Aspectos e impactos ambientales del proceso al cual aplica el cargo, normas, planes y procedimientos asociados con los aspectos.	X
9	Planes y Procedimientos de atención y respuesta ante emergencias.	X
10	Otros aspectos de acuerdo con las necesidades del cargo.	

Expreso mi aprobación a voluntad propia y sin presión alguna, para que TICOM S.A. afirme y realice lo siguiente:

1	Acepto los temas anteriormente impartidos, los entiendo y asumo el compromiso de cumplirlos, de igual manera con todas las normas que TICOM S.A. implemente para la protección laboral y del ambiente en la ejecución de las actividades
2	Autorizo a TICOM S.A. a levantar un registro fotográfico y/o videográfico donde aparezca mi persona; basado en comportamientos y/o condiciones sub estándares; con el fin de tomar las medidas correctivas o preventivas para evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o incidentes ambientales
3	Me comprometo a participar en todas las campañas de promoción, prevención y control de la salud laboral en las que TICOM S.A. me participe (vacunación, evaluaciones médicas ocupacionales, alcoholemias, pruebas toxicológicas, etc)

WIS ching

Firma Nuevo Trabajador

Delly Florez

Firma del Facilitador

OK

Firma Recursos Humanos

INDUCCION



RE INDUCCION



NOMBRE: Wiro cheng
 CC: 8742576 FECHA: 9/05/2025
 CARGO: Conductor PROYECTO: CAA

1. Qué significa TICOM S.A

*Transporte ingeniería construcción
y maquinaria*

3. Señale con una X cuales son las políticas de TICOM S.A.

1. Política integral. ✓
2. Política de gestión de residuos.
3. política para la prevención del acoso laboral. ✓
4. política para la innovación.
5. política para la prevención del riesgo vehicular. ✓
6. política para la prevención del consumo del alcohol, tabaco y drogas. ✓

4. Señale con una X cuales son los programas existentes en TICOM SA

1. Programa prevención y protección contra caída ✓
2. Programa de EPP ✓
3. Programa de riesgo vehicular. ✓
4. Programa de comunicación
5. Programa riesgo químico. ✓
6. Programa de PVE ✓
7. Programas de gestión ambiental ✓
8. Programa de prevención en lesiones en mano. ✓

5. Señale cuál de estas son actividades de las que se encarga el Copasst

- Investigar los accidentes de trabajo.
- Realizar inspecciones de seguridad a los ambientes, maquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas de prevención.
- Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud ocupacional y estudiar las sugerencias que presentan los empleados en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
- Todas las anteriores

2. Señale con una X los actos inseguros y en un círculo las condiciones inseguras

6. Señale cuál de estas son actividades de las que se encarga El comité de convivencia

- Recibir quejas y darles trámites.
- Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.
- Crear los espacios de diálogos para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias
- SUGERIR. A la alta dirección medidas preventivas y correctivas
- Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones.
- Todas las anteriores

7. Señale con una X los elementos de protección personal a utilizar en su trabajo



8. Escriba los puntos de encuentro a la hora de una emergencia que se llegara a presentar en su sitio de trabajo.

9. Señale con una X cuales de estos permisos y/o procedimientos son aplicables a sus actividades dentro de la empresa:

- ☐ Permiso para trabajo seguro en alturas
- ☐ Permiso para trabajo en caliente
- ☐ Permiso para excavaciones
- ☒ Realizar pre operaciones a equipos y herramientas
- ☒ Realizar análisis seguro de trabajo (AST)

10. Mencione dos impactos ambientales en su actividad

- Contaminación suelo
- Contaminación aire

11. Qué tipos de residuos debería ir en las canecas.

Blanco

Para depositar los residuos aprovechables limpios y secos como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón

Verde

Para depositar los residuos no aprovechables, por ejemplo, papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Negro

para depositar residuos orgánicos aprovechables, por ejemplo, restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín etc.

12. A qué peligro y riesgos está asociado a su cargo.

Declaro que he recibido la inducción, conozco el oficio para la cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal ya cumplir con las normas de seguridad que me han sido informales.

Wis ching

FIRMA DEL TRABAJADOR

Relly Florez

FIRMA DEL CALIFICADOR

INDUCCIÓN: ☒
REINDUCCIÓN: ☐
NOMBRE: *Rosa Castro*
CARGO A DESEMPEÑAR/DO: *Servicio General*
AREA/PROCESO/PROYECTO: *CAA*
FECHA: *20/05/2025*

No	TEMA	SI
1	Generalidades de la empresa: Reseña histórica, Misión, Visión, Valores, Organigrama de la empresa y proyecto (si aplica), Descripción de los servicios, Políticas y objetivos organizacionales, Introducción a los sistemas de gestión de la organización.	☒
2	Reglamento Interno de trabajo, de higiene y Seguridad Industrial	☒
3	Aspectos legales	☒
4	Copasst y comité de convivencia	☒
5	Manual de Funciones, Responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad del Cargo.	☒
6	Procesos y procedimientos en los cuales es responsable el cargo o es participe.	☒
7	Peligros y riesgos asociados al cargo y controles operacionales relacionados. (Normas y procedimientos).	☒
8	Aspectos e impactos ambientales del proceso al cual aplica el cargo, normas, planes y procedimientos asociados con los aspectos.	☒
9	Planes y Procedimientos de atención y respuesta ante emergencias.	☒
10	Otros aspectos de acuerdo con las necesidades del cargo.	☒

Expreso mi aprobación a voluntad propia y sin presión alguna, para que TICOM S.A. afirme y realice lo siguiente:

1	Acepto los temas anteriormente impartidos, los entiendo y asumo el compromiso de cumplirlos, de igual manera con todas las normas que TICOM S.A. implemente para la protección laboral y del ambiente en la ejecución de las actividades
2	Autorizo a TICOM S.A. a levantar un registro fotográfico y/o videográfico donde aparezca mi persona; basado en comportamientos y/o condiciones sub estándares; con el fin de tomar las medidas correctivas o preventivas para evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o incidentes ambientales
3	Me comprometo a participar en todas las campañas de promoción, prevención y control de la salud laboral en las que TICOM S.A. me participe (vacunación, evaluaciones médicas ocupacionales, alcoholemias, pruebas toxicológicas, etc)

Rosa Castro
Firma Nuevo Trabajador
Helly Flores
Firma del Facilitador
OK
Firma Recursos Humanos



TICOM S.A.
SOLUCIONES COMPLETAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TEL: 830 509 2763

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y RE-INDUCCION

Versión No: 7

Fecha de versión:
Agosto 10/2021

Página 1 de 1

INDUCCION



RE INDUCCION



NOMBRE:

Rosa Castro

CC:

22598664

FECHA:

20/05/2025

CARGO:

Servicio General


PROYECTO:

CAA

1. Qué significa TICOM S.A

transporte ingeniería construcción maquinaria

2. Señale con una X los actos inseguros y en un círculo las condiciones inseguras

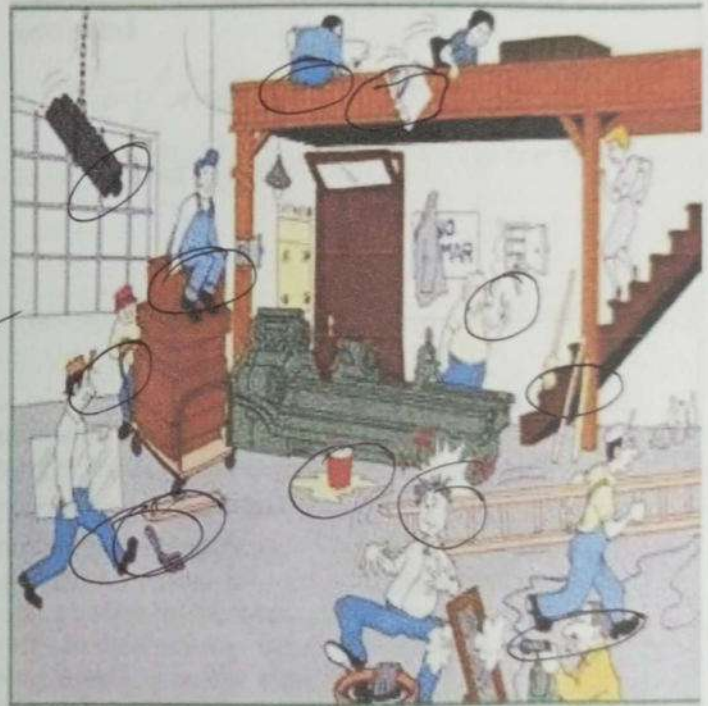

3. Señale con una X cuales son las políticas de TICOM S.A.

1. Política integral. ☒
2. Política de gestión de residuos. ☒
3. política para la prevención del acoso laboral. ☒
4. política para la innovación. ☒
5. política para la prevención del riesgo vehicular. ☒
6. política para la prevención del consumo del alcohol, tabaco y drogas. ☒

4. Señale con una X cuales son los programas existentes en TICOM SA

1. Programa prevención y protección contra caída ☒
2. Programa de EPP ☒
3. Programa de riesgo vehicular. ☒
4. Programa de comunicación ☒
5. Programa riesgo químico. ☒
6. Programa de PVE ☒
7. Programas de gestión ambiental ☒
8. Programa de prevención en lesiones en mano. ☒

6. Señale cuál de estas son actividades de las que se encarga El comité de convivencia

- o Recibir quejas y darles trámites.
- o Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.
- o Crear los espacios de diálogos para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias
- o SUGERIR. A la alta dirección medidas preventivas y correctivas
- o Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones.
- ☒ Todas las anteriores

5. Señale cuál de estas son actividades de las que se encarga el Copasst

- o Investigar los accidentes de trabajo.
- o Realizar inspecciones de seguridad a los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas de prevención.
- o Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud ocupacional y estudiar las sugerencias que presentan los empleados en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
- ☒ Todas las anteriores

7. Señale con una X los elementos de protección personal a utilizar en su trabajo



8. Escriba los puntos de encuentro a la hora de una emergencia que se llegara a presentar en su sitio de trabajo.

9. Señale con una X cuales de estos permisos y/o procedimientos son aplicables a sus actividades dentro de la empresa:


- ☐ Permiso para trabajo seguro en alturas
- ☐ Permiso para trabajo en caliente
- ☐ Permiso para excavaciones
- ☐ Realizar pre operaciones a equipos y herramientas
- ☒ Realizar análisis seguro de trabajo (AST)

10. Mencione dos impactos ambientales en su actividad

- Contaminación aire
- Contaminación suelo

11. Qué tipos de residuos debería ir en las canecas.

Blanco



Para depositar los residuos aprovechables limpios y secos como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón

Verde



Para depositar los residuos no aprovechables, por ejemplo, papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Negro



para depositar residuos orgánicos aprovechables, por ejemplo, restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín etc.

12. A qué peligro y riesgos está asociado a su cargo.

Caídas, golpes, riesgo biomecánico, riesgo público, cortaduras

Declaro que he recibido la inducción, conozco el oficio para la cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal ya cumplir con las normas de seguridad que me han sido informales.

Rosa Castro

FIRMA DEL TRABAJADOR

Lelly Florez

FIRMA DEL CALIFICADOR

INDUCCIÓN: ☒
REINDUCCIÓN: ☐
NOMBRE: Yesica Pino
CARGO A DESEMPEÑAR/DO: Servicio Generales
AREA/PROCESO/PROYECTO: Consorcio Alianza Ambiental **FECHA:** 7/05/2025

No	TEMA	SI
1	Generalidades de la empresa: Reseña histórica, Misión, Visión, Valores, Organigrama de la empresa y proyecto (si aplica), Descripción de los servicios, Políticas y objetivos organizacionales, Introducción a los sistemas de gestión de la organización.	☒
2	Reglamento Interno de trabajo, de higiene y Seguridad Industrial	☒
3	Aspectos legales	☒
4	Copasst y comité de convivencia	☒
5	Manual de Funciones, Responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad del Cargo.	☒
6	Procesos y procedimientos en los cuales es responsable el cargo o es participe.	☒
7	Peligros y riesgos asociados al cargo y controles operacionales relacionados. (Normas y procedimientos).	☒
8	Aspectos e impactos ambientales del proceso al cual aplica el cargo, normas, planes y procedimientos asociados con los aspectos.	☒
9	Planes y Procedimientos de atención y respuesta ante emergencias.	☒
10	Otros aspectos de acuerdo con las necesidades del cargo.	☒

Expreso mi aprobación a voluntad propia y sin presión alguna, para que TICOM S.A. afirme y realice lo siguiente:

1	Acepto los temas anteriormente impartidos, los entiendo y asumo el compromiso de cumplirlos, de igual manera con todas las normas que TICOM S.A. implemente para la protección laboral y del ambiente en la ejecución de las actividades
2	Autorizo a TICOM S.A. a levantar un registro fotográfico y/o videográfico donde aparezca mi persona; basado en comportamientos y/o condiciones sub estándares; con el fin de tomar las medidas correctivas o preventivas para evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o incidentes ambientales
3	Me comprometo a participar en todas las campañas de promoción, prevención y control de la salud laboral en las que TICOM S.A. me participe (vacunación, evaluaciones médicas ocupacionales, alcoholemias, pruebas toxicológicas, etc)

Yesica Pino
Firma Nuevo Trabajador
Kelly Flores
Firma del Facilitador
OK
Firma Recursos Humanos

INDUCCION

RE INDUCCION

NOMBRE: Yesica Pino
CC: 902095293 **FECHA:** 7/05/2025
CARGO: Servicio General **PROYECTO:** CAA
1. Qué significa TICOM S.A

Transporte, ingeniería, construcción
y maquinaria

**3. Señale con una X cuales son las políticas de
TICOM S.A.**

- ☒ 1. Política integral.
- ☒ 2. Política de gestión de residuos.
- ☒ 3. política para la prevención del acoso laboral.
- ☒ 4. política para la innovación.
- ☒ 5. política para la prevención del riesgo vehicular.
- ☒ 6. política para la prevención del consumo del alcohol, tabaco y drogas.

**4. Señale con una X cuales son los programas
existentes en TICOM SA**

- ☒ 1. Programa prevención y protección contra caída
- ☒ 2. Programa de EPP
- ☒ 3. Programa de riesgo vehicular.
- ☒ 4. Programa de comunicación
- ☒ 5. Programa riesgo químico.
- ☒ 6. Programa de PVE
- ☒ 7. Programas de gestión ambiental
- ☒ 8. Programa de prevención en lesiones en mano.

**5. Señale cuál de estas son actividades de las que
se encarga el Copasst**

- ☐ Investigar los accidentes de trabajo.
- ☐ Realizar inspecciones de seguridad a los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas de prevención.
- ☐ Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud ocupacional y estudiar las sugerencias que presentan los empleados en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
- ☒ Todas las anteriores

**2. Señale con una X los actos inseguros y en un
círculo las condiciones inseguras**

**6. Señale cuál de estas son actividades de las que se
encarga El comité de convivencia**

- ☐ Recibir quejas y darles trámites.
- ☐ Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.
- ☐ Crear los espacios de diálogos para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias
- ☐ SUGERIR. A la alta dirección medidas preventivas y correctivas
- ☐ Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones.
- ☒ Todas las anteriores



TICOM
SOLUCIONES TÉCNICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TEL: 020 520 2763

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y RE-INDUCCION

Versión No: 7

Fecha de versión:
Agosto 10/2021

Página 1 de 1

7. Señale con una X los elementos de protección personal a utilizar en su trabajo



8. Escriba los puntos de encuentro a la hora de una emergencia que se llegara a presentar en su sitio de trabajo.

9. Señale con una X cuales de estos permisos y/o procedimientos son aplicables a sus actividades dentro de la empresa:

- ☐ Permiso para trabajo seguro en alturas
- ☐ Permiso para trabajo en caliente
- ☐ Permiso para excavaciones
- ☐ Realizar pre operaciones a equipos y herramientas
- ☒ Realizar análisis seguro de trabajo (AST)

10. Mencione dos impactos ambientales en su actividad

- Contaminación suelo
- Contaminación agua

11. Qué tipos de residuos debería ir en las canecas.

Blanco

Para depositar los residuos aprovechables limpios y secos como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón

Verde

Para depositar los residuos no aprovechables, por ejemplo, papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Negro

para depositar residuos orgánicos aprovechables, por ejemplo, restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín etc.

12. A qué peligro y riesgos está asociado a su cargo.

golpes, caídas a nivel, riesgo biomecánico, riesgo público

Declaro que he recibido la inducción, conozco el oficio para la cual he sido contratado y me comprometo a utilizar los implementos de protección personal ya cumplir con las normas de seguridad que me han sido informales.

Yesica Pino

FIRMA DEL TRABAJADOR

Kelly Flores

FIRMA DEL CALIFICADOR

ANEXO

**CHARLAS Y
CAPACITACIONES**

CHARLAS AMBIENTALES

Fecha: 7/05/2025 Ciudad: Univaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:45 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5^{ta} Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Cerro Villarosa

Exposit: Sonia Gonzalez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Relly Flores	56067903	Supervisor BBT	Relly Flores
2	Walter Barbosa	4226272	Biologo	Walter B.
3	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
4	Mariela Torregrosa	4043028148	Residente Social	M. Torregrosa
5	Humberto Escoria	1234888624	Conductor	Humberto
6	Jose Avila Arenas	19360273	topografo	Jose avila
7	Domingo Gonzalez	11075728	cadenero	Domingo G.
8	Luis Trujillo	4038094776	operador	Luis T.
9	Oscar Ruedes	42144924	Operador	Oscar R.
10	Yesica Pino	10095993	Servicio General	Yesica P.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Fecha: 9/05/2025 Ciudad: Uruaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:45 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cono Villa Rosa

 Exposit: Sonia Gonzalez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Ruben moreno	72308083	Conductor	Ruben moreno
2	Wisching	8742576	Conductor	Wisching
3	Wiss Mizzar	72166803	Conductor	Wiss Mizzar
4	Jader Viter	92250208	Conductor	Jader Viter
5	Humberto escurcia	0234888624	Conductor	Humberto
6	Jasney Motta	1091662627	Ting. Pesquero	Jasney M.
7	Domingo Gonzalez	00075728	Cadenero	Domingo
8	Mariela torregrosa	1043028148	Residente social	Mariela
9	Oscar paredes	72444924	operador	Oscar paredes
10	Walter barbosa	7226278	Biologo	Walter
11	José villa arnez	19360273	Topografo	José villa
12	Wiss frespalacios	1038097776	Operador	Wiss
13	Relly Florez	56067903	Supervisor ST	Relly Florez
14	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable de Evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor



TICOM S.A.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE CALIDAD
TEL: 021 259 2763

REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:
Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: 12/03/2025 Ciudad: Lurucó Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5^{ta} Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Cano Villarosa

Expositor: Sonia Gonzalez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Josney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Josney H.
2	Walter Barbosa	7226242	Biologo	Walter B.
3	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
4	Wisching	8742576	Conductor	Wisching
5	Oscar Paredes	7214494	Operador	Oscar P.
6	Luis trespalacios	1038097776	Operador	L. trespalacios
7	Marianela torregrosa	1043028148	Res. Social	Marianela
8	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G.
9	Luis Mizzor	72166813	conductor	Luis Mizzor
10	Jose avila arenas	19360273	Topografo	Jose avila
11	Humberto escorcia	1234888624	conductor	Humberto
12	Jader Vilal	92250208	conductor	Jader Vilal
13	Kelly Florez	56067903	Supervisor SST	Kelly Florez
14	Yesica Pino	102095393	Servicio General	Yesica Pino
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Fecha: 19/05/2025 Ciudad: Livaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla S* ☒ Otros

Tema de la Actividad: Para que son las conchas negras, blancas y verdes

Lugar: Cerro Villa rosa

Exposit: Sonia Gonzalez

Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
2	Jader Vilal	92250208	Conductor	Jader Vilal
3	Jasney Motta	0091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
4	Domingo Gonzalez	11075128	Cadenero	Domingo G.
5	Ruben Moreno	12308083	conductor	Ruben M.
6	Wisching	8742576	Conductor	Wisching
7	Klariandora Torerosa	1043028148	Res. Social	Klariandora T.
8	Luis trespalacios	1038097776	Operador	L. trespalacios
9	Luis Mizzar	72166813	conductor	Luis Mizzar
10	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
11	Jose Avila Arenas	19360273	Topografo	Jose Avila
12	Humberto Escorcia	1234888624	conductor	Humberto
13	Delly Flores	5607903	Supervisor SST	Delly Flores
14	Yesica Pino	902095293	Servicio General	Yesica Pino
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor

Fecha: 17/05/2015 Ciudad: Lorvaca Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ☒ Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Cono Villa Rosa

Exposit: Sonia Gonzalez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Joder Vital	92250208	Conductor	Joder Vital
2	Ruben Moreno	42308083	Conductor	Ruben Moreno
3	WIS Ching	8742576	Conductor	WIS Ching
4	Luis Mizzor	72166813	Conductor	Luis Mizzor
5	Humberto escorcia	1234888624	Conductor	Humberto
6	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
7	Walter barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
8	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G.
9	José Avila arenal	19360273	topografo	José Avila
10	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
11	Luis Trespacios	1038097776	Operador	Luis Trespacios
12	Marionela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. Torregrosa
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica P.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez

Responsable del evento

Sonia Gonzalez

Facilitador/Expositor

Fecha: 28/05/2025 Ciudad: Luvaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

 Tema de la Actividad: Cuales son los tipos de suelos

 Lugar: Cano Villa rosa

 Exposit: Sonia Gonzalez Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B
2	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M
3	Monicela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. Torregrosa
4	Humberto Escorcia	9234888624	Conductor	Humberto.
5	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
6	Luis Mirzor	72166803	Conductor	Luis Mirzor
7	Jader Vilal	92250208	Conductor	Jader Vilal
8	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
9	Luisching	8742576	Conductor	Luisching
10	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P
11	Luis Trespalacios	1038097776	Operador	Luis T.
12	Domingo Gonzalez	11675728	Carbonero	Domingo
13	Delly Flores	56067903	Supervisor Sot	Delly F.
14	Yesica Pino	402095293	Servicio General	Yesica P.
15	Rosa Castro	22598664	Servicios General	Rosa Castro
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez
Responsable del evento

Sonia Gonzalez
Facilitador/Expositor



TICOM S.A.
CALLE 100 N° 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 01 (57) 300 2783

REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: 30/05/2025 Ciudad: Livaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:45 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5"✓ Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Como villa roza

Exposit: Sonia Gonzalez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wissuspalcios	1038097776	Operador	WissT.
2	Oscar Paredes	72144921	Operador	Oscar p
3	Wiss Mizar	72166813	Conductor	Wiss Mizar
4	Jader Vilal	92250208	Conductor	Jader Vilal
5	Ruben Moreno	72308083	conductor	Ruben Moreno
6	Wiss ching	8742576	Conductor	Wiss ching
7	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B
8	Jasney Blotta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
9	Mariela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. Torregrosa
10	Humberto escoria	2234888624	conductor	Humberto
11	Jose avila Arenas	19360273	topografo	Joseavila
12	Domingo Gonzalez	19075728	Cadenero	Domingo
13	Kelly Flores	56067903	Supervisor SST	Kelly F.
14	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica pino
15	Rosa Castro	22598664	Servicio General	Rosa C.
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Sonia Gonzalez

Responsable del evento

Sonia Gonzalez

Facilitador/Expositor

CHARLAS SST

Fecha: 8/05/2025 Ciudad: Urubaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:45 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5^a ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cono Villa Rosa

 Expositor: Kelly Florez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jasney Motta	1090662627	Ing. Pedrera	Jasney M.
2	Oscar Paredez	24144924	Operador	Oscar P.
3	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor	Humberto
4	Walter Barba	7226272	Biologo	Walter B.
5	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo
6	Jose Avila Arenas	99360273	Topografo	Jose Avila
7	Marianela Torcyrosa	1043028148	Residente Social	Marianela T.
8	Luis Trespalacios	1038097746	Operador	Luis Trespalacios
9	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
 Responsable del evento

Kelly Florez
 Facilitador/Expositor

Fecha: 10/05/2025 Ciudad: Curacao Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:10 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

 Tema de la Actividad: Comite y sus funciones - COPAST - OOL

 Lugar: Cono villa rosa

 Expositor: Kelly Florez

Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wistrespalcias	1038097776	Operador	Wist J.
2	Jose avila aremas	19360273	Topografo	Jose avila
3	Ruben moreno	72308083	Conductor	Ruben moreno
4	Wisching	8742576	conductor	Wisching
5	Jader Mota	92250208	Conductor	Jader Mota
6	Humberto escorcia	1234988624	Conductor	Humberto
7	Oscar Parades	7214494	Operador	Oscar P.
8	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
9	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
10	Domingo Gonzalez	11075728	Cadete	Domingo G.
11	Mariónela ferreros	1043028148	Presidente social	Mariónela
12	Luis Mizzor	72166813	Conductor	Luis Mizzor
13	Yessica Pine	102095293	Servicio General	Yessica Pine
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez

Responsable del evento

Kelly Florez

Facilitador/Expositor

Fecha: 13/05/2025 Ciudad: Lirio Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cano villa rosa

 Expositor: Kelly Florez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	11075728	Conducir	D. Gonzalez
2	Wisching	8742576	Conducir	Wisching
3	Oscar Parades	72144924	Operador	Oscar Parades
4	Luis Mizar	72166813	Conducir	Luis Mizar
5	Josney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Josney M.
6	Matthi Barbosa	7226272	Biologo.	Matthi B.
7	Humberto escorcia	1234888624	Conducir	Humberto
8	Ruben moreno	72308083	Conducir	Ruben moreno
9	Jader Vital	92250208	Conducir	Jader Vital
10	Jose avila arias	19360273	Topografo	Jose avila
11	Luis Trespalacios	1038097776	Operador	Luis T.
12	Mariana torregrosa	1043028148	Res. Social	M. torregrosa
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica P.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez
 Responsable del evento

Kelly Florez
 Facilitador/Expositor

Fecha: 15/05/2025 Ciudad: Livorno Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cano Villarosa

 Exposit: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jader Vilal	92250808	Conductor	Jader Vilal
2	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
3	WIS CHING	8742576	conductor	WIS CHING
4	Luis Mizzor	72166873	conductor	Luis Mizzor
5	Humberto escorcia	1234888624	conductor	Humberto.
6	Jasney Motta	1091662627	Tna. Pesquero	Jasney M.
7	Walter Borbón	7226272	Biologo	Walter B.
8	Dominyo Gonzalez	11075728	carpintero	Dominyo G.
9	José Aviles arenas	119360273	topografo	José Aviles
10	Oscar Pareekes	72144924	operador	Oscar P.
11	Luis tuspalacios	1038097776	Operador	Luis tuspal.
12	Florianela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. Torregrosa
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores
 Responsable del evento

Kelly Flores
 Facilitador/Expositor

Fecha: 16/05/2025 Ciudad: Lima Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5"✓ Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Cano Villa Rosa

Expositor: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M
2	Walter Barbosa	426272	Biologo	Walter B
3	José avila arenas	19360273	Topógrafo	José avila
4	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G.
5	Humberto escorcia	1234888624	Conductor	Humberto ES
6	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
7	Luis cheng	8742576	Conductor	Luis cheng
8	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
9	Ruben moreno	723108083	Conductor	Ruben moreno
10	Luis Mizzar	72142576	Conductor	Luis Mizzar
11	Luis Fred Palacios	1038097776	Operador	Luis F.
12	Mariela farfegrosa	1043028148	Res. Social	Mariela F.
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica P.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 19/05/2025 Ciudad: Loroco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cano Villa Rosa

 Expositor: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Walter barbosa	7226272	Biologo	
2	Jasnev Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasnev M.
3	Humberto Escarcia	9234888624	Conductor	Humberto
4	José avilas arenas	99360273	topografo	jose avilas
5	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G.
6	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
7	Luis Trespulacal	1038097776	Operador	Luis Trespulacal
8	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
9	Marinela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. torregrosa
10	Luis Mizar	72166813	Conductor	Luis Mizar
11	Oscar Pineda	72144924	operador	Oscar P.
12	Luis ching	8742576	Conductor	Luis ching
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica P.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 20/05/2025 Ciudad: Lirio Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla S^a Otros

 Tema de la Actividad: Manejo y prevención del estrés en el trabajo

 Lugar: Canoa Villa Rosa

 Expositor: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jarney Hotta	1094662627	Ing. Pesquero	Jarney M.
2	Honzanola Torregrosa	1043028148	Dcs. Goepal	M. Torregrosa
3	Domingo González	19075728	Calenero	Domingo G.
4	Walter Barbosa	4226272	Biologo	
5	Oscar Paredes	72744924	Operador	Oscar P.
6	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
7	Luis Traspalacios	1088097776	Operador	Luis Traspalacios
8	Luis Ching	8742576	Conductor	Luis Ching
9	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
10	Jose Avila Aranas	79360273	Topografo	Jose Avila
11	Humberto Escorcia	1234888624	Conductor	Humberto
12	Luis Mizar	72166813	Conductor	Luis Mizar
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
14	Rosa Castro	22598664	Servicio General	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 21/05/2025 Ciudad: Curvo Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5^a ☒ Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Cano villa rosa

Exposita: Kelly Florez

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Luis Mizar	72166813	conductor	Luis Mizar
2	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
3	Marianela Torregrosa	1043028148	Res. Social	M. Torregrosa
4	Jasney Motta	1091662622	Ing. Pesquero	Jasney M.
5	Luis Trespalacio	1038097776	Operador	Luis Trespalacio
6	Ruben Moreno	72308083	conductor	Ruben Moreno
7	Jose avila arenas	19360273	topografo	Jose avila
8	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
9	Humberto escorcia	1234888624	Conductor	Humberto
10	Luis Ching	8742576	Conductor	Luis Ching
11	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo G.
12	Walter karbela	7226272	Biologo	Walter B.
13	Rosa Castro	22598664	Secretario General	Rosa Castro
14	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez

Responsable del evento

Kelly Florez

Facilitador/Expositor

Fecha: 23/05/2015 Ciudad: Lirvaleo Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla S-V Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Como villa rosa

Exposit: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	11025728	Cadenaro	Domingo G.
2	Jesus Anita arenas	99360293	Topografo	Jesus Anita
3	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
4	Wio trespalacios	103809776	Operador	Wio T.
5	Jader Vidal	92250208	Conductor	Jader Vidal
6	Jasny Motta	1097662627	Ing. Pesquero	Jasny M.
7	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
8	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
9	Wio Ching	8742576	Conductor	Wio Ching
10	Marionela Ferragrosa	1043028148	Doc. Social	Marionela F.
11	Luis Mizar	72166813	Conductor	Luis Mizar
12	Humberto Escarcia	1234888624	Conductor	Humberto
13	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica Pino
14	Rosa Castro	22598664	Servicio General	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 24/05/2025 Ciudad: Lorvaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:150m

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ☒ Otros

Tema de la Actividad: No utilizar bocinas, pitos durante la ejecución de las actividades

Lugar: Campo Villa Rosa

Expositor: Kelly Flores

Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	41075428	Coordinador	Domingo G.
2	José Avila Arenas	19360243	Topógrafo	José Avila
3	Florianela Torregrosa	1043028148	Res. Social	Florianela
4	Jasney Motta	1091662627	Res. Pesquero	Jasney Motta
5	Walter Barbosa	4226272	Biologo	Walter B.
6	Wisching	8742576	conductor	Wisching
7	Ruben Moreno	72308083	conductor	Ruben Moreno
8	Oscar parades	72444924	Operador	Oscar P.
9	Wiss Mizar	42166813	conductor	Wiss Mizar
10	Wiss Tuspallolas	1038097776	Operador	Wiss T.
11	Humberto escorcia	1234888624	conductor	Humberto
12	Jader Vidal	92250208	conductor	Jader Vidal
13	Yesica Pina	102095293	Servicio General	Yesica Pina
14	Rosa Castro	72598669	Servicio General	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 26/05/2025 Ciudad: Livvoco Hora Inicio: 7:00 Duración: 9:45 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5* ☒ Otros

 Tema de la Actividad: Importancia del orden y aseo de los componentes de obra

 Lugar: Como Villa Rosa

 Exposita: Relly Flores

Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Jader Vilat	92250208	Conductor	Jader Vilat
2	Wis Ching	8742576	Conductor	Wis Ching
3	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben Moreno
4	Luis Mirza	72166803	Conductor	Luis Mirza
5	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
6	Luis Tres Palacios	1038097776	Operador	Luis Trespa.
7	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
8	Maricela Torregrosa	1043028148	Res. Social	Maricela
9	Humberto es Garcia	1234888624	Conductor	Humberto
10	Jader Vilat	92250208	Conductor	Jader Vilat
11	Jasney Motta	1097662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
12	Domingo Gonzalez	1075758	Cadexero	Domingo
13	Rosa Castro	22598664	Servicio General	Rosa C.
14	Yesica Pino	102095293	Servicio General	Yesica P.
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Relly Flores

Responsable del evento

Relly Flores

Facilitador/Expositor

Fecha: 29/05/2015 Ciudad: Livvaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:25 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5"✓ Otros

 Tema de la Actividad: Enfermedades de transmisión sexual

 Lugar: Cano Villeta Rosa

 Expositor: Kelly Florez

Entidad:

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	11075128	Cadenero	Domingo
2	Mariánela Torregrosa	1043028118	Res. Social	Mariánela
3	Humberto esdoreira	1234888624	conductor	Humberto
4	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
5	Jader Vidal	92250208	Conductor	Jader Vidal
6	Ruben Moreno	72308083	conductor	Ruben Moreno
7	Luis Trespalacios	1038097776	Operador	Luis T.
8	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
9	Mattia barbosa	7226272	Biologo	Mattia B.
10	Luis Mirzar	72466813	conductor	Luis Mirzar
11	Josavila arnas	17360273	topografo	Josavila
12	Luis ching	8742576	conductor	Luis ching
13	Yesica Pino	102045293	Servicios Generales	Yesica Pino
14	Rosa Castro	22598664	Servicios Generales	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez

Responsable del evento

Kelly Florez

Facilitador/Expositor

Fecha: 29/05/2025 Ciudad: Uruace Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla ☒ Otros

Tema de la Actividad

 Lugar: Cano, villa rosa

 Exposit: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	71075728	Conducero	Domingo
2	Wisching	8742576	Conducetor	Wisching
3	Josney Motta	1091662627	Tn. Pesquero	Josney M
4	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B
5	Humberto escarcia	1234888624	Conducetor	Humberto
6	Marionela torregrosa	1043028148	Reb. Social	Marionela
7	Joseavila archa	19360273	Topografo	Joseavila
8	Wistuspallaces	1038097726	operador	Wiste
9	Oscar porcedo	72144924	Operador	Oscar P.
10	Wist Mizner	72166813	Conducetor	Wist Mizner
11	Jader Vital	92250208	Conducetor	Jader Vital
12	Roben moreno	72308083	Conducetor	Roben Moreno
13	Yesica Pino	102095293	Servicios Generales	Yesica Pino
14	Rosa Castro	22598664	Servicios Generales	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor



TICOM
INSTRUMENTOS CONJUNTES DE NUESTROS ASESORES TALENTO

REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: 31/05/2025 Ciudad: Lurubaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15 am

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" ✓ Otros

Tema de la Actividad Peatonales en la vía

Lugar: Cano Villa Rosa

Exposito: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo Gonzalez	11075728	Conducir	Domingo G.
2	Walter barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
3	Wisching	8742576	Conducir	Wisching
4	Ruben Moreno	72308083	Conducir	Ruben Moreno
5	Oscar Parades	72142924	Operador	Oscar P.
6	Wrs tuxpalacios	1038097776	Operador	Wrs T.
7	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
8	Wrs Mizzar	72166813	Conducir	Wrs Mizzar
9	Jader Vital	92250208	Conducir	Jader Vital
10	Jose avila arenas	19360273	Topografo	Jose avila
11	Humberto escorcia	1234888624	Conducir	Humberto
12	Marionela torregrosa	11043028148	Res. Social.	Marionela T.
13	Rosa Castro	22598664	Servicios Generales	Rosa Castro
14	Yesica Pino	102095293	Servicios Generales	Yesica Pino
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Kelly Flores

Fecha: 03/06/2015 Ciudad: Lurubaco Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:15

 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5* ☒ Otros

 Tema de la Actividad: Importancia del Kit de emergencia

 Lugar: Cano Villa Rosa

 Expositor: Kelly Flores

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Domingo González	11075128	Cadenero	Domingo
2	Jasney Motta	1091662627	Ing. Pesquero	Jasney M.
3	Walter Barbosa	1226272	Biologo	W. Barbosa
4	Wissching	8742576	Conductor	Wissching
5	Oscar Paredes	12144924	Operador	Oscar P.
6	Ruben Moreno	12308083	Conductor	Ruben Moreno
7	Wiss Tuspallacos	1038097776	Operador	Wiss T.
8	Florianela Torregrosa	1043028148	Rec. Social	Florianela
9	Jader Vilal	12250208	Conductor	Jader Vilal
10	Wiss Mizar	12166813	Conductor	Wiss Mizar
11	Humberto Escoria	1234888624	Conductor	Humberto E.
12	Jose Avila Arenas	19360273	Topógrafo	Jose Avila
13	Yessica Pino	102095293	Servicio Generales	Yessica P.
14	Rosa Castro	22598664	Servicio Generales	Rosa Castro
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Flores

Responsable del evento

Kelly Flores

Facilitador/Expositor

CAPACITACIONES

 TICOM <small>TECNOLOGIA E INGENIERIA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión:
		Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: 22/05/2015 Ciudad: Luruaeo Hora Inicio: 7:00 Duración: 2:40pm

Tipo: Capacitación ☒ Entrenamiento ☐ Charla ☐ Otro ☐

Tema de la Actividad: Riesgo Biomecánico

Lugar: Campo Villa Rosa

Expositor: Kelly Florez Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Walter Barbosa	7226272	Biologo	Walter B.
2	Jasney Motta	1091662627	Ing. PESQUERO	Jasney M.
3	Mariandrea Torregrosa	1043028148	Residente Social	Mariandrea
4	Humberto Escobedo	1234888624	Conductor	Humberto
5	Jose Avila Armas	19360273	Topografo	Jose Avila
6	Domingo Gonzalez	11075728	Cadenero	Domingo
7	Wissel Palacios	7038097776	Operador	Wissel
8	Oscar Peredes	72144924	Operador	Oscar P.
9	Wiss Mizar	72166813	Conductor	Wiss Mizar
10	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
11	Ruben Moreno	72308083	Conductor	R. Moreno
12	Wissching	8742576	Conductor	Wissching
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez

Responsable del evento

Kelly Florez

Facilitador/Expositor

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión: Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: 6/06/2015 Ciudad: Lirio Hora Inicio: 7:00 Duración: 7:40 am

Tipo: Capacitación ☒ Entrenamiento ☐ Charla 5" ☐ Otros ☐

Tema de la Actividad: Primeros auxilios, evacuación

Lugar: Cano Villa Rosa

Expositor: Kelly Florez Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Luis ching	8742576	Conductor	Luis ching
2	Ruben Moreno	72308083	Conductor	Ruben M.
3	Jader Vital	92250208	Conductor	Jader Vital
4	Luis Mizar	72166813	Conductor	Luis Mizar
5	Oscar Paredes	72144924	Operador	Oscar P.
6	Luis trespalacios	1038097776	Operador	L. trespalacios
7	Domingo Gonzalez	00075728	Cadenero	Domingo
8	Jose Avila Aranas	09360273	topografo	Jose Avila
9	Humberto escarcia	1234888629	conductor	Humberto
10	Martanda torregrosa	1043028148	Res. Social	Martanda
11	Jasney Motta	9091662677	Ing. Pesquero	Jasney M
12	Walter barbosa	7226272	Biologo	Walter B
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Kelly Florez

Responsable del evento

Kelly Florez

Facilitador/Expositor

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMIONES</small>		PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)		Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1											
UBICACIÓN:		Cano Villa Rosa		PLACAS: FVO 666											
TRABAJO A EJECUTAR:		transporte del personal													
OPERADOR:		Humberto escoria SEMANA DEL: 5 mayo AL: 10 mayo													
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

**TICOM**
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE CALIDAD**PRE OPERACIONAL****EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)**

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Canoa Villa RosaPLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR:

Transporte del Personal

OPERADOR:

Humberto escorciaSEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Humberto Escarcia

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAYMA</small>		PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)		Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1											
UBICACIÓN: <u>Cerro Villa Rosa</u>		PLACAS: <u>FVO 666</u>													
TRABAJO A EJECUTAR: <u>Transporte del personal</u>															
OPERADOR: <u>Humberto Escorcia</u>		SEMANA DEL: <u>19 mayo</u> AL: <u>24 mayo</u>													
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Humberto Escarcia

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN:

Caro Villa Rosa

PLACAS: FVO 666

TRABAJO A EJECUTAR:

transporte del personal

OPERADOR:

Humberto escorcia SEMANA DEL: 26 mayo AL: 31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad


Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones



Revisado por:

Humberto Escarcía Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Pelly Flores

 TICOM <small>SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS</small>		PRE OPERACIONAL EQUIPO LIVIANO (CAMIONETAS)		Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1											
UBICACIÓN:		<i>Cano Villa roba</i>		PLACAS: <i>FVO 666</i>											
TRABAJO A EJECUTAR:		<i>transporte del personal</i>													
OPERADOR:		<i>Humberto escoria</i>													
		SEMANA DEL: <i>2 Junio</i>		AL: <i>7 Junio</i>											
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Hodómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.1	Luces de tolva y exploradoras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad


Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones



Revisado por:

Humberto Escarcía Cargo: Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Pelly Florez

UBICACIÓN: Cano Villorosa PLACAS: Volvo 210
 TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cano, excavación, movimiento de tierra
 OPERADOR: Luis Francisco Palacios SEMANA DEL: 5 mayo AL: 10 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad.

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Wstispatacios

Cargo:

operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

UBICACIÓN: Cerro Villa rosa PLACAS: Volvo 270
 TRABAJO A EJECUTAR: limpieza de cerro, excavación, movimiento tierra
 OPERADOR: lois hospalacios SEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Sin novedad

Jueves Observaciones	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

5^{ta} novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

vis tres palacios

Cargo:

Operator

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez

UBICACIÓN: Cano Villa Rosa PLACAS: 10/10 210
 TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cano, excavación, movimiento de tierra
 OPERADOR: Luis Traspalacios SEMANA DEL: 19 mayo AL: 24 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis trespalacios

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez

UBICACIÓN: Caño Villa Rosa PLACAS: Volvo 210
 TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de caño, excavación, movimiento de tierra
 OPERADOR: Luis Trespalacios SEMANA DEL: 26 mayo AL: 31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Trespalacios

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

UBICACIÓN: Cano Villa Rosa PLACAS: Volvo 240
 TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cano, excavación, movimiento de tierra
 OPERADOR: Luis Trespalacios SEMANA DEL: 2 Junio AL: 7 Junio

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Frespalacios

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Relly Florez

UBICACIÓN: Cano Villa rosa PLACAS: Volvo 240
 TRABAJO A EJECUTAR: Limpieza de cano, excavación, movimiento de tierra
 OPERADOR: Oscar Paredes SEMANA DEL: 5 mayo AL: 10 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Oscar Paredes

Cargo:

operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez

UBICACIÓN:

Caño villa rosa

PLACAS:

Volvo 240

TRABAJO A EJECUTAR:

Limpieza de caño, excavación, movimiento de tierra

OPERADOR:

Oscar paredes

SEMANA DEL: 12 mayo

AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Oscar Parroles

Cargo:

operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez

UBICACIÓN: Caño Villa rosa PLACAS: Volvo 240
 TRABAJO A EJECUTAR: Empieza de caño, excavación, movimiento tierra
 OPERADOR: Oscar Paredes SEMANA DEL: 19 mayo AL: 29 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

bin moved

Martes Observaciones

sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Oscar Paredes

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

UBICACIÓN:

Cono Villa Rosa

PLACAS: 1/0/10 240

TRABAJO A EJECUTAR:

Limpieza de cono, excavación, movimiento de tierra

OPERADOR:

Oscar Paredes

SEMANA DEL:

26 mayo

AL:

31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Oscar Paredes

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Relly Flores

UBICACIÓN:

Caño Villa Rosa

PLACAS: Volvo 210

TRABAJO A EJECUTAR:

Limpieza de caño, excavación, movimiento de tierra

OPERADOR:

Oscar parades

SEMANA DEL:


2 Junio

AL:

7 Junio

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y RODAJE														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Tren de rodaje.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas laterales y del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del cucharón.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de diente.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Orugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado de la cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de cilindros de levante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Estado externo de cilindro de basculamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.17	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales y exploradoras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de motor de giro 4.4.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Estado de aceite motor de giro 4.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Nivel de liquido refrigerante del motor 4.3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Estado bombas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.10	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.11	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


Lunes Observaciones



Martes Observaciones




Miércoles Observaciones




Jueves Observaciones




Viernes Observaciones



Sábado Observaciones



Domingo Observaciones



Revisado por:

Oscar Paredes

Cargo:

Operador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Pell y Flores



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS DE MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO MEDIANO

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cerro villa Rosa PLACAS: ST3 222
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y disposición del material
OPERADOR: W's ching SEMANA DEL: 9 mayo AL: 10 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.									✓		✓			
1.2	Llantas.									✓		✓			
1.3	Puertas									✓		✓			
1.4	Estado del volco									✓		✓			
1.5	Estado de botes.									✓		✓			
1.6	Extintor.									✓		✓			
1.7	Horómetro.									✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.									✓		✓			
2.2	Direccionales.									✓		✓			
2.3	Stop.									✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2.5	Luces traseras.									✓		✓			
2.6	Pito.									✓		✓			
2.7	Pito de reversa.									✓		✓			
2.8	Tablero.									✓		✓			
2.9	Baliza y buggui									✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.									✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3.3	Estado de frenos.									✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3.5	Estado de dirección.									✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3.7	Motor de arranque.									✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Wis ching

Cargo:

constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Relly Florez



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS EN EL MANEJO DE LA CALIDAD TOTAL
NOS ENFOCAMOS EN TI

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Caño villa Rosa

PLACAS: 845 222

TRABAJO A EJECUTAR:

Cargue y disposición de material

OPERADOR:

Luis ching

SEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de líquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Wisching

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Relly Florez



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS EN MANTENIMIENTO Y ANALISIS DE FALLAS

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Cono Villa Rosor PLACAS: 518 222
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y disposición del material
OPERADOR: WIS ching SEMANA DEL: 19 mayo AL: 29 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Wuiching

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Caño villa rosa

PLACAS: 543 222

TRABAJO A EJECUTAR:

cargue y disposición material

OPERADOR:

Wisching

SEMANA DEL: 26 mayo AL: 31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Ching

Cargo:

Controlador

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cerro Villa rosa PLACAS: sts 222
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y Disposición de material
OPERADOR: Wisching SEMANA DEL: 2 Junio AL: 7 Junio

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Wis Ching

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cano Villa Rosa PLACAS: STS 229
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y disposición del material
OPERADOR: Ruben Moreno SEMANA DEL: 9 mayo AL: 10 mayo 2025

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.									✓		✓			
1.2	Llantas.									✓		✓			
1.3	Puertas									✓		✓			
1.4	Estado del volco									✓		✓			
1.5	Estado de botes.									✓		✓			
1.6	Extintor.									✓		✓			
1.7	Horómetro.									✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.									✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.									✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.									✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.									✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.									✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.									✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.									✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.									✓		✓			
2.2	Direccionales.									✓		✓			
2.3	Stop.									✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.									✓		✓			
2.5	Luces traseras.									✓		✓			
2.6	Pito.									✓		✓			
2.7	Pito de reversa.									✓		✓			
2.8	Tablero.									✓		✓			
2.9	Baliza y buggi									✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.									✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.									✓		✓			
3.3	Estado de frenos.									✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.									✓		✓			
3.5	Estado de dirección.									✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓		✓			
3.7	Motor de arranque.									✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.									✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico									✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).									✓		✓			

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

sin novedad

Sábado Observaciones

sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Ruben Moreno

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Relly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cerro Villa Rosa PLACAS: 515 229
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y Disposición del material
OPERADOR: Ruben Moreno SEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo 2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Ruben moreno

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS EN EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO
TEL: 0020 8008 0700

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Caño villa Rosa

PLACAS:

ST6 224

TRABAJO A EJECUTAR:

Carga y transporte de disposición era

OPERADOR:

Eugen Moreno

SEMANA DEL:

19 mayo

AL:

24 mayo 2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpeza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones	
Sin novedades	
Martes Observaciones	
Sin novedades	
Miércoles Observaciones	
Sin novedades	
Jueves Observaciones	
Sin novedades	
Viernes Observaciones	
Sin novedades	
Sábado Observaciones	
Sin novedades	
Domingo Observaciones	
Revisado por:	Ruben MORENO Cargo: Constructor
Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:	Kelly Florez



TICOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA
TEL: 8000 8000-3793

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Caño Villa Rosa PLACAS: STS 224
TRABAJO A EJECUTAR: Carga y transporte de disposición final
OPERADOR: Ruben Moreno SEMANA DEL: 26 mayo AL: 31 mayo 2025

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedades

Martes Observaciones

Sin novedades

Miércoles Observaciones

Sin novedades

Jueves Observaciones

Sin novedades

Viernes Observaciones

Sin novedades

Sábado Observaciones

Sin novedades

Domingo Observaciones

Revisado por:

Ruben Moreno

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
TEL: 0200 800 01763

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Cerro Villa Rosa PLACAS: STS 224
TRABAJO A EJECUTAR: Carga y transporte de disposición final
OPERADOR: Ruben Moreno SEMANA DEL: 2 junio AL: 7 junio

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones	
sin novedades	
Martes Observaciones	
sin novedades	
Miércoles Observaciones	
sin novedades	
Jueves Observaciones	
sin novedades	
Viernes Observaciones	
sin novedades	
Sábado Observaciones	
sin novedades	
Domingo Observaciones	
Revisado por:	Ruben moreno Cargo: Conductor
Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:	Kelly Florez



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cerro Villorosa PLACAS: WCF 864
TRABAJO A EJECUTAR: Carga y disposición del material
OPERADOR: Lois Mizar SEMANA DEL: 9 mayo AL: 10 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.														
1.2	Llantas.														
1.3	Puertas														
1.4	Estado del volco														
1.5	Estado de botes.														
1.6	Extintor.														
1.7	Horómetro.														
1.8	Avisos laterales y aéreos.														
1.9	Cinta reflectiva.														
1.10	Tuercas y espárragos.														
1.11	Estado externo de la maquina.														
1.12	Estado de la cabina.														
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica														
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas														
1.15	Pintura y latonería.														
1.16	Tapicería y cojinería.														
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.														
2.2	Direccionales.														
2.3	Stop.														
2.4	Luces de parqueo.														
2.5	Luces traseras.														
2.6	Pito.														
2.7	Pito de reversa.														
2.8	Tablero.														
2.9	Baliza y bugui														
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.														
3.2	Nivel de aceite del motor.														
3.3	Estado de frenos.														
3.4	Freno de seguridad.														
3.5	Estado de dirección.														
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.														
3.7	Motor de arranque.														
3.8	Tanque de combustible.														
3.9	Nivel de aceite hidráulico														
3.1	Batería (conexión y carga).														

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Mizar

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cano Villa rosa PLACAS: well 864
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y disposición de material
OPERADOR: Luis Mizzor SEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y colinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Mizar

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



TICOM
SOLUCIONES INTEGRADAS EN MANTENIMIENTO Y AGILIZACIÓN
TEL 040 808 3782

PRE OPERACIONAL

EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Cano Villarosa

PLACAS: well 864

TRABAJO A EJECUTAR:

Cargue y disposición de material

OPERADOR:

Wib Mizar

SEMANA DEL: 19 mayo AL: 24 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y bugui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Mazar

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Florez



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN: Cono villa rosa PLACAS: Wcl 864
TRABAJO A EJECUTAR: Cargue y disposición del material
OPERADOR: Luis Mirzor SEMANA DEL: 26 mayo AL: 31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	/		/		/		/		/		/			
1.2	Llantas.	/		/		/		/		/		/			
1.3	Puertas	/		/		/		/		/		/			
1.4	Estado del volco	/		/		/		/		/		/			
1.5	Estado de botes.	/		/		/		/		/		/			
1.6	Extintor.	/		/		/		/		/		/			
1.7	Horómetro.	/		/		/		/		/		/			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	/		/		/		/		/		/			
1.9	Cinta reflectiva.	/		/		/		/		/		/			
1.10	Tuercas y espárragos.	/		/		/		/		/		/			
1.11	Estado externo de la maquina.	/		/		/		/		/		/			
1.12	Estado de la cabina.	/		/		/		/		/		/			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	/		/		/		/		/		/			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	/		/		/		/		/		/			
1.15	Pintura y latonería.	/		/		/		/		/		/			
1.16	Tapicería y cojinería.	/		/		/		/		/		/			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	/		/		/		/		/		/			
2.2	Direccionales.	/		/		/		/		/		/			
2.3	Stop.	/		/		/		/		/		/			
2.4	Luces de parqueo.	/		/		/		/		/		/			
2.5	Luces traseras.	/		/		/		/		/		/			
2.6	Pito.	/		/		/		/		/		/			
2.7	Pito de reversa.	/		/		/		/		/		/			
2.8	Tablero.	/		/		/		/		/		/			
2.9	Baliza y buggui	/		/		/		/		/		/			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	/		/		/		/		/		/			
3.2	Nivel de aceite del motor.	/		/		/		/		/		/			
3.3	Estado de frenos.	/		/		/		/		/		/			
3.4	Freno de seguridad.	/		/		/		/		/		/			
3.5	Estado de dirección.	/		/		/		/		/		/			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	/		/		/		/		/		/			
3.7	Motor de arranque.	/		/		/		/		/		/			
3.8	Tanque de combustible.	/		/		/		/		/		/			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	/		/		/		/		/		/			
3.1	Batería (conexión y carga).	/		/		/		/		/		/			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Mirza

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Belly Florez



TICOM
SOLUCIONES COMPLETAS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION
TEL: 2225 3005, 37703

PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Pagina 1 de 1

UBICACIÓN:

Cano villarosa

PLACAS: *well 864*

TRABAJO A EJECUTAR:

Cargue y disposicion del material

OPERADOR:

Wib m2201

SEMANA DEL:

2 junio

AL:

7 junio 2015

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	/		/		/		/		/		/		/	
1.2	Llantas.	/		/		/		/		/		/		/	
1.3	Puertas	/		/		/		/		/		/		/	
1.4	Estado del volco	/		/		/		/		/		/		/	
1.5	Estado de botes.	/		/		/		/		/		/		/	
1.6	Extintor.	/		/		/		/		/		/		/	
1.7	Horómetro.	/		/		/		/		/		/		/	
1.8	Avisos laterales y aéreos.	/		/		/		/		/		/		/	
1.9	Cinta reflectiva.	/		/		/		/		/		/		/	
1.10	Tuercas y espárragos.	/		/		/		/		/		/		/	
1.11	Estado externo de la maquina.	/		/		/		/		/		/		/	
1.12	Estado de la cabina.	/		/		/		/		/		/		/	
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	/		/		/		/		/		/		/	
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	/		/		/		/		/		/		/	
1.15	Pintura y latonería.	/		/		/		/		/		/		/	
1.16	Tapicería y cojinería.	/		/		/		/		/		/		/	
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	/		/		/		/		/		/		/	
2.2	Direccionales.	/		/		/		/		/		/		/	
2.3	Stop.	/		/		/		/		/		/		/	
2.4	Luces de parqueo.	/		/		/		/		/		/		/	
2.5	Luces traseras.	/		/		/		/		/		/		/	
2.6	Pito.	/		/		/		/		/		/		/	
2.7	Pito de reversa.	/		/		/		/		/		/		/	
2.8	Tablero.	/		/		/		/		/		/		/	
2.9	Baliza y buggui	/		/		/		/		/		/		/	
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	/		/		/		/		/		/		/	
3.2	Nivel de aceite del motor.	/		/		/		/		/		/		/	
3.3	Estado de frenos.	/		/		/		/		/		/		/	
3.4	Freno de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
3.5	Estado de dirección.	/		/		/		/		/		/		/	
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	/		/		/		/		/		/		/	
3.7	Motor de arranque.	/		/		/		/		/		/		/	
3.8	Tanque de combustible.	/		/		/		/		/		/		/	
3.9	Nivel de aceite hidráulico	/		/		/		/		/		/		/	
3.1	Batería (conexión y carga).	/		/		/		/		/		/		/	

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Domingo Observaciones

Revisado por:

Luis Mirraz

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores



TICOM
SOLUCIONES COMPLEJAS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA
TEL: 800.809.5750

PRE OPERACIONAL

EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Cerro villa rosa

PLACAS: *Wd 865*

TRABAJO A EJECUTAR:

Cargue y disposición del material

OPERADOR:

Jader Vital

SEMANA DEL: *9 mayo* AL: *10 mayo 2025*

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.									✓	✓	✓	✓		
1.2	Llantas.									✓	✓	✓	✓		
1.3	Puertas									✓	✓	✓	✓		
1.4	Estado del volco									✓	✓	✓	✓		
1.5	Estado de botes.									✓	✓	✓	✓		
1.6	Extintor.									✓	✓	✓	✓		
1.7	Horómetro.									✓	✓	✓	✓		
1.8	Avisos laterales y aéreos.									✓	✓	✓	✓		
1.9	Cinta reflectiva.									✓	✓	✓	✓		
1.10	Tuercas y espárragos.									✓	✓	✓	✓		
1.11	Estado externo de la maquina.									✓	✓	✓	✓		
1.12	Estado de la cabina.									✓	✓	✓	✓		
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica									✓	✓	✓	✓		
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas									✓	✓	✓	✓		
1.15	Pintura y latonería.									✓	✓	✓	✓		
1.16	Tapicería y cojinería.									✓	✓	✓	✓		
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.									✓	✓	✓	✓		
2.2	Direccionales.									✓	✓	✓	✓		
2.3	Stop.									✓	✓	✓	✓		
2.4	Luces de parqueo.									✓	✓	✓	✓		
2.5	Luces traseras.									✓	✓	✓	✓		
2.6	Pito.									✓	✓	✓	✓		
2.7	Pito de reversa.									✓	✓	✓	✓		
2.8	Tablero.									✓	✓	✓	✓		
2.9	Baliza y buggui									✓	✓	✓	✓		
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.									✓	✓	✓	✓		
3.2	Nivel de aceite del motor.									✓	✓	✓	✓		
3.3	Estado de frenos.									✓	✓	✓	✓		
3.4	Freno de seguridad.									✓	✓	✓	✓		
3.5	Estado de dirección.									✓	✓	✓	✓		
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.									✓	✓	✓	✓		
3.7	Motor de arranque.									✓	✓	✓	✓		
3.8	Tanque de combustible.									✓	✓	✓	✓		
3.9	Nivel de aceite hidráulico									✓	✓	✓	✓		
3.1	Batería (conexión y carga).									✓	✓	✓	✓		

Lunes Observaciones

Martes Observaciones

Miércoles Observaciones

Jueves Observaciones

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Jader Vilal

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Belly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3
Fecha de Versión:
Julio 9/2015
Página 1 de 1

UBICACIÓN: Cano Villa Rosa PLACAS: well 865
TRABAJO A EJECUTAR: Carga y Transporte de disposición final
OPERADOR: Jorge Vidal SEMANA DEL: 12 mayo AL: 17 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad


Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones



Revisado por:

Jader Vilal

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

 TICOM <small>SOLUCIONES COMPLETAS EN MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA</small>		PRE OPERACIONAL EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)		Versión No: 3 Fecha de Versión: Julio 9/2015 Pagina 1 de 1				
UBICACIÓN: <u>Cano Villa Rosa</u>		PLACAS: <u>WEL 865</u>						
TRABAJO A EJECUTAR: <u>Carga y transporte de disposición FCM</u>								
OPERADOR: <u>Jader Vital</u>		SEMANA DEL: <u>19 mayo</u> AL: <u>24 mayo 2015</u>						
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D
1	CHASIS Y LLANTAS							
1,1	Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2	Llantas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3	Puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4	Estado del volco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,5	Estado de botes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6	Extintor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,7	Horómetro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,9	Cinta reflectiva.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,10	Tuercas y espárragos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,11	Estado externo de la maquina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,12	Estado de la cabina.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,15	Pintura y latonería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,16	Tapicería y cojinería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	SISTEMA ELECTRICO							
2,1	Luces frontales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,2	Direccionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,3	Stop.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,4	Luces de parqueo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,5	Luces traseras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,6	Pito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,7	Pito de reversa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,8	Tablero.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,9	Baliza y buggui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	MOTOR							
3,1	Estado del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,3	Estado de frenos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,4	Freno de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,5	Estado de dirección.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,7	Motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,8	Tanque de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3,1	Batería (conexión y carga).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Lunes Observaciones

Sin novedad

Martes Observaciones

Sin novedad

Miércoles Observaciones

Sin novedad

Jueves Observaciones

Sin novedad

Viernes Observaciones

Sin novedad

Sábado Observaciones

Sin novedad

Domingo Observaciones

Revisado por:

Jader Vital

Cargo:

Conductor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores



PRE OPERACIONAL
EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Cano Villa Rosa

PLACAS:

Well 865

TRABAJO A EJECUTAR:

Carga y Transporte y de Disposición final

OPERADOR:

Jader Vilal

SEMANA DEL:

26 mayo AL: 31 mayo

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1,1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1,16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2,9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3,1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Lunes Observaciones	
sin novedades	
Martes Observaciones	
sin novedades	
Miércoles Observaciones	
sin novedades	
Jueves Observaciones	
sin novedades	
Viernes Observaciones	
sin novedades	
Sábado Observaciones	
sin novedades	
Domingo Observaciones	
Revisado por:	Jador Vilal Cargo: Conductor
Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:	Kelly Flores



TICOM
NO USAR SIN PERMISO DEL INGENIERO Y ARQUITECTO
TEL: 800 205 3772

PRE OPERACIONAL

EQUIPO MEDIANO (VOLQUETAS)

Versión No: 3

Fecha de Versión:

Julio 9/2015

Página 1 de 1

UBICACIÓN:

Caro Villorosa

PLACAS:

WEL 865

TRABAJO A EJECUTAR:

Cargar y transporte hay una canchana

OPERADOR:

Jader Vitat

SEMANA DEL:


2 Junio

AL:


7 Junio

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	CHASIS Y LLANTAS														
1.1	Limpieza general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.2	Llantas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.3	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.4	Estado del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.5	Estado de botes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.6	Extintor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.7	Horómetro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.8	Avisos laterales y aéreos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.9	Cinta reflectiva.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.10	Tuercas y espárragos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.11	Estado externo de la maquina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.12	Estado de la cabina.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.13	Estado externo de la bomba hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.14	Estado externo de manguera hidráulica y válvulas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.15	Pintura y latonería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
1.16	Tapicería y cojinería.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA ELECTRICO														
2.1	Luces frontales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.2	Direccionales.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.3	Stop.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.4	Luces de parqueo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.5	Luces traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.6	Pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.7	Pito de reversa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.8	Tablero.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2.9	Baliza y buggui	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	MOTOR														
3.1	Estado del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.2	Nivel de aceite del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.3	Estado de frenos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.4	Freno de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.5	Estado de dirección.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.6	Nivel de liquido refrigerante del motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.7	Motor de arranque.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.8	Tanque de combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.9	Nivel de aceite hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3.1	Batería (conexión y carga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


Lunes Observaciones




Martes Observaciones




Miércoles Observaciones



Jueves Observaciones




Viernes Observaciones



Sábado Observaciones



Domingo Observaciones



Revisado por:

Jader Vital

Cargo:

Constructor

Vo.Bo. Supervisor de Seguridad:

Kelly Flores

ANEXO

AST

	ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)	Versión No: 4 Fecha de Versión: Julio 23/2022 Página 1 de 2
INICIO: Día: <u>5</u> Mes: <u>05</u> Año: <u>2025</u>		
Aislamiento de energías peligrosas: ☐ Térmico ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Neumática	EPP Requeridos ☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☒ Protección facial/ojos ☒ Protección Auditiva ☒ Protección Respiratoria ☒ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caídas	Tareas de Alto Riesgo ☐ Perros en Caliente ☐ Excavación ☐ Aislamiento ☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas ☐ Trabajos en Alturas
Breve descripción de la Actividad: <u>Supervisión, identificación de Flora y Fauna.</u>		Proyecto: <u>Consorcio a fianza ambiental</u> Lugar: <u>Cano Villavieja</u>
AST Preparado por: <u>Nombre</u> <u>Josany Motta</u> <u>Walter Barbosa</u>	Cargo <u>Ing. Pesquero</u> <u>Biologo</u>	AST Autorizado por: Firma: <u>Polina Muñoz</u> <u>Director Obra</u>
Pasos detallados de la tarea <small>(use hojas adicionales si es necesario)</small>	Peligros existentes y potenciales <small>(use hojas adicionales si es necesario)</small>	Nombre Jefe a cargo: Nombre siso a Cargo: Firma: <u>Polina Muñoz</u> <u>Director Obra</u> Firma: <u>Kelly Flores</u> <u>Supervisor SST</u>
INSPECCION DEL AREA INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIDA AL MISMO NIVEL Y DISTINTOS NIVELES	Riesgo Inicial: <u>M</u>
ENCUESTAS A LA COMUNIDAD CERCANA A LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	Riesgo Inicial: <u>M</u>
SENSO MONITOREO DE FLORA Y FAUNA PRESENTE EN LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	Riesgo Inicial: <u>M</u>
INSPECCION DE ARBOLES PRESENTES EN EL AREA DE INTERVENCION	PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	Riesgo Inicial: <u>M</u>
RESCATE Y REUBICACION DE LA FLORA Y FAUNA	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO GOLPE DE CALOR	Riesgo Inicial: <u>M</u>
INTERACCION DEL ECOSISTEMA CARACTERISTICAS DEL HABITAT DE LOS ANIMALES PRESENTES COMPORTAMIENTO DE ORGANISMO EN EL AREA INTERVENIDA	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, RIESGO PUBLICO	Riesgo Inicial: <u>M</u>
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.		RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.



800 LECTURE COURSE: 40-800/800-8000 • 400/800-8000
 400/800-8000

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Jordan No. 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Versión No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 17 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Supervisión, identificación de Flora y Fauna
Sensu

Proyecto:

Consorcio alianza Ambiental

Lugar:

Cono Villa rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Walter Lortosa	Biologo	Firma: Rolue Hinoj	Firma: Rolue Hinoj	Firma: Kelly Flores
	Jasney Motta	Ing. Pesquero	Director de Obra	Director de Obra	Supervisor
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL AREA INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIDA AL MISMO NIVEL Y DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
ENCUESTAS A LA COMUNIDAD CERCANA A LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	HIDRATACION EPP		B
SENSO MONITOREO DE FLORA Y FAUNA PRESENTE EN LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	MANEJO DE CONFLICTOS COMUNICACIÓN ASERTIVA		B
INSPECCION DE ARBOLES PRESENTES EN EL AREA DE INTERVENCION	PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
RESCATE Y REUBICACION DE LA FLORA Y FAUNA	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO GOLPE DE CALOR	M	IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
INTERACCION DEL ECOSISTEMA CARACTERISTICAS DEL HABITAT DE LOS ANIMALES PRESENTES COMPORTAMIENTO DE ORGANISMO EN EL AREA INTERVENIDA	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, RIESGO PUBLICO	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR ORDEN Y ASEO		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Verfahren: May 4

Fecha de Vencimiento:

DATE 23/12/2017

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Versión No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 19 Mes: 05 Año: 2025

Atenuamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☐ Casco
- ☐ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 24 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Andamio
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Proyecto:

Consorcio alianza ambiental

Lugar:

Cano Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Walter Barbosa	Biologo	Firma: Rolando Muñoz	Firma: Rolando Muñoz	Firma: Kelly Flores
	Jasney Motta	Ing. Pesquero	Director Obra	Director Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos:
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL AREA INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIDA AL MISMO NIVEL Y DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
ENCUESTAS A LA COMUNIDAD CERCANA A LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	HIDRATACION EPP		B
SENSO MONITOREO DE FLORA Y FAUNA PRESENTE EN LA OBRA	DOLORS MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	MANEJO DE CONFLICTOS COMUNICACIÓN ASERTIVA		B
INSPECCION DE ARBOLES PRESENTES EN EL AREA DE INTERVENCION	PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
RESCATE Y REUBICACION DE LA FLORA Y FAUNA	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO GOLPE DE CALOR	M	IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
INTERACCION DEL ECOSISTEMA CARACTERISTICAS DEL HABITAT DE LOS ANIMALES PRESENTES COMPORTAMIENTO DE ARGANISMO EN EL AREA INTERVENIDA	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, RIESGO PUBLICO	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR ORDEN Y ASEO		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Versión No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 26 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 30 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Supervisión, identificación de flora y fauna


Proyecto:

Consorcio alianza ambiental

Lugar:

Cano Villorosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre sise a Cargo:
Walter Barbosa Jasney Motta		Biologo Ing. Pesquero	Firma: Rolue Muñoz Director Obra	Firma: Rolue Muñoz Director Obra	Firma: Kelly Florez Supervisora SST
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	
(use hojas adicionales si es necesario)		(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial		
INSPECCION DEL AREA INSPECCION DE HERRAMIENTAS		CAIDA AL MISMO NIVEL Y DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	
ENCUESTAS A LA COMUNIDAD CERCANA A LA OBRA		DOLORES MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	HIDRATACION EPP	
SENSO MONITOREO DE FLORA Y FAUNA PRESENTE EN LA OBRA		DOLORES MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	MANEJO DE CONFLICTOS COMUNICACIÓN ASERTIVA	
INSPECCION DE ARBOLES PRESENTES EN EL ÁREA DE INTERVENCION		PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	
RESCATE Y REUBICACION DE LA FLORA Y FAUNA		RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO GOLPE DE CALOR	M	IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	
INTERACCION DEL ECOSISTEMA CARACTERISTICAS DEL HABITAT DE LOS ANIMALES PRESENTES COMPORTAMIENTO DE ARGANSIMO EN EL AREA INTERVENIDA		QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, RIESGO PUBLICO	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR ORDEN Y ASEO	
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		





ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Versión No: 4

Fecha de Versión:
Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 2 Mes: 6 Año: 2025

FINAL: Día: 7 Mes: 6 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Supervisión, identificación de Flora y Fauna
Sensu.

Proyecto:

Consorcio alianza ambiental

Lugar:

Cano Ulla Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Walter Cortosa	Biologo	Firma: Walter Cortosa	Firma: Walter Cortosa	Firma: Kelly Flores
	Jasney Notta	Ing. Pesquero	Director Obra	Director Obra	Supervisor SS
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL AREA INSPECCION DE HERRAMIENTAS	CAIDA AL MISMO NIVEL Y DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
ENCUESTAS A LA COMUNIDAD CERCANA A LA OBRA	DOLORES MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	HIDRATACION EPP		B
SENSO MONITOREO DE FLORA Y FAUNA PRESENTE EN LA OBRA	DOLORES MUSCULARES PICADURAS DE ANIMALES PONZAÑOSOS O VENENOSOS	M	MANEJO DE CONFLICTOS COMUNICACIÓN ASERTIVA		B
INSPECCION DE ARBOLES PRESENTES EN EL AREA DE INTERVENCION	PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
RESCATE Y REUBICACION DE LA FLORA Y FAUNA	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO GOLPE DE CALOR	M	IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
INTERACCION DEL ECOSISTEMA CARACTERISTICAS DEL HABITAT DE LOS ANIMALES PRESENTES COMPORTAMIENTO DE ARGANISMO EN EL AREA INTERVENIDA	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, RIESGO PUBLICO	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR ORDEN Y ASEO		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.		RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.			



Version No.: 4

Fecha de Versión:

Juli 23/2022

Página 2 de 2

[illegible]

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.



ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 5 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 10 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

TRANSPORTE DE PERSONA Y TRASLADO DE MATERIAL

Proyectos:

LIMPIEZA DE CAÑO

Lugar:

VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a cargo:
	Humberto Escorcia	conductor	Firma: Polque Hurtado Director Obra	Firma: Polque Hurtado Director Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor est
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FOMENTO DE AUTOCAUDADO PARTICIPACION EN CHARLAS		B
INSPECCION DE CAMIONETA O EQUIPO	ATRAPAMIENTO POR OBJETOS-CAIDA DISTINTOS NIVELES	M	USO DE GUNTES DE SEGURIDO-UTILIZAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA CAMIONETA PARA ASCENSO Y DESCENSO		B
TRASLADO O DESPLAZAMIENTOS DEL CAMPAMENTO A ZONAS DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	TRASLADO DE PERSONAS -ORDEN PUBLICO-OSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - VOLCAMIENTO- DECENSO Y ASCENSO DE VEHICULO	A	RESPECTAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO SEGURO EN CARRETERA- MANEJO DE USUARIO- USO DE DOTACION COMPLETA- LLAMAR CUADRANTE 322-806-7886- NO REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS, SIEMPRE ESTAR ATENTO AL TERRENO DONDE ME TRASLADO- CONCENTRACION AL REALIZAR LABOR- USO DE PUNTOS DE APOYO DEL VEHICULO		M
TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	TRASLADO DE PERSONAS - ORDENES PUBLICO POSTURA INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO	A	RESPECTAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS-USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADAS - HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE CAMIONETA	ACCIDENTES DE TRANCITO DESHIDRATACION	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.



ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 2 de 2

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

INICIO : Día: 12 Mes: 05 Año: 2025 Aislamiento de energías peligrosas:		FINAL: Día: 17 Mes: 05 Año: 2025 Tareas de Alto Riesgo	
☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Neumática		☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☐ Protección facial/ojos ☐ Protección Auditiva ☐ Protección Respiratoria ☐ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caldas	
Breve descripción de la Actividad: TRANSPORTE DE PERSONA Y TRASLADO DE MATERIAL		Proyecto: LIEMPIEZA DE CAÑO	
		Lugar: VILLA ROSA	
AST Preparado por:	Nombre	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:
	Humberto Escorcia		Nombre siso a Cargo:
	Cochinero	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
		Director de obra	Supervisor EST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial	Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS
INSPECCION DE CAMIONETA O EQUIPO	ATRAPAMIENTO POR OBJETOS-CAIDA DISTINTOS NIVELES	M	USO DE GUNTES DE SEGURIDAD-UTILIZAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA CAMIONETA PARA ASCENSO Y DESCENSO
TRASLADO O DESPLAZAMIENTOS DEL CAMPAMENTO A ZONAS DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	TRASLADO DE PERSONAS -ORDEN PUBLICO-OSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - VOLCAMIENTO- DECENSO Y ASCENSO DE VEHICULO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO SEGURO EN CARRETERA- MANEJO DE USUARIO- USO DE DOTACION COMPLETA- LLAMAR CUADRANTE 322-606-7886- NO REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS, SIEMPRE ESTAR ATENTO AL TERRENO DONDE ME TRASLADO- CONCENTRACION AL REALIZAR LABOR- USO DE PUNTOS DE APOYO DEL VEHICULO
TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	TRASLADO DE PERSONAS - ORDENES PUBLICO POSTURA INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS-USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADAS- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES
PARQUEO DE CAMIONETA	ACCIDENTES DE TRANCITO DESHIDRATACION	M	PAUSE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

INICIO: Día: 19 Mes: 05 Año: 2025

Alisamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☐ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 24 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Andamiaje
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

TRANSPORTE DE PERSONA Y TRASLADO DE MATERIAL

Proyectar:

LIEMPIEZA DE CAÑO

Lugar:

VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
Humberto Escocera	Conductor		Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
			Director Obra	Director Obra	Super
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS		B
INSPECCION DE CAMIONETA O EQUIPO	ATRAPAMIENTO POR OBJETOS-CAIDA DISTINTOS NIVELES	M	USO DE GUNTES DE SEGURIDAD-UTILIZAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA CAMIONETA PARA ASCENSO Y DESCENSO		B
TRASLADO O DESPLAZAMIENTOS DEL CAMPAMENTO A ZONAS DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	TRASLADO DE PERSONAS -ORDEN PUBLICO-OSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - VOLCAMIENTO- DECENSO Y ASCENSO DE VEHICULO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO SEGURO EN CARRETERA- MANEJO DE USUARIO- USO DE DOTACION COMPLETA- LLAMAR CUADRANTE 322-806-7886- NO REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS, SIEMPRE ESTAR ATENTO AL TERRENO DONDE ME TRASLADO- CONCENTRACION AL REALIZAR LABOR- USO DE PUNTOS DE APOYO DEL VEHICULO		M
TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	TRASLADO DE PERSONAS - ORDENES PUBLICO POSTURA INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS-USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADAS - HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE CAMIONETA	ACCIDENTES DE TRANCITO DESHIDRATACION	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

INICIO: Día: 26 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caldas

 FINAL: Día: 31 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

TRANSPORTE DE PERSONA Y TRASLADO DE MATERIAL

Proyecto:

LIEMPTA DE CAÑO

Lugar:

VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre aso a Cargo:
	Humberto escorcia	Conductor	Firma: <i>Roberto Lopez</i> Director Obra	Firma: <i>Roberto Lopez</i> Director Obra	Firma: <i>Kelly Flores</i> Supervisor
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS		B
INSPECCION DE CAMIONETA O EQUIPO	ATRAPAMIENTO POR OBJETOS-CAIDA DISTINTOS NIVELES	M	USO DE GUNTES DE SEGURIDAD-UTILIZAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA CAMIONETA PARA ASCENSO Y DESCENSO		B
TRASLADO O DESPLAZAMIENTOS DEL CAMPAMENTO A ZONAS DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	TRASLADO DE PERSONAS -ORDEN PUBLICO-OSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - VOLCAMIENTO- DESCENSO Y ASCENSO DE VEHICULO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO SEGURO EN CARRETERA- MANEJO DE USUARIO- USO DE DOTACION COMPLETA- LLAMAR CUADRANTE 322-806-7886- NO REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS, SIEMPRE ESTAR ATENTO AL TERRENO DONDE ME TRASLADO- CONCENTRACION AL REALIZAR LABOR- USO DE PUNTOS DE APOYO DEL VEHICULO		M
TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	TRASLADO DE PERSONAS - ORDENES PUBLICO POSTURA INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO	A	RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS-USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADAS - HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE CAMIONETA	ACCIDENTES DE TRANCITO DESHIDRATACION	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

INICIO: Día: 2 Mes: 06 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 7 Mes: 06 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la actividad:

TRANSPORTE DE PERSONA Y TRASLADO DE MATERIAL

Proyectos:

LIEMPIEZA DE CAÑO

Lugar:

VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
	Aumberto escorera	Conductor	Firma: Poline Luján Director Obra	Firma: Poline Luján Director Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FOMENTO DE AUTOQUIDAD PARTICIPACION EN CHARLAS		B
INSPECCION DE CAMIONETA O EQUIPO	ATRAPAMIENTO POR OBJETOS-CAIDA DISTINTOS NIVELES	M	USO DE GUNTES DE SEGURIDO-UTILIZAR LOS PUNTOS DE APOYO DE LA CAMIONETA PARA ASCENSO Y DESCENSO		B
TRASLADO O DESPLAZAMIENTOS DEL CAMPAMENTO A ZONAS DE OBRAS EN TODO EL DISTRITO	TRASLADO DE PERSONAS -ORDEN PUBLICO-OSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - VOLCAMIENTO- DESCENSO Y ASCENSO DE VEHICULO	A	RESPECTAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO SEGURO EN CARRETERA- MANEJO DE USUARIO- USO DE DOTACION COMPLETA- LLAMAR CUADRANTE 322-806-7886- NO REALIZAR MANIOBRAS PELIGROSAS, SIEMPRE ESTAR ATENTO AL TERRENO DONDE ME TRASLADO- CONCENTRACION AL REALIZAR LABOR- USO DE PUNTOS DE APOYO DEL VEHICULO		M
TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	TRASLADO DE PERSONAS - ORDENES PUBLICO POSTURA INADECUADAS O PROLONGADA - SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL - FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO	A	RESPECTAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA CAMIONETA (PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS-USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENFASTS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADAS - HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACION/LES		M
PARQUEO DE CAMIONETA	ACCIDENTES DE TRANCITO DESHIDRATACION	M	PAR/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la gravedad del daño que pueda ser causado por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

INICIO: Día: 9 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 10 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

 Breve descripción de la Actividad:
 CARGUE DE VOLQUETA CON RCD. Y DISPOSICION FINAL

Proyecto: Consorcio Alanza ambiental

Lugar: Caño villa rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
WIS Mizar, Jader Vital		Conductores	Firma: Polu Muñoz	Firma: Polu Muñoz	Firma: Kelly Flores
ruben moreno, wis chiny			Director de Obra	Director Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FONENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS SST		B
INSPECCION DE VOLQUETA	VOLCAMIENTO POR TERRENO INREGULAR	M	HIDRATACION- USO DE EPP ADECUADO A LAS TAREA		B
CARGUE DE MATERIAL	ATRAPAMIENTO- PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y VENENOSOS- VOLCAMIENTO- PELIGRO DE TRANSITO	A	PAUSAS- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS- ALERTRA ALOS PUNTOS CRITICOS- IMPLMETACION DE LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL(PITO,LARMA DE LA VOLQUETA)		M
DESCARGUE DE MATERIAL	ORDEN PUBLICO- POSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- FATIGA VISUALY AGOTAMIENTO - ESTRÉS- CANSACIO	A	CONTROLES: RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA VOLQUETA(PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS- USO DE DOTACION COMPLETA - REALIZAR PAUSA ACTIVA ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADA- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE VOLQUETA	ATRAPAMIENTO- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- CEFALEA -VIBRACION- RUIDO	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO		B
SALIDA DE VOLQUETA	ACCIDENTE DE TRANCITO-EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS-SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- VIBRACION-RUIDO	M	PARA/SIGA-IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO- DOCUMENTOS DEL VEHICULO AL DIA- USO DE CINTURON DE SEGURIDAD		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Pagina 1 de 2

INICIO: Día: Mes: Año:

12 05 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: Mes: Año:

17 06 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

CARGUE DE VOLQUETA CON RCD. Y DISPOSICION FINAL

Proyecto:

Consorcio alianza Ambiental

Lugar:

Cano Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Wis ching, Wis mirraz, ruben morales, Jorder Vitor		Conductores	Firma: Rodue Munoz Director de Obra	Firma: Rodue Munoz Director de Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FONENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS SST		B
INSPECCION DE VOLQUETA	VOLCAMIENTO POR TERRENO INREGULAR	M	HIDRATACION- USO DE EPP ADECUADO A LAS TAREA		B
CARGUE DE MATERIAL	ATRAPAMIENTO- PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y VENENOSOS- VOLCAMIENTO- PELIGRO DE TRANSITO	A	PAUSAS- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS- ALERTRA ALOS PUNTOS CRITICOS- IMPLEMETACION DE LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL(PITO,LARMA DE LA VOLQUETA)		M
DESCARGUE DE MATERIAL	ORDEN PUBLICO- POSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- FATIGA VISUALY AGOTAMIENTO - ESTRÉS- CANSACIO	A	CONTROLES: RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA VOLQUETA(PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS- USO DE DOTACION COMPLETA - REALIZAR PAUSA ACTIVA ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADA- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE VOLQUETA	ATRAPAMIENTO- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- CEFALEA -VIBRACION- RUIDO	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO		B
SALIDA DE VOLQUETA	ACCIDENTE DE TRANCITO-EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS-SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- VIBRACION-RUIDO	M	PARA/SIGA-IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO- DOCUMENTOS DEL VEHICULO AL DIA- USO DE CINTURON DE SEGURIDAD		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Luis ching	Luis ching	12/05/2025	Luis ching	Luis ching	16/05/2025
Jader Vital	Jader Vital	12/05/2025	Luis Mizzor	Luis Mizzor	16/05/2025
Ruben moreno	Ruben moreno	12/05/2025	Ruben moreno	Ruben moreno	17/05/2025
Luis Mizzor	Luis Mizzor	12/05/2025	Jader Vital	Jader Vital	17/05/2025
Luis Mizzor	Luis Mizzor	13/05/2025	Luis ching	Luis ching	17/05/2025
Ruben moreno	Ruben moreno	13/05/2025	Luis Mizzor	Luis Mizzor	17/05/2025
Luis ching	Luis ching	13/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	13/05/2025			
Luis Mizzor	Luis Mizzor	14/05/2025			
Ruben moreno	Ruben moreno	14/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	14/05/2025			
Luis ching	Luis ching	14/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	15/05/2025			
Luis Mizzor	Luis Mizzor	15/05/2025			
Luis ching	Luis ching	15/05/2025			
Ruben moreno	Ruben moreno	15/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	16/05/2025			
Ruben moreno	Ruben moreno	16/05/2025			

CONSECUENCIA: Es el resultado de una accion llamase negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.

 <p>TICOM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)	Versión No: 4 Fecha de Versión: Julio 23/2022 Página 1 de 2		
INICIO: Día: 19 Mes: 05 Año: 2025 Aislamiento de energías peligrosas: ☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Neumática	EPP Requeridos ☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☒ Protección Facial/Ojos ☒ Protección Auditiva ☒ Protección Respiratoria ☒ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caldas	FINAL: Día: 24 Mes: 05 Año: 2025 Tarea de Alto Riesgo ☐ Permisos en Caliente ☐ Excavación ☐ Aislamiento ☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas ☐ Trabajos en Alturas		
Breve descripción de la Actividad: CARGUE DE VOLQUETA CON RCD. Y DISPOSICION FINAL		Proyecto: CAA Lugar: Camino Villorosa		
AST Preparado por: Nombre Ruben Moreno, Wis Ching, Jader Vilal, Wis Mizzar	Cargo Conductores	AST Autorizado por: Firma: Rolando Muñoz Director de Obra	Nombre Jefe a cargo: Firma: Rolando Muñoz Director de Obra	Nombre Siso a Cargo: Firma: Kelly Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea <small>(use hojas adicionales si es necesario)</small>	Peligros existentes y potenciales <small>(use hojas adicionales si es necesario)</small>	Riesgo Inicial	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FONENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS SST	B
INSPECCION DE VOLQUETA	VOLCAMIENTO POR TERRENO INREGULAR	M	HIDRATACION- USO DE EPP ADECUADO A LAS TAREA	B
CARGUE DE MATERIAL	ATRAPAMIENTO- PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y VENENOSOS- VOLCAMIENTO- PELIGRO DE TRANSITO	A	PAUSAS- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS- ALERTA A LOS PUNTOS CRITICOS- IMPLMETACION DE LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL(PITO,LARNA DE LA VOLQUETA)	M
DESCARGUE DE MATERIAL	ORDEN PUBLICO- POSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- FATIGA VISUAL Y AGOTAMIENTO - ESTRÉS- CANSACIO	A	CONTROLES: RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA VOLQUETA(PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS- USO DE DOTACION COMPLETA- REALIZAR PAUSA ACTIVA ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADA- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES	M
PARQUEO DE VOLQUETA	ATRAPAMIENTO- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- CEFALEA -VIBRACION- RUIDO	M	PARA/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO	B
SALIDA DE VOLQUETA	ACCIDENTE DE TRANCITO-EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS-SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- VIBRACION-RUIDO	M	PARA/SIGA-IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO- DOCUMENTOS DEL VEHICULO AL DIA- USO DE CINTURON DE SEGURIDAD	B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.		RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4

Fecha de Version:
Julio 23/2022

Pagina 1 de 2

INICIO: Día: 26 Mes: 05 Año: 2025
Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Químico/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 31 Mes: 05 Año: 2025
Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:
CARGUE DE VOLQUETA CON RCD. Y DISPOSICION FINAL

Proyecto: Consorcio alianza ambiente

Lugar: Cano Villa rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Wies chiny, Jader Vital ruben moreno, Luis mizzor	Conductor	Firma: Roque Muñoz Director Obra	Firma: Roque Muñoz Director Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor SST

Pasos detallados de la tarea (use hojas adicionales si es necesario)	Peligros existentes y potenciales (use hojas adicionales si es necesario)	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos
		Inicial		Después
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FONENTO DE AUTOCUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS SST	B
INSPECCION DE VOLQUETA	VOLCAMIENTO POR TERRENO INREGULAR	M	HIDRATACION- USO DE EPP ADECUADO A LAS TAREA	B
CARGUE DE MATERIAL	ATRAPAMIENTO- PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y VENENOSOS- VOLCAMIENTO- PELIGRO DE TRANSITO	A	PAUSAS- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS- ALERTRA ALOS PUNTOS CRITICOS- IMPLEMETACION DE LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL(PITO, LARMA DE LA VOLQUETA)	M
DESCARGUE DE MATERIAL	ORDEN PUBLICO- POSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- FATIGA VISUALY AGOTAMIENTO - ESTRÉS- CANSACIO	A	CONTROLES: RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA VOLQUETA(PITO, REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS- USO DE DOTACION COMPLETA - REALIZAR PAUSA ACTIVA ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADA- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES	M
PARQUEO DE VOLQUETA	ATRAPAMIENTO- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- CEFALEA -VIBRACION- RUIDO	M	PAR/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO	B
SALIDA DE VOLQUETA	ACCIDENTE DE TRANCITO-EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS-SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- VIBRACION-RUIDO	M	PARA/SIGA-IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO- DOCUMENTOS DEL VEHICULO AL DIA- USO DE CINTURON DE SEGURIDAD	B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Jader Vital	Jader Vital	26/05/2025	Jader Vital	Jader Vital	30/05/2025
Ruben Moreno	Ruben Moreno	26/05/2025	Luis Mizzar	Luis Mizzar	30/05/2025
Luis Mizzar	Luis Mizzar	26/05/2025	Ruben Moreno	Ruben Moreno	31/05/2025
Luis Ching	Luis Ching	26/05/2025	Jader Vital	Jader Vital	31/05/2025
Jader Vital	Jader Vital	27/05/2025	Luis Ching	Luis Ching	31/05/2025
Luis Ching	Luis Ching	27/05/2025	Luis Mizzar	Luis Mizzar	31/05/2025
Ruben Moreno	Ruben Moreno	27/05/2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	27/05/2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	28/05/2025			
Luis Ching	Luis Ching	28/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	28/05/2025			
Ruben Moreno	Ruben Moreno	28/05/2025			
Luis Ching	Luis Ching	29/05/2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	29/05/2025			
Ruben Moreno	Ruben Moreno	29/05/2025			
Jader Vital	Jader Vital	29/05/2025			
Luis Ching	Luis Ching	30/05/2025			
Ruben Moreno	Ruben Moreno	30/05/2025			

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción llamada negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO : Día: 2 Mes: 06 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☐ Casco
- ☐ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 7 Mes: 06 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:
CARGUE DE VOLQUETA CON RCD. Y DISPOSICION FINAL

Proyecto:

0AA

Lugar:

Canoa Villarosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	ruben moreno, jader Vital, luis mizgar, luis ching	Conductores	Firma: Rolue Muñoz Director Obra	Firma: Rolue Muñoz Director Obra	Firma: Kelly Florez Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Despues
INSPECCION DEL ARE	CAIDA AL AVISMO Y DISTINTOS NIVELES ATAQUE ANIMAL, VECTORES Y PLANTA	M	FONENTO DE AUTOQUIDADO PARTICIPACION EN CHARLAS SST		B
INSPECCION DE VOLQUETA	VOLCAMIENTO POR TERRENO IRREGULAR	M	HIDRATACION- USO DE EPP ADECUADO A LAS TAREA		B
CARGUE DE MATERIAL	ATRAPAMIENTO- PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS Y VENENOSOS- VOLCAMIENTO- PELIGRO DE TRANSITO	A	PAUSAS- IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS- ALERTRA ALOS PUNTOS CRITICOS- IMPLMETACION DE LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL(PITO,LARMA DE LA VOLQUETA)		M
DESCARGUE DE MATERIAL	ORDEN PUBLICO- POSTURAS INADECUADAS O PROLONGADA- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- FATIGA VISUALY AGOTAMIENTO - ESTRES- CANSACIO	A	CONTROLES: RESPETAR NORMAS DE TRANSITO- USO DE ALARMAS DE LA VOLQUETA(PITO,REVERSA)- MANEJO DE USUARIOS- USO DE DOTACION COMPLETA - REALIZAR PAUSA ACTIVA ENFASIS VISUAL- TOMAR DESCANSO ENTRE JORNADA- HIDRATACION- ACTIVIDADES DINAMICAS OCUPACIONALES		M
PARQUEO DE VOLQUETA	ATRAPAMIENTO- SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- CEFALEA -VIBRACION- RUIDO	M	PARE/SIGA- IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO		B
SALIDA DE VOLQUETA	ACCIDENTE DE TRANCITO-EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS-SUPERFICIE DEFECTUOSA O EN DESNIVEL- VIBRACION-RUIDO	M	PARA/SIGA-IDENTIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS- SEÑALES DE TRANSITO- DOCUMENTOS DEL VEHICULO AL DIA- USO DE CINTURON DE SEGURIDAD		B

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Ruben Moreno	Ruben Moreno	2 / 06 / 2025	Ruben Moreno	Ruben Moreno	6/06/2025
Jader Vital	Jader Vital	2 / 06 / 2025	Wis ching	Wis ching	6/06/2025
Luis ching	Wis ching	2 / 06 / 2025	Luis Mizzar	Luis Mizzar	7/06/2025
Luis Mizzar	Luis Mizzar	2 / 06 / 2025	Ruben Moreno	Ruben Moreno	7/06/2025
Wis ching	Wis ching	3 / 06 / 2025	Wis ching	Wis ching	7/06/2025
Jader Vital	Jader Vital	3 / 06 / 2025	Jader Vital	Jader Vital	7/06/2025
Ruben Moreno	Ruben Moreno	3 / 06 / 2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	3 / 06 / 2025			
Wis ching	Wis ching	4 / 06 / 2025			
Jader Vital	Jader Vital	4 / 06 / 2025			
Ruben Moreno	Ruben Moreno	4 / 06 / 2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	4 / 06 / 2025			
Ruben Moreno	Ruben Moreno	5 / 06 / 2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	5 / 06 / 2025			
Jader Vital	Jader Vital	5 / 06 / 2025			
Wis ching	Wis ching	5 / 06 / 2025			
Jader Vital	Jader Vital	6 / 06 / 2025			
Luis Mizzar	Luis Mizzar	6 / 06 / 2025			

CONSECUENCIA A1:Q57A: Es el resultado de una acción llamase negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Pagina 1 de 2

INICIO: Día: 5 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 10 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Medición y marcación del terreno donde se ejecutara la obra.

Proyecto:

Consorcio alianza Ambiental

Lugar:

Cerro Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
Jose avila Arenas		Topografo	Firma: Rolando Munoz	Firma: Rolando Munoz	Firma: Betty Flores
Domingo Garguerez		Cadenero	Director de Obra	Director de Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	
(use hojas adicionales si es necesario)		(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial		
INSPECCION DE L AREA		CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	
INSPECCION DE HERRAMIENTAS		TEMPERATURA EXTREMA, GOLPE DE CALOR	M	CHARLAS SST, DELIGENCIAS FORMATO	
TRASLADO E INSTALACION DEL EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE TRABAJO		ALERGIAS NAZALES Y DERMICAS, MATERIAL PATRIDO	M	INSPECCIONESY PREOPERACIONALES DE MAQUINAS / HERRAMIENTAS	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		PICADURAS DE ANIMALES O INSECTOS	M	USO DE PASAMONTAÑAS, USO DE EPP	
COLOCACION DE ESTANCAS DE MEDISIDAS		ATROPELLAMIENTO, DOLORES MUSCOESQUELETICO POR EXPOSICIÓN A POSTURAS	M	REALIZAR PAUASA ACTIVA, HIDRATAACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	
REPLANTEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS		RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO	M	SEÑALIZACION Y DEMARCAACION DE AREAS	
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS		QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, HESGO PUBLICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	CULTURA PREVENTIVA Y SEÑALIZACION DE TRABAJO CON INTERACCION DE MAQUINAS	
MANTENER ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO		PICADURAS, MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	USO DE PARE/SIGA, PERMISO DE TRABAJO, ACOPIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	
PELIGRO: Fuente, situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]



ANALISTA SEGURO DE TRABAJO (AST)

Versión No: 4
Fecha de Versión:
Julio 23/2022
Página 1 de 2

INICIO: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025		FINAL: Día: 17 Mes: 05 Año: 2025			
Atenuamiento de energías peligrosas:		EPP Requeridos			
☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Pneumática		☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☒ Protección Facial/Ojos ☐ Protección Auditiva ☒ Protección Respiratoria ☐ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caídas			
Tareas de Alto Riesgo: ☐ Permisos en Caliente ☐ Excavación ☐ Andamiaje ☐ Espacios Confinados ☐ Carga de Cargas ☐ Trabajos en Alturas					
Breve descripción de la Actividad: Medición y marcación del terreno donde se ejecutara la obra		Proyecto: Consorcio alianza ambiental Lugar: Cano villa rosa			
AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Jose avila arnes		Topografo	Firma: Rolue Hinoi	Firma: Rolue Hinoi	Firma: Kelly Flores
Domingo Gonzalez		Cadenero	Director de Obra	Director de Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgo
(ver hojas adicionales si es necesario)		(ver hojas adicionales si es necesario)	Inicial		Después
INSPECCION DE L AREA		, CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCONCIENCIA	B
INSPECCION DE HERRAMIENTAS		, TEMPERATURA EXTREMA , GOLPE DE CALOR	M	CHARLAS SST, DELIGENCIAS FORMATO	B
TRASLADO E INSTALACION DEL EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE TRABAJO		ALERGIAS NAZALES Y DERMICAS, MATERIAL PATRIDO	M	INSPECCIONESY PREOPERACIONALES DE MAQUINAS / HERRAMIENTAS	B
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		PICADURAS DE ANIMALES O INSECTOS	M	USO DE PASAMONTAÑAS, USO DE EPP	B
COLOCACION DE ESTANCAS DE MEDIDAS		ATROPELLAMIENTO, DOLORS MUSCOESQUELETICO POR EXPOSICIÓN A POSTURAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	B
REPLANTEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS		RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO	M	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	B
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS		QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, HESGO PUBLICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	CULTURA PREVENTIVA Y SEÑALIZACION DE TRABAJO CON INTERACCION DE MAQUINAS	B
MANTENER ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO		PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	USO DE PARE/SIGA, PERMISO DE TRABAJO, ACOPIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Version No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 19 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Calzado
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 23 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Medición y marcación del terreno donde se ejecutará la obra.

Proyecto:

Consorcio alarma ambiental

Lugar:

Cano villa rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
Jose avila arenas		Topografo	Firma: Polue Huñoz	Firma: Polue Huñoz	Firma: Kelly Florez
Domingo Gonzalez		Cadenero	Proctor de Obra	Director de Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Despues
INSPECCION DE L AREA	, CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	, TEMPERATURA EXTREMA , GOLPE DE CALOR	M	CHARLAS SST, DELIGENCIAS FORMATO		B
TRASLADO E INSTALACION DEL EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE TRABAJO	ALERGIAS NAZALES Y DERMICAS, MATERIAL PATRIDO	M	INSPECCIONESY PREOPERACIONALES DE MAQUINAS / HERRAMIENTAS		B
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	PICADURAS DE ANIMALES O INSECTOS	M	USO DE PASAMONTAÑAS, USO DE EPP		B
COLOCACION DE ESTANCAS DE MEDISDAS	ATROPELLAMIENTO, DOLORES MUSCOSQUELETICO POR EXPOSICIÓN A POSTURAS	M	REALIZAR PAUASA ACTIVA, HIDRATAACION, USO DE PROTECTOR SOLAR		B
REPLANTEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO	M	SEÑALIZACION Y DEMARCAACION DE AREAS		B
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, HESGO PUBLICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	CULTURA PREVENTIVA Y SEÑALIZACION DE TRABAJO CON INTERACCION DE MAQUINAS		B
MANTENER ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO	PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	USO DE PARE/SIGA, PERMISO DE TRABAJO, ACOPIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	19/05/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	20/05/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	21/05/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	22/05/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	23/05/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	24/05/2025

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción llamase negativa o positiva.

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Joseavila arenas	Joseavila A.	19/05/2025
Joseavila arenas	Joseavila A.	20/05/2025
Joseavila arenas	Joseavila A.	21/05/2025
Joseavila arenas	Joseavila A.	22/05/2025
Joseavila arenas	Joseavila A.	23/05/2025
Joseavila arenas	Joseavila A.	24/05/2025

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Versión No: 4

Fecha de Versión:
Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 26 Mes: 05 Año: 2025

Atsamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☒ Protección Contra Caldas

FINAL: Día: 31 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Atsamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Medición y marcación del terreno donde se ejecutará la obra

Proyecto:

Consorcio Alianza Ambiental

Lugar:

Cerro villa rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Jose avila arenas	Topografo	Firma: Rolue Hurtos	Firma: Rolue Hurtos	Firma: Kelly Flores
	Domingo Gonzalez	Cadenero	Director de Obra	Director de Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	
(use hojas adicionales si es necesario)		(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial		
INSPECCION DE LA AREA		, CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCLUIDADO	
INSPECCION DE HERRAMIENTAS		, TEMPERATURA EXTREMA , GOLPE DE CALOR	M	CHARLAS SST, DELIGENCIAS FORMATO	
TRASLADO E INSTALACION DEL EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE TRABAJO		ALERGIAS NAZALES Y DERMICAS, MATERIAL PATRIDO	M	INSPECCIONESY PREOPERACIONALES DE MAQUINAS / HERRAMIENTAS	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		PICADURAS DE ANIMALES O INSECTOS	M	USO DE PASAMONTAÑAS, USO DE EPP	
COLOCACION DE ESTANCAS DE MEDISDAS		ATROPELLAMIENTO, DOLORES MUSCOESQUELETICO POR EXPOSICIÓN A POSTURAS	M	REALIZAR PAUASA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	
REPLANTEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS		RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO	M	SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS	
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS		QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, HESGO PUBLICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	CULTURA PREVENTIVA Y SEÑALIZACION DE TRABAJO CON INTERACCION DE MAQUINAS	
MANTENER ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO		PICADURAS , MORDEDURAS Y ALERGIAS	M	USO DE PARE/STGA, PERMISO DE TRABAJO, ACOPIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	
PELIGRO: Fuente, situacion o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinacion de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible][illegible]

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción llámese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.

	ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)	Versión No: 4 Fecha de Versión: Julio 23/2022 Página 1 de 2		
INICIO: Día: <u>2</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2025</u> Aislamiento de energías peligrosas: ☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Neumática	EPP Requeridos: ☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☒ Protección facial/ojos ☐ Protección Auditiva ☒ Protección Respiratoria ☐ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caídas	FINAL: Día: <u>9</u> Mes: <u>06</u> Año: <u>2025</u> Tareas de Alto Riesgo: ☐ Permisos en Caliente ☐ Excavación ☐ Anclamiento ☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas ☐ Trabajos en Alturas		
Breve descripción de la Actividad: <u>Medición y marcación del terreno donde se ejecutará la obra</u>		Proyectos: <u>C.A.A.</u> Lugar: <u>Cerro Villa Rosa</u>		
AST Preparado por: Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Siso a cargo:
<u>José Avila arenas</u> <u>Domingo Gonzalez</u>	<u>Topógrafo</u> <u>Cadenero</u>	Firma: <u>Rolando Muñoz</u> <u>Director de obra</u>	Firma: <u>Rolando Muñoz</u> <u>Director de obra</u>	Firma: <u>Lelly Flores</u> <u>Supervisor SST</u>
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial		Después
INSPECCION DEL AREA	, CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	, TEMPERATURA EXTREMA, GOLPE DE CALOR	M	CHARLAS SST, DELIGENCIAS FORMATO	B
TRASLADO E INSTALACION DEL EQUIPO TOPOGRAFICO EN AREA DE TRABAJO	ALERGIAS NAZALES Y DERMICAS, MATERIAL PATRIDO	M	INSPECCIONESY PREOPERACIONALES DE MAQUINAS / HERRAMIENTAS	B
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	PICADURAS DE ANIMALES O INSECTOS	M	USO DE PASAMONTAÑAS, USO DE EPP	B
COLOCACION DE ESTANCAS DE MEDISDAS	ATROPELLAMIENTO, DOLORES MUSCOESQUELETICO POR EXPOSICIÓN A POSTURAS	M	REALIZAR PAUSA ACTIVA, HIDRATACION, USO DE PROTECTOR SOLAR	B
REPLANTEO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	RIESGO FISICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, MECANICO	M	SEÑALIZACION Y DEMARACION DE AREAS	B
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	QUIMICO, CONDICIONES ALMOFERICAS, HESGO PUBLICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	CULTURA PREVENTIVA Y SEÑALIZACION DE TRABAJO CON INTERACCION DE MAQUINAS	B
MANTENER ORDEN Y ASEO EN AREA DE TRABAJO	PICADURAS, MORDEJURAS Y ALERGJAS	M	USO DE PARE/SIGA, PERMISO DE TRABAJO, ACOPIO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.		RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	2/06/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	3/06/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	4/06/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	5/06/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	6/06/2025
Domingo Gonzalez	D. Gonzalez	7/06/2025

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción llámese negativa o positiva.

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
Jose avila arenas	Josravila A	2/06/2025
Jose avila arenas	Jose avila A	3/06/2025
Jose avila arenas	Jose avila A	4/05/2025
Jose avila arenas	Jose avila A	5/05/2025
Jose avila arenas	Jose avila A	6/05/2025
Jose avila arenas	Jose avila A	7/05/2025

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.

INICIO: Día: 7 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmico
- ☐ Potencial
- ☐ Cinético/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Químico
- ☐ Eléctrico
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 10 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo:

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Múltiples tareas que deben desarrollarse para la adecuación y mantenimiento de la obra, tanto en las oficinas como en el almacén, zonas comunes y área de intervención para la ejecución del proyecto.

Proyecto:

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Lugar:

CAÑO VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
Yesica Pino	Servicio General		Firma: Rolan Muñoz Director Obra	Firma: Rolan Muñoz Director Obra	Firma: Zell y Flores Supervisor SET
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
Inspección de área de trabajo	Caída a nivel y distinto nivel, golpes, tropezones, resbalones, atropellos, desprendimientos de terreno, exposición a condiciones climáticas extremas	MEDIO	Autocuidado, socialización de identificación de peligros y riesgos, charlas de seguridad, hidratación.		BAJO
Inspección de herramientas	Golpes, machucos, inhalación de polvo, sustancias químicas	BAJO	Inspección de herramientas antes de su utilización, generar cultura preventiva, uso de EPP adecuado		BAJO
Mantener las señalizaciones y demarcaciones en buen estado	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Medidas preventivas a los riesgos asociados, punto de hidratación, pausas activas, protector solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Mantener el orden y aseo en contenedores, áreas comunes, centros de acopio temporal, almacén y la obra en general	Atropellamiento por maquinaria y vehículos en la obra, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, humo, deshidratación, afecciones musculoesqueléticas, manipulación de sustancias químicas, puyazos, cortaduras, deshidratación	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
Mantener en buen estado el cerramiento provisional	Caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, deshidratación, cortaduras	BAJO	Autocuidado, hidratación, pausas, protección solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Paletero para la salida y entrada de maquinaria a la obra	Atropellamiento, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, agresiones verbales y físicas, exposición a material particulado, humo, deshidratación	ALTO	Autocuidado, capacitación en seguridad vial, hidratación, pausas, protección solar, comunicación asertiva, uso adecuado de EPP		BAJO
Realizar tareas diversas que se requieran en la obra	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



Version No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 2 de 2

[illegible]

INICIO: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025

FINAL: Día: 17 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmico
- ☐ Potencial
- ☐ Onéctico/Mecánico
- ☐ Gravitacional
- ☐ Químico
- ☐ Eléctrico
- ☐ Hidráulico/Neumático

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Múltiples tareas que deben desarrollarse para la adecuación y mantenimiento de la obra, tanto en las oficinas como en el almacén, zonas comunes y área de intervención para la ejecución del proyecto.

Proyecto:
CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
Lugar:
CAÑO VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Siso a Cargo:
	Yesica Pino	Servicio General	Firma: Roque Hurtado Director Obra	Firma: Roque Hurtado Director Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
Inspección de área de trabajo	Caída a nivel y distinto nivel, golpes, tropezones, resbalones, atropellos, desprendimientos de terreno, exposición a condiciones climáticas extremas	MEDIO	Autocuidado, socialización de identificación de peligros y riesgos, charlas de seguridad, hidratación.		BAJO
Inspección de herramientas	Golpes, machucones, inhalación de polvo, sustancias químicas	BAJO	Inspección de herramientas antes de su utilización, generar cultura preventiva, uso de EPP adecuado		BAJO
Mantener las señalizaciones y demarcaciones en buen estado	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Medidas preventivas a los riesgos asociados, punto de hidratación, pausas activas, protector solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Mantener el orden y aseo en: contenedores, áreas comunes, centros de acopio temporal, almacén y la obra en general	Atropellamiento por maquinaria y vehículos en la obra, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, humo, deshidratación, afecciones musculoesqueléticas, manipulación de sustancias químicas, puyazos, cortaduras, deshidratación	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
Mantener en buen estado el cerramiento provisional	Caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, deshidratación, cortaduras	BAJO	Autocuidado, hidratación, pausas, protección solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Paletero para la salida y entrada de maquinaria a la obra	Atropellamiento, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, agresiones verbales y físicas, exposición a material particulado, humo, deshidratación	ALTO	Autocuidado, capacitación en seguridad vial, hidratación, pausas, protección solar, comunicación asertiva, uso adecuado de EPP		BAJO
Realizar tareas diversas que se requieran en la obra	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



Version No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 2 de 2

[illegible]

INICIO: Día: 19 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 24 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:
Múltiples tareas que deben desarrollarse para la adecuación y mantenimiento de la obra, tanto en las oficinas como en el almacén, zonas comunes y área de intervención para la ejecución del proyecto.
Proyecto:
CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
Lugar:
CAÑO VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Yosilea Pino	Servicio General	Firma: Polue Luvioz	Firma: Polue Luvioz	Firma: Velly Florez
	Rosa Castro	Servicio General	Director Obra	Director Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
Inspección de área de trabajo	Caída a nivel y distinto nivel, golpes, tropezones, resbalones, atropellos, desprendimientos de terreno, exposición a condiciones climáticas extremas	MEDIO	Autocuidado, socialización de identificación de peligros y riesgos, charlas de seguridad, hidratación.		BAJO
Inspección de herramientas	Golpes, machucones, inhalación de polvo, sustancias químicas	BAJO	Inspección de herramientas antes de su utilización, generar cultura preventiva, uso de EPP adecuado		BAJO
Mantener las señalizaciones y demarcaciones en buen estado	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Medidas preventivas a los riesgos asociados, punto de hidratación, pausas activas, protector solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Mantener el orden y aseo en contenedores, áreas comunes, centros de acopio temporal, almacén y la obra en general	Atropellamiento por maquinaria y vehículos en la obra, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, humo, deshidratación, afecciones musculoesqueléticas, manipulación de sustancias químicas, puyazos, cortaduras, deshidratación	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
Mantener en buen estado el cerramiento provisional	Caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, deshidratación, cortaduras	BAJO	Autocuidado, hidratación, pausas, protección solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Paletero para la salida y entrada de maquinaria a la obra	Atropellamiento, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, agresiones verbales y físicas, exposición a material particulado, humo, deshidratación	ALTO	Autocuidado, capacitación en seguridad vial, hidratación, pausas, protección solar, comunicación asertiva, uso adecuado de EPP		BAJO
Realizar tareas diversas que se requieran en la obra	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.



Version No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23 / 2022

Página 2 de 2

[illegible][illegible]

Powered by  CamScanner

INICIO : Día: 26 Mes: 05 Año: 2025

Alisamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL : Día: 31 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Alisamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Traje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:
Múltiples tareas que deben desarrollarse para la adecuación y mantenimiento de la obra, tanto en las oficinas como en el almacén, zonas comunes y área de intervención para la ejecución del proyecto.
Proyecto:
CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
Lugar:
CAÑO VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Yesica Pino Rosa Castro		Servicio General Servicio General	Firma: Roque Hurtado Director Obra	Firma: Roque Hurtado Director Obra	Firma: Kelly y Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
Inspección de área de trabajo	Caída a nivel y distinto nivel, golpes, tropezones, resbalones, atropellos, desprendimientos de terreno, exposición a condiciones climáticas extremas	MEDIO	Autocuidado, socialización de identificación de peligros y riesgos, charlas de seguridad, hidratación.		BAJO
Inspección de herramientas	Golpes, machucos, inhalación de polvo, sustancias químicas	BAJO	Inspección de herramientas antes de su utilización, generar cultura preventiva, uso de EPP adecuado		BAJO
Mantener las señalizaciones y demarcaciones en buen estado	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Medidas preventivas a los riesgos asociados, punto de hidratación, pausas activas, protector solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Mantener el orden y aseo en contenedores, áreas comunes, centros de acopio temporal, almacén y la obra en general	Atropellamiento por maquinaria y vehículos en la obra, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, humo, deshidratación, afecciones musculoesqueléticas, manipulación de sustancias químicas, puyazos, cortaduras, deshidratación	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
Mantener en buen estado el cerramiento provisional	Caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, deshidratación, cortaduras	BAJO	Autocuidado, hidratación, pausas, protección solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Paletero para la salida y entrada de maquinaria a la obra	Atropellamiento, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, agresiones verbales y físicas, exposición a material particulado, humo, deshidratación	ALTO	Autocuidado, capacitación en seguridad vial, hidratación, pausas, protección solar, comunicación asertiva, uso adecuado de EPP		BAJO
Realizar tareas diversas que se requieran en la obra	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



Version No: 4

Fecha de Versión:

Julien 23/2022

Página 2 de 2

[illegible]

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción llámese negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.

INICIO: Día: 2 Mes: 06 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Pneumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☒ Protección facial/ojos
- ☒ Protección Auditiva
- ☒ Protección Respiratoria
- ☒ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 7 Mes: 02 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Iraje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Múltiples tareas que deben desarrollarse para la adecuación y mantenimiento de la obra, tanto en las oficinas como en el almacén, zonas comunes y área de intervención para la ejecución del proyecto.

Proyecto:
CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL
Lugar:
CAÑO VILLA ROSA

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
	Yesica Ping	Servicio General	Firma: Rolan Linoz	Firma: Rolan Linoz	Firma: Kelly Florez
	Rosa Castro	Servicio General	Director Obra	Director Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
Inspección de área de trabajo	Caída a nivel y distinto nivel, golpes, tropezones, resbalones, atropellos, desprendimientos de terreno, exposición a condiciones climáticas extremas	MEDIO	Autocuidado, socialización de identificación de peligros y riesgos, charlas de seguridad, hidratación.		BAJO
Inspección de herramientas	Golpes, machucos, inhalación de polvo, sustancias químicas	BAJO	Inspección de herramientas antes de su utilización, generar cultura preventiva, uso de EPP adecuado		BAJO
Mantener las señalizaciones y demarcaciones en buen estado	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Medidas preventivas a los riesgos asociados, punto de hidratación, pausas activas, protector solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Mantener el orden y aseo en contenedores, áreas comunes, centros de acopio temporal, almacén y la obra en general	Atropellamiento por maquinaria y vehículos en la obra, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, humo, deshidratación, afecciones musculoesqueléticas, manipulación de sustancias químicas, puyazos, cortaduras, deshidratación	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO
Mantener en buen estado el cerramiento provisional	Caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, exposición a material particulado, deshidratación, cortaduras	BAJO	Autocuidado, hidratación, pausas, protección solar, uso adecuado de EPP		BAJO
Paletero para la salida y entrada de maquinaria a la obra	Atropellamiento, caída, exposición a altas temperaturas, exposición a lluvias, golpes, movimientos repetidos, posturas prolongadas, agresiones verbales y físicas, exposición a material particulado, humo, deshidratación	ALTO	Autocuidado, capacitación en seguridad vial, hidratación, pausas, protección solar, comunicación asertiva, uso adecuado de EPP		BAJO
Realizar tareas diversas que se requieran en la obra	Caída a nivel y distinto nivel, resbalones, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas extremas, lumbago, deshidratación, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, puyazos	BAJO	Autocuidado, hidratación constantes, regulación de pausas durante la jornada, sensibilización sobre higiene postural, orden y aseo, socialización de Hoja de datos de seguridad material		BAJO

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.




	ANALISTA SEGURO DE TRABAJO (AST)	Version No: 4 Fecha de Version: Julio 23/2022 Pagina 1 de 2			
INICIO: Día: <u>5</u> Mes: <u>05</u> Año: <u>2025</u>					
Aislamiento de energías peligrosas: ☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Pneumática	EPP Requeridos ☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☐ Protección facial/ojos ☐ Protección Auditiva ☐ Protección Respiratoria ☐ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caídas	FINAL: Día: <u>10</u> Mes: <u>05</u> Año: <u>2025</u> Tareas de Alto Riesgo ☐ Permisos en Caliente ☐ Excavación ☐ Aislamiento ☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas ☐ Trabajos en Alturas			
Breve descripción de la Actividad: Realización de actas de Vecindad, atención PQR, Reuniones con la Comunidad		Proyecto: Consorcio Alianza Ambiental			
		Lugar: Cerro Villa Rosa			
AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Siso a Cargo:
	Marianela Torrejosa	Residente Social	Firma: RODOLFO HERNANDEZ Director Obra	Firma: RODOLFO HERNANDEZ Director Obra	Firma: Betty Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea		Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	
<small>(usar hojas adicionales si es necesario)</small>		<small>(usar hojas adicionales si es necesario)</small>	Inicial	Riesgos	
				Después	
INSPECCION DE LA AREA		. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCLUIDADO	
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS		. TEMPERATURA EXTREMA VERBAL Y FISICA . AGRESION	M	HIDRATACION USO DE EPP	
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD		. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA		ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTITUCIONALES		PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA		TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION		DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	
		RIESGO FISICO, QUIMICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	PAUSAS	
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (A S T)	Version No: 4 Fecha de Version: Julio 23/2022 Pagina 1 de 2		
INICIO: Día: <u>02</u> Mes: <u>05</u> Año: <u>2025</u> Finalización de energías peligrosas: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ☐ Térmica ☐ Potencial ☐ Cinética/Mecánica ☐ Gravitacional ☐ Química ☐ Eléctrica ☐ Hidráulica/Neumática </div> <div> EPP Requeridos ☒ Casco ☒ Ropa de seguridad ☐ Protección facial/ojos ☐ Protección Auditiva ☐ Protección Respiratoria ☐ Guantes de Seguridad ☐ Protección Contra Caídas </div> <div> Tareas de Alto Riesgo ☐ Permisos en Caliente ☐ Excavación ☐ Anclamiento ☐ Espacios Confinados ☐ Izaje de Cargas ☐ Trabajos en Alturas </div> </div>				
Breve descripción de la Actividad: <u>Realización de actas de Vecindad, atención PAR, reunión con la comunidad.</u>		Proyecto: <u>Consortio alianza ambiental</u> Lugar: <u>Cerro Villorosa</u>		
AST Preparado por: <u>Marionela Torregrosa</u>	Cargo: <u>Residente Social</u>	AST Autorizado por: <u>Roberto Muñoz</u> Firma: <u>Roberto Muñoz</u> <u>Director Obra</u>		
Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a cargo:		
Firma: <u>Roberto Muñoz</u>	Firma: <u>Roberto Muñoz</u>	Firma: <u>Velly Flores</u>		
<u>Supervisor SST</u>	<u>Supervisor SST</u>	<u>Supervisor SST</u>		
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo	Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial		Después
INSPECCION DE LA AREA	CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO	B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	TEMPERATURA EXTREMA VERBAL Y FISICA AGRESION	M	HIDRATACION USO DE EPP	B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	DISTRUBIOS DESHIDRATAACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS	B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA	B
VISITAS CON LIDERES COMUNALES VISITAS INSTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES	B
VOLANTEO CON INFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS	B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE	B
	RIESGO FISICO, QUIMICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	PAUSAS	B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.		RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

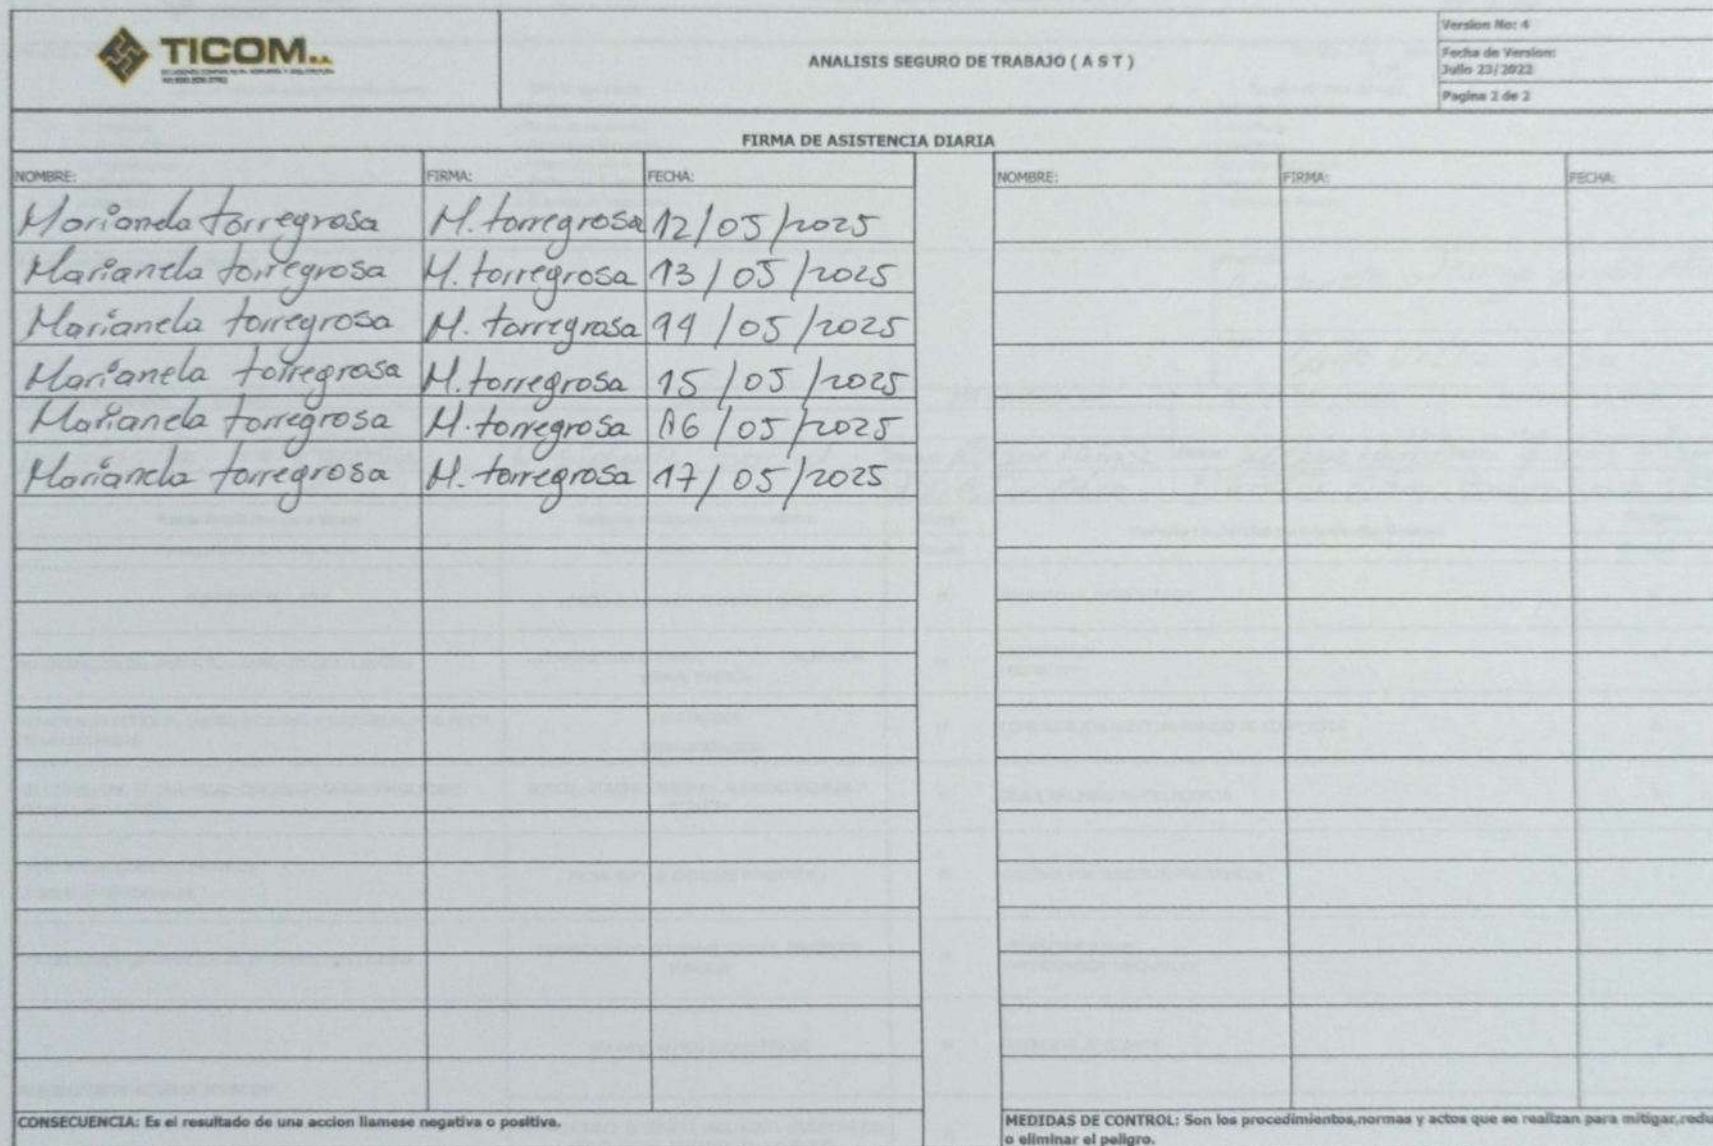



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Pagina 1 de 2

INICIO : Día: 19 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caldas

FINAL: Día: 24 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Perros en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Realización de actas de Vecindad, atención PAR, Reuniones con la comunidad

Proyecto:

Consorcio alianza ambiental

Lugar:

Cano Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
	Marianela Torregrosa	Residente Social	Firma: Roque Muñoz Director Obra	Firma: Roque Muñoz Director Obra	Firma: Kelly Flores Profesional SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(usar hojas adicionales si es necesario)	(usar hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DE LA AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA VERBAL Y FISICA .AGRESION	M	HIDRATACION USO DE EPP		B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS		B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA		B
.VISITAS CON LÍDERES COMUNALES .VISITAS INSTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES		B
VOLANTEO CON INFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS		B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE		B
	RIESGO FISICO, QUIMICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	PAUSAS		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		



ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Version No: 4

Fecha de Version:

Julio 23/2022

Pagina 1 de 2

INICIO: Día: 26 Mes: 05 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caídas

FINAL: Día: 31 Mes: 05 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinados
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Realización de actas de Vecindad, atención a PQR, Reuniones con la comunidad.

Proyecto:

Consejo alianza ambiental

Lugar:

Cano Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre Jefe a Cargo:
Marionela Torregrosa	Residente Social		Firma: Rodue Hinoj	Firma: Rodue Hinoj	Firma: Kelly Flores
			Director Obra	Director Obra	Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DE L AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA .AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION USO DE EPP		B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS		B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA		B
.VISITAS CON LIDERES COMUNALES .VISITAS INTTUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES		B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS		B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE		B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	PAUSAS		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible][illegible]

CONSECUENCIA: Es el resultado de una acción flamearse negativa o positiva.

MEDIDAS DE CONTROL: Son los procedimientos, normas y actos que se realizan para mitigar, reducir o eliminar el peligro.



ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO (AST)

Versión No: 4

Fecha de Versión:

Julio 23/2022

Página 1 de 2

INICIO: Día: 2 Mes: 06 Año: 2025

Aislamiento de energías peligrosas:

- ☐ Térmica
- ☐ Potencial
- ☐ Cinética/Mecánica
- ☐ Gravitacional
- ☐ Química
- ☐ Eléctrica
- ☐ Hidráulica/Neumática

EPP Requeridos

- ☒ Casco
- ☒ Ropa de seguridad
- ☐ Protección facial/ojos
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Protección Respiratoria
- ☐ Guantes de Seguridad
- ☐ Protección Contra Caldas

FINAL: Día: 7 Mes: 06 Año: 2025

Tareas de Alto Riesgo

- ☐ Permisos en Caliente
- ☐ Excavación
- ☐ Aislamiento
- ☐ Espacios Confinado
- ☐ Izaje de Cargas
- ☐ Trabajos en Alturas

Breve descripción de la Actividad:

Realización de actas de vecindad, atención PQR, Reuniones
Con la Comunidad

Proyecto:

Consortio Alianza Ambiental

Lugar:

Cano Villa Rosa

AST Preparado por:	Nombre	Cargo	AST Autorizado por:	Nombre Jefe a cargo:	Nombre siso a Cargo:
Mañana	torregrosa	Residente Social	Firma: Rolando Muñoz Director Obra	Firma: Rolando Muñoz Director Obra	Firma: Kelly Flores Supervisor SST
Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Riesgo	Medidas requeridas para controlar el riesgo		Riesgos
(use hojas adicionales si es necesario)	(use hojas adicionales si es necesario)	Inicial			Después
INSPECCION DE LA AREA	. CAIDA AL AVISMOY DISTINTOS NIVELES	M	FOMENTO DE AUTOCUIDADO		B
SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES ALEDAÑAS	. TEMPERATURA EXTREMA . AGRESION VERBAL Y FISICA	M	HIDRATACION EPP		B
ATENCION DE PETICION, QUEJAS, RECLAMO Y SUGERENCIA DE PARTE DE LA COMUNIDAD	. DISTRUBIOS . DESHIDRATACION	M	COMUNICACIÓN ACERTIVA MANEJO DE CONFLICTOS		B
REUNIONES CON LA COMUNIDAD CERCANA PARA INFORMAR SOBRE AVANCES DE LA OBRA	ROBOS, ATROPELLAMIENTO, ALERGIAS NAZALES Y DESMICAS	M	CONOCER LINEAS DE EMERGENCIA		B
. VISITAS CON LIDERES COMUNALES . VISITAS INSTITUCIONALES	PICADURAS DE ANIMALES PONZOÑOSO	M	CAMINAR POR SENDEROS PEATONALES		B
VOLANTEO CON IBFORMACION DE INTERES SOBRE LA OBRA	TEMPERATURAS EXTREMAS, ESTRÉS, DESORDEN PUBLICO	M	PROTECTOR SOLAR PARTICIPACION EN CHARLAS		B
REALIZACION DE ACTAS DE ATENCION	DOLORES MUSCO ESQUELETICOS	M	ATENCION AL CLIENTE		B
	RIESGO FISICO, QUIEMICO, BIOLOGICO, BIOMECANICO, PSICOLOGICO, PSICOSOCIAL Y PUBLICO	M	PAUSAS		B
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones y/o medio ambiente.			RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		

FIRMA DE ASISTENCIA DIARIA

[illegible]

ANEXO

INSPECCIONES

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	<i>Pelly Flores</i>	CARGO	<i>Supervisor</i>
PROYECTO	<i>Consorcio aianza ambiental</i>		
FECHA DE INSPECCION	<i>31/mayo/2025</i>	INP. No:	<i>3</i>
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	<i>Cano Villa Rosa</i>		

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI)
1 Estado del botiquín	✓		1	
2 Manual uso de botiquín	✓		1	
3 Cuello ortopédico	✓		1	
4 Guantes de látex	✓		3	
5 Yodopovidona solución	✓		1	
6 Gasa estéril	✓		2	
7 Alcohol aséptico	✓		1	
8 Venda de algodón laminado 3 x 5 yardas	✓		1	
9 Venda elástica 3 x 5	✓		1	
10 Venda elástica 5 x 5 yardas	✓		1	
11 Venda elástica 2 x 5 yardas	✓		1	
12 Venda elástica laminado 5 x 5 yardas	✓		1	
13 Tapabocas	✓		50	
14 Esparadrapo de tela	✓		2	
15 Aplicadores de algodón (copito)	✓		1 caja	
16 Curitas	✓		1 caja	
17 Baja lenguas	✓		1 paquete	
18 Botella de agua	✓		1	
19 Termómetro	✓		1	
20 Linterna	✓		1	
21 Bisturí	/			
22 Dispositivo reanimación RCP	/			
23 Jabón antibacterial	/			
24 Alcohol antiséptico frasco por 375 ml	✓		1	
25 Alcohol aséptico	✓		1	
26 Protector solar	/			
27 Condones	✓		1	
28 Toallas	✓		1	
29 Solución salina 500 ml	✓		1	
30 Inmovilizador de cuello, brazo, antebrazo, tobillo y pierna	/			
31 Pito	✓		1	
32 lágrimas humectantes	/			
33 sales de hidratación oral 20.5g	✓		1	

OBSERVACIONES:

Se evidencia que se cuenta con un botiquín en buen estado



FORMATO DE INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Versión No: 1

Fecha de Versión:

Enero 15/2014

Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Delly Flores	CARGO	Supervisor SSI
PROYECTO	Consorcio alianza ambiental		
FECHA DE INSPECCION	31/ mayo/ 2025	INP. No:	3
UBICACIÓN CAMILLA	Cono Villa Rosa		

INSPECCIÓN DE CAMILLA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓		
2	Señalización	✓		
3	Estado del soporte	✓		
4	Correas de seguridad	✓		
5	Sujetadores para agarre	✓		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓		

OBSERVACIONES:

Se cuenta con camillas en buen estado



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

Kelly Flores

FECHA:

31/05/2025

PLACA:

FVO 666

TECNOMECANICA:

16/09/2026

MARCA:

Nissan

MODELO:

2020

SOAT:

29/03/2026

TIPO:

Camioneta

COLOR:

Blanco

CONDUCTOR:

Humberto Escobedo

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores	✓			32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato	✓		
14 Soporte del Eje de Mano	✓			42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			✓	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas			✓
18 Fugas		✓		46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso			✓	47 Radio de Comunicación			✓
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)	✓			50 Baliza estroboscopia Visible		✓	
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento	✓		
25 Cinta Reflectiva	✓			52 accidental de cabina			
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓			Los sistemas están marcados e	✓		
27 Docuemntos del Vehículo	✓			53 identificados			
28 Bloque Master Operativo	✓						

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Página 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

Relly Florez

FECHA:

31/05/2015

PLACA:

Volvo 240

TECNOMECANICA:

N/A

MARCA:

Volvo

MODELO:

Volvo 240

SOAT:

N/A

TIPO:

Petroexcavadora

COLOR:

amarillo

CONDUCTOR:

Wistres Palacios

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores		X		32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato		X	
14 Soporte del Eje de Mano			X	42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			X	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas	✓			46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso		X		47 Radio de Comunicación			X
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)		X		50 Baliza estroboscopia Visible			X
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento accidental de cabina			X
25 Cinta Reflectiva	✓			Los sistemas están marcados e identificados			X
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓						
27 Docuemntos del Vehículo	✓						
28 Bloque Master Operativo			X				

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Página 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

Kelly Flores

FECHA:

31/05/2025

PLACA:

Volvo 240

TECNOMECANICA:

N/A

MARCA:

Volvo

MODELO:

SOAT:

N/A

TIPO:

Retractoradora

COLOR:

Amarillo

CONDUCTOR:

Oscar paredes

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores		X		32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato		X	
14 Soporte del Eje de Mano			X	42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			X	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas	✓			46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso		X		47 Radio de Comunicación			X
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)		X		50 Baliza estroboscopia Visible			X
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento accidental de cabina			X
25 Cinta Reflectiva	✓			Los sistemas están marcados e identificados			X
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓						
27 Docuemntos del Vehículo	✓						
28 Bloque Master Operativo			X				

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

Kelly Flores

FECHA:

31/05/2025

PLACA:

WCH 864

TECNOMECANICA:

18/01/2026

MARCA:

International

MODELO:

2015

SOAT:

18/01/2026

TIPO:

Velocista

COLOR:

Blanco

CONDUCTOR:

Luis Miguez

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores	✓			32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato	✓		
14 Soporte del Eje de Mano	✓			42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			X	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas		X		46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso	✓			47 Radio de Comunicación			X
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)	✓			50 Baliza estroboscopia Visible			X
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento accidental de cabina	✓		
25 Cinta Reflectiva	✓			Los sistemas están marcados e identificados	✓		
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓						
27 Documentos del Vehículo	✓						
28 Bloque Master Operativo	✓						

OBSERVACIONES:

Se encuentra en óptimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Pagina 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

FECHA:

MARCA:

TIPO:

PLACA:

MODELO:

COLOR:

TECNOMECANICA:

SOAT:

CONDUCTOR:

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores	✓			32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato	✓		
14 Soporte del Eje de Mano	✓			42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts	✓		×	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas		×		46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso	✓			47 Radio de Comunicación			×
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)	✓			50 Baliza estroboscopia Visible			×
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento accidental de cabina	✓		
25 Cinta Reflectiva	✓			Los sistemas están marcados e identificados	✓		
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓						
27 Docuemntos del Vehículo	✓						
28 Bloque Master Operativo	✓						

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Página 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

FECHA:

MARCA:

TIPO:

PLACA:

MODELO:

COLOR:

TECNOMECANICA:

SOAT:

CONDUCTOR:

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores	✓			32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Taseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato	✓		
14 Soporte del Eje de Mano	✓			42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			X	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas		X		46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso	✓			47 Radio de Comunicación	✓		X
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)	✓			50 Baliza estroboscopia Visible			X
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento	✓		
25 Cinta Reflectiva	✓			52 accidental de cabina			
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓			Los sistemas están marcados e	✓		
27 Documentos del Vehículo	✓			53 identificados			
28 Bloque Master Operativo	✓						

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones



INSPECCIÓN DETALLADA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Version No 1

Fecha de version:
Julio 14/2019

Página 1 de 1

INSPECCIONADO POR:

Kelly Flores

FECHA:

31/05/2025

PLACA:

575 222

TECNOLOGICA:

31/08/2025

MARCA:

International

MODELO:

2012

SOAT:

OK

TIPO:

Volquete

COLOR:

Blanco

CONDUCTOR:

Luis Chiny

ITEMS PARA REVISAR				ITEMS PARA REVISAR			
	S	N	N/A		S	N	N/A
1 Limpieza General	✓			29 Indicadores Luces de Parqueo	✓		
2 Carrocería	✓			30 Indicadores Luces de Dirección	✓		
3 Vidrio Pabrisas	✓			31 Indicadores Luces Altas/Bajas	✓		
4 Espejos Retrovisores	✓			32 Indicadores Nivel de Combustible	✓		
5 Vidrios Laterales Tarseros	✓			33 Indicadores Presión Aire/Frenos	✓		
6 Luces Principales	✓			34 Indicadores de Temperatura	✓		
7 Luces de Parqueo/Dirección	✓			35 Indicadores de Velocidad	✓		
8 Luces Frenos/Trasero	✓			36 Tacómetro (RPM)	✓		
9 Alarma de Retroceso	✓			37 Plumillas Limpia Vidrios	✓		
10 Llantas/Llanta de repuesto	✓			38 Pito Señal de Advertencia	✓		
11 Exhosto/Tubo de Escape	✓			39 Botiquín Primeros Auxilios	✓		
12 Tanque de Combustible	✓			40 Extintor de Incendios	✓		
13 Sistema de Suspensión	✓			41 Cuñas/Conos/Llave o Cruz/Gato	✓		
14 Soporte del Eje de Mano	✓			42 Luces Interiores	✓		
15 Puerta/ Salida/Salida de Emergencia	✓			43 Frenos de Parqueo/Serv. Emerg	✓		
16 Antena Buggy Whip a 4.2 Mts			X	44 Dirección Timón/Terminales	✓		
17 Manijas de Abordaje	✓			45 Bancas	✓		
18 Fugas		X		46 Pisos/Ventana	✓		
19 Luz en el Estribo/Piso	✓			47 Radio de Comunicación	✓		X
20 Cinturones de Seguridad	✓			48 Aire Acondicionado/Bus	✓		
21 Luces del Tablero	✓			49 Puerta P/pal. Control Neumático	✓		
22 Luces Interiores (Techo)	✓			50 Baliza estroboscopia Visible			X
23 Barra Antivuelco	✓			51 Sillas	✓		
24 Espárragos/Tuercas	✓			Vehículo Ref: Cargo, Seguro adicionales de levantamiento accidental de cabina	✓		
25 Cinta Reflectiva	✓			Los sistemas están marcados e identificados	✓		
26 Avisos Laterales y Aéreos	✓						
27 Documentos del Vehículo	✓						
28 Bloque Master Operativo	✓						

OBSERVACIONES:

Se encuentra en optimas condiciones

Fecha: 31/05/2025 Proyecto: Consorcio Altonza Ambiental
 Observador: Kelly Flores Cargo: Supervisor SST Firma: Kelly Flores

NOMBRE	CEDULA	CASCO		PROTECTOR AUDITIVO EN ESPUMA TIPO TAPON, ESPUMA O COPA		PROTECCION VISUAL ANTECOSOS DE SEGURIDAD		PROTECTOR FACIAL TIPO CARETA		PROTECCION RESPIRATORIA (TAPABOCAS O MASCARILLA)		GUANTES DE CUERO O CAUCHO		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DE CAUCHO-CAÑA ALTA O PANTAFERRAS		CHALECO		MANDIL O PETO		ARNES DE SEGURIDAD	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Oscar paredes	72144924	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Luis ching	8742576	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Humberto escorcia	1234888624	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Ruben Moreno	12308083	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Jader Vital	92250208	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Domingo Gonzalez	11075728	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Luis Frespalacios	1039097776	✓	OK			✓	OK							✓	OK								
Walter Barbosa	1091662627	✓	OK			✓	OK							✓	OK								

CARACTERIZACION: SE COLOCA UNA X PARA EL ITEM QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO O NO SE ESTE USANDO POR PARTE DEL TRABAJADOR, Y UN OK EVIDENCIANDO QUE TODO SE ENCUENTRA BIEN.

U: USO

E: ESTADO

Observaciones:

Se observa que el personal hace buen uso de los EPP

PLAN DE ACCION

Corrección () y/o Acciones Correctivas ()	Responsable	Fecha Planeada

FECHA: 30/05/2025 RESPONSABLE: Kelly Flores

CARGO: Supervisor SST

AREA DE INSPECCION: ADMINISTRATIVA

OBRA EN EJECUCION: CANTO VILLA ROSA - LIRUAER

#	Area	Ubicación	TIPO	Capac	Fecha recarga	Manguera PQS	Boquilla	Manguera Y Corneta para CO2	Sello de seguridad	Pasador	Calcomanía	Pintura Extintor	Manómetro	Color Aro de Verificación	P. Hidrostática	observaciones
1	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Sep 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Sep 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Sep 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Oct 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Oct 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Oct 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Operativa	Canto Villa Rosa	ABC	20	Sep 2024	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																



INSPECCION DE KIT ANTIDERRAME OBRAS

Versión No: 2

Fecha de Versión:

Junio 02/2025

Página 1 de 1

Proyecto: Consorcio Alianza Ambiental

Ubicación: Cano Villa Rosa

Inspeccionado por: Kelly Flores

Cargo: Supervisor SST

Fecha de inspeccion: 31/05/2025

No	COMPONENTES	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	
1	Ubicación (proteccion condiciones ambientales)	✓			
2	Señalización y visibilidad	✓			
3	Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstaculos en el area para acceso)	✓			
4	Estado de empaque (maletin o barril)	✓			
5	Maletin/contenedor	✓			
6	Bolsas rojas	✓			
7	Paño absorbente de tela	✓			
8	Pala plastica	✓			
9	Barrera absorbente tipo gusano	✓			
10	Cinta de señalización	✓			
11	Etiqueta de residuos peligrosos	✓			
12	Paleta pare - siga	✓			
13	Overol	✓			
14	Gafas de seguridad	✓			
15	Guantes de nitrilo	✓			
16	Mascarilla proteccion vapores organicos	✓			
17	Linterna manual	✓			
18	Chaleco reflectivo	✓			
19	kit tacos	✓			
20	Masilla epoxica	✓			
21	Desengrasante	✓			
22	Recogedor de manos	✓			
23	Martillo de goma	✓			
24	Cepillo de mano	✓			
25	otros	✓			
26					
27					

Se evidencia que el kit antiderrame esta en buen estado.

**FORMATO DE INSPECCION DE ORDEN Y ASEO**

Versión No: 1

Fecha de Versión:

Enero 26/2016

Página 1 de 1

OBRA EN EJECUCION CAA - Cano Villa RosaFECHA: 31/05/2025

ADMINISTRATIVA		SI	NO	NA
1	El area esta libre de basura y otros elementos que puedan causar resbalones y caídas	✓		
2	Los aires acondicionados estan en buena condiciones	✓		
3	La iluminacion es la adecuada en los puestos de trabajo	✓		
4	Los archivos o cajoneros para almacenar los insumos y elementos de oficina estan en buen estado	✓		
5	Las instalaciones estan en optimas condiones	✓		
6	Las mangueras y cables eléctricos se encuentran recogido y apropiadamente almacenado	✓		
7	Los baños estan en buen estado y de facil acceso	✓		
8	Los equipos de trabajo tales como computador, mause, teclado, silla y demas insumos estan en buen estado	✓		
ALMACEN		SI	NO	NA
1	El area esta libre de basura, grasas, cables, mangueras y otros elementos que puedan causar resbalones y caídas			✓
2	Posee estantes limpios y estables para la colocación de materiales y cuenta con cajas o cajones para almacenamiento de materiales pequeño			✓
3	Los equipos están identificados según su criterio para su rápida disponibilidad			✓
4	Las cajas se encuentran protegidas contra humedad y apiladas de manera que no causen derrumbes			✓
5	Las mangueras y cables eléctricos se encuentran recogido y apropiadamente almacenado			✓
6	La zona de almacenamiento de equipo y herramientas eléctricas están libre de humedad y temperaturas extremas			✓
7	Se encuentran las hojas de seguridad de las sustancias químicas a manipular disponibles en el sitio			✓
8	Identificación de recipientes rotulado de acuerdo al tipo de sustancias químicas			✓
9	Los equipos y herramientas están debidamente organizados.			✓
10	Los materiales (cemento, bloques, ladrillos, cajas, etc.) están debidamente apilados y asegurados que no se vuelquen.			✓
11	Hay objetos que sobresalen, tales como clavos, esquinas, cables eléctricos y demas.			✓
12	Existen las señales de seguridad necesarias.			✓
OPERATIVA		SI	NO	NA
1	Los avisos, afiches y señales se encuentran en un lugar visible y sin ningún elemento que lo oculte.	✓		
2	Los EPP se usan de manera adecuada	✓		
3	Los elementos de protección personal, la ropa de trabajo y elementos personales de los trabajadores están bien organizados y en buenas condiciones de limpieza.	✓		
4	Estado o condición de los EPP	✓		
5	Ubicación e identificación de punto ecológico de residuos generados en obra	✓		
6	Cuentan con identificación de los recipientes	✓		
7	Manejo adecuado de los residuos sólidos	✓		
8	Cuenta con ubicación para la disposicion de madera, escombros, metales	✓		
9	Los baños estan en buen estado y de facil acceso	✓		
10	Las áreas comunes se encuentran libres de obstáculos y organizadas	✓		
11	Identificación de recipientes rotulado de acuerdo al tipo de residuo	✓		

OBSERVACIONES :

Las instalaciones se encuentran en optimas con-
diciones.

Firma del responsable:

Kelly Florez

Cargo:

Supervisor SST



TICOM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEGURIDAD Y ARQUITECTURA
TEL: 8500-5588, 2763

REGISTRO DE INSPECCIONES PLANEADAS

Versión No: 3

Fecha de versión:

Mayo 14/2014

Página: 1 de 1

TIPO DE INSPECCION: GENERAL ☒

GERENCIAL ☐

FECHA DE INSPECCION:

31/05/2025

AREA ADMINISTRATIVA

1	CONDICIONES A INPECCIONAR	C	NC	N/A
1	Se dispone de ventanales suficientes y se encuentren limpios y libres de obstáculos para lograr una iluminación natural	☒		
2	Si se cuenta con aire acondicionado, se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento	☒		
3	La distribución de la iluminación es la adecuada no produce reflejos ni brillo que dificulten la visibilidad	☒		
4	Se dispone de archivadores y cajoneras para almacenar los elementos de oficina	☒		
5	El techo se encuentra en buenas condiciones	☒		
6	Las paredes se encuentran en optimas condiciones, sin grietas ni aberturas o aristas puntiagudas.	☒		
7	El piso se encuentra en optimas condiciones sin huecos ni grietas.	☒		
8	Las puertas están debidamente asegurada	☒		
9	Existe la facilidad de baños cerca al lugar de trabajo	☒		
10	Cuenta con un numero de sillas de trabajo suficientes	☒		
11	Se encuentran en buen estado las sillas	☒		
12	Las sillas son ergonómicas y permiten adaptarse a la altura de la superficie de trabajo	☒		
13	Los monitores se encuentran ubicados frontalmente y en relación con los hombros	☒		
14	El mouse y el teclado se encuentran contiguos	☒		
15	Todos los elementos están ubicados en la superficie de trabajo evitando esfuerzos	☒		
16	Se observa postura adecuada al momento de la inspección	☒		
17	Se disponen archivos o cajoneros para almacenar insumos y elementos de oficina	☒		
18	El botiquín de primeros auxilios esta disponible, ubicado en un lugar y altura accesible, sin obstáculos, dotado del material requerido, esta limpio y sin deterioro.	☒		
19	Estado de fugas en los sistemas			☒
2	ORDEN Y ASEO	C	NC	N/A
1	Se observa una adecuado almacenamiento de los implementos de oficina			☒
2	Las instalaciones se encuentran en un adecuado estado de aseo.	☒		
3	Las instalaciones y zonas de trabajo se encuentran organizadas libres de obstáculos que puedan generar un accidente de trabajo.	☒		
3	EQUIPOS DE EMERGENCIA	C	NC	N/A
1	Se cuenta el tipo y numero de extintores en estado de funcionamiento	☒		
2	Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con elementos adecuados	☒		
3	Los extintores se encuentran en buen estado y en optimas condiciones de operación	☒		
4	Los extintores tienen carga vigente	☒		
4	DEMARCAION Y SEÑALIZACION	C	NC	N/A
1	Se encuentran señalizados adecuadamente de tableros eléctricos	☒		
2	En el área se encuentran las señales que prohíben comportamientos susceptibles de provocar peligros (prohibido fumar).			☒
3	Los productos químicos y materiales utilizados en el área se encuentran adecuadamente señalizados.			☒
4	Los extintores se encuentran señalizados	☒		
5	Se cuenta con señales de salvamento necesarias (botiquín de primeros auxilios, rutas de evacuación)	☒		
6	La señalización se encuentra en un lugar accesible con iluminación y a la altura y posición que sean visibles	☒		
5	INSTALACIONES ELECTRICAS	C	NC	N/A
1	Las instalaciones eléctricas poseen puesta a tierra de protección	☒		
2	Los tomas eléctricos están libres de daños, poseen puesta a tierra, libre de partes expuestas, solo un equipo conectado a la vez.	☒		

3	Verificación de conectores, adaptadores y reguladores e instalaciones eléctricas relacionadas (enchufes y cableado) están en buen estado.	✓		
4	Las cajas de interruptores están provistos con las cubiertas adecuadas	✓		
5	Verificación de luminarias están en buen estado	✓		
6	Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en sitios de trabajo?	✓		
7	Existen cables sueltos por el piso?	✓		
8	Existen empalmes defectuosos?		✓	
9	Existen toma corrientes sin cubrir?		✓	
10	Se encuentra señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje?	✓		
11	Existen tableros de circuitos adecuadamente cubiertos y puestos?	✓		
12	Todas las cajas de breakers o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas?	✓		
13	Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra?	✓		

OBSERVACIONES

las instalaciones de las oficinas se encuentran en buen estado.

Firma del responsable:

Reilly Torres

Cargo:

Supervisor SST



TICOM S.A.
SOLUCIONES CONTABLES, FINANCIERAS Y ASESORIA
TEL: 820.508.2783

INSPECCIONES PUNTOS ECOLOGICOS

Version No 1

Fecha de version:
Diciembre 26/2017

Pagina 1 de 1

Fecha: 31 mayo 2025

Inspeccionado por:

Delly Florez

INDICADOR	Evaluación					OBSERVACIÓN
	N.M.D	N.D	N.A	N.B	N.E	
Estado de las Canecas Obra					✓	
Clasificación adecuada Obra					✓	
Acceso al Punto Ecologico Obra					✓	
Estado de las Canecas Admon					✓	
Clasificación adecuada Admon					✓	
Acceso al Punto Ecologico Admon					✓	
Estado de las Canecas Mantenimiento					✓	
Clasificación adecuada Mantenimiento					✓	
Acceso al Punto Ecológico Mantenimiento					✓	

Observaciones

Se cuenta con punto ecologico en buen estado

N.M.D: Nivel Muy Deficiente

ND: Nivel Deficiente

NA: Nivel Aceptable

NB: Nivel Bueno

NE: Nivel Excelente

ANEXO 7. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

**“REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS
Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL
GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.**

PERIODO:

INFORME DEL 7 MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2025.

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 2025

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE OBRA

Durante la ejecución del proyecto se realizaron charlas y capacitaciones al personal de obra sobre temas ambientales.

Tabla 1 Charlas Ambientales, SST.

CHARLAS		
Fecha	Tema	Responsable
7/05/2025	Prohibido la tala de árboles	Sonia González
8/05/2025	Prevención lesiones en la columna	Kelly Florez
9/05/2025	Medidas para la protección y conservación de habitat	Sonia González
10/05/2025	Comité y sus funciones - COPASTT y CCL	Kelly Florez
12/05/2025	Importancia de separar los residuos solidos	Sonia González
13/05/2025	Autoreportes de actos y condiciones inseguras	Kelly Florez
14/05/2025	Para que son las canecas negras, blancas y verdes	Sonia González
15/05/2025	La importancia del ATS	Kelly Florez
16/05/2025	Identificación de peligro y evaluación del riesgo	Kelly Florez
17/05/2025	Manejo y disposición final de los residuos liquidos	Sonia González
19/05/2025	Cuando es un accidente de trabajo	Kelly Florez
20/05/2025	Manejo y prevención del estrés en el trabajo	Kelly Florez
21/05/2025	Velocidad moderada	Kelly Florez
23/05/2025	Agotamiento por calor	Kelly Florez
24/05/2025	No utilizar bocinas, pitos, durante la ejecución de las actividades	Kelly Florez
26/05/2025	Importancia del orden y aseo de los campamentos de obra	Kelly Florez
27/05/2025	Enfermedades de transmisión sexual	Kelly Florez
28/05/2025	Cuales son los tipos de suelo	Sonia González
29/05/2025	Autocuidado	Kelly Florez
30/05/2025	Como identificar fauna en campo.	Sonia González
31/05/2025	Peatones en la vía	Kelly Florez
3/06/2025	Importancia del kits de emergencia (botiquin, camilla,	Kelly Florez
4/06/2025	Codigo de los colores de las canecas	Sonia González
5/06/2025	Prohibido la caza de animales	Sonia González







Ilustración 1 Registro fotografico de charlas

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Fecha de Versión: Febrero 2025
		INFORME No. 3
		Página 6 de 15

2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

Durante este periodo se continuó con el campamento principal (oficina) el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Repelón- Atlántico; el campamento principal de obra se encuentra ubicado en la salida de Repelón hacia Villa Rosa, donde funcionara el punto de atención a la comunidad.



Ilustración 2 Registro fotografico de campamento principal

Durante este periodo se realizó la instalación de kits de emergencia (camilla, botiquín y extintor), punto ecologico, punto de hidratación.



Ilustración 3 Registro fotografico de campamento

 CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Fecha de Versión: Febrero 2025
		INFORME No. 3
		Página 7 de 15

PQRS

El día 10 de mayo de 2025 se presentó una PQRS del señor Darlis Parra Gonzalez en el frente de obra caño Villa rosa en Repelón, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio; el 23de mayo se dio cierre a la PQRS del señor Darlis Parra Gonzalez con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa)

El 12 de mayo se dio cierre a la PQRS dela señora Anadira Gonzalez Siada con el pago de 700.000 mil pesos por jornales para arreglo de terreno afectado por maquinaria.

El 13 de mayo se presentó PQRS del señor Calixto Ruiz Otero en el frente de obra caño Villa rosa en Repelón, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio; el 23de mayo se dio cierre a la PQRS del señor Calixto Ruiz Otero con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa)

El 13 de mayo se presentó PQRS del señor Blass Julio Pino en el frente de obra caño Villa rosa en Repelón, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio; el 23 de mayo se dio cierre a la PQRS del señor Blass Julio Pino con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa)

El 15 de mayo se presentó PQRS del señor Javith Ruiz Parra en el frente de obra caño Villa rosa en Repelón, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio; el 23de mayo se dio cierre a la PQRS del señor Javith Ruiz Parra con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa)

El día 26 mayo se presentó PQRS del señor Cesar Morales Cantillo en el frente de obra caño Compuertas Porvenir en Manatí, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio y lote agricultor el cual solicita 1 rollo de alambre púa, una caja de grapas y 60 jornales; el día 6 de junio se dio cierre a la PQRS del

señor Cesar Morales Cantillo con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa) queda pendiente por parte de gerencia la revisión de los 60 jornales para arreglo de lote agricultor.

El día 28 mayo se presentó PQRS del señor Edesmo Morales Catilla en el frente de obra caño Compuertas Porvenir en Manatí, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de la maquinaria se presentaron afectaciones a la cerca de su predio y lote agricultor el cual solicita 1 rollo de alambre púa, una caja de grapas y 50 jornales; el día 6 de junio se dio cierre a la PQRS del señor Cesar Morales Cantillo con la entrega de materiales para arreglo de su cerca (1 rollo de alambre púa y 1 caja de grapa) queda pendiente por parte de gerencia la revisión de los 50 jornales para arreglo de lote agricultor.





Ilustración 4 Registro fotografico de PQRS

Tabla 2 Listado de PQRS

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PQRS CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL								
N.CON	NOMBRE	DIRECCION	FRENTES DE OBI	FECHA RECEPCI	FECHA DE CIER	DESCRIPCION DE LA PQRS	ESTADO DE PQR	
							Abierta	Cerrada
1	Ana Dira Gonzalez	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	3/04/2025	12/05/2025	Daño en cultivos por actividades de obra		1
2	Carlos Garcia Gonzalez	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	8/04/2025	11/04/2025	Daños en el terreno		1
3	Jose Redondo Teran	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	15/04/2025	23/04/2025	Daños en la cerca		1
4	Darlis Parra Gonzalez	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	10/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
5	Calixto Ruiz Otero	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	13/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
6	Blas Julio Pino	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	13/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
7	Javi Ruiz Parra	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	15/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
8	Cesar Adolfo Morales Cantillo	Compuerta-Porvenir	Manatí	26/05/2025	6/06/2025	Daño en la cerca		1
						pago de 60 jornales para arreglo de terreno agricultor	1	
9	Edesmo Julio Morales Castilla	Compuetas-Porvenir	Manatí	28/05/2025	6/06/2025	Daño en la cerca		1
						pago de 50 jornales para arreglo de terreno agricultor	1	

PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD

Durante este periodo se dio continuidad a las actividades de limpieza manual del caño villa rosa en cercanía al embalse el guajaro, ubicado en el Corregimiento de Villa Rosa en el Municipio de Repelón – Atlántico, esta actividad se realizara por 20 días, con 17 personas suministrados por la Asociación de Pescadores y Agricultores del Corregimiento de Villa Rosa – ASOPACOVIR, trabajando de manera intercalada, en grupos de 10 personas diarias.



Ilustración 5 Registro fotografico de jornada de limpieza Manual con comunidad de pescadores del Corregimiento de Villa Rosa – Repelón - Atlántico

El día 9 de mayo de 2025, se da inicio a la limpieza manual del arroyo limón, sector Porvenir en el municipio de Luruaco – Atlántico con la participación de la Fundación Municipal de Pescadores y Ambientalistas – FUPAMLUR, en el Municipio de Luruaco Atlántico y se realizó la entrega de unos kits que consta de una camisa, botas pantaneras, guantes, sacos, machetes; para dar inicio dicha actividad, esta actividad se realizara por 15 días, con 8 personas suministrados por la Asociación.



Ilustración 6 Registro fotografico de jornada de limpieza Manual con comunidad de pescadores del Municipio de Luruaco - Atlántico

3. PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Durante este periodo se realizó levantamiento de actas de vecindad de cierre de las viviendas y lotes ubicados en cercanía de los arroyos negro en el Municipio de Luruaco – Atlántico.



Ilustración 7 Registro fotografico de cierre de actas de vecindad.

Tabla 3 Listado de cierre de actas de vecindad

Fechas	Detalle	Cantidad
Del 07-05-2025 al 08-05-2025	Actas de vecindad Inicial Arroyo Negro - Luruaco	28
09-05-2025	Actas de entorno Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
09-05-2025	Actas de lote Inicial Arroyo Negro - Luruaco	1
Total		30

4. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Durante este periodo se realizó contratación de mano de obra no calificada.

Tabla 4 Listado de personal de mano de obra no calificada

Nombre Completo	Cedula	Genero	Cargo	Ciudad	Tipo de mano de obra	Fecha de ingreso
Yesica Pino	102095293	F	Servicio General	Repelón	MONC	7/05/2025
Rosa Castro	22598664	F	Servicio General	Repelón	MONC	20/05/2025

Durante este periodo en conjunto con la Asociación de Pescadores y Agricultores del Corregimiento de Villa Rosa – ASOPACOVIR se realizó una jornada de limpieza manual del Caño Villa Rosa en cercanía al Embalse el Guajaro por 20 días, en la cual se contó con la participación de 17 personas; y con la Fundación Municipal de Pescadores y Ambientalistas – FUPAMLUR se realizó una jornada de limpieza manual en el Arroyo Limón en el Municipio de Luruaco por 15 días, en la cual se contó con la participación de 8 personas; se relaciona el siguiente personal del área de influencia directa:

Tabla 5 Lista de personal de mano de obra no calificada de manera indirecta.

Nombre Completo	Cedula	Genero	Ciudad
Bernardo de Jesus Cabrera	1130304121	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Deison Perez de León	1002095735	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Arquimedes Cabrera Pajaro	8604372	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Abrahan Parra	3751566	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Carlos Cabrera Duran	1049533818	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Francisco Utria	3976685	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Kevin Reales Perez	1048580006	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Yony Utria	3751050	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Javier Cabrera Perez	8601876	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Alberto Perez	1234888264	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Reinaldo Ruiz Cabrero	8604353	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Jose Javier Cabrera	7961956	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Teofilo Sarmiento	19895186	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Luis Avillamil	8601207	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Manue A. Perez C.	1046266619	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Hammer Perez Cabrera	1046268507	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Angel Castro Dominguez	8602900	Masculino	Villa Rosa - Atlántico
Marco Sarmiento	72070951	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Adalgo Lopez Franco	10452288701	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Omar Garcia Vloria	1002070638	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Wilfrido Pajaro Torres	73558399	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Ermides Beltrán López	1002073865	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Osnaider García Vloria	104822694	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Wilson García	72073430	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco
Brainer Mares Roa	1002073476	Masculino	Arroyo Limón - Luruaco

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Fecha de Versión:
Febrero 2025

INFORME No. 3

Página 15 de 15

ANEXOS

ANEXO 1

PQRS

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PQRS CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL								
N. CONS	NOMBRE	DIRECCION	FRENTA DE OBRA	FECHA RECEPCIÓN	FECHA DE CIERRE	DESCRIPCION DE LA PQRS	ESTADO DE PQR	
							Abierta	Cerrada
1	Ara Dira Gonzalez	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	3/04/2025	12/05/2025	Daño en cultivos por actividades de obra		1
2	Carlos Garcia Gonzalez	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	8/04/2025	11/04/2025	Daños en el terreno		1
3	Jose Redondo Teran	Arroyo Negro - Luruaco	Arroyo Negro	15/04/2025	23/04/2025	Daños en la cerca		1
4	Darlie Parra Gonzalez	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	10/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
5	Calixto Ruiz Otero	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	13/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
6	Blas Julio Pino	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	13/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
7	Javit Ruiz Parra	Compuerta-Villa Rosa	Villa Rosa	15/05/2025	23/05/2025	Daño en la cerca		1
8	Cesar Adolfo Morales Cantillo	Compuerta-Porvenir	Manatí	26/05/2025	6/06/2025	Daño en la cerca		1
						pago de 60 jornales para arreglo de terreno agricultor	1	
9	Edesmo Julio Morales Castilla	Compuetas-Porvenir	Manatí	28/05/2025	6/06/2025	Daño en la cerca		1
						pago de 50 jornales para arreglo de terreno agricultor	1	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

FORMATO DE PQRS

Versión N° 1

Fecha de Versión:

Junio 26 -2019

N°

Fecha: 10-05-2025

Nombre completo:

Darius Puma Gonzales

Doc. De

Identificación:

7959569

Tipo:

Cc

X

Ti:

NIT:

Dirección:

Compuertas Villa - Losa

Ciudad:

Repelón

Teléfono fijo:

Celular: 312 638 8864.

Correo Electrónico:

Tipo:

Petición:

Queja:

X

Reclamos:

Sugerencia:


Otros:

Descripción


Se presentó una PQRS del señor Darius Puma Gonzales, en el frente de obra del Camo Compuertas de Villa Losa - Repelón en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de maquinaria se presentaron afectaciones a Corra de su predio; el propietario solicita arreglo.

Se procedió con la toma de PQRS y revisión con Gerencia.

Firma del solicitante: x



Firma de quien recibe:



Repelón, Villa Rosa

Fecha: 23-05-2025

A QUIEN INTERESE:

AFECTADO: DARLIS PARRA GONZÁLEZ

ASUNTO: Entrega de Material

Darlis Parra González, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 7.959.569, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrela o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Darlis Parra González declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFECTADO (A):

x *Darlis Parra G.*

DARLIS PARRA GONZÁLEZ

C.C. N°: 7959569

Dirección: *Compuertas Villa Rosa.*

Teléfono: 312 638 8864

Correo electrónico:



CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

FORMATO DE PQRS

Versión N° 1

Fecha de Versión:

Junio 26 -2019

N°

Fecha: 13-05-2025

Nombre completo:

Calixto Ruiz Otero

Doc. De
identificación:

7.959.433

Tipo:

Cc

X

Ti:

NIT:

Dirección:

Compuertas - Villa Rosa

Ciudad:

Repelón

Teléfono fijo:

Celular:

Correo Electrónico:

Tipo:

Petición:

Queja:

X

Reclamos:

Sugerencia:

Otros:

Descripción

Se presento PQRS del Señor Calixto Ruiz Otero, en frente de obra del Camo Compuertas Villa Rosa- Repelón en el cual manifiesta que durante las actividades de obra, por el paso de maquinaria se presentaron afectaciones a cerca de su predio, el propietario solicita arreglo.

Se procedio con la toma de PQRS y revision con gerencia

Firma del solicitante:

Calixto Ruiz O.

Firma de quien recibe:

Juan Carlos Paredes C.

Repelón, Villa Rosa
Fecha: 23-05-2025

A QUIEN INTERESE:

AFFECTADO: CALIXTO RUIZ OTERO

ASUNTO: Entrega de Material

Calixto Ruiz Otero, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 7.959.433, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrela o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Calixto Ruiz Otero declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFFECTADO (A):




CALIXTO RUIZ OTERO

C.C. N°: 7959433

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:



CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

FORMATO DE PQRS

Versión N° 1

Fecha de Versión:

Junio 26 -2019

N°

Fecha: 13-05-2025

Nombre completo:

Blos Julio Pino

Doc. De

identificación:

1049537629

Tipo:

Cc

X

Ti:

NIT:

Dirección:

Compuertas Villa Rosa.

Ciudad:

Repelón

Teléfono fijo:

Celular: 3233057248

Correo Electrónico:

Tipo:

Petición:

Queja:

X

Reclamos:

Sugerencia:

Otros:

Descripción

Se Presento una PQRS del Señor Blos Julio Pino, en el frente de obra del Canal Compuertas de Villa Rosa - Repelón en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de maquinaria se presentaron afectaciones a Cercas de su predio, el propietario solicita arreglo.

Se procedio con la toma de PQRS y revision con Gerencia.

Firma del solicitante: NO FIRMA.

Firma de quien recibe:

Juanita Toranzo

Repelón, Villa Rosa
Fecha: 23-05-2025

A QUIEN INTERESE:

AFECTADO: BLAS JULIO PINO

ASUNTO: Entrega de Material

Blas Julio Pino, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 1.049.537.629, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querella o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Blas Julio Parra declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFECTADO (A):

NO FIRMA
BLAS JULIO PARRA
C.C. N°: 1049537629
Dirección: Compuertas Villa Rosa.
Teléfono: 3233057248
Correo electrónico:



CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

FORMATO DE PQRS

Versión N° 1

Fecha de Versión:

Junio 26 -2019

N°

Fecha: 15-05-2025

Nombre completo:

Javith Ruiz Parra

Doc. De
identificación:

3751658

Tipo:

Cc

X

Ti:

NIT:

Dirección:

Compuertas Villa Rosa

Ciudad:

Repelón

Teléfono fijo:

Celular: 312638 8864

Correo Electrónico:

Tipo:

Petición:

Queja:

X

Reclamos:

Sugerencia:

Otros:

Descripción

Se presenta una PQRS del Señor Javith Ruiz Parra, en el frente de Obra del Cano Compuertas de Villa Rosa - Repelón en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de maquinaria se presentaron afectaciones a Cercas de su predio, el propietario solicita arreglo.

Se procedió con la toma de PQRS y revisión con Gerencia

Firma del solicitante: X

Javith Ruiz Parra

Firma de quien recibe:

Marcelo Toranzo CA.

Repelón, Villa Rosa

Fecha: 23-05-2025

A QUIEN INTERESE:

AFECTADO: JAVITH RUIZ PARRA

ASUNTO: Entrega de Material

Javith Ruiz Parra, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 3.751.658, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrella o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Javith Ruiz Parra declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFECTADO (A):

Javith Ruiz Parra

JAVITH RUIZ PARRA

C.C. N°: 3751658

Dirección:

Teléfono: 312 638 8864

Correo electrónico:



CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

FORMATO DE PQRS

Versión N° 1

Fecha de Versión:

Junio 26 -2019

N°

Fecha: 26-05-2025

Nombre completo:

Cesar Adolfo Flores Camillo

Doc. De
Identificación:

1050 006 971

Tipo:

Cc

✓

Ti:

NIT:

Dirección:

Compuertas - Povenir

Ciudad:

Manatí

Teléfono fijo:

Celular: 3043974946

Correo Electrónico:

Tipo:

Petición:

Queja:

✓

Reclamos:

Sugerencia:

Otros:

Descripción

Se presenta una PQRS del Señor Cesar Flores Camillo en el frente de Obra del Caño Compuertas Povenir, en el cual manifiesta que durante las actividades de obra por el paso de maquinaria se presentaron afectaciones a Cercas y Cote agricultor de Puerto a su Predio (aproximadamente 60 jornales).

Se procedió con la toma de PQRS y revisión con Gerencia

Firma del solicitante: x Cesar Flores

Firma de quien recibe:

Manatí

Manatí, Compuertas Porvenir

Fecha: 6-06-2025

A QUIEN INTERESE:

AFECTADO: CESAR ADOLFO MORALES CASTILLO

ASUNTO: Entrega de Material

Javith Ruiz Parra, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 1.050.006.971, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrela o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Cesar Adolfo Morales Castillo declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFECTADO (A):

Cesar Morales


CESAR ADOLFO MORALES CASTILLO

C.C. N°: 1050006971

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:



Manatí, Compuertas Porvenir

Fecha: 6-06-2025

A QUIEN INTERESE:

AFECTADO: EDESIMO JULIO MORALES CASTILLA

ASUNTO: Entrega de Material

Darlis Parra González, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número de 63.475.412, residente en lote cercado margen derecho – Caño de compuertas Villa Rosa, en mi condición de afectado por paso de maquinaria durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.

Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrela o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la afectación de cercado por las obras, se realizó una conciliación por *entrega de materiales para arreglo de cerca*; yo Edesimo Julio Morales Castillo declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFECTADO (A):




EDESIMO JULIO MORALES CASTILLO

C.C. N° 73475412

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:



Luruaco, 12 de Mayo de 2025.

A QUIEN INTERESE:

AFFECTADO: ANA DIRA GONZÁLEZ SIADO

ASUNTO: Indemnización Integral.

Ana Dira González Siado, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número de 22.729.764, residente en lote agricultor margen derecho – Arroyo Negro en Luruaco, en mi condición de afectado por terreno irregular durante la ejecución del proyecto cuyo objeto es REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, correspondiente al contrato de obra pública No. 492 DE 2024, manifiesto que desisto de toda acción civil, penal o contravencional a favor del **CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL** identificada con NIT: 901893943-1 y/o la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.**

Desistimiento que se hace extensivo a favor de cualquier persona natural o jurídica o aseguradora que directa o indirectamente este llamado a responder, como consecuencia del incidente en mención.


Este desistimiento lo hago de manera libre y voluntaria por lo que no es mi interés formular querrela o reclamación al respecto ante autoridad competente.

En lo referente a la irregularidad del terreno por las obras, se realizó una conciliación por un valor de **SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 700.000)**, que han sido cancelados a treves de consignación cuenta NEQUI ; yo Ana Dira González Siado declaro haber recibido de conformidad a la firma del presente documento.

Atentamente,

AFFECTADO (A):

x Ana Dira Gonzalez
ANA DIRA GONZÁLEZ SIADO
C.C. N°: 22.729.764 Leo.
Dirección:
Teléfono: 3245083393
Correo electrónico:



ANEXO 2

ENTREGA DE KITS

Fecha: 4-05-2025 Ciudad: Llanuco Hora Inicio: 7:00 Duración: _____
 Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros _____

 Tema de la Actividad: Asistencia Entrega de Kit

 Lugar: Amayo Uman

Expositor: _____ Entidad: _____ Evaluación Realizada _____


#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma	Calificación
1	Wilfredo Portero Torres	73518397		Wilfredo	
2	Marcos Sarmiento	32070951		marco	
3	Adalge Lopez Franco	764522930		Adalge	
4	Omar Garcia Viloria	1002070638		omar	
5	Brainer Reyes	1062073476		Brainer	
6	Osneider Garcia Viloria	70472694		Osneider	
7	Wilson Garcia	32073430		wilson	
8	Ermides Beltran Lopez	1002073866		Ermides	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					


Contenido del tema:

Promedio de calificación

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


 Responsable del evento


 Facilitador/Expositor

ASISTENCIA PESCADORES

LURUACO

Fecha: 27. 7. 2013 Ciudad: Catamarca Hora Inicio: 7 pm Duración: 12 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Comprensión

Lugar: Ciudad Lima - Lurigancho

Exposit: Entidad: SANT

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wilfredo Pardo Torres	43.558399	obrero	Wilfredo
2	Marcelo Samartino	72040951	obrero	Marcelo
3	Adalberto Lopez Franco	1045228401	obrero	Adalberto
4	Simón GARCÍA VILLALBA	1002070638	obrero	Simón
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Simón GARCÍA VILLALBA
Responsable del evento

Simón GARCÍA VILLALBA
Facilitador/Expositor

Fecha: mayo 10 2018 Ciudad: Cotacaca Hora Inicio: 4pm Duración: 90 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Limpieza

Lugar: Amor Amor - Cotacaca

Exposit: _____ Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Adalberto Lopez Franco	1048228404	obrero	
2	Orman Garcia Vidales	1002070638	obrero	
3	Wilfredo Rojas Torres	73558399	obrero	
4	marco serrano	72040967	obrero	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


Responsable del evento


Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: mayo 12, 2015 Ciudad: Lorua CD Hora Inicio: 7 Am Duración: 1 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actualidad de la imprentaLugar: Arroyo Limón - Corasco

Expositor: _____ Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	marcos Sarmento p.	12070951	obrero	marcos p.
2	Adalberto Lopez Franco	1045228709	obrero	A
3	marcos Garcia Veloz	1002070638	obrero	marcos
4	Welfredo Pajero Torres	73558399	obrero	welfredo
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

 TICOM <small>TECNOLOGIA E INICIATIVA COMUNITARIA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión: Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: Mayo 13 2013 Ciudad: Cusco Hora Inicio: 7 am Duración: 92 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 8ª Otros

Tema de la actividad: Asistencia de Actividades de Comprensión

Lugar: Aroyo Lemón - Urubico

Expositor: _____ Entidad: _____

#	Nombre completo	Código	Cargo	Firma
1	Adalberto Lopez Franco	1048728707	Obrero	<i>[Firma]</i>
2	Orman Garcia Vidales	1002070638	Obrero	<i>[Firma]</i>
3	WILIBERTO PARRA TANGA	13558399	Obrero	<i>[Firma]</i>
4	MARCOS SANCHEZ	72070967	Obrero	<i>[Firma]</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

[Firma]
Responsable del evento

[Firma]
Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3
Fecha de versión:
Junio 20/2013
Página 1 de 1

Fecha: 07.14.2025 Ciudad: Colegio Hora Inicio: 7 am Duración: 12 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5ª Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Limpieza

Lugar: Colegio Limón - Lomas

Expositor: _____ Entidad: SAT

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wilfredo Páez Torres	43558399	obrero	Wilfredo
2	Alfonso Sánchez	72050951	obrero	Alfonso
3	Adalberto López Franco	1045220101	obrero	Adalberto
4	Amey García Vitoria	1007070638	obrero	Amey
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Francisco Tanguayo C.
Responsable del evento

Francisco Tanguayo C.
Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: Mayo 15-2015 Ciudad: Corvaco Hora Inicio: 7 AM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5* Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actualizadas de LimpiezaLugar: Arroyo Limon - Corvaco

Expositor: _____ Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Omar Garcia Victoria	1002070638	Obrero	Omar
2	Wilfredo Parguro Torres	73558399	Obrero	Wilfredo
3	MARCELO SAIMIENTO	72070951	Obrero	Marcelo S.
4	Adalberto Lopez Franco	1045228701	Obrero	Adalberto
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión: Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: Mayo 10-2013 Ciudad: Lorvaco Hora inicio: 7 AM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de limpieza

Lugar: Arroyo Limón - Lorvaco


Exposit: _____ Entidad: _____


#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Adalge Lopez Franco	1045228701	Obiero	
2	Omar Garcia Vitoria	1002070638	Obiero	omar
3	Wilfrido Puyar Torres	73558399	Obiero	Wilfrido
4	Marcelo Sarmiento	72070951	Obiero	Marcelo
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


Responsable del evento


Facilitador/Expositor

	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión: Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: Mayo 12/2025 Ciudad: LORUACO Hora Inicio: 7 PM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5* Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actitud de limpieza.

Lugar: Arroyo Limon-Loruaco


Exposit: _____ Entidad: _____


#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Ermioles Beltran Lopez	4002073866	Obrero	Ermioles
2	Oswalder Garcia Vilora	104822694	Obrero	Oswalder
3	Wilson Ocelus	72073430	Obrero	Wilson
4	Izramer Marcos Roa	1002072426	Obrero	Izramer
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema: _____

Evaluación realizada: _____

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


Responsable del evento


Facilitador/Expositor

 TICOM <small>por el Estado contribuyente de los impuestos</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión: Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Facilitador: Mayo 19-25 Ciudad: Corvaco Hora Inicio: 7 AM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de limpieza

Lugar: Arroyo Limon - Corvaco


Exposit: _____ Entidad: _____


#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wilson Garmey	1002073866	Obrero	Ermiades
2	Ermiades Beltran Lopez	104822694	Obrero	Osnalder
3	Braimer Mares Roa	72073430	Obrero	Wilson
4	Osnalder Garcia Vilora	1002073476	Obrero	Braimer
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema: _____

Evaluación realizada: _____

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


Responsable del evento


Facilitador/Expositor

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	Versión: 3
		Fecha de versión:
		Junio 20/2013
		Página 1 de 1

Fecha: Mayo 20 - 2015 Ciudad: Curuaco Hora inicio: 7 AM Duración: 12 hrs

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5^a Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Limpieza

Lugar: Cerrojo Limón - Curuaco
 Evacuación: _____ Entidad: _____


#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Wilson Govey	1002073866	Obrero	Exmides
2	Ernides Beltran Lopez	104822694	Obrero	Osnader
3	Brainer Mares Roa	72073430	Obrero	Wilson
4	Osnader Garcia Vilora	1002073476	Obrero	Brainer
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema: _____

Evaluación realizada: _____

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable


 Responsable del evento


 Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3
 Fecha de versión:
 Junio 20/2013
 Pagina 1 de 1

Fecha: Mayo 21-25 Ciudad: Curvaco Hora Inicio: 7 AM Duración: 12 pm

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 6* Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de limpieza

Lugar: Arroyo Limón - Curvaco

Expositor: Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Ermides Beltran Lopez	1002073866	Obrero	Ermides
2	Osnider Garcia Vilora	104822694	Obrero	Osnider
3	Wilson Ocaso	72073430	Obrero	Wilson
4	Braimer Mares Roa	1002073476	Obrero	Braimer
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Josue Luis Toranzo C.
 Responsable del evento

Josue Luis Toranzo C.
 Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3
 Fecha de versión:
 Junio 20/2013
 Página 1 de 1

Fecha: Huyo 22-2015 Unidad: Luruvaco Hora Inicio: 7 AM Duración: 1 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5* Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Limpieza
 Lugar: Barrio Lurum - Luruvaco

Expositor: _____ Entidad: _____

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Brainer Mares Roa	1002073476	Obrero	Brainer
2	Osnider Garcia Vilora	104822694	Obrero	Osnider
3	Wilson Garen	72033430	Obrero	Wilson
4	Ermides Beltran Lopez	1002073866	Obrero	Ermides
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

 TICOM <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA</small>	REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	<small>Fecha de versión:</small> Junio 20/2013
		<small>Página 1 de 1</small>

Fecha: Mayo 23/2025 Ciudad: Lorvaco Hora Inicio: 7 AM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 9ª Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Actividad de Limpieza

Lugar: Arroyo Limón - Lorvaco

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Osnaioler García Vitoria	104222694	Obrero	Osnaioler
2	Wilson Guevara	72073430	Obrero	Wilson
3	Braimer Mares Roa	1082073476	Obrero	Braimer
4	Fernando Beltrán López	1202073866	Obrero	Fernando
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del taller:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Francisco Toranzo de
 Responsable del evento

Francisco Toranzo de
 Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: Mayo 26, 2015 Ciudad: Lurua Co. Hora: 7 AM a 1 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla S* Otros

Tema de la Actividad

Lugar: Arroyo Limón - Lurua Co.

Expositor:

Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Brainer Mares Roa	1002073476	Obrero	Brainer
2	Osnalder García Vilora	104822694	Obrero	Osnalder
3	Wilson Lora	72033430	Obrero	Wilson
4	Ermiel Beitran Lopez	1001073566	Obrero	Ermiel
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Versión: 3
Fecha de versión:
Junio 20/2013
Página 1 de 1

Fecha: 14/07/2015 Ciudad: Lima Hora inicio: 7 AM Duración: 12 PM

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5° Otros

Tema de la Actividad: Asistencia Administrativa de Limpieza

Lugar: Arrojo Limón - Lima

Exposit: Entidad

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Osnaioler Garcia Vilora	104822694	Obrero	Osnaioler
2	Wilson Guevara	72073430	Obrero	Wilson
3	Brainer Mares Roa	1002073476	Obrero	Brainer
4	Fernando Beltran Lopez	1002073866	Obrero	Fernando
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

VILLA ROSA - REPELÓN

**TICOM.****REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN**

Versión: 3

Fecha de versión:
Junio 20/2013

Página 1 de 1

Fecha: 7-05-2025 Ciudad: Villa RosaHora Inicio: 7:00 Duración: _____

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia actividades de LimpiezaLugar: Cano Villa RosaExpositr: _____ Entidad: CA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Teofilo Sarmiento P	19495186	Socio	Teofilo
2	Francisco Villalba	3976685	Socio	Francisco
3	Luis Villamil	8601707	Socio	Luis
4	Abraham Ferra	3751566	Socio	Abraham
5	Reinoldis Ruiz Cabrera	4.604353	Socio	Reinoldis
6	Bernardo Cabrera Marko	7130304127	Socio	Bernardo
7	Deison Perez De Leon	1002095735	Socio	Deison
8	Yony Utrilla	3751650	Socio	Yony
9	Harmer Perez Cabrera	1046269507	Socio	Harmer P
10	Alber Perez C	1234888264	Socio	Alber
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

Fecha: 8-05-2025 Ciudad: Villa Rosa Hora Inicio: 7:10 Duración: _____

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

 Tema de la Actividad: Asistencia actividades de Limpieza

 Lugar: Cano Villa Rosa

 Expositor: _____ Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	José Filo Sarmiento	19495186	Socio	José Filo
2	Fernando Villamil	3876685	Socio	Fernando
3	Luis Villamil	8601207	Socio	Luis
4	Abraham Ferra	3751566	Socio	Abraham
5	Reinoldis Ruiz Cabrera	4604353	Socio	Reinoldis
6	Bernardo Cabrera Marko	7130304727	Socio	Bernardo
7	Deison Perez de Leon	1002095735	Socio	Deison
8	Yony Utrilla	3751650	Socio	Yony
9	Harner Perez Cabrera	1046269507	Socio	Harner P
10	Alber Perez C	1234888264	Socio	Alber
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento


 Facilitador/Expositor

Fecha: 9-05-2025 Ciudad: Villa Rica Hora: 7:10

Tipo de Evento: Asistencia actividades de Cmara

Lugar: CARR VILLARICA

Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Francisco Uribe	3426685	Socio	Francisco
2	A. Bahen Para	3751 566	Socio	A. BAHEN
3	Jos. Jaime Ayerra	7961 056	Socio	Jos. Jaime
4	ARKI MEDES Cobrea	8.004 372	Socio	ARKI
5	Bernardo Cabrera M	1730304727	Socio	Bernardo
6	Yosif Sarmiento		Socio	Yosif
7	Alberto Perez C	123888264	Socio	Alberto
8	LOIS VILLAMIL	8601 207	Socio	LOIS
9	Reinoldo Ruiz C	8.604 353	Socio	Reinoldo
10	Deison Perez de Leon	1002095435	Socio	Deison
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada:

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento:

Facilitador/Expositor:

**TICOM****REGISTRO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN**

Versión: 3

Fecha de versión:

Junio 20, 2013

Página 1 de 1

Fecha: 12-05-2025

Ciudad: Villa Rosa

Hora Inicio:

Duración:

Tipo: Capacitación

Entrenamiento

Charla 5"

Otros:

Tema de la Actividad:

Lugar: CEND Villa Rosa

Asistencia actividades de Cuidado

Expositor:

Entidad:

CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Francisco Ortiz	3476685	Socio	Francisco
2	Abramo Parra	3751566	Socio	Abramo
3	José Jaime Carrera	7961056	Socio	José Jaime
4	ARKI MEDES Cabra	8.004372	Socio	ARKI
5	Bernardo Cabrera M	1730304727	Socio	Bernardo
6	Yosile Sarmiento		Socio	Yosile
7	Alberto Pérez C	123888264	Socio	Alberto
8	LOIS VILLAMIL	8601207	Socio	LOIS
9	Reinoldis Ruiz C	8.604353	Socio	Reinoldis
10	Deison Pérez de León	1002095435	Socio	Deison
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada:

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

Fecha: 13-05-2025 Ciudad: Villa Posa Hora Inicio: 9:10 Duración:

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

Tema de la Actividad: Asistencia actividades de Limpieza

Lugar: Cam Villa Posa

Exposit: Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Francisco Zúñiga	3941605	Socio	Francisco
2	Abraham Fara	3251586	Socio	Abraham
3	José Javier Cabrera	7961056	Socio	José
4	ARKIMEDES CABALLA	8.604372	Socio	ARKI
5	Bernardo Cabrera Maldonado	773030477	Socio	Bernardo
6	Nicolás Sarmiento		Socio	Nicolás
7	LUIS VILLAMIL	8601207	Socio	Luis
8	Alberto Pérez	1234089264	Socio	Alb.
9	Reinoldis Quis. C	8.604353	Socio	Reinoldis
10	Deyson Pérez	1002095935	Socio	Deyson
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA

Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

Fecha: 14-05-2015 Ciudad: Villa Rosa Hora Inicio: 7:10 Duración: _____

Tipo: Capacitación Entrenamiento Charla 5" Otros

 Tema de la Actividad: Asistencia Actividades de Cumplera

 Lugar: Cano Villa Rosa

 Exposit: _____ Entidad: CAA

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Neofitosarmiento	19896726	Soci	Neofitosarmiento
2	Bernardo cabrera marteio	2130304721	Soci	Bernardo
3	Francisco Muriel	3976685	Soci	Francisco
4	Luis Villamil	8601207	Soci	Luis
5	Abraham Parra	3751566	Soci	Abraham
6	Raimondis Ruiz Cabrera	8.604353	Soci	Raimondis
7	Deison Perez De Leon	1002095735	Soci	Deison
8	Alberto Paez	1234886204	Soci	Alberto
9	Xony Urdia	3751600	Soci	Xony
10	Homer Perez Cabrera	1046269507	Soci	Homer
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

Fecha: 15-05-2025 Ciudad: Villa Rosa

Hora Inicio: 7:10

Duración:

Tipo: Capacitación

Entrenamiento

Charla S

Otros

 Tema de la Actividad: Asistencia actividades de Limpieza
 Lugar: cano villa Rosa.

Expositor:

Entidad:

CAA.

#	Nombre completo	Cédula	Cargo	Firma
1	Abraham Torra	3751566	Socio	ABRAHAM
2	Bernardo Cabrera marlek	7730304727	Socio	Bernardo
3	jose cabrera	7961056	Socio	José
4	Teofilio Sarmiento	19895186	Socio	Teofilio
5	Luis Villamil	8601207	Socio	Luis
6	Alber perez c	7234000264	Socio	Alber
7	Reinoldis Auz	8.604353	Socio	Reinoldis
8	Haner perez Cabrera	1046269507	Socio	Haner perez
9	ANDRIMENES Cabrera	8.604372	Socio	ARKI
10	Francisco Zúñiga	3976685	Socio	Francisco
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Contenido del tema:

Evaluación realizada:

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA		
Fecha	Observaciones/comentarios	Responsable

Responsable del evento

Facilitador/Expositor

ANEXO 3

**LEVANTAMIENTO DE
ACTAS DE VECINDAD
DE CIERRE.**

**ARROYO NEGRO –
LURUACO - ATLÁNTICO**

ACTA DE CIERRE DE ENTORNO

Entorno

1

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		ACTA DE VICINIDAD DE CIERRE		VERSIÓN: 3.0
FECHA DE CIERRE		FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES		
09/05/2025 DD MM AA		PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
ACTA No.: 001				
No. de Contrato 492 DE 2024		Fecha de Contrato 7 DE MARZO DE 2025		
Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		Encuestador: <u>Hernando Tenebrera C.</u>		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO		
		Nombre del Responsable del predio: <u>AD Ror</u>		
		Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐		
		Nombre del Propietario: <u>Via - Pardo Negro</u>		
		Dirección: <u>Via - Pardo Negro</u>		
		Teléfono: <u> </u> No. de pisos <u> </u>		
		Long. del frente (mts) <u> </u>		
		Metricula Inmobiliaria No. <u> </u>		
		Cedula Catastral: <u> </u>		
		SERVICIOS PÚBLICOS		
		1. Agua ☐ SI ☐ NO ☐		
		2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO ☐		
		3. Energía ☐ SI ☐ NO ☐		
		4. Teléfonos ☐ SI ☐ NO ☐		
		5. Gas ☐ SI ☐ NO ☐		
		6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO ☐		
		7. Otros ☐ SI ☐ NO ☐		
		TIPO DE PREDIO		
		1. Monumento Nacional ☐ 5. En Construcción ☐		
		2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin Edificar ☐		
		3. Valor Intermedio ☐ 7. Otro ☐		
		4. Valor Normal ☐ Cual? ☐		
		USO ACTUAL		
		1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐		
		2. Comercial ☐ 6. Beldío ☐		
		3. Industrial ☐ 7. Otro ☐		
		4. Institucional ☐ Cual? ☐		
		ACCESOS VEHICULARES		
		Garaje SI ☐ NO ☒		
		Cuantos ☐		
		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒		
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Usar el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)				
ESTRUCTURA: <u>Se observa Construcción en material de block</u>				
<u>de concreto en buenas condiciones.</u>				
MUROS: <u>Se observan murales en las partes laterales.</u>				
CUBIERTA: <u>Se observan techos en material de</u>				
<u>asfalto en buenas condiciones.</u>				
PISOS: <u> </u>				
FACHADA: <u>Buenas Condiciones</u>				
GRIETAS Y FISURAS: <u>No se observan grietas ni fisuras en su estructura.</u>				
HUMEDADES: <u>No se observan humedades.</u>				
HUNDIMIENTO PISO: <u>No se observan hundimientos.</u>				
DESPLAZAMIENTOS: <u>No se observan desplazamientos.</u>				
OTRO: Cual? <u> </u>				

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		VERSIÓN: 3.0
FECHA DE CIERRE 04 DD 05 MM 2015 AA		FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURIACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
ACTA No.: 001				
4. ANEXOS Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)				
5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")				
FIRMAS				
Firma Responsable del predio		Firma Residente social del Contratista		Vo.Bo. Residente social de la Interventoría
Nombre:	C.C. O NIT	Nombre:	C.C. O NIT	Nombre:
[Firma]		[Firma]		[Firma]
Firma Residente de obra del Contratista		Firma Residente de obra de la Interventoría		
Nombre:	C.C. O NIT	Nombre:	C.C. O NIT	
[Firma]		[Firma]		

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VICINIDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025


FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUADO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

DD MM AA
ACTA No.:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE CIERRE DE LOTES

001

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE CIERRE DE LOTES

Proyecto: Realizar la Limpieza y Recuperación Ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse el Guájaro en el Departamento del Atlántico.

Nombre del ciudadano: _____
Cedula de ciudadanía: _____ Dirección: Luruaco - Atlántico
Barrio: Vía - Arroyo negro. Celular: _____
Tipo de predio: Lote.

Descripción:

Se Observa lote con construcciones en la vía Arroyo Negro, vía
que conducía a frente de obra (Arroyo Negro)
El lote se encuentra en el mismo estado después de la
intervención, por lo que no fue afectado por el paso de la
maquinaria durante las actividades, también se observan Vegetación
y algunos escombros.

Se visitó el lote en varias ocasiones y no se encontró propietario
ni responsable.

Firma del ciudadano: _____

Firma de interventoría: A.J.E.

Firma del contratista: Correa

Dado en Luruaco - Atlántico a los 9 días del mes de
Mayo. de 2025

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Registro fotografico



ACTA DE RESPONSABILIDAD

El día 09 del mes mayo del año 2025 a las 8:40 AM., se procedió a realizar una visita al predio ubicado Via - Arroyo negro con el fin de establecer y determinar el estado de deterioro, conservación y estabilidad de esta construcción, el estado de los muros medianeros y fachada, debido a que cuentan con una construcción vecina, que realizara el Consorcio Alianza Ambiental, identificada con el NIT 901896859-2, con número de contrato 492 de 2024 y cuyo objeto es Realizar la Limpieza y Recuperación Ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse el Guájaro en el Departamento del Atlántico.

A continuación detallamos lo que se encontró en la visita al predio: Se observa lote con construcción, en buenas condiciones después de la obra, de igual forma se visualiza vegetación y algunas estorninos.

Terminada la visita se procede a realizar un registro fotográfico a la fachada de la vivienda para identificación, debido a que no se encontró el propietario, el Consorcio Alianza Ambiental no se responsabiliza de los posibles daños ocasionados durante la ejecución de la Limpieza y Recuperación Ambiental de los caños y/o arroyos afluentes a la Laguna de Luruaco y al Embalse el Guájaro en el Departamento del Atlántico.

ACTA DE CIERRE DE VECINDAD

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

07 05 2025
DD MM AA

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No.: 001

No. de Contrato

492 DE 2024

Fecha de Contrato

7 DE MARZO DE 2025

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Encuestador: *Hanunela Teneqwa Cuervo*

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio:

Haden Cabarcas Ospino

Tenencia:

Propietario

Arrendatario ☒

Poseedor

Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección

Via Arroyo Negro

Teléfono

324 381 1782

No. de pisos,

1

Long. del frente (mts)

2 m

Matrícula Inmobiliaria No.

Cedula Catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

SI

NO

OBSERVACIONES

1. Agua

☐☒

2. Alcantarillado

☐☒

3. Energía

☒☒

4. Teléfonos

☐☒

5. Gas

☐☒

6. Televisión cable

☐☒

7. Otros

☐☐

Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional

☐

5. En Construcción

☐

2. Valor Arquitectónico

☐

6. Sin Edificar

☐

3. Valor Intermedio

☐

7. Otro

☐

4. Valor Normal

☒

Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial

☒

5. Recreacional

☐

2. Comercial

☐

6. Baldío

☐

3. Industrial

☐

7. Otro

☐

4. Institucional

☐

Cuál?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI

NO

Cuentos

El garaje se usa como

comercio

SI

NO

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: *Vivienda en material de ladrillo para pisos y**Paredes regulares*MUROS: *Se observan muros regulares*CUBIERTA: *Cubierta en laminas de Zinc en buen estado*PISOS: *Pisos en deterioro y en tierra*FACHADA: *fachada con pintura en deterioro por tiempo.*GRIETAS Y FISURAS: *Se observan grietas y fisuras en el Area de sala, ~~severa~~.*HUMEDADES: *NO se observan humedades.*HUNDIMIENTO PISO: *No se observo hundimiento.*DESPLAZAMIENTOS: *No se observo desplazamiento.*

OTRO: Cui?

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

07 05 2025

DD MM AA

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUJAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No.: 001

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

07 05 2025
DD MM AA

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No.: 002

No. de Contrato

492 DE 2024

Fecha de Contrato

7 DE MARZO DE 2025

Entidad ejecutora de la Obra:

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Encuestador

Maribel Torguero Cuenca

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio:

Edes Johana Sangua Torres

Tenencia:

Propietario X

Arrendatario

Poseedor

Otro Cual?

Nombre del Propietario

Edes Johana Sangua Torres

Dirección

Amalu Negro

Teléfono

301 523 8866

No. de pisos

1

Long. del frente (mts)

12 m

Matrícula Inmobiliaria No.

Cédula Catastral

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	La vivienda no cuenta con medidor de energía
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En Construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin Edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor Normal	☒	Cual?	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Beldio	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒
Cuentos		
El garaje se usa como comercio	SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda fabricada en bloque, pisos en concreto pulido, y paredes en gesso en obra negra.

MUROS: Se observan muros en gesso en obra negra sin repello, en buen estado.

CUBIERTA: Cubiertas en material de asbesto en buenas condiciones.

PISOS: Se observó piso en concreto pulido con grietas.

FACHADA: Se observó fachada con pintura en buenas condiciones.

GRIETAS Y FISURAS: Se observó grietas en el área de la fachada y algunas fisuras.

HUMEDADES: No se observó humedad.

HUNDIMIENTO PISO: No se observó hundimiento.

DESPLAZAMIENTOS: No se observó desplazamiento.

OTRO: Cual?

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES


07 05 2025

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUJAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ACTA No.:

002

REGISTRO FOTOGRÁFICO

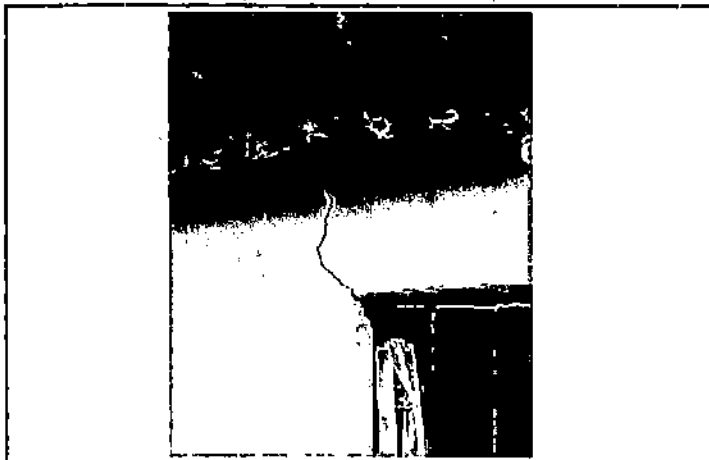

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

07 05 2025
DD MM AA

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No.: 003

No. de Contrato

492 DE 2024

Fecha de Contrato

7 DE MARZO DE 2025

Entidad ejecutora de la Obra:

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Encuestador:

Hilanele Teneqpa Chanis

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio:

Fidel José Alcaraz Bullosta

Tenencia:

Propietario X

Arrendatario

Poseedor

Otro Cual?

Nombre del Propietario

Fidel José Alcaraz Bullosta

Dirección

Vía Arroyo Negro

Teléfono

304 654 2202

No. de pisos

1

Long. del frente (mts)

8m

Matrícula inmobiliaria No.

Cédula Catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua

SI

NO OBSERVACIONES

2. Alcantarillado

SI

3. Energía

SI

4. Teléfonos

SI

5. Gas

SI

6. Televisión, cable

SI

7. Otros

SI

Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional

SI

5. En Construcción

SI

2. Valor Arquitectónico

SI

6. Sin Edificar

SI

3. Valor intermedio

SI

7. Otro

SI

4. Valor Normal

SI

Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial

SI

5. Recreacional

SI

2. Comercial

SI

6. Beldío

SI

3. Industrial

SI

7. Otro

SI

4. Institucional

SI

Cuál?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI

NO

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI

NO

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda en material de bahareque, puertas y

ventanas en material metálico en buenas condiciones.

MUROS: Se observan muros en el área de la sala

detrá de ellos.

CUBIERTA: Cubierta en laminas de zinc en buenas

condiciones.

PISOS: Pisos en concreto pulido sin afectaciones.

FACHADA: Fachada con pintura en buenas condiciones.

GRIETAS Y FISURAS: Se observan grietas en el cerco de la sala

y parte del material de barro en deterioro.

HUMEDADES: No se observan humedades.

HUNDIMIENTO PISO: No se observan hundimientos.

DESPLAZAMIENTOS: No se observa desplazamiento.

OTRO: Cuel?

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		VERSIÓN: 3.0
FECHA DE CIERRE DD MM AA 027 05 2025		FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
ACTA No.: 003				
4. ANEXOS Fotografías (archivo fotográfico o filmico)				
5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")				
FIRMAS				
Nombre: Fidel José Aleza B. C.C. O NIT: 72071464		Nombre: Alanurely Tenebreza C. C.C. O NIT: 1043028143		
Nombre: Javier Contrato C.C. O NIT:		Nombre: Arleno Pariz E. C.C. O NIT:		

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VICINIDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE


FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

04 05 2025

DD MM AA

ACTA No.: 003

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

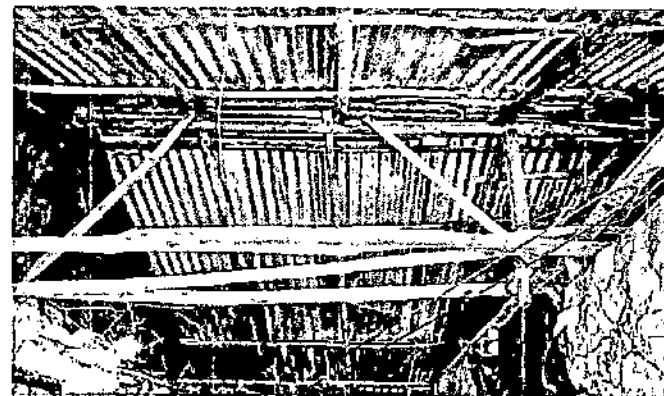REGISTRO FOTOGRAFICO

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

07 DD 05 MM 2025 AA

ACTA No.:

004

No. de Contrato

492 DE 2024

Fecha de Contrato

7 DE MARZO DE 2025

Entidad ejecutora de la Obra:

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Encuestador:

Hernando Torregrosa Charris

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio:

Edilberto Escobar

Tenencia:

Propietario

Arrendatario

Poseedor

Otro Cual?

Nombre del Propietario

Jenis de la Rosa

Dirección

Vía Arroyo Negro

Teléfono

315 930 18668

No. de pisos

8 m

Long. del frente (mts)

Matrícula inmobiliaria No.:

Cédula Catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua

SI

NO

OBSERVACIONES

2. Alcantarillado

SI

NO

3. Energía

SI

NO

4. Teléfonos

SI

NO

5. Gas

SI

NO

6. Televisión cable

SI

NO

7. Otros

SI

NO

Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional

SI

5. En Construcción

SI

2. Valor Arquitectónico

SI

6. Sin Edificar

SI

3. Valor Intermedio

SI

7. Otro

SI

4. Valor Normal

SI

Cual?

SI

USO ACTUAL

1. Residencial

SI

5. Recreacional

SI

2. Comercial

SI

6. Baldo

SI

3. Industrial

SI

7. Otro

SI

4. Institucional

SI

Cual?

SI

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI

NO

Cuentos

SI

NO

El garaje se usa como

comercio

SI

NO

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda fabricada en material de bahueque

Con pisos en concreto pulido.

MUROS: Muros en buenas conclusiones.

CUBIERTA: Cubierta en laminas de zinc en buenas

Conclusiones

PISOS: pisos en Concreto pulido en buenas Conclusiones.

FACHADA: Fachada con algunas fisuras producto del material de fabricación.

GRIETAS Y FISURAS: Se observan algunas fisuras en el area de la fachada.

HUMEDADES: No se observa humedad.

HUNDIMIENTO PISO: No se observa hundimiento.

DESPLAZAMIENTOS: No se observa desplazamiento.

OTRO: Cual?

CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL			ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			VERSIÓN: 3.0 30/01/2025	
FECHA DE CIERRE			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES				
07	05	2025	PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAMARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.				
DD	MM	AA					
ACTA No.: 007							
4. ANEXOS Fotografías (archivo fotográfico o filmico)							
5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR")							
FIRMAS							
Nombre: <u>Edilberto Escobar.</u> C.C. ONIT: <u>1045229301.</u> <u>(Comae)</u> Nombre: <u>Javier Comae</u> C.C. ONIT: _____		Nombre: <u>Manuel Toranzo Ch.</u> C.C. ONIT: <u>1043028148</u> <u>(B.I.E.)</u> Nombre: <u>Manuel Toranzo Ch.</u> C.C. ONIT: _____		Vo.Bo. Residente social de la Interventoria Nombre: _____ C.C. ONIT: _____		_____ _____ _____	

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

09

05

2025

DD

MM

AA

ACTA No.:


004

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CANOS Y O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAIJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAA CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		VERSIÓN: 3.0																												
FECHA DE CIERRE		FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES																														
07 DD	05 MM	2025 AA																														
ACTA No. 005		PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.																														
No. de Contrato 492 DE 2024		Fecha de Contrato 7 DE MARZO DE 2025																														
Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL		Encuestador: <u>Hanandely Toneyra Ch.</u>																														
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO																														
		Nombre del Responsable del predio: <u>Kathy Jolis Perez.</u>																														
		Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐																														
		Nombre del Propietario: <u>Luz Hannu Perez.</u>																														
		Dirección: <u>Via Arroyo Negro.</u>																														
		Teléfono: <u>324 455 1696</u> No. de pisos: <u>1</u>																														
		Long. del frente (mts): <u>9 m.</u>																														
		Matrícula inmobiliaria No. _____																														
		Cedula Catestral: _____																														
		SERVICIOS PÚBLICOS																														
		<table border="0" style="width:100%;"><tr><td>1. Agua</td><td>☐ SI</td><td>☒ NO</td><td>OBSERVACIONES</td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>4. Teléfonos</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>6. Televisión cable</td><td>☐</td><td>☒</td><td></td></tr><tr><td>7. Otros</td><td>☐</td><td>☐</td><td>Cual?</td></tr></table>			1. Agua	☐ SI	☒ NO	OBSERVACIONES	2. Alcantarillado	☐	☒		3. Energía	☒	☐		4. Teléfonos	☐	☒		5. Gas	☐	☒		6. Televisión cable	☐	☒		7. Otros	☐	☐	Cual?
1. Agua	☐ SI	☒ NO	OBSERVACIONES																													
2. Alcantarillado	☐	☒																														
3. Energía	☒	☐																														
4. Teléfonos	☐	☒																														
5. Gas	☐	☒																														
6. Televisión cable	☐	☒																														
7. Otros	☐	☐	Cual?																													
TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESOS VEHICULARES																												
<table border="0" style="width:100%;"><tr><td>1. Monumento Nacional ☐</td><td>5. En Construcción ☐</td></tr><tr><td>2. Valor Arquitectónico ☐</td><td>6. Sin Edificar ☐</td></tr><tr><td>3. Valor Intermedio ☐</td><td>7. Otro ☐</td></tr><tr><td>4. Valor Normal ☒</td><td>Cual? ☐</td></tr></table>		1. Monumento Nacional ☐	5. En Construcción ☐	2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin Edificar ☐	3. Valor Intermedio ☐	7. Otro ☐	4. Valor Normal ☒	Cual? ☐	<table border="0" style="width:100%;"><tr><td>1. Residencial ☒</td><td>5. Recreacional ☐</td></tr><tr><td>2. Comercial ☐</td><td>6. Baldo ☐</td></tr><tr><td>3. Industrial ☐</td><td>7. Otro ☐</td></tr><tr><td>4. Institucional ☐</td><td>Cual? ☐</td></tr></table>		1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐	2. Comercial ☐	6. Baldo ☐	3. Industrial ☐	7. Otro ☐	4. Institucional ☐	Cual? ☐	Garaje SI ☐ NO ☒ Cuanos _____ El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒												
1. Monumento Nacional ☐	5. En Construcción ☐																															
2. Valor Arquitectónico ☐	6. Sin Edificar ☐																															
3. Valor Intermedio ☐	7. Otro ☐																															
4. Valor Normal ☒	Cual? ☐																															
1. Residencial ☒	5. Recreacional ☐																															
2. Comercial ☐	6. Baldo ☐																															
3. Industrial ☐	7. Otro ☐																															
4. Institucional ☐	Cual? ☐																															
3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)																																
ESTRUCTURA: <u>Vivienda fabricada en bloques y Concreto, Pisos en Concreto y Cera de la faja en obra negra.</u>		GRIETAS Y FISURAS: <u>No se observo ni grietas ni fisuras.</u>																														
MUROS: <u>Se observo muro en el Cera de faja en obra negra en buenas condiciones.</u>		HUMEDADES: <u>No se observo humedad.</u>																														
CUBIERTA: <u>Cubiertas en laminas de eternit (asbesto) en buenas condiciones.</u>		HUNDIMIENTO PISO: <u>No se observo hundimientos.</u>																														
PISOS: <u>Piso en Concreto pulido, deteriorado por uso.</u>		DESPLAZAMIENTOS: <u>No se observo desplazamientos.</u>																														
FACHADA: <u>Fachada con pintura en buenas condiciones.</u>		OTRO: Cual? _____																														

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE


FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

07 05 2025
DD MM AA

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No. 005

REGISTRO FOTOGRAFICO

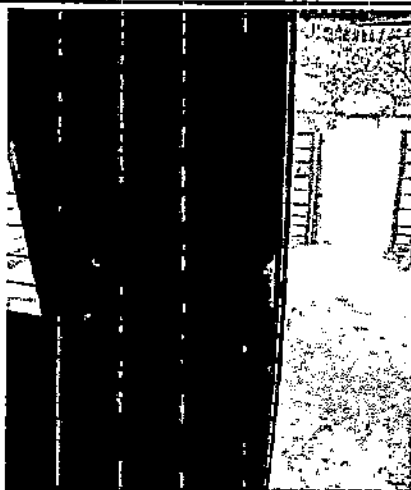

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

07 05 2025
DD MM AA

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ACTA No.: 006

No. de Contrato

492 DE 2024

Fecha de Contrato

7 DE MARZO DE 2025

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

Encuestador: Mariacela Fongarzu Quirós

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio:

Tenencia:

Propietario ☒

Arrendatario

Poseedor

Otro Cuál?

Nombre del Propietario

Dirección

Teléfono

Long. del frente (mts)

Matrícula inmobiliaria No.

Cédula Catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Teléfonos

5. Gas

6. Televisión cable

7. Otros

SI

NO OBSERVACIONES

☐☐☒☐☐☐☐☒☒☒☒☒☒☐

Cual?

Cual?

Cual?

Cual?

Cual?

Cual?

Cual?

USO ACTUAL

1. Residencial

2. Comercial

3. Industrial

4. Institucional

5. Recreacional

6. Balcón

7. Otro

Cual?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda fabricada en bloc y concreto

En Obra negra.

MUROS: Se observan grietas en muros de bloques y parte exterior

CUBIERTA: Detachos en Caminas de Sinc en buenas

condiciones

PISOS: Pisos en concreto pulido en buenas condiciones

FACHADA: Fachada de viviendas en obra negra.

GRIETAS Y FISURAS: Se observan Grietas en paredes internas y externas

HUMEDADES: No se observó humedad

HUNDIMIENTO PISO: No se observó hundimientos

DESPLAZAMIENTOS: No se observó desplazamientos

OTRO: Cual?

CAA

CONSORCIO ALIANZA AMBIENTAL

ACTA DE VICINDAD DE CIERRE

VERSIÓN: 3.0

30/01/2025

FECHA DE CIERRE

09 05 2025

DD MM AA

ACTA No.:

006

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

PROYECTO: REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUYENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

