



Comentario: Instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y juego de incrustaciones



Comentario: Adecuación del mesón para atención a personal en condición de discapacidad



Comentario: Cambio de caja hidráulica y pivote de puerta en vidrio principal



Comentario: Cambio de caja hidráulica y pivote de puerta en vidrio principal





Comentario: Cambio de caja hidráulica y pivote de puerta en vidrio principal




Comentario: Instalación de puerta corrediza para baño PMR.



Comentario: Suministro e instalación de espejos en baños

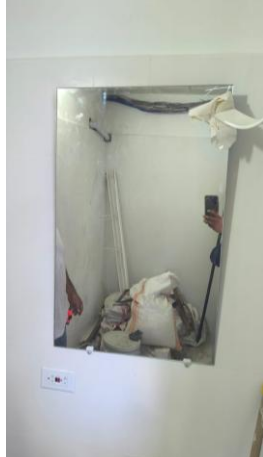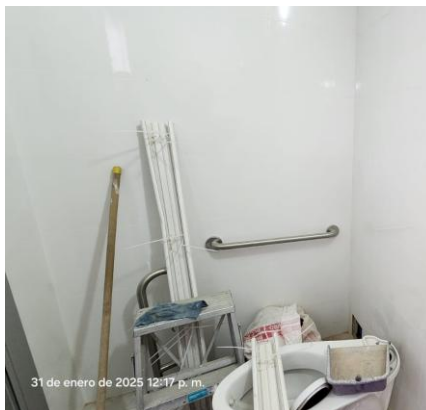


Comentario: Suministro e instalación de barra fija y abatible en baño PMR

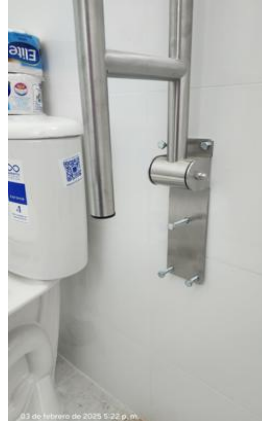



Comentario: Instalación de aparatos sanitarios, orinal y lavamanos

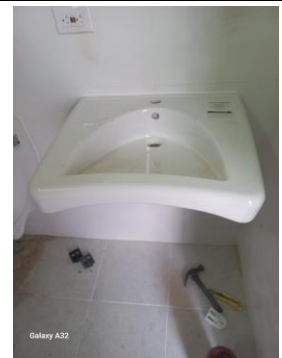

Comentario: Instalación de estructura para soporte de lavamanos de discapacitados



Comentario: Instalación de mueble inferior en cocina



Comentario: Instalación de mueble superior en cocina



Comentario: Aplicación de graniplast



Comentario: Instalación de espejo en baño PMR



Comentario: Instalación de lavaplatos en cocina



Comentario: Se cubren equipos



Comentario: Resane en grietas de muros en zona de atención al publico



Comentario: Resane en grietas de muros en zona de atención al publico



01 de febrero de 2025 8:20 p. m.

Comentario: Instalación de cintas antideslizantes en escaleras



ro de 2025 8:22 p. m.

Comentario: Reinstalación de mesón, instalación de vidrio y de perfil para adecuación de zona de atención a personal condiscapacidad



de 2025 8:39 p. m.

Comentario: Limpieza de fachada



01 de febrero de 2025 7:53 p. m.


Comentario: Aseo y limpieza en zona de archivo y reubicación de archivadores



Comentario: Baño PMR



Comentario: Instalación de luminaria tipo tortuga en patio de condesadora

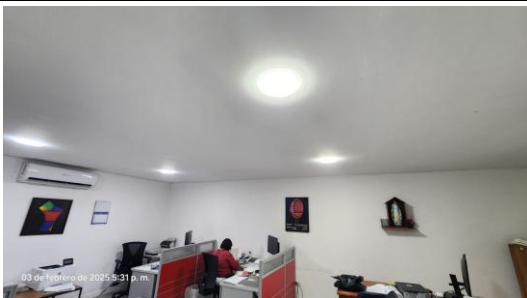


03 de febrero de 2025 9:31 p. m.

Comentario: Cambio de luminarias en oficina del segundo piso



10:53 p. m.

Comentario: Traslado de cajas y archivos de piso

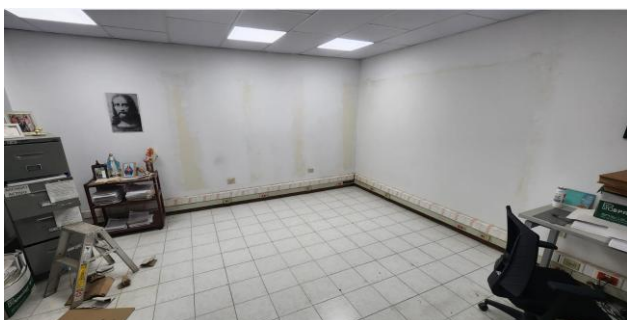

Comentario: Aseo general



Comentario: Graniplast sobre muros



Comentario: Sondeo y limpieza a red sanitaria



Comentario: Instalación de toma corriente GFCI

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
<p>Para esta semana en la ORIP de Roldanillo se incrementa el atraso llegando al (-)10,09% lo que genera alertas debido a que a la fecha se está a 5 días para la terminación del contrato y la mayoría de las actividades pendientes por ejecutar dependen de los tiempos de fabricación y adquisición. Por otra parte, la interventoría insta al contratista de obra en la radicación de documentos para cobro parcial por avance de esta sede.</p>	<p>Firma</p> <p>Nombre : FABIAN MIGUEL RADA SEGURA</p> <p>Matrícula No.: MP 08700-55928 del Atlantico.</p>
