



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: APOYO

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: JC - ABSOP - F - 37

FECHA: 30/07/2022.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS FECHA: 15 de JULIO de 2025

PERIODO: DEL 12 de JUNIO de 2025 AL 0 de JULIO de 2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, AL IGUAL QUE, LÁMPARAS SOLARES TIPO FAROL DESTINADAS AL ALUMBRADO DEL PARQUE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO "TODO PUEDE SER MEJOR 2024 - 2027."

N° Contrato: C-MS-AC-023-2025 Fecha de suscripción contrato: junio 9, 2025 Fecha de Terminación contrato: julio 1, 2025

Nombre del Supervisor: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ Identificación: 1.002.313.731

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista: SURET SAS RL: OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO Identificación: NIT. 901.144.671-9 / C.C 1.013.644.475

Teléfono: 313 2514653 Dirección: Calle 16 # 13-73 piso 3

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRATO

dd mm aaaa

FECHA DE INICIACIÓN: 12 6 2025

PLAZO INICIAL

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA INICIAL



1 7 2025

PLAZO ADICIONAL No. 1

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

AVANCE DE EJECUCIÓN

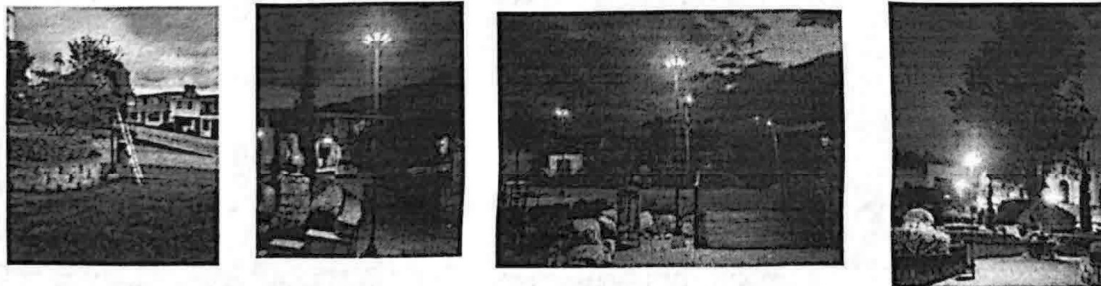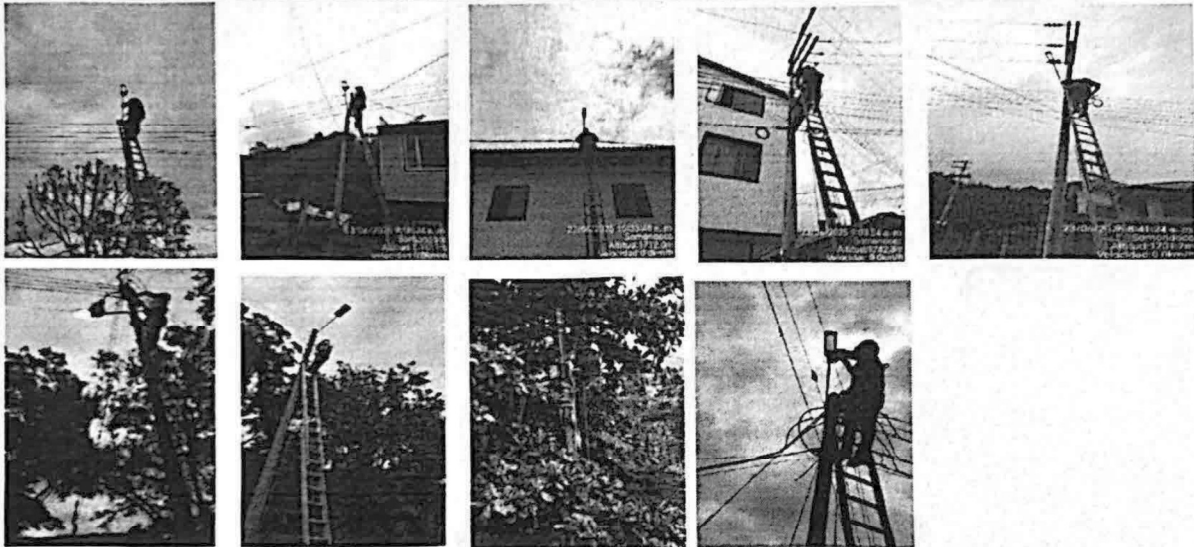

% DE AVANCE CTO


100.0%

% TIEMPO TRANSCURRIDO

100.0%

% PAGOS AUTORIZADOS


0.0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato	\$ 8,778,197.68
Valor Adición	\$ 0.00
Valor Total del contrato	\$ 8,778,197.68
Pago anticipado	\$ 0.00
Valor Pagado	\$ 0.00
Valor a pagar en el periodo	\$ 8,778,197.68
Valor Ejecutado	\$ 8,778,197.68
Saldo	\$ 0.00
<b>TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR</b>	<b>\$ 8,778,197.68</b>

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL												
DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS										Valor Total Pagado	
	JUNIO											
Salud	\$ 198,000.00											198,000
Pensión	\$ 250,800.00											250,800
Aportes ARL	\$ 110,400.00											110,400
Caja compensar	\$ 33,000.00											33,000
ICBF												0
parafiscales												0
Valor pagado por periodo	\$ 592,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	592,200

**OBSERVACIONES**  
El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:   
 VoBo Supervisor  
 NOMBRE: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ

Documentos y folios Anexos FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN 03</b> <b>04/03/2024</b>
	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO</b> <b>NIT: 800029826-5</b>	<b>Código: SP</b>
	<b>UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>

CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA  
No. C-MS-MC-023-2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

SURET SAS, representada legalmente OSCAR EDUARDO GONZALEZ OSORIO, identificado con C.C N° 1.013.644.475 cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato No. C-MS-MC-023-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, AL IGUAL QUE, LÁMPARAS SOLARES TIPO FAROL DESTINADAS AL ALUMBRADO DEL PARQUE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 'TODO PUEDE SER MEJOR 2024 – 2027'.**"

Se autoriza el pago por valor **OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE** conforme a lo pactado en el mencionado contrato mediante Un único pago previa la presentación de informe y recibo de satisfacción.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000206	2.3.2.02.02.008 1.2.4.3.03 21 2102 1900 2102011 16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 8.778.197,68

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día quince (15) de julio de 2025; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en Unidad de Servicios Públicos, a los quince (15) días del mes de julio de Dos mil veinticinco (2025).

  
**ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ**  
Supervisora

**Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14**  
Código Postal: 153030  
Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232  
[alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@somondoco-boyaca.gov.co)  
Página 1 de 1

