

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS

9.1. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS Y PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. DE ORDEN	CONDICIONES CONTRACTUALES						PERIODO 1 JUNIO		MES 2 JULIO		ACUMULADO TOTAL	
	DESCRIPCION ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
PRELIMINARES												
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	72.00	\$ 13,296.99	\$ 957,383.46	72.00	\$ 957,383.46			72.00	\$ 957,383.46	
EXCAVACIONES												
2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	205.76	\$ 119,979.70	\$ 24,686,782.96	60.00	\$ 7,198,781.95	44.89	\$ 5,385,593.55	104.89	\$ 12,584,375.50	
3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	205.76	\$ 205,757.89	\$ 42,336,332.91	70.00	\$ 14,403,052.63	57.45	\$ 11,820,832.20	127.45	\$ 26,223,884.84	
4	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	560.00	\$ 20,806.02	\$ 11,651,368.42	560.00	\$ 11,651,368.42	2633.66	\$ 54,795,932.11	3193.66	\$ 66,447,300.53	
5	EXCAVACION CAISSON	ML	12.70	\$ 2,472,215.04	\$ 31,397,130.98							
RELLENO,ESTRUCTURA, VIA												

Jorge Edgar Rubio Calderón
Ingeniero Civil

6	RELLENO EN SUELO CEMENTO CLASE SC-R TIPO B	M3	290.00	\$	302,927.07	\$	87,848,849.62					
7	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12.00	\$	409,782.71	\$	4,917,392.48					
8	CONCRETO CLASE C 4,000 PSI FLUIDO, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO A 7 DIAS (BASES)	M3	73.00	\$	1,442,215.04	\$	105,281,697.74					
9	CONCRETO CLASE C 4,000 PSI FLUIDO, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO A 7 DIAS (MUROS)	M3	49.00	\$	1,442,215.04	\$	70,668,536.84					
10	CONCRETO CLASE C 4,000 PSI FLUIDO, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO A 7 DIAS (VIGAS EN PUENTE)	M3	85.00	\$	1,442,215.04	\$	122,588,278.20					
11	CONCRETO CLASE C 4,000 PSI FLUIDO, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO A 7 DIAS (PLACAS)	M3	110.00	\$	1,442,215.04	\$	158,643,654.14					
12	CONCRETO CLASE C 4,000 PSI FLUIDO, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO A 7 DIAS (CASSON)	M3	26.00	\$	1,442,215.04	\$	37,497,590.98					
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	560.00	\$	25,100.00	\$	14,056,000.00					
14	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	26920.4 2	\$	7,745.86	\$	208,521,929.95					
15	BARANDA METÁLICA	MIL	36.00	\$	592,169.92	\$	21,318,117.29					

Dirección: Cra 4 N° 8-23 Edificio torreón del parque B/ La pola Ibagué-Tolima
Correo: oficina.jorgerubio@gmail.com - Cel: 320 288 4361

[illegible]

Rubio Calderón
Ingeniero Civil

26	Suministro e instalacion de postes metalicos 8,5 metros, con base, 1 lampara alumbrado publico 30W con fotocelda, 1 lampara alumbrado publico de 60 w con fotocelda.	UNID	4.00	\$	4,850,000.00	\$	19,400,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	--	------	------	----	--------------	----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección: Cra 4 N° 8-23 Edificio torreón del parque B/ La pola Ibagué-Tolima
Correo: oficina.jorgerubio@gmail.com – Cel: 320 288 4361

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL ACTA PARCIAL 1
1.1	Informe Preliminar y Diagnostico Situacional	UND	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
1.2	Estudio de suelos y Geotecnia	UND	1	\$ 35,000,000.00	
1.3	Estudio topográfico	UND	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00
1.4	Diseño Estructural	UND	1	\$ 30,000,000.00	
1.5	Diseños arquitectónicos	UND	1	\$ 25,000,000.00	
1.6	Presupuesto de Obra	UND	1	\$ 5,000,000.00	
1.6.1	Memoria de Cantidades de Obras	UND	1	\$ 2,000,000.00	
1.6.2	Análisis de Precios Unitarios - APU	UND	1	\$ 2,000,000.00	
1.6.3	Cálculo del AIU y de la Interventoría	UND	1	\$ 2,000,000.00	
1.6.4	Especificaciones Técnicas	UND	1	\$ 2,000,000.00	
1.6.5	Cronograma de la obra	UND	1	\$ 2,000,000.00	
1.7	Análisis Hidráulico de la Estructura	UND	1	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
1.8	Permiso de ocupación de cauce	UND	1	\$ 6,000,000.00	
V/ COSTO DIRECTO					\$ 59,000,000.00
IVA				19%	\$ 11,210,000.00
V/ TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 70,210,000.00

NP5 COMPLEMENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL ACTA PARCIAL 1
2	ESTUDIOS HIDROLOGICOS COMPLEMENTARIOS				
2.1	Estudio hidrológico de la fuente hídrica (necesario para la modelación de la estructura y permiso de ocupación del cauce)	UND	1	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
2.2	Estudio de socavación	UND	1	\$ 14,800,000.00	\$ 14,800,000.00
2.3	Análisis de estabilidad de taludes	UND	1	\$ 13,000,000.00	
3	ESTUDIOS ADICIONALES				
3.1	Diseño estructural de estructuras hidráulicas y de contención.	UND	1	\$ 25,000,000.00	
3.2	Plan de manejo Ambiental	UND	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
3.3	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	UND	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
V/ COSTO DIRECTO					\$ 58,800,000.00
IVA				19%	\$ 11,172,000.00
V/ TOTAL COMPLEMENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 69,972,000.00

10. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se adjunta a la presente el listado del equipo utilizado en el periodo del presente informe.

No.	MAQUINARIA Y EQUIPOS
1	MINIRETROEXCAVADORA CATERPILLAR 305E2
3	VOLQUETA SENCILLA DE 7M3
2	VOLQUETA DOBLE TROQUE DE 15M3
1	HERRAMIENTA MENOR

11. CONCLUSIONES

- La intervención en la quebrada San Jorge se consolida como una respuesta oportuna frente a los problemas de erosión, evidenciando un manejo adecuado de los recursos públicos destinados para proteger la infraestructura vial y las viviendas cercanas.
- Las actividades ejecutadas hasta la fecha han sido desarrolladas bajo los lineamientos técnicos, administrativos y contractuales, contando con la supervisión de la Ingeniera Kelly Johanna Díaz Barrios, adscrita a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Girardot, y con la interventoría de la empresa Hermanos Villanueva Ingeniería S.A.S., asegurando el control y seguimiento requerido, a la fecha del presente informe se lleva un avance físico de obra del 33,00%.
- Este proyecto se destaca por su impacto positivo en la movilidad, permitiendo habilitar un paso seguro para peatones y vehículos, al tiempo que se recupera la seguridad hidráulica de la rivera y se mitigan riesgos ambientales.
- Con la ejecución de las actividades previstas, se promueve la confianza de la comunidad en la administración local, demostrando resultados tangibles que mejoran la calidad de vida y previenen emergencias futuras.

ANEXO 1.

DESCRIPCION ACTIVIDADES DIARIAS



INFORME SEMANAL DE OBRA

Semana Número: 1 Del: 1 de julio de 2025 Al: 5 de julio de 2025
Nombre del Supervisor: ING. YEISON TRUJILLO GARCIA Interventoria: HERMANOS VILLANUEVA INGENIERIA S.A.S
R/L ING EDUARDO JOSE VILLANUEVA
HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT -CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
Contrato No. 742-2025
Valor del contrato: \$ 1.669.448.329,54
Plazo de ejecución: 6 meses
Acta de inicio: 11 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MARTES	1/07/25	Se verifican movimientos de tierra acceso a carretable con topografía, se realiza aseo, adecuación cerramiento lona y señalización puntos críticos de obr, demolición andenes existentes, ciclo ruta, bordillos, sardineles y sacado de materiales con volqueta, muro sosteniendo ciclo ruta existente, salio de la excavacion
MIERCOLES	2/07/25	Se continua con demolicion de muros soporte ciclo ruta existente, excavaciones de la misma, visita del ing jacinto acuagyr, revision red tubería PVC DE 12" agua potable, sacada de material y transpaleo con maquina del material y carga y retiro material a la escombrera autorizada medicion de muros soporte ciclo ruta existente, con topografia se saco la cota lamina de agua rio bogota con poligonal desde la obra hasta la desembocadura de la quebrada visita por parte inge yeison trujillo, supervisor delegado alcaldia municipal.
JUEVES	3/07/25	se continua con demolicion zona tubería red agua potable excavacion con maquina cargue y retro de material, durante todo el día se realizo las labores, se realizo visita por parte del ingeniero hidraulico para inspeccion del proceso de diseño
VIERNES	4/07/25	se realiza excavacion zona tubería PVC 14" agua potable para instalacion de valvula a la tubería de 14" pvc por tanto se demolio parte anden y ciclo ruta existente contra muro de unicentro por precaucion de derrumbe por la profundidad y se desestabiliza, del nivel de pozo existente en separador con tubería novafort que viene de unicentro, se retiro material con volqueta, material excavado, se demolio el muertoque sostiene la tubería pvc de 14" debido a que esta desplazando la tubería y se desempata.
SABADO	5/07/25	se demarco con cinta peligro la zona exvaciones que todas las noches la gente la dañan se realizo transpaleo de material ceca muro unicentro para cargarlo a volqueta y llevarlo para escombrera, se realizo replanteo aproximado para bos culvert nuevo



INFORME SEMANAL DE OBRA

Semana Número: 2 Del: 7 de julio de 2025 Al: 12 de julio de 2025
Nombre del Supervisor: ING. YEISON TRUJILLO GARCIA Interventoria: HERMANOS VILLANUEVA INGENIERIA S.A.S
R/L ING EDUARDO JOSE VILLANUEVA
HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
Contrato No. 742-2025
Valor del contrato: \$ 1.669.448.329,54
Plazo de ejecución: 6 meses
Acta de inicio: 11 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES	7/07/25	se realizo excavacion y demolicion de asfalto y concreto de calzada derecha sentido homcenter hacian unicentro, se realizo cargue y retiro material de la excavacion y la demolicion, se realizo visita por parte del ingeniero yeison supervisor delegado alcaldia municipal, se encuentra tubería metálica de 14" sin servicio en zona de excavacion donde se va a construir el nuevo box culvert, y se autoriza el corte del mismo y retiro por parte del supervisor delegado de la alcaldia secretaria infraestructura, se estan realizando niveles tuberías existentes con topografía.
MARTES	8/07/25	se realiza secciones longitudinales con topografía via glorieta unicentro y via glorieta kennedy de la via del proyecto se esta demoliendo asfalto para el cajon del box existente y poder demolerlo ya que se debe realizar las terrazas para llegar al nivel de la cotade profundidad de la quebrada, se instalo proteccion del tubo de presion pvc 14" para evitar que se safe y produzcan daños a la excavacio, se realiza excavacion para terrazas para la estabilizacion del terreno, se realiza cargue y transpaleo del material excavado y demolicion, se realiza el corte de la tubería metálica existente encontrado y autorizado desmontarlo a cortarlo, y se realiza la respectiva señalización de las zonas de excavacion.
MIÉRCOLES	9/07/25	se continua con excavacion con excavacion zona box culvert existentes para posteriormente demoler el box, se hace transpaleo con maquina para cargarlos a la volqueta para transporte y llevarlo a escombrera, visita tecnica por parte del supervisor delegado secretaria infraestructura girardot para inspeccionar avances de la obra el ing yeison trujillo se realiza soporte para tubería pvc 14" porque esta en el aire , esto realizo la empresa de acuagyr, se encuentra tubería desagüe 18" del centro comercial unicentro que descarga en la quebrada y esta en zona de influencia del proyecto y esta en funcionamiento se debe realizar una provisional y desvio mientras se contruye el nuevo boxculvert, se adecua terreno se realiza señalización de la zona excavacion para prevencion.
JUEVES	10/07/25	se roban tapa de pozo de inspeccion de aguas lluvias que desagua en la quebrada, se visualiza avistamiento de caiman tipo aguja aguas abajo quebrada, saliendo del box existente, se continua con excavacion zona influencia del box culvert existente para su demolicion como tambien transpaleo cargue retiro material excavado y demolido, demolicion asfalto placa concreto via se realiza señalización y cerramiento zonas de excavacion para prevencion.
VIERNES	11/07/25	se encuentra caja de telefono etb y tambien se avista tubería para el cable que pasa por el proyecto del box culvert existente, se avisa a etb y no respondieron la llamada que se realizo al encargado juan pablo, se toman puntos con topografía de caja telefonica, se realiza demolicion de asfalto espesor de 0,17mts promedio y placa de concreto espesor 0,22 mts en la calzada izquierda via homecenter unicentro, cargue transpaleoy retiro de material de demolicion y excavacion, la gente este cruzando por la zona de trabajodel box culvert son profundas y que esta prohibido el paso por la zona del proyecto.
SÁBADO	12/07/25	se continua con excavacion zona de influencia del box culvert existente para llegar a la tapa superior del mismo, se realizo retiro y transpaleo de material con la maquina para posteriormente cargarlo a la volqueta retirarlo para la escombrera, se realizo visita por parte del ingeniero hidraulico revisando la propuesta de la implantacion del nuevo box culvert revisando la entrada y la salida del mismo.

		INFORME SEMANAL DE OBRA	
Semana Número: <u>3</u>		Del: <u>14 de julio de 2025</u>	
Nombre del Supervisor: <u>ING. YEISON TRUJILLO GARCIA</u>		Al: <u>19 de julio de 2025</u>	
Interventoría: <u>HERMANOS VILLANUEVA INGENIERIA S.A.S</u>		HERNANDEZ	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.			
CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE OBRA:			
Contratista: <u>ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON</u>		Contrato No. <u>742-2025</u>	
Valor del contrato: <u>\$ 1.669.448.329,54</u>		Plazo de ejecución: <u>6 meses</u>	
Acta de inicio: <u>11 DE JUNIO DE 2025</u>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA			
LUNES	14/07/25	se continua con la excavacion sobre boc culvert existente para su demolicion,cargue retiro de material excavado para escombrera, se realiza transpaleocon miniexcavadora debido a tubería sanitaria, hidraulica, telefonica, gas, llegaron los señores de acuagyr para realizar bypass de la tubería agua potable de 14" con el tubo de 20" para dejarnos trabajar sin obstaculos en la excavacion en la excavaciones para el nuevo box culvert, realizo visita del ing yeison trujillo supervisor apoyo a la supervision de SIG con el motivo de revisar avance de obra se implementa nuevamente la propuesta del ing hidraulico del nuevo box culvert se le informa al ing yeison que la empresa de etb no responden para el tema de la caja y tubería pvc corrugada por donde pasa el cable fibraoptica y realizar la respectiva por parte alcaldia vía oficio.	
MARTES	15/07/25	se continua con excavacion de box culvert existente para su posterior demolicion con su respectivo cargue y retiro de material se realiza transpaleo con la maquina por temas de tubería presión pvc agua potable y sanitario aguas lluvias los señores de acuagyr siguen con los trabajos para realizar bypass a la tubería pvc 14"y realizarla con tubería de 20" este trabajo es por parte de la empresa de acuagyr, realizo visita técnica el ing carlos nieto especialista de suelos y realiza las siguientes recomendaciones realizar manejo de aguas de las vías de acceso al proyecto para evitar socavaciones y derrumbes que para el talud del nuevo box recomienda un terraseo de 4mts a cada costado del proyecto del box por la profundidad que el terreno a la cota del nuevo box que son aproximadamente 7,48mts de profundidad donde hay que hacer terraseo para evitar socavacion y posibles desestabilizacion de taludes y derrumbes de material de la quebrada no se puede utilizar como relleno de terrazas son preliminares mientras se tiene el estudio correspondiente.	
MIÉRCOLES	16/07/25	se continua con demolicion aletas y cabezote de box culvert existente durante todo el dia con la demolicion y organizando para posteriormente sacarlo y retirarlo, realizo visita el ing yeison trujillo apoyo a la supervision secretaria de infraestructura girardot para ver avance de obra y coloco comite de obra para el dia de mañana 17 de julio de 2025 con especialista de estructura, suelo, hidraulico, director de obra, interventoria, secretaria de infraestructura quien es la supervision del contrato.	
JUEVES	17/07/25	se continua con demolicion de aletas box existente costado derecho via homecenter a unicentro, verificacion de señalizacion zonas de excavacion, se realizo visita por parte de acuagyr para verificar el tema de la tubería pvc de 28" aguas lluvias para realizar provisional y desviarla de la zona de trabajo porque esta en funcionamiento que es la que viene de unicentro, se realizo comite de obra en el sitio de trabajo por parte de alcaldia municipal con secretaria de infraestructura, supervisor de apoyo secretaria infraestructura por parte contratista director de obra , residente de obra, especialista geotecnia, especialista hidraulico, por parte de interventoria director de interventoria, y tambien estuvieron la gerente de unicentro, director de operaciones especialista estructuras unicentro, el ing ramon sepulveda, para verificar el muro pantalla que en su epoca el centro comercial lo construyo y se esta viendo afectado por el nuevo box culvert que se va a construir porque una parte de soporte del muro pantalla especialmente de los leison queda en el aire por ello se realizo el comite con todas las partes para determinar el procedimiento a realizar donde se determino el proceso para demolicion del muro donde se realizara 2 cortes internos y externos del muro para demolerlos hasta encontrar el acero y dejarlo libre de concreto y posteriormente cortar los aceros y posteriormente demoler la parte afectada por la obra, se reviso el planteo o esquema propuesto por el ing hidraulico el ing camilo carvajal montado en programa y se acepto por las partes y se propuso que como la excavacion es de 8mts por recomendacion del ing carlos nieto realizar terrazas de 1mts de ancho como minimo para estabilizar el talud y 1 mts para zona de trabajo para formatear el box culvert a construir y queda aprobado por las partes que intervinieron en el comite supervision contrato interventoria.	
VIERNES	18/07/25	se continua con la excavacion zona derecha box existente de la via homecenter a unicentro recogio excombro de la demolicion muro demolicion muros costados aguas abajo quebrada y organizando la zona para estudio de suelos, acuagyr instalo las tees 20" y el tapon por la tubería pvc 20" para realizar baypass con la tubería pvc presión de 14" 12" se replanteo con topografia desde donde inicia las terrazas para continuar con las excavaciones.	
SÁBADO	19/07/25	se realizo perfil transversal del terreno y dibujo por parte de topografia entrada y salida de box culvert existente, se realizo conexion de valvula de 12" y que podría tee instalada de 20" por parte de la empresa acuagyr y el corte de agua para desmontar pvc de 12" que lleva agua a kennedy el día martes 22 de julio de 2025	



INFORME SEMANAL DE OBRA

Semana Número: 4 Del: 21 de julio de 2025 Al: 26 de julio de 2025
Nombre del Supervisor: ING. YEISON TRUJILLO GARCIA Interventoria: HERMANOS VILLANUEVA INGENIERIA S.A.S
R/L ING EDUARDO JOSE VILLANUEVA
HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT -CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
Contrato No. 742-2025
Valor del contrato: \$ 1.669.448.329,54
Plazo de ejecución: 6 meses
Acta de inicio: 11 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES	21/07/25	Se continua con demolicion placa en asfalto y placa de concreto porque tiene doble placa en zona box culvert existente para las terrazas que se autorizaron en comite de obra y se continua con excavacion para terrazas, se inicia con perforaciones para estudio suelos del nuevo box culvert con equipo perforaciones profundas
MARTES	22/07/25	Se continua con demolicion para terrazas de excavacion del nuevo box culvert a construir se retiro el material excavado para la escombrera o sitio autorizado se continua con los estudios de suelos para la cimentacion del nuevo box culvert con sodeos con equipo de perforaciones aguas arriba cerca al box existentes, siendo las 4:40 pm se presento un incidente ajeno a la obra donde una retro excavadora externa a la obra al parecer se quedo sin frenos e ingreso a la obra vayo a la excavacion que estamos realizando donde afecto o danno tuberia pvc de 18" de aguas lluvias que vienen de unicentro y un maletin de prevencion , no se presentaron afectaciones a ninguna personade la obra ni ajena a la obra.
MIÉRCOLES	23/07/25	se continua con demolicion placa de asfalto se encuentra de bajo placa de concreto de espesor de 0.20mts se continua con excavacion y retiro de material de la excavacion y de la demolicion para sitio autorizado de disposicion dinal y de la demolicion para sitio autorizado de disposicion final del material se continúa con sondeos de estudio de suelos para la cimentacion del nuevo boc culvert en zona derecha via homecenter a unicentro aguas arriba , se realizo comite de obra con secretaria de infraestructura, prodesarrollo, inspectora de policia, interventoria , contratista para determinar el espacio que se requiere para las terrazas que se deben construir por la profundidad del nivel cimentacion del box culvert
JUEVES	24/07/25	se desmonta tuberia pvc de 12" agua potable zona box culvert, continua con excavacion para terrazas para el box nuevo que se implemento para llegar a la placa superior box existente, señalizacion zonas de excavacion y adecuacion cerramiento del nuevo box culvert se realizo retiro de material excavado
VIERNES	25/07/25	se continua con excavacion para terrazas para talud de llegar al nivel de cimentacion del nuevo box culvert se realizaron retiro de material de excavacion se corto tuberia en politileno para desmontarlo de 20" se continua con perforaciones para estudio suelos para la cimentacion del nuevo box culvert en costado aguas abajo no se ha determinado el tema de la caja de telefonía etb porque esta obstruyendo el talud para contruir la terraza.
SÁBADO	26/07/25	se continua con excavacion de terrazas para llegar al nivel de cimentacion del nuevo box culvert y del existente, se continua con perforaciones para estudio de suelos para la cimentacion del nuevo box culvert con equipo de perforacion profunda de la quebrada san jorge y poder desaguar zona donde se realizaran los muros y aletas del nuevo box para la zona tiene omo 90cm aproximadamente y todavia esta el caiman tipo aguja.



INFORME SEMANAL DE OBRA

Semana Número: 5 Del: 28 de julio de 2025 Al: 31 de julio de 2025
Nombre del Supervisor: ING. YEISON TRUJILLO GARCIA Interventoria: HERMANOS VILLANUEVA INGENIERIA S.A.S
R/L ING EDUARDO JOSE VILLANUEVA
HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
Contrato No. 742-2025
Valor del contrato: \$ 1.669.448.329,54
Plazo de ejecución: 6 meses
Acta de inicio: 11 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LUNES	28/07/25	Se continua con excavacion para terraza para llegar al nivel placa superior del box culvert existente se le comunica acuagyr para provisional del tubo pvc de aguas lluvias unicentro de 18" para quitarlo del sitio de trabajo del nuevo box culvert se desmonta tubería en polietileno de 20" de zona donde se esten realizando las terrazas para llegar al nivel de cimentacion del box nuevo se realizaro retiro de material de la excavacion
MARTES	29/07/25	se continua con excavacion para terrazas para llegar al nivel placa superior del box culvert existente se inicia con personal de acuagyr desmontando tubería pvc 18" aguas lluvias de la red que viene de unicentro se realizo retiro material excavado, no se ha pronunciado la empresa de etb para la caja de telefono que pasa por la zona donde se va a construir el nuevo box culvert
MIÉRCOLES	30/07/25	se continúa con excavacion de terrazas para llegar al nivel de cimentacion del box culvert y la cimentacion del nuevo box se realizo retiro de material excavado se continúa tubería pvc 18" aguas lluvias por la empresa acuagyr desague del centro comercial unicentro que se requiere mover porque esta en la zona donde se construira del nuevo box culvert
JUEVES	31/07/25	Se continua con la excavacion de terrazas para llegar al nivel de cimentacion del box existente y cimentacion del nuevo box culvert y se realizo retiro de material de excavacionse arreglo fuga de agua de tubería pvc de 12" agua potable se esta terminando de arregla el desvio provisional de la tubería pvc sanitaria aguas lluvias unicentro de 18" todos estos trabajos realizados por la empresa acuagyr no se ha demolido caja telefonica por parte de etb ni respuesta alguna

ANEXO 2.

CERTIFICADO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
 NIT: 890932389-8
 Teléfono: 01 8000 423 724
 Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüí

INFORMACION GENERAL					
Cliente:	HIERROS Y LAMINAS LA 20 SAS	Fecha Impresión	25/07/29	Informe N°:	108235
Dirección:	CLL 24 10 18 GIRARDOT GIRARDOT	No. Remisión:	187206602	Informe Ant N°:	
Teléfono:	8325274	Página:	1 de 2	Centro:	Centro Bogota

DATOS GENERALES				PROPIEDADES QUIMICAS										
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971403	NTC 4537	Ternium	0.20	0.64	0.14	0.029	0.019	0.230	0.084	0.165	0.018	0.040
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971708	NTC 4537	Ternium	0.21	0.63	0.15	0.023	0.012	0.215	0.131	0.182	0.018	0.047

DATOS GENERALES				PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Nb
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971403	NTC 4537	Ternium	0.001
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971708	NTC 4537	Ternium	0.001

Autoriza
 Sebastian Carmona Restrepo
 Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
 La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
 Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
 No se debe reproducir información parcial del Informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS



Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: **HIERROS Y LAMINAS LA 20 SAS** Fecha Impresión: **25/07/29** Informe N°: **108235**
Dirección: **CLL 24 10 18 GIRARDOT GIRARDOT** No. Remisión: **187206602** Informe Ant N°:
Teléfono: **8325274** Página: **2 de 2** Centro: **Centro Bogota**

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PROD	FABRICANTE	PROPIEDADES FISICAS					
					Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	DOBLADO	Resiste. Tracción2	Resist. Fluencia2
C8012359	BARRA ORNAMENTAL ESTRIADA 5.0mm 6m	1AB128055		Ternium	MPa	MPa	%		MPa	MPa
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971403	NTC-4537	Ternium	376	481	22	SinGrieta	503	375
C8000038	ANGULO 1 1/2"x1/8" 6m A572G50	A011971708	NTC-4537	Ternium	387	512	20		520	390

Material	Ensayo	Método	Fecha Ensayo
C8012359			10.07.2025

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el Área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

ANEXO 3.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)**

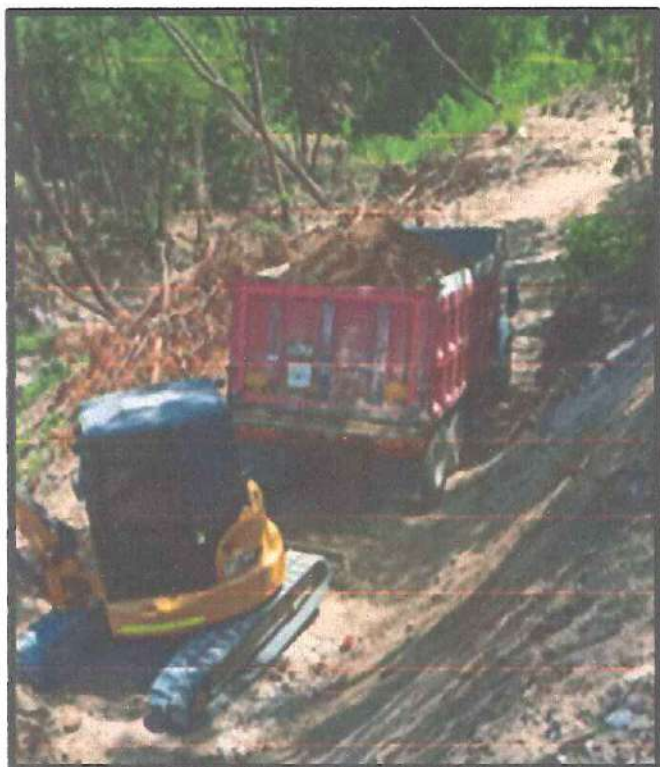






**TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES,
PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES**





**EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**







**TRASIEGO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y MATERIAL DE
DEMOLICIÓN HASTA ZONA DE CARGUE**




ANEXO 4.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

TABLA DE REVISIONES

VERSIÓN	MODIFICACIONES	ELABORÓ	REVISÓ
1		Cargo: ASESOR SISO Licencia: 7608/2019	Cargo: Representante legal
		Nombre: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS	Nombre: ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
	FIRMA:		

APROBADO POR:


**ING. EDUARDO JOSE
VILLANUEVA HERNANDEZ**
 HERMANOS VILLANUEVA
 INGENIERIA S.A.S
 INTERVENTORIA DE OBRA

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

INFORME No. 02

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contrato De Obra N° 742 del 2025

PROYECTO:

**“CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO
VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA
INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE
GIRARDOT CUNDINAMARCA”**

PERIODO: 01 AL 31 de Julio Del 2025

GIRARDOT – CUNDINAMARCA

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que la Seguridad y Salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores, **EL INGENIERO JORGE EDGAR RUBIO CALDERON** a través de su equipo desarrolla actividades en Seguridad y Salud en el trabajo, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones que a su vez deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

La Seguridad industrial es un tema de alta importancia en el área de la construcción ya que se enfoca en la protección integral del trabajador en los procesos de seguridad con los cuales se pretende motivar al trabajador sobre valorar su vida y protegerse a sí mismos y evitar accidentes relacionados principalmente por descuidos o cuando el trabajador no está plenamente concentrado en su labor.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

BENEFICIOS PARA EL EMPLEADOR Y PARA EL TRABAJADOR

BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR	BENEFICIOS PARA EL EMPLEADOR
Refuerza el sentido de pertenencia a la empresa	Mejora las relaciones empresario trabajador.
Brinda satisfacción por el trabajo realizado.	Aumenta la productividad en la empresa.
Motiva a hacer una tarea con calidad.	Incrementa la calidad de los productos y servicios.
Mejora el ambiente de trabajo.	Disminuye gastos médicos y de seguros.
Favorece el compañerismo.	Disminuye el ausentismo.
Favorece la armonía de las relaciones familiares.	Proyecta una buena imagen ante la sociedad.
Mantiene una adecuada salud física y mental.	Participa en el desarrollo del país.
Favorece la prolongación de la vida productiva.	Cumple con legislación.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

1. INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025

La Salud en el trabajo es la ciencia que tiene por finalidad proteger y mejorar la salud física, mental y social de trabajadores en los puestos de trabajo y en la empresa en general. Su objetivo es proporcionar condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y mejorar la productividad.

1.1 ASPECTOS BASICOS LEGALES

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Este programa reúne los requerimientos básicos legales y del sector que toda empresa debe cumplir en cuanto al área de Salud en el trabajo antes de toda contratación. **INGENIERO JORGE EDGAR RUBIO CALDERON** realiza mensualmente seguimiento al pago de seguridad social; el proceso consiste en recibir los primeros 10 días las planillas del mes inmediatamente anterior para verificar el pago respectivo.

El pago de seguridad del personal contratado por OPS se verificará al momento del radicado de la cuenta de cobro del contratista.

A continuación, se relaciona el personal contratado para el desarrollo del contrato, el cual podrá ser variable de acuerdo a las necesidades del proyecto.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE DISEÑO	JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ
ASESOR E S T R U C T U R A L	RAÚL ERNESTO ARANGO YEPES
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO	BRYAN STEVEN CARDENAS LOZANO

PERSONAL DE OBRA:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	SERGIO ANDRÉS VERA ACOSTA
GEOTECNISTA	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA
TOPÓGRAFO	JOSE ORLANDO CARMONA DURAN
ASESOR SISO	ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS
MAESTRO DE OBRA	MARIO GOMEZ VASQUEZ

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

Accidentes de Trabajo:

En el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2025, **NO** se presentó ningún tipo de incidente y/o accidentes laborales en la obra. Se Anexa la certificación de la ARL SURA de no existir reportes de Accidentes laborales.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas tienen por objeto mejorar las condiciones de trabajo, protección de la salud de los trabajadores y evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; mediante la planificación, aplicación y evaluación de dichas acciones de mejora destinadas a controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Las actividades desarrolladas en el periodo presente son según el cronograma SG- SST son:

2.1. DOCUMENTACION EXIGIDA PARA INGRESO A OBRA:

Es la revisión de la documentación con las competencias exigidas por cargo y por actividad para el ingreso al personal a obra, que además incluye pago de parafiscales en el periodo vigente; donde se demuestra la cobertura y protección del trabajador frente al régimen de Salud, régimen de Riesgos Laborales y régimen pensional.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



2.2. Elementos de Protección Personal

Se hace entrega de elementos de protección personal a los trabajadores y cambio de ellos por daño o desgaste, se realiza revisión del porte y uso de EPP. Actualmente se implementó formato para la entrega de elementos de protección personal donde se especifica el tipo de EPP entregado, fecha y firma del trabajador que recibe. Se Anexa Formato de entrega de los EPP firmado por cada trabajador.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



2.3. Actividades De Capacitación Y Sensibilización Del Personal:

Se realizaron charlas de 5 minutos programadas en el cronograma de capacitación del SG-SST, enfocadas a los riesgos por los cuales los trabajadores se encuentran expuestos durante su jornada laboral, se realiza antes del inicio de las actividades diarias, socializando temas y responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo SST que se ejecutan durante el proyecto. Se dio paso a los ejercicios de calistenia que hacen una pausa activa antes de empezar las actividades y dan cumplimiento a la intervención del riesgo Ergonómico durante la labor diaria.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



EL INGENIERO **JORGE EDGAR RUBIO CALDERON** suministra los tiempos, espacios y recursos necesarios para la capacitación del personal propio y contratado en temas referentes a seguridad y salud en el trabajo y las medidas preventivas de mitigación relacionado a los riesgos presentes en el sitio de trabajo como:

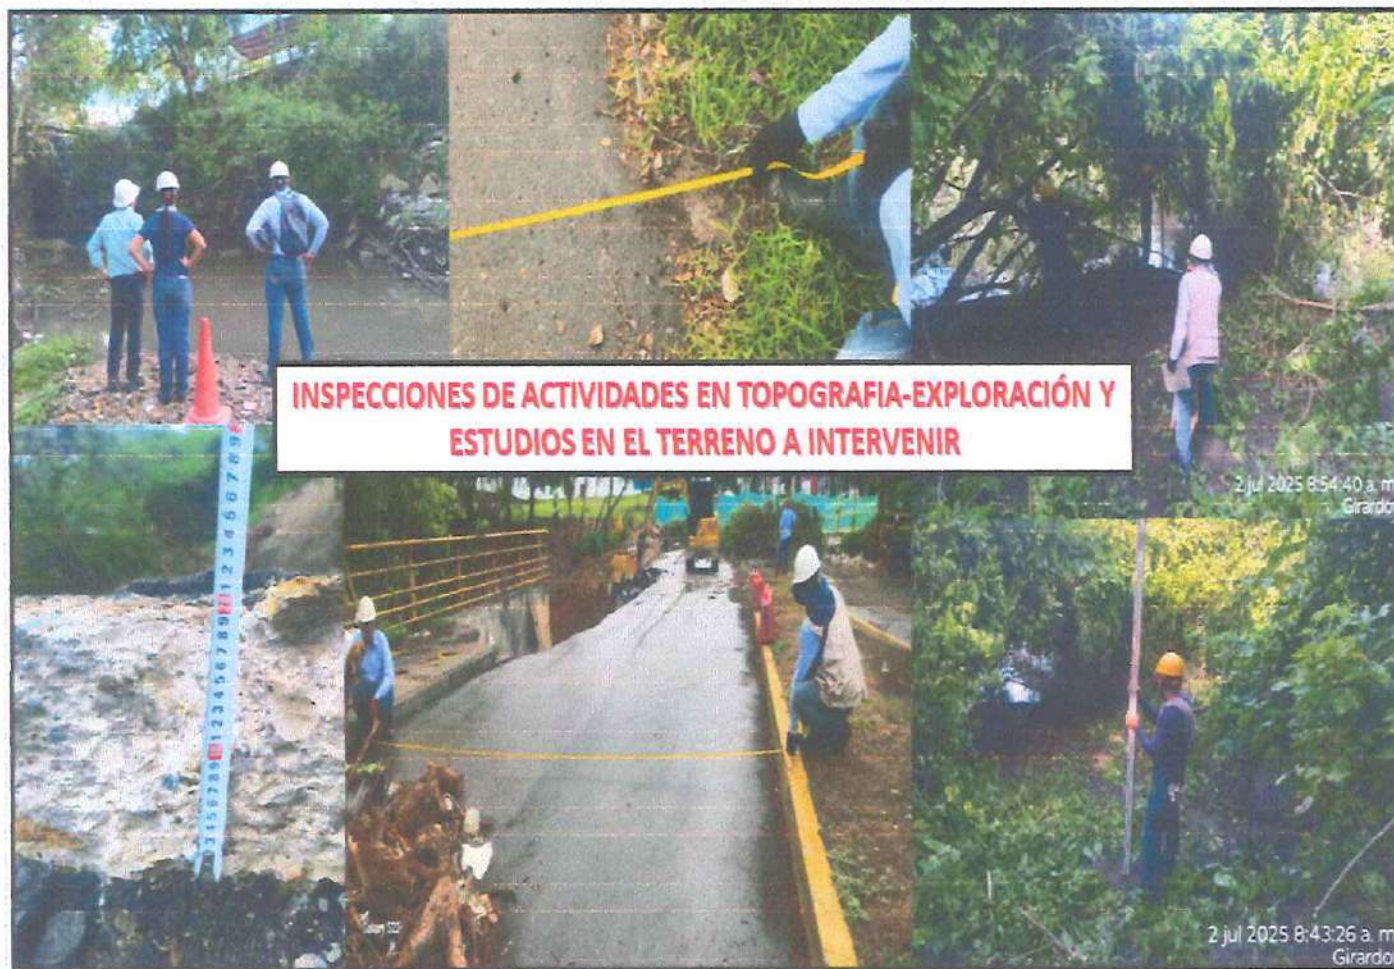
- ❖ Control de Ingreso de Personal **Anexo 1.**
- ❖ Temario y Asistencia a Inducción **Anexo 2.**
- ❖ Asistencia a Reuniones y Capacitaciones **Anexo 3.**
- ❖ Actas de Reunión para Copasst.. **Anexo 4.**
- ❖ Análisis de trabajo seguro y/o Pre operacional ATS. **Anexo 5.**

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

- ❖ Permisos de Trabajo seguro para tareas de Alto Riesgo **Anexo 6.**
- ❖ Charlas de los 5 Minutos la seguridad SI paga **Anexo 7.**

2.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD:



**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



**INSPECCIONES DE MATERIALES- HERRAMIENTAS MANUALES Y
ELECTRICAS**

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



**INSPECCIONES EN INGRESOS Y ACTIVIDADES EN ESPACIOS
CONFINADOS DENOMINADA TAREA DE ALTO RIESGO**



**INSPECCION A EQUIPOS DE
EMERGENCIA
Y PRIMEROS AUXILIOS**

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



INSPECCIONES DE VEHICULOS - TRANSPORTE DE MATERIALES Y RCD



INSPECCION EN TAREAS DE EXCAVACION

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



INSPECCIONES DE TAREAS EN DEMOLICION PERFORACIONES Y SONDEO

Se inspeccionarán periódicamente las áreas, equipos y herramientas de trabajo con el fin de identificar condiciones inseguras y realizar las acciones correctivas necesarias.

- ❖ **ATS Herramientas Eléctricas Anexo 8.**
- ❖ **Pre operacional de Pulidora Anexo 9.**
- ❖ **Inspecciones de Operación Anexo 10.**
- ❖ **inspección de Herramientas Manuales Anexo 11.**
- ❖ **Pre operacional de Vehículos Anexo 12.**
- ❖ **Inspección de Herramientas Manuales Anexo 13.**
- ❖ **Pre operacional de Equipos y Herramientas Anexo 14.**

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

2.7 DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO DEL CAMPAMENTO



DESPEJE Y APERTURA DE CAMINOS



**MANTENIMIENTO EN LA SEÑALIZACION- DEMARCACION
Y BALIZACION DE AREAS CRITICAS**

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

Se han despejado áreas y espacios en obra, creando y dando apertura a caminos con el fin de que haya operaciones de calidad y con seguridad. Se delimito el área total de la obra con lonas verdes, realizando encerramiento de la misma; se demarcaron espacios de profundidad y riesgos de derrumbe donde las probabilidades y consecuencias en las personas y máquinas son del mas grave nivel de perdida. Se cuenta con la construcción de un centro de operaciones y/o Campamento acondicionado en área próxima a la obra, en donde se reciben y acopia los diferentes materiales y equipos y herramientas utilizados en obra. Al igual cuenta con el área de almacén y bodega para disposición del material a utilizar en los diferentes centros de trabajo.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EL INGENIERO JORGE EDGAR RUBIO CALDERON identificará los peligros existentes, evaluará y determinará las medidas de control para las actividades comprendidas en los diferentes procesos que se desarrollan en los frentes de trabajo de las Obras. En esta la empresa implementa como medida de control Preoperacional y/o Análisis de Trabajo Seguro **ATS**, al igual que Permisos de trabajo para tareas de Alto Riesgo Formato diligenciado por los trabajadores previos al inicio de las labores con el fin de identificar los riesgos que se pueden generar en el desarrollo de la actividad, así como determinar las medidas preventivas a implementar. **VER ANEXOS 5 y 6.**

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. Formato Control de Ingreso de Personal ✓

ANEXO 2. Asistencia a Reuniones y Capacitaciones ✓

ANEXO 3. Actas de Reunión. ✓

ANEXO 4. Formato entrega de elementos de protección personal ✓

ANEXO 5. ATS Herramientas Eléctricas. ✓

ANEXO 6. Inspección de operación. ✓

ANEXO 7. Preoperacional de Vehículos ✓

ANEXO 8. Certificado de trabajo en caliente. ✓

ANEXO 9. Preoperacional de pulidora. ✓

ANEXO 10. Inspección preoperacional miniexcavadora (contratista). ✓

ANEXO 11. Certificado de ARL de no accidentalidad. ✓

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 1

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		VERSION 01
CALDERON		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SST-FO-01
		CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL		FECHA 06/06/2025

SubProyecto: CIERRO PUENTE GUERRERO SAN JORGE

FECHA	N° DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	NOTIVO	FIRMA
01-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
01-07-2025	93132403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
01-07-2025	93124814	Delgado Cormona D.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
01-07-2025	1069178480	Beyan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
01-07-2025	52422616	ERIK A. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
02-07-2025	93128234	Gomez Vasquez Mario	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
02-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio A.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
02-07-2025	93124814	Delgado Cormona D.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
02-07-2025	1069178480	Beyan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
02-07-2025	52422616	ERIK A. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
03-07-2025	93128234	Gomez Vasquez Mario	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
03-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
03-07-2025	93124814	Delgado Cormona D.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
03-07-2025	1069178480	Beyan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
03-07-2025	52422616	ERIK A. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
04-07-2025	93128234	Gomez Vasquez Mario	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
04-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
04-07-2025	93124814	Delgado Cormona D.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
04-07-2025	1069178480	Beyan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>
04-07-2025	52422616	ERIK A. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Signature]</i>

[Signature]
Revisado por

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON			VERSION 01	
CALDERON		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			SST-FO-01	
Código Proyecto: OBRA PUENTE SAN JOSE		CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL			FECHA 05/06/2025	
FECHA	N° DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	NOTIVO	FIRMA
05-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Monu	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
05-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
05-07-2025	93124814	Defando Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
05-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lozano	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
05-07-2025	52922616	ERIK A. C. WAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
06-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Monu	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
06-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
06-07-2025	93124814	Defando Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
06-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lozano	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
06-07-2025	52922616	ERIK A. C. WAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
07-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Monu	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
07-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
07-07-2025	93124814	Defando Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
07-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lozano	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
07-07-2025	52922616	ERIK A. C. WAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
08-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Monu	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
08-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
08-07-2025	93124814	Defando Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
08-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lozano	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
08-07-2025	52922616	ERIK A. C. WAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>

Remetido por

Objeto Proyecto: OBRA PUENTE SAN JORGE

FECHA	N° DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	MOTIVO	FIRMA
09-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
09-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
09-07-2025	93124814	Defando Cormona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Firma]</i>
09-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lopez	6:45AM	5:00PM		<i>[Firma]</i>
09-07-2025	52422616	ERIK A C. CUNAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Firma]</i>
10-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
10-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
10-07-2025	93124814	Defando Cormona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Firma]</i>
10-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lopez	6:45AM	5:00PM		<i>[Firma]</i>
10-07-2025	52422616	ERIK A CONSTANZA CUNAGNER A	6:45AM	5:00PM		<i>[Firma]</i>
11-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
11-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
11-07-2025	93124814	Defando Cormona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Firma]</i>
11-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas				<i>[Firma]</i>
11-07-2025	52422616	ERIK A C. CUNAGNER ARIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Firma]</i>
12-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
12-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45	5:PM		<i>[Firma]</i>
12-07-2025	93124814	Defando Cormona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Firma]</i>
12-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas Lopez	6:45	5:00PM		<i>[Firma]</i>
12-07-2025	52422616	ERIK A CONSTANZA CUNAGNER A	6:45	5:00PM		<i>[Firma]</i>

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON				VERSION 01	
CALDERON		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				SST-FO-01	
Sede/Proyecto: OBRA PUENTE SAN JORGE		CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL				FECHA 06/06/2025	
FECHA	N° DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	MOTIVO	FIRMA	
14-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
14-07-2025	93133403	Ulva Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
14-07-2025	93124914	Defondo Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
14-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
14-07-2025	52422616	ERMA CONSTANZA UAGNERA A	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
15-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
15-07-2025	93133403	Ulva Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
15-07-2025	93124914	Defondo Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
15-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
15-07-2025	52422616	ERMA C. UAGNERA ARIAS	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
16-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
16-07-2025	93133403	Ulva Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
16-07-2025	93124914	Defondo Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
16-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
16-07-2025	52422616	ERMA C. UAGNERA ARIAS	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
17-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
17-07-2025	93133403	Ulva Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
17-07-2025	93124914	Defondo Carmona D.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
17-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	
17-07-2025	52422616	ERMA C. UAGNERA ARIAS	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>	

Renovado por

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		VERSION 01		
CALDERON		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SST-FO-01		
Fecha/ingreso:		CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL		FECHA 04/06/2025		
CUBA PUEBLO QUEBRANA SAN JORGE						
FECHA	Nº DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	MOTIVO	FIRMA
18-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45am	5:PM		<i>[Signature]</i>
18-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45A	5:PM		<i>[Signature]</i>
18-07-2025	93124814	Orlando. Cormono D	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
18-07-2025	1069178480	Reynan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
18-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ACIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
19-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
19-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45A	5:PM		<i>[Signature]</i>
19-07-2025	93124814	Orlando Cormono D	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
19-07-2025	1069178480	Reynan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
19-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ACIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
21-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45am	5:PM		<i>[Signature]</i>
21-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45A	5:PM		<i>[Signature]</i>
21-07-2025	93124814	Orlando Cormono D	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
21-07-2025	1069178480	Reynan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
21-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ACIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
22-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mario	6:45am	5:PM		<i>[Signature]</i>
22-07-2025	93133403	Vera Acosta Sergio Andres	6:45A	5:PM		<i>[Signature]</i>
22-07-2025	93124814	Orlando Cormono D	6:45AM	5:PM		<i>[Signature]</i>
22-07-2025	1069178480	Reynan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>
22-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ACIAS	6:45AM	5:00PM		<i>[Signature]</i>

Revisado por: _____

Revisado por:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		VERSION 01		
CALDERON		SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SST-FO-01		
		CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL		FECHA 06/06/2025		
Sede/Proyecto: OREBA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE						
FECHA	N° DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	MOTIVO	FIRMA
23-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Muno	6:45AM	5:PM		[Firma]
23-07-2025	93133403	Uribe Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		[Firma]
23-07-2025	93124814	Defondo Comono D.	6:45AM	5:PM		[Firma]
23-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		[Firma]
23-07-2025	52922616	Erika C. Wagner Arias	6:45AM	5:00PM		[Firma]
24-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Muno	6:45AM	5:PM		[Firma]
24-07-2025	93133403	Uribe Acosta Sergio Andres	6:45	5:PM		[Firma]
24-07-2025	93124814	Defondo Comono D.	6:45AM	5:PM		[Firma]
24-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		[Firma]
24-07-2025	52922616	Erika C. Wagner Arias	6:45AM	5:00PM		[Firma]
25-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Muno	6:45	5:PM		[Firma]
25-07-2025	93133403	Uribe Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		[Firma]
25-07-2025	93124814	Defondo Comono D.	6:45AM	5:PM		[Firma]
25-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		[Firma]
25-07-2025	52922616	Erika C. Wagner Arias	6:45AM	5:00PM		[Firma]
26-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Muno	6:45AM	5:PM		[Firma]
26-07-2025	93133403	Uribe Acosta Sergio Andres	6:45AM	5:PM		[Firma]
26-07-2025	93124814	Defondo Comono D.	6:45AM	5:PM		[Firma]
26-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45AM	5:00PM		[Firma]
26-07-2025	52922616	Erika C. Wagner Arias	6:45AM	5:00PM		[Firma]

Items por

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		VERSION 01
	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SST-FO-01
	CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL		FECHA 06/06/2025

Se debe imprimir:

FECHA	Nº DE IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	HORA INGRESO	HORA DE SALIDA	MOTIVO	FIRMA
28-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mauro	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
28-07-2025	93128134	Ulloa Acosta Sergio Andres	6:45 A	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
28-07-2025	93124814	Orlando Carrmona D	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
28-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
28-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
29-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mauro	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
29-07-2025	93128134	Ulloa Acosta Sergio Andres	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
29-07-2025	93124814	Orlando Carrmona D	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
29-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
29-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
30-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mauro	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
30-07-2025	93128134	Ulloa Acosta Sergio Andres	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
30-07-2025	93124814	Orlando Carrmona D	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
30-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
30-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
31-07-2025	93128134	Gomez Vasquez Mauro	6:45	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
31-07-2025	93128134	Ulloa Acosta Sergio Andres	6:45 A	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
31-07-2025	93124814	Orlando Carrmona D	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
31-07-2025	1069178480	Bryan Steven Cardenas L.	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>
31-07-2025	52422616	ERIK C. WAGNER ARIAS	6:45 AM	5:00 PM		<i>[Firma]</i>

firmado por

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 2

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund.) 01-07-2025

Expositor: ERICA C. WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: OTRA PUENTE CUESTADA SAN JOSE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 2:30 AM

Tema: TECNICAS de LEVANTAMIENTO seguro de cargas

Objetivo: GENERAL CONOCIMIENTO en el enfoque de minimizar el riesgo de
LESIONES OSTEO MUSCULARES- PRIORIZANDO LA SEGURIDAD al manipular objetos
Pesados, MANTENER POSTURA CORRECTA, UTILIZAR FUERZA de la pierna con el apoyo



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

María Gamel Vasquez 932804 Hostess

Sergio P. Vera A. 93133403 Residente obra

Dejando Germano D. 93124814 topografo

Bryan Steven Calderon Liano 1069178480 Prof. Presupuesto

OBSERVACIONES:

EWA

Firma Responsable Actividad

ERICA C. WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot Cund. 02-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OTRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Objetivo: CONOCER EL CONJUNTO DE MEDIDAS Y SISTEMAS DISEÑADOS PARA PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR INCENDIOS, CON EL OBJETIVO DE PROTEGER VIDAS Y BIENES. MEDIDAS ACTUALES DE DETECCIÓN Y EXTINCION. PAUSAS COMO LA CONTINUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Humb Gomez Vasquez

93168134

Muestro

[Firma]

Sergio A. Vera

93133403

Residente de zona

[Firma]

Defando Carmona D

93124814

Topografo

[Firma]

BRYAN STEVEN CARDENAS LOzano 1069178480

[Firma]

OBSERVACIONES:

[Firma]

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 03-07-2025

Expositor: ERIKA C. LUAGNEA ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN-JORGE

Hora inicio: 7:45 AM - 2:00 PM

Hora finalización: 8:00 AM - 2:15 PM

Tema: EJERCICIOS de CALISTENIA y ESTIRAMIENTO

Objetivo: Calentamiento y distensión muscular de las calistenias
al iniciar sus labores y durante ellas.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mano Gomez Vasquez 93128130 Maestro

Sergio A. Vera A 93133403 Residente obra

BRYAN STEVEN CALDERON 1069178980

[Firma]
Bryan Calderon

OBSERVACIONES:

[Firma]

Firma Responsable Actividad

ERIKA C. LUAGNEA ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDOT (Cund) 03-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANCIA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUERRADA SAN TORCE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: RIESGOS EN EL TRASLADO DE MATERIALES E PAJES SEGUROS

Objetivo: Identificar e inspeccionar riesgos comunes tales como: Accidentes de tráfico, Cargas, Manipulación incorrecta de materiales peligrosos, Daños a la carga y Riesgos asociados a la manipulación de maquinaria pesada y el uso de ella (Ergo).



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Harib Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Sergio Vera A. 93133403 Residente obra

BRYAN STEVEN CARDENAS L. 1069198980

[Firma]

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad

[Firma] ERIKA CONSTANCIA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 04-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: PROCEDIMIENTOS DE EVacuación DE EMERGENCIA

Objetivo: DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE INCLUYEN LA DETECCIÓN DEL PELIGRO, LA EXTINCIÓN DE ALARMA, PREPARACIÓN PARA SALIR Y LA EVACUACIÓN EN SI, SEÑALANDO LAS RUTAS DESIGNADAS Y LAS DISPOSICIONES DEL PERSONAL DE EMERGENCIA



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Vasquez 9312834 Maestro

Heriberto A. Urra L. 9313403 Presidente obra

Orlando Camacho D. 9312484 Topografo

Bryan Steven Cardenas L. 1069178480 Prof. Presupuesto

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad ERIKA C. WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cond) 07-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: OTBRA PUENTE QUETAMA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: PRIMEROS AUXILIOS - PRIMER RESPONDIENTE

Objetivo: Conocer como actuar y que responsabilidades tiene el primer respondiente en primeros auxilios les quien ofrece los primeros auxilios a una persona lesionada antes que llegue el personal medico competente.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mano Gomez Vargas 93128134 Maestro

Sergio A. Vero A. 93133443 Serdente obra

Oslando Carrero D 93124814 topografo

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad

ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDOT (Cund) 08-07-2025

Expositor: ERMA C. CUNENEL ARIAS

Centro de Trabajo: ORLA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Protección Respiratoria y Monitoreo de la calidad del Aire.

Objetivo:

Identificar la protección respiratoria oficial para minimizar la inhalación de contaminantes y proteger la salud en ambientes con mala calidad del Aire.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOVIEMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO FIRMA

Mano Gomez Jasper 93128134 Maestro Y
Sergio A. Ucho A. 93133403 Residente obra ACA
Olyando Camacho D 93124814 Topografo @fuerza
BRYAN STEVEN CORRALES LOAÑO 1069178480 Pte. Presupuesto Miguel Calderon

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad ERMA CUNENEL ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 09-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora início: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: ENTRENAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN ACUÁTICA

Objetivo: Mantener la conservación auditiva realizando practicas y estrategias diseñadas para proteger la audición de daños causados por el ruido y otros factores. Prevención a la pérdida auditiva.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES A REPLENIR

PERKIN REACTION

GRAPH

0012-1644

Manoel Gomes Vasquez 93128134 Maestro
Sergio A. Vera A 93133413 Evidente de
Orlando Carrasco D 93124814 Topografo
BRYAN STEVEN CARDENAS L 1069178480 Profesor de Pregrado

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad ERIKA C WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDOT (and) 10-07-2025

Expositor: ERIKA C. WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: ORRA PUNTE Quebrada San Jorge

Hora Inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Fortalecimiento de la cultura de Seguridad

Objetivo: Crear un entorno laboral donde la Seguridad es una prioridad y un valor compartido por todos los miembros de la organización.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Vasquez 93128134 Huerto

Sergio A. Vera A. 93133403 Residente

Orlando Camacho D. 93124814 Topografo

OBSERVACIONES:

Erika C. Wagner Alias

Firma Responsable Actividad ERIKA C. WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GRACIOT (Cond.) 11-07-2025

Expositor: ERNA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA DEL PUENTE GUERRA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Inducción y Reinducción al SST. Gestión SST.

Objetivo: Aprender que la Inducción y reinducción SST son procesos esenciales para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Manteniendo vigente a los nuevos y antiguos empleados actualizados sobre el SG-SST.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
--------------------	----------------	-------	-------

Marino Gomez Vasquez	93128134	Maestro	
----------------------	----------	---------	--

Sergio A. Vera A.	93133423	Residente obra	
-------------------	----------	----------------	--

Orelando Cernorra D	93124814	Topografo	
---------------------	----------	-----------	--

Bryan Steven Cardenas Jorano	1069178480	Prof. Presupuesto	Bryan Cardenas
------------------------------	------------	-------------------	----------------

OBSERVACIONES:

ERNA

Firma Responsable Actividad ERNA. CONSTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDIST (Cund.) 14-07-2025

Expositor: ERICA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Importancia de los Permisos de Trabajo en Tareas de Alto Riesgo

Objetivo: Garantizar que los permisos de Trabajo son un mecanismo de control y prevención de Accidentes en Tareas de Alto Riesgo siendo esenciales en las operaciones de obra.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Hario Gomez Vasquez	93128734	Maestro	<i>[Firma]</i>
Sergio A. Urra A.	93133463	Residente obra	<i>[Firma]</i>
Orlando Carrasco D.	93124804	Topografo	<i>[Firma]</i>
Bryan Steven Cardenas Lomero	106978480	PNT presupuesto	<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES:

[Firma]

Firma Responsable Actividad ERICA CONSTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDOT (Cund.) 15-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAR

Centro de Trabajo: NOGA Puente quebrada San Jorge

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: QUE HACER en caso de A.T?

Objetivo: Generar conciencia del reporte del (A.T) Accidente de Trabajo y la importancia de informar a sus jefes de inmediato, generar un primer auxilio y trasladar al accidentado a un centro medico asistencial.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Garcia Vazquez	93128130	Muerto	M
Sergio A. Urra A.	93133403	Presidente obrero	Peru
Defonso Camacho D.	93124814	Topografo	Defonso
Bryan Steven Cardenas Somo	1069178980	Prof. Presupuesto	Bryan Cardenas

OBSERVACIONES:

Ecu

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAR

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRALOT (and) 16-07-2025

Expositor: ERIVA CONSTANZA WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: OTRA PUNTE Quebrada San Jorge

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS CLAROS Y MEDIBLES

Objetivo: Proporcionar dirección y propósito estableciendo objetivos claros y medibles fundamentales para el éxito, ya sea en proyectos personales, profesionales o empresariales, mientras la medición permite evaluar los progresos.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO FIRMA

Harío Goma Varquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vero A. 93133403 Residente de dpa.

Orlando Carrera D 93124814 Topógrafo

Bryan Javier Cardenas Lomero 106917848 PPF. Presupuesto

OBSERVACIONES:

ERIVA

Firma Responsable Actividad ERIVA C. WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 17-07-2025

Expositor: Erika Constanza Wagner Arias

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE.

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 2:30 PM

Tema: Importancia de los Registros de Participación en el SG-SST

Objetivo: Demostrar el cumplimiento normativo de la documentación y los Registros como instrumentos fundamentales en el SG-SST porque proporciona evidencia tangible de la implementación y el cumplimiento de las políticas y planes SST.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Hugo Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Urra A. 93133453 Residente obra

Orlando Carmona D. 93124814 Topografo

Bryan Steven Cardenas Jaramo 1069178480 Prof. Pretructor

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad Erika Constanza Wagner Arias

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 21-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: OBEA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora Inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: NORMATIVA Y ACQUATACIONES Legales de SG-SST

Objetivo: Resaltar que el SG-SST en Normativas y Acquaticiones Legales por las principales Ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 lineamientos generales para la implementación del SG-SST.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOVEDADES Y APRENDIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vera A. 93133403 Residente obra

Dejando Carmona D 93124814 Topografo

Bryan Steven Corderas Lora 1.055.178.450 PPF. Presupuesto

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad

ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cundi) 22-07-2025

Expositor: Erika Constanza Wagner Alías

Centro de Trabajo: DBPA- Puente Quebrada San Jorge

Hora Inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Investigación de A.T. e Incidentes

Objetivo: DETERMINAR FRENTE AL APRENDIZAJE DE LA INV. del A.T. como un
PROCESO SISTEMATICO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE UN A.T. O UN
INCIDENTE LABORAL con el fin de PREVENIR FUTURAS DEVENENCIAS.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	SIRMA
María Gomez Vasquez	93128134	Maestro	[Firma]
Scrygo A. Vera A.	93133403	Residente obra	[Firma]
Dejando Camacho D.	93124814	Topografo	[Firma]
BRYAN STEVEN CANDENAS L.	1.069178980	Prof. Presupuesto	[Firma]

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA WAGNER ALÍAS

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA: 06/06/2025

Ciudad y fecha: Sirardot (Cund) 23-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIA

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN TOME

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: COMITÉ DE CONVIVENCIA LAR-FA? (COOP) A

Objetivo: Promover un ambiente de trabajo sano y respetuoso conformando un grupo bipartite por representantes del empleador y los trabajadores con el fin de prevenir y solucionar casos de Acoso laboral dentro de una empresa o proveedor.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

MEMBERS ARE IDEAS

DEFINITION

SALES

IDEAS

Mario Gomez Vasquez	9312834	Maestro	
Senio A. Vera A.	93133423	Asistente de	
Diondo Carranza D	93124814	Topografo	
Bryan Steven Cardenas L	1069178.980	Prof. Presupuesto	

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANCIA WAGNER ARAN

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 29-07-2025

Expositor: ERIKA CONTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: ORRA PUENTE QUEBRADA SAN TORSE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Objetivo: ADOPTAR HABITOS que promuevan el bienestar físico y mental,
Incluyendo una alimentación balanceada, actividad física regular,
pausas activas, manejo del estrés y un buen descanso. VIDA SALUDABLE.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Gasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vera A. 93133403 Residente obra

Orlando Carranza D 93124814 Topografo

Bryan Steven Cardela Jorano 1067175480 Prof. Presupuesto

OBSERVACIONES:

EWA

Firma Responsable Actividad ERIKA CONTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha:

Girardot (Cund.) 25-07-2025

Expositor:

ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo:

OBRA PUENTE SAN JORGE

Hora inicio:

7:00 AM

Hora finalización:

7:30 AM

Tema:

Gestión del Riesgo Psico Social.

Objetivo:

Identificar, evaluar e intervenir los factores en el entorno
laboral que pueden afectar la salud mental y el bienestar de los
Trabajadores.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Vasquez

9312834

Maestro

Sergio A. Vera A.

93133403

Residente de obra

Defonso Carmena D

93124814

Topografo

Bryan Steven Ordenas L

1069178480

Prof Presupuesto

Intendiente

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad

ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GILARDOT (Cund.) 28-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA LUAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN TORRE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: GESTION Comité Paritario de SST. (CORAST)

Objetivo: ENFOCAR EN PROMOVER Y VIGILAR LAS NORMAS de SST a través de la
Creación del Comité Paritario de SST. como un organismo obligatorio en
empresas públicas y privadas con más de 10 empleados



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Harro Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vera A. 93133463 Residente obra

Orlando Camacho D 93124814 Topografo

BRYAN STEVEN CARDENAS Lozano 1069178480 PROF. Presupuesto

OBSERVACIONES:

ERKA

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA LUAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 29-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 2:30 PM

Tema: PLAN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Objetivo: DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE LAS EMERGENCIAS POR MEDIO DE MEDIDAS NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SUPERVIVENCIA DE LOS INVOLUCRADOS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA Y LA REDUCCIÓN DE COSTOS POR DAÑOS EN EMERGENCIAS.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

MIEMBROS PRESENTES

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gamal Vasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vera A. 93133403 Perifoneo obra

Orlando Carrero D. 93124814 Topografo

Bryan Steven Cardenas L. 1069188480 PROF. Presupuesto

OBSERVACIONES:

EWUS

Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund.) 30-03-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIZA

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUERADA SAN TORSE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: PREVENCIÓN DEL ACIDO LACTICO

Objetivo: ESTABLECER POLÍTICAS CLARAS CONTRA EL ACOSO, PROMOVER UNA CULTURA DE RESPETO, IMPLEMENTAR CANALES DE DENUNCIA Y REALIZAR CAPACITACIONES PARA SENSIBILIZAR A LOS EMPLEADOS.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES APPELES

DIFFERENTIAL

CARGO

FIRMA

Mano Gomes Vasquez	93128134	Maestro	<i>[Signature]</i>
Sergio A. Urra A.	93133403	Residente obra	<i>[Signature]</i>
Orlando Carmona	93124814	Topografo	<i>[Signature]</i>
BRYAN STEVEN GARCENAS	2 1069178480	PROF. PRESENTE	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Actividad

ELISA CONSTANZA WAGNER ARINS

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund.) 31-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE SAN JOSE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: PRACTICAS CONTRA EL ESTRÉS Y CULTURA DE AUTOCUIDADO

Objetivo: ADOPTAR PRACTICAS que promuevan el bienestar físico, mental y emocional que contrarresten el estrés permanente que puede afectar negativamente la salud ante situaciones de riesgo a nivel personal y laboral.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mario Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Bergio A. Vera A. 93133403 Residente obra

Dejando Carrasosa D. 93124814 Topografo

Bryan Steven Cardenas Loraño 106918980 Prof. Presupuesto

OBSERVACIONES:

Erika



Firma Responsable Actividad ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 3

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE REUNIÓN	Versión	1.0
		Código	SST-FQ-12
		Fecha	06-06-2025

ACTA DE REUNION No. 04	
1. Identificación.	GIRARDOT (Cund)
FECHA: 01-07-2025	FECHA: Semana del 01 al 05 de julio/2025
HORA DE INICIO: 7:00 PM	
EMPRESA O PROYECTO:	OBRA Puente Quebrada San Jorge
TIPO REUNION:	INFORMATIVA y de Seguimiento al SG-SST
LUGAR:	GIRARDOT (Cund) OBRA Puente Quebrada San Jorge
HORA FINALIZACION:	2:30 PM

2. ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA:
Héctor Gómez Vasquez	Maestro	
Sergio A. Vera A.	Residente obra	
Luis Armando Carranza	Topógrafo	
Bryan Steven Cárdenas Lozano	Prot. Presupuesto	
EDITH CONSTANZA LUQUEZ ARAS	ASEXSA SST	

3. OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de Asistencia Verificación de Quorum. Personal Citado completo al 100% Lectura y Aprobación del Acta Anterior Se aprueba y se corroboran Cumplimientos de compromisos semana anterior Diligenciamiento Formatos y registros preparatorios Proposiciones y varios Asignación de tareas operativas <ul style="list-style-type: none"> Se trata de nuevo horario laboral para las turnadas en Colombia Se renuevan los temas Capacitación de la semana. Compromisos <ul style="list-style-type: none"> postura de pasacalles informativo y viral. Prohibido El Paso a personal no autorizado.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> Se realiza capacitación a primera hora de entrada a laborar 7:00 A.M. Se leen los temas a dictar durante la semana del 01 al 05 de julio del 2025. Se realizan Formatos y registros preparatorios SST para colaboradores y contratistas. Se recibe suministro de agua para hidratación y pasacalles (v) Prohibido ingreso de personal no autorizado.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE REUNIÓN	Versión	1.0
		Código	SST-FO-12
		Fecha	06-06-2025

Alcalde (Coord.)

ACTA DE REUNION No. 05

1. Identificación.	
FECHA: 07-07-2025	FECHA: 07 al 12 de julio / 2025
HORA DE INICIO: 7:00 PM	
EMPRESA O PROYECTO:	ORRA PUEBLO Quebrada San Jorge
TIPO REUNION:	INFORMATIVA y de Seguimiento al SST
LUGAR:	Alcalde (Coord.) ORRA PUEBLO Quebrada San Jorge
HORA FINALIZACION:	2:30 PM

2. ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA:
Mario Gomez (bague)	Maestro	[Firma]
Sergio A. Vera A.	Residente obra	[Firma]
Orlando Camuna	Topografo.	[Firma]
Bryan Steven Cardenas	Prof. Presupuesto	[Firma]
ERICA CONSTANZA WAGNERA	Asesora SST.	[Firma]

3. OBJETIVOS	
> Verificación de Asistencia	Verificación de Quorum. Personal Citado. Completo al 100%
> Lectura y Aprobación del Acta Anterior	Se aprueban y se corroboran Cumplimientos de compromisos semana anterior
> Disposiciones y varios	Disposiciones Firmatos y registros Preoperacionales
> Proposiciones y varios	Asignación de tareas operativas.
> Compromisos	Se mencionan los temas de capacitación de la semana.
	Adquirir Cinta de Seguridad y guacaladas o paños de madera Fortalecer encerramientos

4. DESARROLLO DE LA AGENDA	
1. Se realiza capacitación a primera hora de entrada a la obra 7:00 AM	
2. Se leen los temas a dietar durante la semana del 07 al 12 de julio / 2025.	
3. Se realizan Formatos y registros Preoperacionales SST para colaboradores y contratistas	
4. Se recibe suministro de agua para hidratación	

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE REUNIÓN	Versión	1.0
		Código	SST-FQ-12
		Fecha	06-06-2025

ACTA DE REUNION No. 06	
1. Identificación.	Girardot (Cund.)
FECHA: 14-07-2025	FECHA: Semana 14 al 19 de Julio del 2025
HORA DE INICIO:	2:00 PM
EMPRESA O PROYECTO:	OBRA PUNTE Quebrada San Jorge.
TIPO REUNION:	Informal y de seguimiento al SG SST.
LUGAR:	Girardot (Cund.) OBRA PUNTE Quebrada San Jorge
HORA FINALIZACION:	2:30 PM

2. ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA:
Mario Gomez Vasquez	Maestro	<i>[Firma]</i>
Sergio A. Vera A.	Residente obra	<i>[Firma]</i>
Defando Comuna.	topografo	<i>[Firma]</i>
Bryan Steven Caceres L.	PROF. Presupuesto	<i>[Firma]</i>
ERIKA C. WAGNER ARIAS	Asesora SST.	<i>[Firma]</i>

3. OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de Asistencia Verificación Asistencia personal Citado. Quorum al 100%. Lectura y Aprobación del Acta Anterior Se aprueban y se convierten Cumplimientos de compromisos semana anterior. Diligenciamiento Formatos y registros preoperacionales. Proposiciones y varios ASIGNACIÓN de Tareas operativas. Se mencionan los temas de capacitación de la semana. Compromisos ASIGNACIÓN del nuevo horario de Trabajo A 44 horas Semanales por la aprobación del Nuevo Regimen Laboral. En Colombia.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> Se realiza capacitación a primera hora de entrada a laborar 7:00 AM. Se leen los temas a tratar durante la Semana del 14 al 19 de Julio /2025. Se realizan Formatos y registros preoperacionales SST para colaboradores y contratistas. Se recibe suministro de agua para hidratación Semanal de los colaboradores.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA DE REUNIÓN	Versión	1.0
		Código	SST-FQ-12
		Fecha	06-06-2025

ACTA DE REUNION No. 07	
1. Identificación.	GIVARDOT (Cond.)
FECHA: 21-07-2025	FECHA: Semana del 21 al 26 Julio / 2025
HORA DE INICIO:	2:00 PM
EMPRESA O PROYECTO:	OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE
TIPO REUNION:	INFORMATIVA y de Seguimiento al SC-SST
LUGAR:	GIVARDOT (Cond.) OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE
HORA FINALIZACION:	2:30 PM

2. ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA:
Horio Gomez Vasquez	Maestro	
Sergio A. Vera A.	Presidente obra	
Defando Carmona	Topografo	
Bryan Steven Cardenas J	PROF. Presupuesto	
ERNA C WACNER ARIAS	Asesora SST.	

3. OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none"> Verificación de Asistencia Del personal citado. Obteniendo 100% de Asistencia. Lectura y Aprobación del Acta Anterior Se aprueba y se Corrobora cumplimiento de compromisos semana anterior Diligenciamiento de Formatos y Registros Preoperacionales Proposiciones y varios ASIGNACION de TAREAS operativas. Se mencionan los temas de capacitación de la semana. Compromisos ASIGNACION de Recursos PARA Construcción del Camyamento de OBRA.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> Se realiza Capacitación a primera hora de entrada a la labor 7:00 AM. Se leen los Temas a dictar durante la Semana del 21 al 26 de Julio del 2025 Se realizan Formatos y registros preoperacionales SST para colaboradores y contratistas. Se recibe suministro de Agua para hidratación Semanal de los colaboradores

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

ANEXO 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 01
FECHA: JUNIO 2025

No	FECHA	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) DEL TRABAJADOR	CEDULA	ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL								DOTACIÓN			FIRMA DEL TRABAJADOR
				Casco	Tapa oídos	Careta	Gafas	Gautes	Chaleco	Arnés de seguridad	Tapabocas	Carnisa	Pantalón	Botas	
1	01-07-2025	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93128134	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	<i>[Firma]</i>
2	01-07-2025	Sergio Vera A	93133403	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	<i>[Firma]</i>
3	01-07-2025	Defonso. Carmona	93124814	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	<i>[Firma]</i>
4	01-07-2025	Bryan Steven Cardenas L	1069178980	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	<i>[Firma]</i>
5	01-07-2025	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93128134					✓			✓				<i>[Firma]</i>
6	01-07-2025	Sergio Vera A	93133403					✓			✓				<i>[Firma]</i>
7	01-07-2025	Defonso. Carmona	93124814					✓			✓				<i>[Firma]</i>
8	01-07-2025	ERIK A. WAGNER A	52922616	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	<i>[Firma]</i>
9	01-07-2025	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93128134					✓			✓				<i>[Firma]</i>
10	01-07-2025	Sergio Vera A	93133403								✓				<i>[Firma]</i>
11	01-07-2025	Bryan Steven Cardenas L	1069178980								✓				<i>[Firma]</i>
12	01-07-2025	Defonso. Carmona	93124814								✓				<i>[Firma]</i>
13	01-07-2025	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93128134	✓					✓		✓				<i>[Firma]</i>
14	01-07-2025	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93128134	✓					✓		✓				<i>[Firma]</i>

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

ANEXO 5

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	CODIGO: SST-F0-008 FECHA DE CREACION: JUNIO 2023 VERSION: 01
PERMISO DE USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS		

1. DATOS BASICOS DEL PERMISO

Empresa: Jorge Edgar Rubio C.	Ciudad: Girardot (cund.)	Consecutivo: 02
Proceso: Perforación de pozo canino	Ubicación donde se realiza el trabajo: Quebrada San Jorge	
Fecha de Inicio: 14-07-2025	Fecha de Finalización: 19-07-2025	Vigencia del Permiso: 7 días.
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM.	

Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma
93128134	MANO GOMEZ VASQUEZ	MAESTRO.	Si	<i>[Firma]</i>

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos **Demolicion** a realizar y ubicación:
DEMOLICION ROCA PARA EL REPRESENTANTO DIRECCION AV. CAUSE DE LA QUEBRADA SAN JORGE.

ITEM	Si	No	N/A	ITEM	Si	No	N/A
------	----	----	-----	------	----	----	-----

ESTADO DE LAS EXTENSIONES				ESTADO DEL TALADRO			
¿La extensión es encauchada?	☒			MARCA MOLITION HAMMER	REFERENCIA D25780-B3 1838.		
¿La extensión cuenta con clavija macho?	☒			Verifique el estado del interruptor del encendido y que no tenga corto circuito		☒	
¿La extensión cuenta con clavija hembra?	☒			Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a la toma corriente	☒		
¿La extensión se encuentra pelada?		☒		Verifique el estado de la broca y si se encuentra apta para realizar la labor	☒		
¿La extensión se encuentra apta para la labor?	☒			Verificar que la broca coincide con el diámetro del mandril	☒		
ESTADO DE LA PULIDORA				Verifique el correcto funcionamiento de mandos de control			
					☒		

MARCA DEWALT.	REFERENCIA DWE4010-(TA25)	INSPECCIONES REALIZADAS					
Verifique el estado del interruptor del encendido y que no tenga corto circuito	☒	¿El sitio donde se realiza el trabajo se encuentra señalizado?	☒				
Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a la toma	☒	¿Los trabajadores han recibido capacitación sobre los Peligros y Riesgos presentes en el área de trabajo?	☒				
Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad a realizar	☒	¿Los trabajadores cuentan con los EPP necesarios para la labor?	☒				
Verifique la pulgata de la pulidora para así mismo colocar el disco correcto	☒	¿Se restringe o protege el área de peligro de explosión o incendio?	☒				
Verifique que el disco no presente fisuras o desgaste excesivo	☒	¿Se han previsto medios de primeros auxilios en caso de ser necesarios?	☒				
Verifique que la pulidora cuente con el protector	☒	¿Se realizó inspección pre-operacional a las herramientas?	☒				
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:		OJOS ☒	MANOS ☒	CABEZA ☒	RESPIRATORIA ☒		
		CARA ☒	PIES ☒	CUERPO ☒	AUDITIVA ☒		

4. VALIDACION DEL PERMISO POR PARTE DEL AREA SST Y PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

<i>[Firma]</i> Validación día 1*	<i>[Firma]</i> Validación día 2*	<i>[Firma]</i> Validación día 3*	<i>[Firma]</i> Validación día 4*	<i>[Firma]</i> Validación día 5*	<i>[Firma]</i> Validación día 6*	Validación día 7*
<i>[Firma]</i> Validación día 1*	<i>[Firma]</i> Validación día 2*	<i>[Firma]</i> Validación día 3*	<i>[Firma]</i> Validación día 4*	<i>[Firma]</i> Validación día 5*	<i>[Firma]</i> Validación día 6*	Validación día 7*

Nombre y Cedula del Inspector SST y coordinador de TSA	Firma
ERIK A. LONDETA ALI	<i>[Firma]</i>

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		PERMISO DE USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS		CODIGO: SST-FD-006 FECHA DE CREACION: JUNIO 2025 VERSION: 01	
1. DATOS BASICOS DEL PERMISO							
Empresa: Jorge Edgar Rubio C	Ciudad: Guirapota	Consecutivo: 03					
Proceso: PERFORACION DESPEJE CAMINO	Ubicación donde se realiza el trabajo: Quebrada San Jorge						
Fecha de Inicio: 21-07-2025	Fecha de Finalización: 26-07-2025	Vigencia del Permiso: 7 días					
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 PM						
Cedula (Ejecutor)	Nombres y Apellidos (Ejecutor)	Profesión	Verificación de la Seguridad Social	Firma			
93128134	MARIO GOMEZ VASQUEZ	MAESTRO	✓	[Firma]			
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR							
Tipos de trabajos a realizar y ubicación: DEMOLICIÓN ROCA PARA EL REPERTEAMIENTO. DIRECCIONAR CAUSE de la Quebrada San Jorge.							
ITEM	Si	No	N/A	ITEM	Si	No	N/A
ESTADO DE LAS EXTENSIONES				ESTADO DEL TALAORO			
¿La extensión es encauchada?	✓			MARCA MOLTON HAMMER	REFERENCIA D25980-B3 1878		
¿La extensión cuenta con clavija macho?	✓			Verifique el estado del interruptor del encendido y que no tenga corto circuito		✓	
¿La extensión cuenta con clavija hembra?	✓			Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a la toma corriente	✓		
¿La extensión se encuentra pelada?		✓		Verifique el estado de la broca y si se encuentra apta para realizar la labor	✓		
¿La extensión se encuentra apta para la labor?	✓			Verificar que la broca coincide con el diámetro del mandril	✓		
ESTADO DE LA PULIDORA				Verifique el correcto funcionamiento de mandos de control			
MARCA DEWALT	REFERENCIA DWE9010-(TALS)			INSPECCIONES REALIZADAS			
Verifique el estado del interruptor del encendido y que no tenga corto circuito	✓	✓		¿El sitio donde se realizará el trabajo se encuentra señalizado?	✓		
Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a la toma	✓			¿Los trabajadores han recibido capacitación sobre los Peligros y riesgos presentes en el área de trabajo?	✓		
Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad a realizar	✓			¿Los trabajadores cuentan con los EPP necesarios para la labor?	✓		
Verifique la pulgada de la pulidora para así mismo colocar el disco correcto	✓			¿Se retiró o protegió el área de peligro de explosión o incendio?	✓		
Verifique que el disco no presente fisuras o desgaste excesivo	✓			¿Se han previsto medios de primeros auxilios en caso de ser necesarios?	✓		
Verifique que la pulidora cuente con el protector	✓	✓		¿Se realizó inspección pre-operacional a las herramientas?	✓		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:				OJOS ✓	MANOS ✓	CABEZA ✓	RESPIRATORIA ✓
				CARA ✓	PIES ✓	CUERPO ✓	AUDITIVA ✓
4. VALIDACION DEL PERMISO POR PARTE DEL AREA SST Y PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD							
[Firma] Validación día 1°	[Firma] Validación día 2°	[Firma] Validación día 3°	[Firma] Validación día 4°	[Firma] Validación día 5°	[Firma] Validación día 6°	[Firma] Validación día 7°	
[Firma] Validación día 1°	[Firma] Validación día 2°	[Firma] Validación día 3°	[Firma] Validación día 4°	[Firma] Validación día 5°	[Firma] Validación día 6°	[Firma] Validación día 7°	
Nombre y Cedula del Inspector SST y coordinador de TSA				Firma			
[Firma]				[Firma]			

SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO
JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
CERTIFICADO DE APOYO TRABAJOS ELECTRICOS

CODIGO: SST-FO-018
 FECHA CREACION: 05/06/2025
 VERSION: 01

GENERALIDADES

FECHA DE APERTURA: 14-07-2025	FECHA DE CIERRE: 19-07-2025	EMPRESA EJECUTORA: JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	N° CERTIFICADO DE APOYO:
LUGAR/SITIO EXACTO: GIRASOL (cond) OBRA PUENTE SANTIAGO	EQUIPO A INTERVENIR/AISLAR:	N° PERMISO DE TRABAJO RELACIONADO:	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: CONEXIÓN DE TRAMINALIA Y EQUIPOS PARA MOTOBOMBAS Y MOTORHERRILLAS.		TENSIÓN:	ALTA (>35.000 V) MEDIA (>1.000 V) BAJA (<1.000 V) ☒

EPP Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	☒	GUANTES AISLANTES CERTIFICADOS CLASE I / II	☒	TAPETE / BUTACA AISLANTE CERTIFICADA	☒
PROTECCIÓN AUDITIVA	☒	GUANTES AISLANTES CERTIFICADOS CLASE III / IV	☒	PERTIGA AISLANTE CERTIFICADA	☒
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	TRAJE DE ARCO ELECTRICO CLASE IV (40 CL/CM2)	☒	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN	☒
BOTAS DIELECTRICAS	☒	TRAJE EN HOMEX DE 6 CAL/CM2	☒	HERRAMIENTA MANUAL AISLADA	☒
OVEROL DE TRABAJO SIN PARTES METALICAS	☒				

OTROS:

ESCRIBA LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

TESTER, ALICATES, PINZAS, DESTORNILLADOR.

PREPARACIÓN / AISLAMIENTO DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR

a) Equipo/cableado donde aislara, instálara el Bloqueo y etiquetado:

b) Equipo/cableado donde abrirá, instálara el Bloqueo y etiquetado:

REQUERIMIENTO

	SI	NO	N/A
Se realizó el corte de energía / aislamiento eléctrico	☒		
Se realizó el protocolo de bloqueo y etiquetado por las disciplinas y/o empresas participantes	☒		
Se verificó la ausencia de tensión con un equipo certificado	☒		
Cruce y aterramiento / Instalación de puestas a tierra	☒		
Señalización y demarcación del área de trabajo	☒		
Se ha identificado la presencia de líneas energizadas adyacentes	☒		
El personal que va a realizar la maniobra / trabajo es idóneo para la labor	☒		
La herramienta a utilizar está en buen estado y es aislada	☒		
Se cuenta con un procedimiento para la actividad y ha sido divulgado al grupo de trabajadores	☒		

OTROS:

FIRMAS DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE APOYO

RESPONSABLES	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	
AUTORIDAD DE ÁREA ELECTRICA								OBSERVACIONES
FIRMA SUPERVISOR DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	<i>A</i>	<i>FEIT</i>	<i>FEIT</i>	<i>FEIT</i>	<i>FEIT</i>	<i>FEIT</i>		
FIRMA COORDINADOR SST Y/O INSPECTOR SST								
FIRMA DEL EJECUTANTE Y/O LÍDER DEL EQUIPO DE TRABAJO	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>J</i>		

Como autoridad eléctrica confirmo que he revisado e identificado en sitio, las condiciones de riesgo presentes para el desarrollo del presente trabajo, he divulgado a los trabajadores las propuestas medidas de prevención para controlar los factores de riesgo.

Como supervisor confirmo a través de la firma del presente certificado de apoyo que las condiciones de seguridad y requerimientos del presente documento se encuentran dispuestas para el desarrollo de la labor.

Como Coordinador y/o Inspector SST confirmo mediante la firma del presente certificado de apoyo que he verificado las condiciones en la operación sea segura bajo Normas RETIE y NORMAS ELECTRICAS Vigentes a la fecha y el espacio donde se va a laborar así como el monitoreo de atmósferas peligrosas, conozco mis funciones como Coordinador y/o Inspector SST y el plan de emergencias.

Como supervisor ejecutante y ejecutor, confirmo que el grupo de trabajo es el adecuado para realizar la labor, conozco los peligros y riesgos a los cuales van a estar expuestos, se les ha explicado las medidas de control y se han implementado las mismas en pro de evitar la ocurrencia de eventos no deseados. Las herramientas han sido inspeccionadas y se cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor.

FIRMAS DE CIERRE DEL CERTIFICADO DE APOYO

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA Y HORA
SUPERVISOR EMPRESA EJECUTANTE	SERGIO ANDER VERGA	<i>S</i>	19-07-2025 12:00 m
EJECUTANTE	MARIO GONZALEZ VARGAS	<i>M</i>	19-07-2025 12:00 m
FIRMA COORDINADOR SST Y/O INSPECTOR SST	EDGAR CORTES OLIVERA	<i>E</i>	19-07-2025 12:00 m

Como ejecutor confirmo que el trabajo/actividad se ha concluido de acuerdo a lo planeado. El área de trabajo ha quedado en óptimas condiciones de orden y aseo. Quedan en funcionamiento los sistemas de protección o seguridad de los equipos y/o sistemas intervenidos.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 6

JOSÉ EDGAR RUBIO CALDERÓN		CÓDIGO: SST-FO-007
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 08-06-2025
REGISTRO DE INSPECCIONES DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES EN EL SSGST		VERSION 1

DESDE EL DÍA 01 MES: 07 AÑO: 2025 HORA: _____ HASTA EL DÍA: 05 MES: 07 AÑO: 2025 HORA: _____
 PROYECTO: OBPA PUNTE Quebrada 5 Jirca AREA DONDE SERA REALIZADO EL TR: Quilabot (Card) OBPA PUNTE San Jorge
 OFICIO O TAREA A REALIZAR: ESTUDIO TOPOGRAFICO

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:	NOMBRE	CARGO	Nº IDENTIFICACIÓN	FIRMA
PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO:	Mario GOMEZ VASQUEZ	MAESTRO	931258134	
	ORLANDO GARMONA D	TOPOGRAFIA	93124814	

ID	EQUIPO O SISTEMAS A UTILIZAR	HERRAMIENTAS	INSUMOS, MATERIALES Y/O QUIMICOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA			BUE	
2				REG	
3				REAL	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

LISTA DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área o terreno se encuentra estable, libre de movimientos de tierra u/o grades o arenas movedizas.	✓			
El estado del clima para trabajar en la operación se encuentra sin vientos, sin rayos, ni lluvias frecuentes en la zona.	✓			
Se tiene demarcada y señalizada el área (conos, paletas, cinta de seguridad).	✓			
Para la comunicación se cuenta con radios punto a punto y linterna.	NO			
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Casco de seguridad, cachucha, guantes, monogafas, protección auditiva, calzado de seguridad, overol completo y cambiuso.	✓			
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Escafandra (monje), mascarilla, tapabocas, visor, Peto, Cantilleras.	✓			
En caso que el trabajo de demolición sea en altura los trabajadores tienen sus elementos de seguridad (arnes, líneas de vida (cuerdas), eslingas, mosquetones, deslizador, frenos, deslizador, silla).	N/A			
La herramienta está en buen estado y son las indicada para realizar la actividad.	✓			
La operación cuenta con accesos personales definidos, libres de obstáculos y bien señalizados.	✓			
Se protegen los vacíos con barandillas, rodapiés y cintas.	✓			
Los andamios están en buen estado, armados de acuerdo al procedimiento de seguridad.	N/A			
Las escaleras están en buen estado y cumplen con las normas de seguridad.	N/A			
Se tienen definidas áreas para el almacenamiento de: reutilizables y escombros y están debidamente señalizadas y demarcadas.	✓			
El material de desecho es depositado en las áreas asignadas.	✓			
Las sustancias químicas utilizadas dentro del proceso o en la operación, se encuentran almacenadas y protegidas de la lluvia y el calor.	✓			
Las sustancias químicas encontradas en el proceso y/o operación se encuentran debidamente selladas en sus embases y bajo condiciones de seguridad en almacenamiento de sustancias químicas.	✓			
Las sustancias químicas utilizadas se encuentran rotuladas y con la debida hola de seguridad MSM.	✓			
Los trabajadores utilizan las vías y accesos personales.	✓			

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS-EPP)	ENTREGA Y/O CAMBIO	NOMBRE	FIRMA
JEAN (PANTALON DE TRABAJO)			
CAMBIUSO			
CASCO			
BOTAS PUNTA DE ACERO			
BOTAS CAUCHO			
MONOGAFAS			
GAFAS DE POLICARBONATO (TRANSPARENTES / OSCURAS)			
CARETA DE ESMERILAR			
CARETA PARA SOLDAR			
CARETA MEDIA CARA			
CARETA FULL FACE			
FILTROS INORGANICOS			
TAPABOCAS (N95 INDUSTRIAL DESECHABLE)	✓	Orlando GARMONA	

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		CÓDIGO: SST-FQ-007
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 05-06-2025
REGISTRO DE INSPECCIONES DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES EN EL SGSST		VERSION 1

DESDE EL DÍA: 07 MES: 07 AÑO: 2025 HORA:

HASTA EL DÍA: 12 MES: 07 AÑO: 2025 HORA:

PROYECTO: PUNTE QUEBRADA SAN JOSE AREA DONDE SERA REALIZADO EL TR: GIATLAND) PTE Quebrada San Jose

OFICIO O TAREA A REALIZAR: Redireccionamiento de la Quebrada y estudio topografico

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	NOMBRE	CARGO	N° IDENTIFICACIÓN	FIRMA
PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO:	Mario Gomez Usque	Ing. de Topografia	931248134	[Firma]
	DELANO CARMONA D	Topografo	93124814	

EQUIPOS O SISTEMAS PUNTUALES DEBEN SER UTILIZADOS Y/O BLOQUEADOS PARA REALIZAR EL TRABAJO:

ID	EQUIPO O SISTEMAS A UTILIZAR	HERRAMIENTAS	INSUMOS, MATERIALES Y/O QUIMICOS	ESTADO	OBSERVACIONES
1	EQUIPOS de TOPOGRAFIA		Quinto de Topografia	BUE	/
2				REG	
3				MAL	
4					
5	TALADRO	PALA - VILLAS	GABINA	BUE	/
6				REG	
7				MAL	
8					
9	MOTOR VIBRA			BUE	/
10				REG	
11				MAL	
12					

LISTA DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Si área o terreno se encuentra estable, libre de movimientos de tierra v/o grietas o arenas movedizas.	SI	/	/	
El estado del clima para trabajar en la operación se encuentra sin vientos, sin rayos, ni lluvias frecuentes en la zona.	SI	/	/	
Se tiene demarcada y señalizada el área (conos, paletas, cinta de seguridad).	SI	/	/	
Para la comunicación se cuenta con radios punto a punto y linterna.	SI	/	/	
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Casco de seguridad, cachucha, guantes, monogafas, protección auditiva, calzado de seguridad, overol completo y canchales.	SI	/	/	
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Escaladora (monje), mascarilla, tapabocas, visor, Peto, Canilleras.	SI	/	/	
En caso que el trabajo de demolición sea en altura los trabajadores tienen sus elementos de seguridad (arnes, línea de vida (cuerdas), eslingas, mosquetones, deslizador, frenos, desancladores, etc).	N/A	/	/	
La herramienta esta en buen estado y con las indicadas para realizar la actividad.	SI	/	/	
La operación cuenta con accesos peatonales definidos, libres de obstáculos y bien señalizados.	SI	/	/	
Se protegen los vacíos con barandillas, rodapiés y cintas.	SI	/	/	
Los andamios están en buen estado, armados de acuerdo al procedimiento de seguridad.	N/A	/	/	
Las escaleras están en buen estado y cumplen con las normas de seguridad.	N/A	/	/	
Se tienen definidas áreas para el almacenamiento de: reutilizables y escombros y están debidamente señalizados y demarcados.	SI	/	/	
El material de desecho es depositado en las áreas asignadas.	SI	/	/	
Las sustancias químicas utilizadas dentro del proceso o en la operación, se encuentran almacenadas y protegidas de la lluvia y el calor.	SI	/	/	
Las sustancias químicas encontradas en el proceso y operación se encuentran debidamente selladas en sus embases y bajo condiciones de seguridad en almacenamiento de sustancias químicas.	SI	/	/	
Las sustancias químicas utilizadas se encuentran rotuladas y con la debida hoja de seguridad MSDS.	SI	/	/	
Los trabajadores utilizan las vías y accesos peatonales.	SI	/	/	

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS-EPP)	ENTREGA Y/O CAMBIO	NOMBRE	FIRMA
JEAN (PANTALON DE TRABAJO)	/	/	/
CAMBIO	/	/	/
CASCO	/	/	/
BOTAS PUNTA DE ACERO	/	/	/
BOTAS CAUCHO	/	/	/
MONOGAFAS	/	/	/
GAFAS DE POLICARBONATO (TRANSPARENTES / OSCURAS)	/	/	/
CARETA DE ESMERILAR	/	/	/
CARETA PARA SOLDAR	/	/	/
CARETA MEDIA CARA	/	/	/
CARETA FULL FACE	/	/	/
FILTROS INORGANICOS	/	/	/
TAPABOCAS (N95/ INDUSTRIAL DESECHABLE)	/	/	/

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		CÓDIGO: SST-FQ-007
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 06-06-2025
REGISTRO DE INSPECCIONES DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES EN EL SGSST		VERSION 1

DESDE EL DÍA: 19 MES: 02 AÑO: 2025 HORA: _____ HASTA EL DÍA: 19 MES: 02 AÑO: 2025 HORA: _____
 PROYECTO: Puente Quebrada San Jorge AREA DONDE SERA REALIZADO EL TR: GRUPO (CUMD) PTE Quebrada San Jorge
 OFICIO O TAREA A REALIZAR: ESTUDIO TOPOGRAFICO y RECONSTRUCCION DE LA QUEBRADA SAN JORGE

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:	NOMBRE	CARGO	N° IDENTIFICACION	FIRMA
PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO:	HAYD GOMEZ VASQUEZ	MAESTRO	93124814	[Firma]
	ORLANDO CARMONA D	TOPOGrafo	93124814	[Firma]

EQUIPOS O SISTEMAS PUNTUALES DEBEN SER UTILIZADOS Y/O BLOQUEADOS PARA REALIZAR EL TRABAJO:							
ID	EQUIPO O SISTEMAS A UTILIZAR	HERRAMIENTAS	INSUMOS, MATERIALES Y/O QUIMICOS	ESTADO			OBSERVACIONES
				BUEN	REG	MAL	
1	EQUIPOS de TOPOGRAFIA TRIADADO MOTORBOMBA	PARA VAIDE	BARRIOS de TOPOGRAFIA GASOLINA	/	/	/	
2				/	/	/	
3				/	/	/	
4				/	/	/	
5				/	/	/	
6				/	/	/	
7				/	/	/	
8				/	/	/	
9				/	/	/	
10				/	/	/	

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El área o terreno se encuentra estable, libre de movimientos de tierra y/o crecidas o anegales movilizables.	/	/	/	
El estado del clima para trabajar en la operación se encuentra sin vientos, sin rayos, ni lluvias frecuentes en la zona.	/	/	/	
Se tiene demarcada y señalizada el área (conos, paletas, cinta de seguridad).	/	/	/	
Para la comunicación se cuenta con radios punto a punto y internas.	/	/	/	
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Casco de seguridad, cachucha, guantes, monogafas, protección auditiva, calzado de seguridad, overol completo y cambruso.	/	/	/	
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Escafandra (monje), mascarilla, tapabocas, visor, Peto, Canilleras.	/	/	/	
En caso que el trabajo de demolición sea en altura los trabajadores tienen sus elementos de seguridad (arnes, línea de vida (cuerdas), eslingas, mosquetones, destrozadores, francos, desancladores, silla).	N/A	/	/	
La herramienta está en buen estado y son las indicadas para realizar la actividad.	/	/	/	
La operación cuenta con amosos personales definidos, libres de obstáculos y bien señalizados.	/	/	/	
Se protegen los ruidos con barandillas, rodapiés y cintas.	/	/	/	
Los andamios están en buen estado, armados de acuerdo al procedimiento de seguridad.	N/A	/	/	
Las escaleras están en buen estado y cumplen con las normas de seguridad.	N/A	/	/	
Se tienen definidas áreas para el almacenamiento de: reutilizables y escombros y están debidamente señalizados y demarcados.	/	/	/	
El material de desecho es depositado en las áreas asignadas.	/	/	/	
Las sustancias químicas utilizadas dentro del proceso o en la operación, se encuentran almacenadas y protegidas de la lluvia y el calor.	/	/	/	
Las sustancias químicas encontradas en el proceso y/o operación se encuentran debidamente señadas en sus embases y bajo condiciones de seguridad en almacenamiento de sustancias químicas.	/	/	/	
Las sustancias químicas utilizadas se encuentran rotuladas y con la debida hoja de seguridad MSM.	/	/	/	
Los trabajadores utilizan las vías y accesos oficiales.	/	/	/	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS-EPP)	ENTREGA Y/O CAMBIO	ROMBRE	FIRMA
JEAN (PANTALON DE TRABAJO)			
CAMBIUSO			
CASCO			
BOTAS PUNTA DE ACERO			
BOTAS CAUCHO			
MONOGAFAS			
GAFAS DE POLICARBONATO (TRANSPARENTES / OSCURAS)			
CARETA DE ESMERILAR			
CARETA PARA SOLDAR			
CARETA MEDIA CARA			
CARETA FULL FACE			
FILTROS INORGANICOS			
TAPABOCAS (NRS/ INDUSTRIAL DESECHABLE)	SI	HAYD GOMEZ VASQUEZ	[Firma]

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON		CÓDIGO: SST-FQ-007	
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 06-06-2025	
REGISTRO DE INSPECCIONES DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES EN EL SGSST		VERSION 1	

DESDE EL DÍA 21 MES: 03 AÑO: 2025 HORA: _____

PROYECTO: OBRA PUNTE QUEBRADA S. JORDAN AREA DONDE SERA REALIZADO EL TR: GRABAT (Cnd) OBRA PUNTE QUEBRADA S. J.

HASTA EL DÍA: 26 MES: 03 AÑO: 2025 HORA: _____

OFICIO O TAREA A REALIZAR: POSTURA DE JARRINES Viales para OBRA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:	NOMBRE	CARGO	N° IDENTIFICACIÓN	FIRMA
PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO:	<u>Harold Gomez Vasquez</u>	<u>Maestro</u>	<u>93128134</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>ORLANDO CARMONA D</u>	<u>Topografo</u>	<u>93124814</u>	<u>[Firma]</u>

EQUIPOS O SISTEMAS PUNTUALES DEBEN SER UTILIZADOS Y/O BLOQUEADOS PARA REALIZAR EL TRABAJO:						
ID	EQUIPO O SISTEMAS A UTILIZAR	HERRAMIENTAS	INSUMOS, MATERIALES Y/O QUIMICOS	ESTADO		OBSERVACIONES
1	<u>TRIPIE</u>	<u>TRINCHETA - PATA</u>	<u>COMPAS -</u>	<u>BUEB</u>	<u>REG</u>	<u>FINAL</u>
2		<u>ESPALMA - PATA</u>	<u>REVELO</u>			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD						OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A			
El área o terreno se encuentra estable, libre de movimientos de tierra y/o gradas o arenas movedizas.	<u>VS</u>					
El estado del clima para trabajar en la operación se encuentra sin vientos, sin rayos, ni lluvias frecuentes en la zona.	<u>VS</u>					
Se tiene demarcada y señalizada el área (conos, paletas, cinta de seguridad).	<u>VS</u>					
Para la comunicación se cuenta con radios punto a punto y linterna.	<u>VS</u>					
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Casco de seguridad, cachucha, guantes, monogafas, protección auditiva, calzado de seguridad, overol completo y cambuso.	<u>VS</u>					
Los trabajadores cuentan con el equipo de protección personal requerido para desarrollar la actividad: Escalandra (monja), mascarilla, tapabocas, visor, Peto, Camiseras.	<u>VS</u>					
En caso que el trabajo de demolición sea en altura los trabajadores tienen sus elementos de seguridad (arnes, línea de vida (cuerdas), eslingas, mosquetones, destiladores, frenos, desancladores, silla).	<u>VS</u>					
La herramienta está en buen estado y son las indicadas para realizar la actividad.	<u>VS</u>					
La operación cuenta con accesos peatonales definidos, libres de obstáculos y bien señalizados.	<u>VS</u>					
Se protegen los vacíos con barandillas, rodapiés y cintas.	<u>VS</u>					
Los andamios están en buen estado, armados de acuerdo al procedimiento de seguridad.	<u>N/A</u>					
Las escaleras están en buen estado y cumplen con las normas de seguridad.	<u>N/A</u>					
Se tienen definidas áreas para el almacenamiento de: reutilizables y escombros y están debidamente señalizadas y demarcadas.	<u>VS</u>					
El material de desecho es depositado en las áreas asignadas.	<u>VS</u>					
Las sustancias químicas utilizadas dentro del proceso o en la operación, se encuentran almacenadas y protegidas de la lluvia y el calor.	<u>VS</u>					
Las sustancias químicas encontradas en el proceso y/o operación se encuentran debidamente selladas en sus envases y bajo condiciones de seguridad en almacenamiento de sustancias químicas.	<u>VS</u>					
Las sustancias químicas utilizadas se encuentran rotuladas y con la debida hoja de seguridad MSDS.	<u>VS</u>					
Los trabajadores utilizan las vies y accesos peatonales.						

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs-EPP)	ENTREGA Y/O CAMBIO	NOMBRE	FIRMA
JEAN (PANTALON DE TRABAJO)			
CAMBUSO			
CASCO			
BOTAS PUNTA DE ACERO			
BOTAS CAUCHO			
MONOGAFAS	<u>✓</u>	<u>HAROLD GOMEZ VASQUEZ</u>	<u>[Firma]</u>
GAFAS DE POLICARBONATO (TRANSPARENTES / OSCURAS)			
CARETA DE ESMERILAR			
CARETA PARA SOLDAR			
CARETA MEDIA CARA			
CARETA FULL FACE			
FILTROS INORGANICOS			
TAPABOCAS (MSB/ INDUSTRIAL DESECHABLE)	<u>✓</u>	<u>ORLANDO CARMONA</u>	<u>[Firma]</u>

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 7

[illegible]

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

ANEXO 8

CODIGO: SST-FO-016
FECHA CREACION: 06/06/2025
VERSION: 01

FECHA DE APERTURA: 19-07-2025		FECHA DE CIERRE: 19-07-2025		GENERALIDADES:		VERSION: 01	
LUGAR/SITIO EXACTO: Carretera (Km 1) Dpto. Pinar del Rio		EMPRESA EJECUTORA: Jorge Edgar Rubio		EQUIPO A INTERVENIR:		N° CERTIFICADO DE APOYO:	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						N° PERMISO DE TRABAJO RELACIONADO:	
Corre de Tubos con manguera pulidora							

EPP Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR INYECTAR CON M.					
CASCO DE SEGURIDAD	✓ SI	MASCARILLAS CON CARTUCHOS PARA GASES Y VAPORES ORGANICOS	N/A	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA	N/A.
GAFAS DE SEGURIDAD	✓ SI	MASCARILLA PARA POLVOS Y HUMOS METALICOS	✓ SI	EXTINTORES PORTATILES EN SITIO	✓ SI
CARETA PARA SOLDAR	N/A	GUANTES DE CARNAZA	✓ SI	MANGUERAS CONTRA INCENDIOS DISPONIBLES	N/A.
CARETA PARA ESMERILAR	✓ SI	PETO EN CARNAZA	✓ SI	MAMPARA DE PROTECCIÓN	N/A.
PROTECCION AUDITIVA	✓ SI	MANEAS EN CARNAZA	N/A	MEDIDOR DE ATMOSFERAS	✓ SI
OTROS:					N/A.

ESCRIBA LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

PULIDORA (DELWANT-DWE9010-TAZ)- Alicates- pinzas DESTORNILLADORES-
barra y GARNICHTA.

REQUERIMIENTO

RECOMENDACIÓN	SI	NO	N/A
Se analizaron los peligros y riesgos asociados a la actividad y fueron divulgados al personal involucrado.	SI		
El personal que realizara el trabajo de soldadura esta certificado / cuenta con las competencias.	SI		
Se requiere vigia ocupacional durante el desarrollo de la actividad.	SI		
El personal cuenta con sus elementos de protección completos y en buen estado.	SI		
El área de trabajo ha sido previamente limpiada, se encuentra ordena, libre de material combustible y libre de obstáculos.	SI		
El área se encuentra totalmente aislada.	SI		
Se han drenado completamente las líneas y cajas edycones, en encuentren completamente aisladas, bloqueadas y etiquetadas.	SI		
Se requiere purga la línea en caso de soldadura.	SI		
Se requiere de realizar monitoreo de atmósferas.	NA		
El medidor de monitoreo de atmósferas encuentra en buen estado y certificado.	NA		
Las condiciones atmosféricas son apropiadas y se verifican la dirección del viento.	NA		
El equipo o sistema a intervenir requiere de ventilación artificial.	SI		
Existe una distancia de seguridad entre soldadura y ayudantes.	NA		
Se cuenta con mamparas de seguridad elaboradas en material no combustible.	NA		
Los equipos se encuentran debidamente pterizados, en buen estado y han sido inspeccionados previamente.	NA		
El equipo de corte fue inspeccionado, cuenta con atrapa llamas y tiene válvula cheque.	SI		
Las pulidoras cuentan con guardas de seguridad y se encuentran en buen estado.	NA		
Se ha verificado el desarrollo de actividad simultaneas y se ha informado al personal vecino al punto de trabajo.	SI		
Fecha de última calibración del medidor de atmósferas:	SI		
RECOMENDACIÓN: En caso de presentarse lluvias suspender actividades.	NA		
	SI		

REPORTORE DE ATMOSFERA'S

Diligencia los resultados de los monitores de almacenamiento

[illegible]

FIRMAS DE APROBACIÓN Y REVALIDACIÓN DEL CERTIFICADO DE ACORDO

RESPONSABLES	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
FIRMA SUPERVISOR DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	/
FIRMA DEL EJECUTANTE Y/O LÍDER DEL EQUIPO DE TRABAJO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	/
FIRMA COORDINADOR SST Y/O INSPECTOR SST							
OBSERVACIONES							

Como supervisor de la empresa responsable a través de INVI INGENIERIA S.A.S. confirmo a través de la firma del presente certificado de apoyo que las condiciones de seguridad y requisitos del presente documento se encuentran dispuestas para el desarrollo de la labor,

Como supervisor y jefe de equipo confirmo que el grupo de trabajo es el adecuado para realizar la labor, conozco los peligros y riesgos a los cuales van a estar expuestos, se les ha explicado las medidas de control y se han implementado las mismas en pro de evitar la ocurrencia de cualquier accidente. Las instrucciones han sido las adecuadas y se cuentan con los elementos de protección personal requeridos para la labor.

Como Coordinador y/o Inspector SST de INVERMONTESA, S.A. confirmo mediante la firma del presente certificado de apoyo que he verificado las condiciones en la operación del seguro y el espacio donde se va a laborar en el caso el cumplimiento de observaciones referidas.

FIRMAS DE CIENNA DEL CERTIFICADO DE APOYO

NOMBRE Y APELLIDOS

CONCLUSIONS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 9

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-011
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO PULIDORA	VERSIÓN: 01
		FECHA: JUNIO 2025

EQUIPO: Pulidora

OBRA Puente Queribana San Jorge DUEÑO DELWALT FECHA: 03-07-2025
 CONTRATISTA Mario Gomez SERIE (TA-15) MARCA DELWALT
Ref 93128134

ASPECTOS A INSPECCIONAR		BIEN	MAL	N.A	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO					
ESTADO DEL CABLE	Verifique el estado del cable que sean encauchetados, que estén libres de desgastes, roturas que estén afilados con alambre expuestos	✓			
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o afilados y que posean clavija para la conexión a los tomacorriente	✓			
	verificar que las instalaciones estén bien conectadas	✓			
ESTADO DEL BOTON ENCENDIDO	Verifique el estado del boton y que no tenga corto circuito	✓			
ESTADO DE MADRIL	Verificar que el madril este bien ajustado y que este debidamente asegurado	✓			
DISCO DE CORTE	Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad. Asbesto: corte metal - Diamantado: corte concreto o bloque	✓			
	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la pulidora	✓			
	Verifique que el disco no presente fisura o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones de la pulidora	✓			
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que la pulidora cuente con guarda de protección y que este correctamente asegurada	✓			
EXTINTOR	Verifique existencia de un extintor de 10 lbs con carga vigente cerca de la zona en donde va a realizar la actividad	✓			
Visto bueno del operador		✓			

[Firma]
 FIRMA DEL OPERADOR
 Mario Gomez Vasquez
 93128134

[Firma]
 FIRMA DEL INSPECTOR

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-011
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPO PULIDORA	VERSIÓN: 01
		FECHA: JUNIO 2025

EQUIPO: Pulidora

OBRA: Puente Aterrado San Jorge

FECHA: 17-07-2025

CONTRATISTA: CA-93128134

SERIE: DWE 400

MARCA: DEWALT
MARIO GOMEZ VASQUEZ

ASPECTOS A INSPECCIONAR		BIEN	MAL	N.A	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
INSPECCION VISUAL AL EQUIPO					
ESTADO DEL CABLE	Verifique el estado del cable que sean encauchados, que estén libres de desgastes, roturas que estén añadidos con alambre expuestos	✓			
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones estén en buen estado, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para la conexión a los tomacorriente	✓			
	verificar que las instalaciones estén bien conectadas	✓			
ESTADO DEL BOTON ENCENDIDO	Verifique el estado del boton y que no tenga corto circuito	✓			
ESTADO DE MADRIL	Verificar que el madril este bien ajustado y que este debidamente asegurado	✓			
DISCO DE CORTE	Verifique que el disco sea el adecuado para la actividad. Asbesto: corte metal - Diamantado: corte concreto o bloque	✓			
	Verifique que se encuentre instalado y asegurado correctamente a la pulidora	✓			
	Verifique que el disco no presente fisura o excesivo desgaste y que sea el adecuado de acuerdo con las revoluciones de la pulidora	✓			
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que la pulidora cuente con guarda de protección y que este correctamente asegurada	✓			
EXTINTOR	Verifique existencia de un extintor de 10 lbs con carga vigente cerca de la zona en donde va a realizar la actividad	✓			
Visto bueno del operador		✓			

FIRMA DEL OPERADOR

93128134
Mario Gomez Vasquez

FIRMA DEL INSPECTOR

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 10

[illegible]

[illegible]

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	--	--

ANEXO 11

Medellín, 4 de agosto de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa **JORGE EDGAR RUBIO CALDERON, CC C93396950**, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,




Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

ANEXO 5.


INFORME SOCIOAMBIENTAL

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

TABLA DE REVISIONES

VERSION	MODIFICACIONES	ELABORÓ	REVISÓ
1		Cargo: ASESOR SISO Licencia: 7608/2019	Cargo: Representante Legal
		Nombre: ERIKA C. WAGNER ARIAS	Nombre: JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
	FIRMA:		

APROBADO POR:


**ING. EDUARDO JOSE
VILLANUEVA HERNANDEZ**
 HERMANOS VILLANUEVA
 INGENIERIA S.A.S
 INTERVENTORIA DE OBRA

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02

Contrato De Obra N° 742 del 2025

PROYECTO:

CONTRATAR LA ELEBORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNCIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

PERIODO: 01 al 31 de Julio Del 2025

GIRARDOT – CUNDINAMARC

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objetivo la verificación el cumplimiento del Plan de manejo socio ambiental por parte **INGENIERO JORGE EDGAR RUBIO CALDERON**; mostrar que efectivamente, el estudio de evaluación de impacto ambiental y social posee un carácter sostenible, identificando y valorando los impactos ambientales y sociales generados por el proyecto, así como las medidas Preventivas y mitigadoras previstas en las órdenes ambiental y social.

El presente documento contiene el informe de gestión ambiental del 01 al 31 de Julio del 2025, donde se describen las actividades ambientales que se desarrollan y el cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental por parte **INGENIERO JORGE EDGAR RUBIO CALDERON**, el cual forma parte del Estudio de Impacto Ambiental.

OBJETIVOS:

- ✚ informar sobre la gestión socio ambiental de la “CONTRATACION PARA LA ELEBORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA”.
- ✚ Desarrollar actividades con el fin de gestionar los aspectos ambientales que puedan generar cambios en el medio ambiente y la comunidad.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Objeto del Proyecto: CONTRATACION PARA LA ELEBORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNCIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

DURACIÓN: 6 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

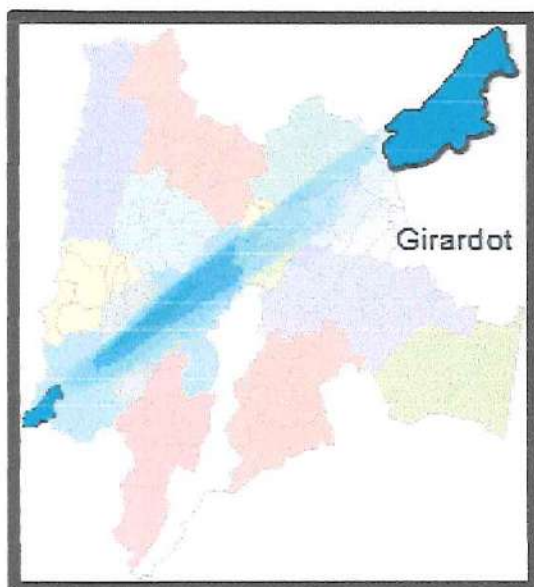

1. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

1.1. Localización general y área de influencia del proyecto

La intervención se desarrolla en la avenida Kennedy entre el barrio san Jorge y el barrio Kennedy del municipio de Girardot – Cundinamarca, a continuación, se muestra la ubicación general de las intervenciones a realizar.

2. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN COLOMBIA Y EN EL DEPARTAMENTO DEL CUNDINAMARCA

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



FUENTE: Galería de Mapas Alcaldía municipal de Girardot - Cundinamarca

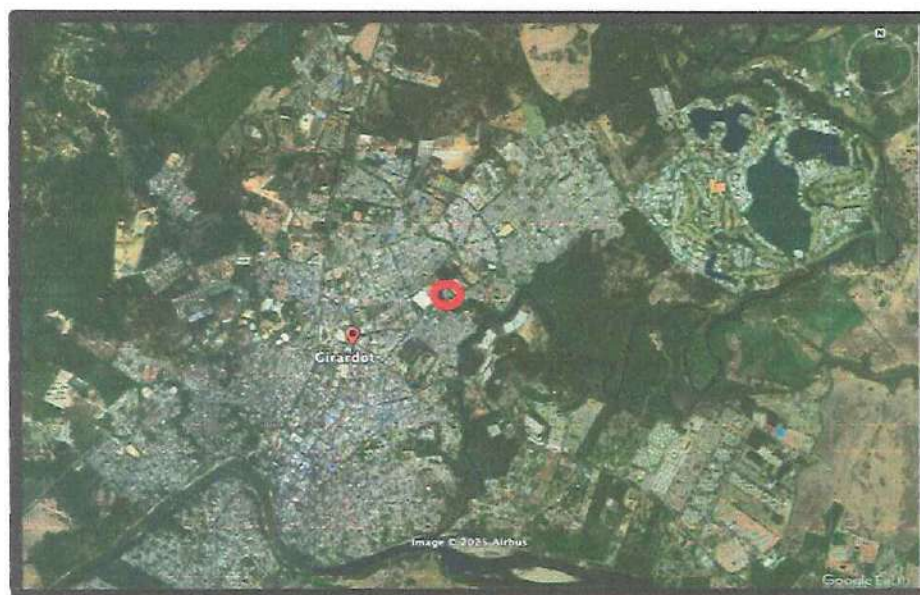
**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO



FUENTE: Google Earth



FUENTE: Google Earth

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

1. PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES. IMPACTOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE CONTROL

ACTIVIDAD DESARROLLADA	ASPECTO/ IMPACTO AMBIENTAL	ACCIÓN
Replanteo: proceso de definir y <u>medir</u> en un terreno las dimensiones de la obra donde se realizará la construcción	Consumo de papel	*Uso de papelería reciclable
Descapota: Consiste en el retiro de raíces y de suelos que contengan materia orgánica, arcillas expansivas o cualquier otro material inapropiado para la construcción de la obra.	Generación de material particulado	*Emisión de boletín informativo *Capacitación del personal Manejo, clasificación y disposición final de desechos biodegradables.
Excavación y Demolición: procesos de excavar, demoler y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, hormigones, y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según los planos de cada proyecto.	Generación de residuos sólidos, generación de material particulado	* Emisión de boletín informativo * Reutilización de material para rellenos *Programa de capacitación al personal. Manejo, clasificación y disposición final de desechos y RCD
Fundición: Consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad (vaciado)	Consumo de agua y energía, generación de residuos sólidos, generación de ruido, material particulado	*Emisión de boletín informativo *Reutilización de material *Reutilización del agua *Establecimiento del programa de capacitación del personal. *Inspección de los puntos* Conformación de grupo administrativo de gestión ambiental *Segregación de residuos.

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

2. INFORME DE GESTION AMBIENTAL

En el presente informe se reportan las actividades de gestión ambiental por parte de **JORGE EDGAR RUBIO CALDERON**

3.1 PLAN SOCIAL BASICO:

3.1.1 Atención al usuario: **JORGE EDGAR RUBIO CALDERON** cuenta con el correo electrónico Oficina.jorgerubio@gmail.com con el fin de recibir las peticiones en general respecto al proyecto; de igual manera la comunidad y trabajadores podrán expresar las inquietudes con el ingeniero residente de la obra y residente SST en las visitas diarias realizadas por el personal.

3.2 GESTIÓN SOCIAL:

3.2.1 Se emite boletín informativo para los predios donde se desarrollan la mejora según el inicio de cada proyecto. (se realiza el proceso según avances y frentes a intervenir) **ANEXO 2**

3.2.2 **Oficio Comunicación Riesgos presentes en la obra y medidas preventivas para la prevención y mitigación de Riesgos Ambientales.** Se entregó al momento de iniciar el proyecto en cada uno de los predios beneficiados un oficio donde se informará los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, el nivel de consecuencias frente a la afectación de los mismos; la obligación legal. Generando una mitigación de los mismos en unión a la comunicación. Los cuales se pueden exponer a las diferentes personas de la zona, este oficio también contiene las normas o medidas preventivas y mitigación del Riesgo Biológico virus, hongos y bacterias, animales a tener en cuenta durante el desarrollo de esta.

ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD

Tabla 1 Tabla de viviendas caracterizadas en el Barrio San Jorge, viviendas cercanas a la quebrada San Jorge

DIRECCION	MENORES NIÑAS	MENORES NIÑOS	ADULTOS HOMBRES	ADULTOS MUJERES	ESTADO	NIVEL DE RIESGO
CARRERA 5 N° 35 - 69 BARRIO SAN JORGE	1	0	2	2	HABITABLE	EROSIÓN CAPA DE SUELO POR POSIBLE REMOCIÓN
CARRERA 5 N° 35 - 59 BARRIO SAN JORGE	1	0	1	1	HABITABLE	REMOCIÓN EN MASA
CARRERA 5 N° 35 - 53 BARRIO SAN JORGE	1	0	1	3	NO HABITABLE	EROSIÓN CAPA SUBSUELO POSIBLE REMOCIÓN EN MASA POR
CARRERA 5 N° 35- 65 BARRIO SAN JORGE	0	0	3	1	HABITABLE	TALUD NATURAL COLINDANTE CON EL CAÑO CANAL AGUAS

Tabla 2 relación de viviendas caracterizadas en el Condominio Villa Yaneth, viviendas cercanas a la quebrada San Jorge

DIRECCION	MENORES NIÑAS	MENORES NIÑOS	ADULTOS HOMBRES	ADULTOS MUJERES	ESTADO	NIVEL DE RIESGO
MANZANA 2 CASA 11 CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA YANETH	0	0	1	1	HABITABLE	PROCESO EROSIVO TALUD NATURAL COLINDANTE A

Tabla 3 relación de viviendas caracterizadas en la Magdalena III, viviendas cercanas a la quebrada San Jorge

DIRECCION	MENORES NIÑAS	MENORES NIÑOS	ADULTOS HOMBRES	ADULTOS MUJERES	ESTADO	NIVEL DE RIESGO
MANZANA F CASA 14 BARRIO LA MAGDALENA III	0	0	1	1	HABITABLE	EROSIÓN DE SUELO
MANZANA F CASA 1 BARRIO LA MAGDALENA III APARTAMENTO I	2	0	1	1	HABITABLE	EROSIÓN DE SUELO Y REMOCIÓN EN MASA
MANZANA F CASA 1 BARRIO LA MAGDALENA III APARTAMENTO II	0	1	1	3	HABITABLE	EROSIÓN SUELO Y REMOCIÓN EN MASA
MANZANA F CASA 15 BARRIO LA MAGDALENA III	0	0	1	1	HABITABLE	REMOCIÓN EN MASA
MANZANA F CASA 16 BARRIO LA MAGDALENA III	0	0	2	2	HABITABLE	REMOCIÓN EN MASA

3.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.3.1 Capacitación al personal: Se tiene establecido el programa de capacitación del personal; donde tiene en cuenta los riesgos a los que se exponen los trabajadores durante el desarrollo de las actividades, de igual manera al trabajador que ingresa por primera vez se le suministra la inducción al cargo. Y se le socializaron los roles y responsabilidades. **(ANEXOS presentados en el informe SST No. 02)**

SUMINISTRO DE EPP: Se hace entrega y cambio de elementos de protección personal de acuerdo al cargo y actividades desarrolladas. **(Anexos presentados en el informe SST N° 02)**

3.3.2 Demarcación: Se cuenta con centros de operaciones donde se reciben y acopia los diferentes materiales y equipos y herramientas utilizados en obra, y se acondiciona los puntos de los trabajadores.



SITIOS DE ACOPIO PROVISIONAL DE DESECHOS ORGANICOS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME
SOCIOAMBIENTAL No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



**SEÑALIZACION, DELIMITACION, DEMARCACION DE AREA TOTAL
Y BALIZACION DEMARCANDO ZONAS DE ALTO RIESGO EN OPERACION**

3.4 GESTIÓN AMBIENTAL

3.4.1 CONFORMACION GRUPO DE GESTION AMBIENTAL: JORGE EDGAR RUBIO CALDERON; Conformara comité de gestión ambiental con el fin de dar trámite los requerimientos, necesidades y tramites de los aspectos e impactos ambientales generados por el proyecto.

3.4.2 DEFINICION DE ESPACIO PARA DISPOSICIÓN RESIDUOS SOLIDOS (RCD).

ESCOMBRERA o SITIO DE DEPOSITO PARA EL MANEJO DE RCD

EL municipio de Girardot cuenta con un sitio establecido y autorizado para el manejo de los RCD aprobado por la Alcaldía de Girardot y certificado como sitio competente para tal manejo

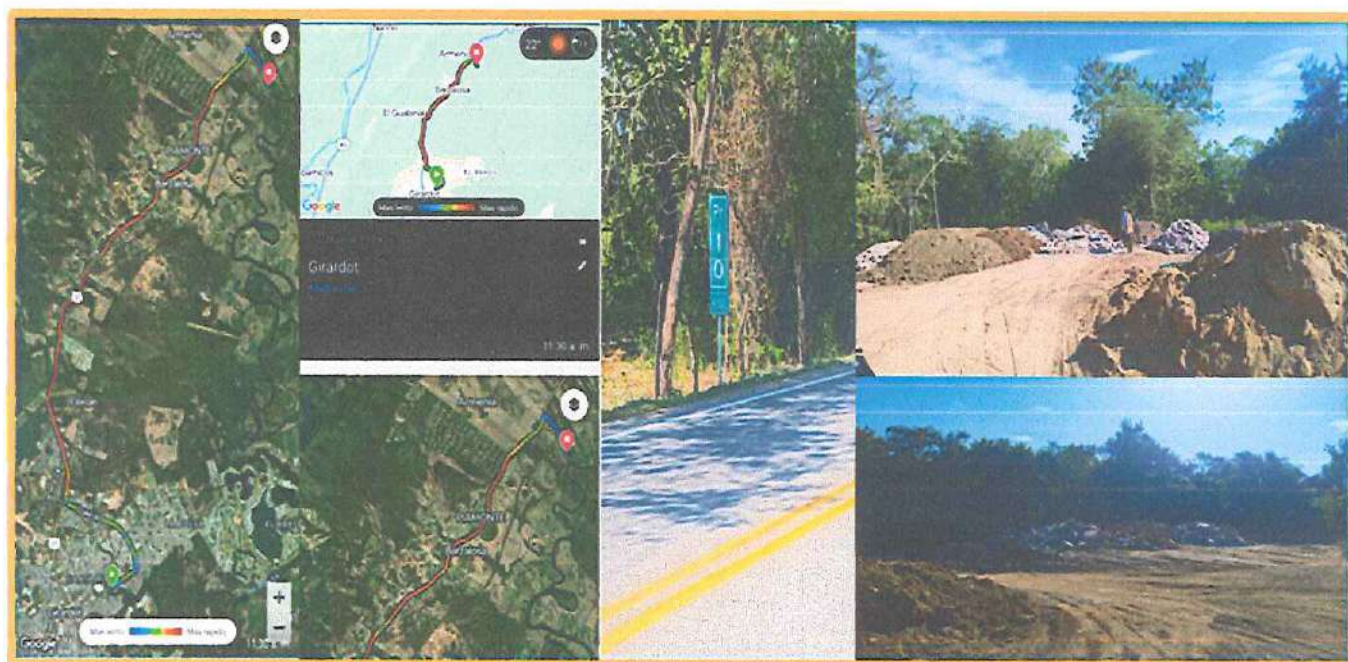
**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME
SOCIOAMBIENTAL No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**

por La CAR regional Alto Magdalena. Llamada Mina

LOS BARRANCOS la cual se encuentra hoy ubicada en la vereda presidente del Municipio de Girardot. El sector donde se encuentra ubicada la Mina los barrancos es un área con morfología plana, de forma alargada atravesada por un carreteable utilizado para el transporte de material y una antigua vía de ferrocarril, sin rieles.

Figura 6. Ubicación de la Mina Barrancos sitio de depósito de RCD



Ubicación de la Mina Los BARRANCOS sitio de depósito de RCD

Pertenece a la cuenca baja del río Bogotá, costado oriental subcuenca Apulo- Girardot. En los anexos se adjunta la resolución 1946 del 03 septiembre del 2014 apertura y funcionamiento de la Mina Los Barrancos. La cual es aceptada hacia su cierre como espacio provisional para recepción y manejo de RCP. A continuación, se denotan los comunicados para su acreditación y uso.

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME
SOCIOAMBIENTAL No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



ELEMENTOS Y CAPACITACIONES

**JORGE EDGAR
RUBIO
CALDERON**

**INFORME
SOCIOAMBIENTAL No. 02
Contrato De Obra N° 742 DEL 2025**



JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1: Capacitación aprovechamiento y uso del agua

ANEXO 2. Capacitación de Clasificación de Rotulación de Residuos sólidos y/o peligrosos.

ANEXO 3. Capacitación Manejo de conflictos socio ambientales

ANEXO 4 Resolución por autorización CAR

ANEXO 5 Desprendibles de PMA LOS BARRANCOS

ANEXO 6 Actas de vecindad

Los anexos relacionados con seguridad y salud en el trabajo de entrega en el informe 02

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 1

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: Girardot (Cund) 15-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS

Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: Aprovechamiento del AGUA.

Objetivo: Generar conciencia de la importancia de aprovechar
EL AGUA y el Buen Manejo de ella haciendo énfasis en las
diferentes técnicas en operaciones de obra para su control.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRE APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mons Gomez Vasquez 93128134 Maestro

Sergio A. Vera A 93133463 Residente obra

BRYAN STIVEN CAROLAS L 1069178480 PROF. Prevencion Ambiental

OBSERVACIONES:

Edna

Firma Responsable Actividad EDNA C. WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 2

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRARDOT (Cund) 21-07-2025
Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS
Centro de Trabajo: OBRA PUENTE QUEBRADA SAN JORGE
Hora inicio: 7:00 AM
Hora finalización: 7:30 AM

Tema: CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS

Objetivo: Identificar: Y/O PELIGROSOS.
COMO CLASIFICAR UN RESIDUO - Que importancia tiene la Resolucion
y como ELABORAR esta clasificacion.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPAÑA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mano Gonzalez Vasquez 93128130 Maestro

Sergio A. Vera A 93133403 Residente obra

BRYAN STEVEN CARDENAS 1069138480 PROF. PREPUESTO Bryan Cardenas

OBSERVACIONES:

Erika

Firma Responsable Actividad ERIKA C. WAGNER ARIAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 3

JORGE EDGAR RUBIO
CALDERON

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACION DIVULGACIONES CHARLAS Y
PAUSAS ACTIVAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

SST-FO-003

VERSION 01

FECHA 06/06/2025

Ciudad y fecha: GIRALDOT (Cund) 28-07-2025

Expositor: ERIKA CONSTANZA WAGNER ALIAS

Centro de Trabajo: OBRA QUEBRADA SAN JORGE

Hora inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:30 AM

Tema: MANEJO DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES

Objetivo: ABORDAR Y RESOLVER LAS DISPUTAS RELACIONADAS CON EL USO Y
MANEJO DE RECURSOS NATURALES, INVOLUCRADOS COMO DIFERENTES ACTORES SOCIALES
Y SUS INTERESES.



CHARLA



CAPACITACION



CAMPANA



PAUSAS ACTIVAS



DIVULGACION

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION

CARGO

FIRMA

Mano Gomez Vasquez 93/28134 Maestro [Firma]
Sergio A. Lora A. 93/33403 Residente obra [Firma]
BRYAN STEVEN CALZADAS 1069198480 PROF. PROYECTO [Firma]

OBSERVACIONES:

ECWA

Firma Responsable Actividad ERIKA C. WAGNER ALIAS

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 4



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena
República de Colombia

Girardot,

Doctor
SALOMON SAID ARIAS
Alcalde Municipal
planeacion-ambiental@girardot-cundinamarca.gov.co
Girardot (Cundinamarca)

CAR 21/04/2025 15:56
Al Contestar cite este No.: 03252002648
Origen: Dirección Regional Alto Magdalena
Destino: SALOMON SAID ARIAS
Anexos: Fol: 3

ASUNTO: Respuesta al radicado 20251039554: Consulta sobre autorización para depósito de RCD en el predio "Los Barrancos"

Cordial Saludo,

La Dirección Regional Alto Magdalena atendiendo su solicitud de información sobre la vigencia actual del instrumento ambiental (Plan de Manejo Ambiental) establecido por la Resolución CAR-1946 del 03 de septiembre de 2014, referente a la mina denominada "LOS BARRANCOS" localizada en la Vereda Presidente, jurisdicción del Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca, dentro del trámite de legalización de minería de hecho No. FLN-08A, respetuosamente se permite precisar lo siguiente:

Revisado el sistema de administración de expedientes – SAE, se pudo evidenciar la existencia de un trámite permisivo obrante con expediente CAR No. 47501 "solicitud de legalización de minería de hecho con expediente minero FLN – 08A", proceso actualmente activo en estado de seguimiento que contiene la Resolución No. 1946 del 03/09/2014 correspondiente al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental por parte de la CAR.

Esta resolución contiene todas las actividades y obligaciones que conforman el PMA, en su numeral 11 establece el Plan de cierre y abandono, el numeral 13 hace mención al relleno de los pit de minería abandonados, con materiales de excavación o escombros de construcción, para evitar mantener aguas estancadas que generen criaderos de zancudos.

Por otro lado, se menciona que la Agencia Nacional de Minería mediante la Resolución VSC No. 000808 del 13 de septiembre de 2024 en su artículo primero declara la terminación del contrato de concesión No. FLN-08A, recomendando en su parágrafo "no adelantar actividades mineras dentro del área del contrato y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 114 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas.

Artículo 114 – Código de Minas (Ley 685 de 2001).

Obligaciones en caso de terminación. El concesionario, en todos los casos de terminación del contrato, quedará obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionario.

Lo anterior permite entender que no es posible adelantar actividades de extracción minera en el



Girardot Calle 21 No. 8-23 Granada; Código Postal 252432

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 2902 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines institucionales de la Corporación



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena
República de Colombia

predio Los barrancos, pero el concesionario debe cumplir todas las obligaciones exigibles al tiempo de hacerse efectiva la terminación como las relacionadas con el cierre, clausura y restauración de las áreas afectadas por la explotación minera finalizada.

Referente a la vigencia del PMA el artículo 2 de la Resolución 1946 del 03/09/2014 señala que *"el PMA que se establece mediante la presente providencia tendrá un término de vigencia de acuerdo al contrato de concesión y correspondiente Registro Minero Nacional que se suscriba entre el interesado y la Agencia Nacional de Minería"*, queda claro que la actividad minera finalizó pero deben cumplirse las obligaciones de orden ambiental que buscan evitar la generación de pasivos ambientales por incumplimiento del concesionario.

Es de informar que el titular del contrato de concesión minera deberá dar cumplimiento al Artículo 4 en los siguientes numerales:

Numeral 11. Plan de cierre y Abandono

1. se deberá dar estricto cumplimiento a las actividades propuestas y descritas en el programa de revegetalización y diseño paisajístico. Las labores de revegetalización deberán iniciar inmediatamente después de que termine la explotación de cada talud o área de extracción.

2. se deberá acondicionar la zona explotada para uso productivo acorde con el Programa de trabajos y Obras – PTO y en armonía con los requerimientos ambientales necesario para la recuperación del área afectada.

3. se deberá realizar el desmantelamiento de la infraestructura que sirvió para la actividad minera; del mismo modo se deberá realizar una limpieza general del área.

13 se deberá hacer relleno de los pit de minería abandonados, con materiales de excavación o escombros de construcción, para evitar mantener aguas estancadas que generen criaderos de zancudos.

También se definen las competencias que corresponden a cada una de las autoridades encargadas del control y vigilancia de actividades mineras, dejando claro que la CAR cuenta con autonomía para decidir sobre el instrumento ambiental PMA que estableció para el manejo ambiental de la actividad minera el cual hace parte del expediente 47501.

La revisión normativa permitió aclarar que está vigente el Plan de Manejo Ambiental establecido por la CAR, es para garantizar la restauración de las zonas afectadas por la minería en el predio Los Barrancos, instrumento de seguimiento, control y vigilancia que no determina el tiempo para que el concesionario cumpla las obligaciones de orden ambiental.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, esperamos haber dado respuesta a su solicitud de información y aclaración del trámite ambiental que se adelanta en el expediente 47501, sobre el cual la Corporación mantiene su autonomía y facultad decisoria.

Cordialmente;

CAMILA ANDREA VELÁSQUEZ BAQUERO
Directora Regional Alto Magdalena



<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 2902 Correo electrónico: sau@car.gov.co



Girardot,

Señora
NUBIA SUAREZ TAPIERO
CORREGIDORA MUNICIPAL
corregimiento@girardot-cundinamarca.gov.co
Girardot (Cundinamarca)

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena
República de Colombia

CAR 21/04/2025 15:55
Al Contestar cite este No.: 03252002647
Origen: Dirección Regional Alto Magdalena
Destino: NUBIA SUAREZ TAPIERO
Anexos: Fol: 4

ASUNTO: Respuesta al radicado 20251043235: SOLICITUD DE INFORMACIÓN- ACLARACIÓN

Cordial Saludo:

En atención a la solicitud radicada con el N° 20251043235 del 10/04/2025, con asunto "Solicitud de Información – Aclaración", donde refiere: "En atención a la respuesta según radicado número 03252002236, este despacho solicita claramente de acuerdo a su respuesta, que tiempo tiene el concesionario, para cumplir las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacer efectiva dicha terminación, por la explotación minera, que al caso se terminó: según resolución VSC No. 000808 del 13/09/2024", la Dirección Regional Alto Magdalena se permite dar respuesta en los siguientes términos:

La Corporación mediante oficio No. 03252002236 del 07/04/2025, respondió oportuna y claramente, que revisado el sistema de administración de expedientes – SAE, se evidencia la existencia de un trámite permisivo obrante con expediente CAR No. 47501 "solicitud de legalización de minería de hecho con expediente minero FLN – 08A", proceso actualmente activo en estado de seguimiento que contiene la Resolución No. 1946 del 03/09/2014 correspondiente al establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental por parte de la CAR para el predio conocido como mina LOS BARRANCOS en el municipio de Girardot.

Buscando responder la solicitud de información y aclaración de la respuesta generada con oficio No. 03252002236 del 07/04/2025 frente al trámite ambiental (Expediente 47501), es importante acudir a la normatividad vigente para dilucidar igualmente responsabilidades, obligaciones y competencias de los actores involucrados, precisando lo siguiente:

El Decreto 1076 de 2015 en la sección 9 - Control y Seguimiento, artículo 2.2.2.3.9.1, en su párrafo 1, señala: "La autoridad ambiental que otorgo la licencia ambiental o estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas."

La Resolución 2206 del 27/12/2016 del MADS, correspondiente a los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera, señala referente a los PMA que: "Los programas de manejo ambiental



Girardot Calle 21 No.8-23 Granada; Código Postal 252432

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 2902 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena
República de Colombia

son el conjunto detallado de acciones y/o medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad".

La Guía para la Elaboración del Plan de Cierre y Abandono de Proyectos Mineros de la ANLA, en su numeral 1.3 señala: "Cada proyecto es diferente, el tiempo de cierre lo puede definir el tipo de minería y su escala, la complejidad de la operación, los impactos de la mina al ambiente, la efectividad en la implementación de medidas durante el cierre progresivo, y la participación de actores interesados. El cierre durará hasta el momento que la autoridad ambiental establezca que el área intervenida puede mantenerse estable en el tiempo sin necesidad de acción humana alguna".

Por otro lado, se revisa la Resolución No. 1946 del 03/09/2014 como instrumento de control y seguimiento ambiental establecido por la Corporación, encontrando que corresponde a un plan de manejo ambiental que acorde a la norma contiene medidas de cierre, clausura y restauración que deben ser ejecutadas, pero no define un plazo para su realización.

Esta resolución contiene todas las actividades y obligaciones que conforman el PMA, en su numeral 11 establece el Plan de cierre y abandono, el numeral 13 hace mención al relleno de los pit de minería abandonados, con materiales de excavación o escombros de construcción, para evitar mantener aguas estancadas que generen criaderos de zancudos.

Revisado el marco normativo alrededor del instrumento ambiental PMA LOS BARRANCOS, queda claro que el concesionario debe cumplir las obligaciones de orden ambiental para evitar la generación de pasivos ambientales, igualmente expresa que la competencia frente al seguimiento corresponde a la Corporación como autoridad ambiental que lo estableció.

No existe relación de subordinación o dependencia entre las competencias de la autoridad ambiental y minera frente a los instrumentos de control establecidos y/o generados por cada una, el cumplimiento de las obligaciones debe evaluarse separadamente sin convertirse en prerrequisito entre autoridades ya que las actividades a desarrollar son complementarias.

Para el caso particular del seguimiento a las actividades a desarrollar en la mina Los Barrancos que hacen parte del PMA establecido con Resolución No. 1946 del 03/09/2014, la Corporación conservará su autonomía y facultad decisoria frente al señalado instrumento.

Pasando a las decisiones de la autoridad minera frente a la explotación finalizada en el predio Los Barrancos, donde señalan igualmente la necesidad de ejecutar las medidas de orden ambiental, se procede a revisar el acto administrativo generado con las disposiciones respectivas para el tema ambiental realizando las siguientes precisiones:

La Resolución VSC No. 000808 del 13 de septiembre de 2024 en su artículo primero declara la terminación del contrato de concesión No. FLN-08A, recomendando en su



Girardot Calle 21 No. 8-23 Granada; Código Postal 252432

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 2902 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Alto Magdalena
República de Colombia

parágrafo "no adelantar actividades mineras dentro del área del contrato y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 114 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas.

Código de Minas (Ley 685 de 2001) Capítulo XII Terminación de la Concesión - Artículo 114:

Obligaciones en caso de terminación. El concesionario, en todos los casos de terminación del contrato, quedará obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionario.

El mismo Código de Minas (Ley 685 de 2001) - Capítulo XX Aspectos Ambientales en su artículo 209 señala lo siguiente:

Obligaciones en el caso de terminación. En todos los casos de terminación del título, el beneficiario estará obligado a hacer las obras y poner en práctica todas las medidas ambientales necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y frentes de trabajo.

Finalmente queda claro que la actividad minera finalizo quedando prohibida la extracción de materiales en el predio Los Barrancos por terminación del contrato de concesión minera, permaneciendo pendiente por parte del concesionario el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles al tiempo de hacerse efectiva la terminación.

También se definen las competencias que corresponden a cada una de las autoridades encargadas del control y vigilancia de actividades mineras, dejando claro que la CAR cuenta con autonomía para decidir sobre el instrumento ambiental PMA que estableció para el manejo ambiental de la actividad minera el cual hace parte del expediente 47501.

La revisión normativa permitió aclarar que está vigente el Plan de Manejo Ambiental establecido por la CAR, es para garantizar la restauración de las zonas afectadas por la minería en el predio Los Barrancos, instrumento de seguimiento, control y vigilancia que no determina el tiempo para que el concesionario cumpla las obligaciones de orden ambiental.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, esperamos haber dado respuesta a su solicitud de información y aclaración del trámite ambiental que se adelanta en el expediente 47501, sobre el cual la Corporación mantiene su autonomía y facultad decisoria.

Cordialmente;

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO
Directora Regional Alto Magdalena

Respuesta a: 20251043235 del 10/04/2025

Elaboró: Gustavo Jesus Velásquez Velandis / DRAM



Girardot Calle 21 No. 8-23 Granada; Código Postal 252432

<https://www.car.gov.co> Conmutador: 5801111 EXT 2900 Ext: 2902 Correo electrónico: sau@car.gov.co

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 5

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
01 | 07 | 2025

No. 1176

Razón Social: Jorge Rebo c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot Cend.

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

1: 35 PM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
01 | 07 | 2025

No. 1177

Razón Social: Jorge Rebo c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot Cend.

Placa: SOL 704

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

1: 50 PM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
01 | 07 | 25

No. 1178

Razón Social: Jorge Rebo c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

2: 35.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
01 | 07 | 25

No. 1179

Razón Social: Jorge Rebo c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: GQB 315

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

3: 15 PM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
01 07 25	1180

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: GQB 315

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

2: 15 PM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
01 07 25	1181

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot Card.

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

3: 30 PM

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
01 07 25	1182

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: GQB 315

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
01 07 25	0163

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TMJ 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
01	07	25

 N° 0164

Razón Social: Jorge Reboc

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
01	07	25

 N° 0165

Razón Social: Jorge Reboc

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
01	07	25

 N° 0166

Razón Social: Jorge Reboc

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
02	07	25

 No. 1183

Razón Social: Jorge Reboc

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot cord

Placa: YAB 572

Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

9: 45 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
02	07	25	

1184

Razón Social: Jorge Lebao c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot card

Placa: SOL 104

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLE-
VADO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

10:15 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
02	07	25	

1185

Razón Social: Jorge Lebao c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot.

Placa: SOL 104

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLE-
VADO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

11: 20 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
02	07	25	

1186

Razón Social: Jorge Lebao c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot.

Placa: SOL 104

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLE-
VADO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

1:15

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
02	07	25	

1187

Razón Social: Jorge Lebao c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot.

Placa: SOL 104

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLE-
VADO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

2: 20.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
02	07	25

No. 1188

Razón Social: Jorge Lebrija C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

3:20

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
02	07	25

No. 1189

Razón Social: Jorge Lebrija C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot cond.

Placa: SOL 704

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

3:30 PM

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
02	07	25

No. 0543

Razón Social: Jorge Lebrija C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot Cond

Placa: SLM 791

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

1:40 PM

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
02	07	25

No. 2000

Razón Social: Jorge Lebrija C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot cond.

Placa: SLM 791

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
02	07	25	0162

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
02	07	25	0160

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
02	07	25	0161

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
03	07	25	1191

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot (Carr.)

Placa: SOL 704

Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

1:50 PM

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
03	07	25

No. 1192

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOE 704

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

2:30 PM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
03	07	25

Nº 0232

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
03	07	25

Nº 0233

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
03	07	25

Nº 0234

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0235
03	07	25		

Razón Social: Jorge Rivas C

Obra: paso vehicular sin jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETOLLEADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0236
03	07	25		

Razón Social: Jorge Rivas C

Obra: paso vehicular sin jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETOLLEADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0237
03	07	25		

Razón Social: Jorge Rivas C

Obra: paso vehicular sin jorge

Municipio: Girardot

Placa: TM 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETOLLEADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0238
03	07	25		

Razón Social: Jorge Rivas C

Obra: paso vehicular sin jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETOLLEADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
04/07/25 No. 1193

Razón Social: Jorge Lebio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: 502 704

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETO LLEVADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

8:05 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
04/07/25 No. 1195

Razón Social: Jorge Lebio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: 502 704

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETO LLEVADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

9:30 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
04/07/25 No. 1194

Razón Social: Jorge Lebio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: 030 746

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETO LLEVADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

8:35.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
04/07/25 No. 1196

Razón Social: Jorge Lebio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: 030 746

Cantidad: 7 M3

RECIBIDO MATERIAL RETO LLEVADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

9:40 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1197

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PAISAJISTICA)
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
ABANDONADOS EN
AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

10:00 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1198

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOR 104

Cantidad: 7 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PAISAJISTICA)
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
ABANDONADOS EN
AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

10:30 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1199

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: OBV 746

Cantidad: 7 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PAISAJISTICA)
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
ABANDONADOS EN
AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

10:45 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1200

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PAISAJISTICA)
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
ABANDONADOS EN
AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
CONTROL INGRESO MATERIAL DE

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

11:10 AM.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1190

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot Concl

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

1:40 PM

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1202

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	1205

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOL 104

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
04/07/25	0239

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOL 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0240
04	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0241
04	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1203
05	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 532

Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1204
05	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 532

Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/20	0242

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SEM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/25	0243

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/25	0244

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/25	0245

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: paseo vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SEM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/26	0246

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/26	0248

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SEN 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/25	0249

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
05/07/25	0250

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17192

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
07	07	25	1209

Razón Social: Jagerobio C

Obra: paso vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

17309

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
07	07	25	1208

Razón Social: Jagerobio C

Obra: paso vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOR 104

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

17193

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
07	07	25	1207

Razón Social: Jagerobio C

Obra: paso vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: OB 146

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

17192

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
07	07	25	1206

Razón Social: Jagerobio C

Obra: paso vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

17301

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
07/07/25	1201

Razón Social: Jorge Iobio C

Obra: paso vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SOR 104

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

11:08

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
07/07/25	0251

Razón Social: Jorge Iobio C

Obra: paso vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
07/07/25	0252

Razón Social: Jorge Iobio C

Obra: paso vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
07/07/25	0253

Razón Social: Jorge Iobio C

Obra: paso vehicular san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
07	07	25	0254

Razón Social: Yorgelubio

Obra: pasavehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: DSE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
07	07	25	0255

Razón Social: Yorgelubio

Obra: pasavehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
07	07	25	0256

Razón Social: Yorgelubio

Obra: pasavehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
07	07	25	0271

Razón Social: Yorgelubio

Obra: pasavehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)
VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

171/25

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 0247
05	07	25	

Razón Social: Jorge Rubio C
 Obra: paso vehicular san jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: USE360
 Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1212
08	07	25	

Razón Social: Jorge Rubio C.
 Obra: paso vehicular san jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: YA3572
 Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
 COPIA OBRA (GENERADOR)

173/01

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1211
08	07	25	

Razón Social: Jorge Rubio C
 Obra: paso vehicular san jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SOL 704
 Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
 COPIA OBRA (GENERADOR)

173/01

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1210
08	07	25	

Razón Social: Jorge Rubio C
 Obra: paso vehicular san jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SOL 704
 Cantidad: **7 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
 COPIA OBRA (GENERADOR)

12/75
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
08	07	25	1515

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: pasaje vehicular en jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 15 M3 2 VIAJE

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
08	07	25	0257

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: pasaje vehicular en jorge

Municipio: Girardot

Placa: OSE360

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
08	07	25	0258

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: pasaje vehicular en jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
08	07	25	0259

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: pasaje vehicular en jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
08	07	25	0260

Razón Social: Yagerubio

Obra: pasos vehiculares san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADAS EN
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
08	07	25	0261

Razón Social: Yagerubio

Obra: pasos vehiculares san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADAS EN
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
08	07	25	0262

Razón Social: Yagerubio

Obra: pasos vehiculares san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SDM191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADAS EN
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
08	07	25	0263

Razón Social: Yagerubio

Obra: pasos vehiculares san Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADAS EN
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17196 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
09 07 25	1519 ✓

Razón Social: Jorge Lebrija
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: YAB 572
 Cantidad: 15 M3

RECIBIDO MATERIAL RETRO ILU. 30
 CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) *flus*
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17311 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
09 07 25	1518 ✓

Razón Social: Jorge Lebrija
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SOL 704
 Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINA LOS BARRANCOS
 RECIBIDO MATERIAL RETRO ILU. 30
 CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) *flus*
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17311

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
09 07 25	1517 ✓

Razón Social: Jorge Lebrija
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SOL 704
 Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINA LOS BARRANCOS
 RECIBIDO MATERIAL RETRO ILU. 30
 CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) *flus*
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17196 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
09 07 25	1516 ✓

Razón Social: Jorge Lebrija
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: YAB 572
 Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINA LOS BARRANCOS
 RECIBIDO MATERIAL RETRO ILU. 30
 CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) *flus*
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
09 07 25 N° 0264

Razón Social: joigerobio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTERMINACIÓN MINERA
(PIT) ABAJOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
04 07 25 N° 0265

Razón Social: joigerobio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SR m 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTERMINACIÓN MINERA
(PIT) ABAJOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
09 07 25 N° 0266

Razón Social: joigerobio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTERMINACIÓN MINERA
(PIT) ABAJOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
09 07 25 N° 0267

Razón Social: joigerobio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTERMINACIÓN MINERA
(PIT) ABAJOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17451 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
09/07/25	0268

Razón Social: Jorge Rubio

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: 50m 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
10/07/25	1523

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLENADO

2 Viajes

17197 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
10/07/25	1522

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLENADO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

17451

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
10/07/25	1521

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

RECIBIDO MATERIAL RETRO LLENADO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

17177
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
10	07	25	1520

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB572

Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
10	07	25	0269

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
10	07	25	0270

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
10	07	25	0272

Razón Social: Jorge Rebio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: 15 M3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA
CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
10 | 07 | 25 No. 0273

Razón Social: pergero d d

Obra: pasos vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
11 | 07 | 25 No. 1214

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: pasos vehicular san jorge

Municipio: Girardot

Placa: OBD 746

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

171945
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
11 | 07 | 25 No. 1213

Razón Social: Jorge Rubio C

Obra: pasos vehicular San jorge

Municipio: Girardot

Placa: OBD 746

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

17452
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
11 | 07 | 25 No. 1527

Razón Social: Jorge Rubio

Obra: pasos vehicular San jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

17452 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
11/07/25	1526

Razón Social: Jorge Lehoc
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: JVH 655 Ecceba
 Cantidad: 15 M3 2 Vajes internos

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) PLC
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

2 Vajes
internos

17194 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
11/07/25	1525

Razón Social: Jorge Lehoc
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: OBD 746
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) PLC
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

2 Vajes

17452 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
11/07/25	1524

Razón Social: Jorge Lehoc
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: JVH 655
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) PLC
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

2 Vajes

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
11/07/25	0274

Razón Social: Jorge Lehoc
 Obra: Paso Vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SRM 191
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA) PLC
 VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
11	07	25	

Nº 0275

Razón Social: Jorge Pablos

Obra: Paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
12	07	25	

Nº 1529

Razón Social: Jorge Pablos

Obra: Paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: OB D 746

Cantidad: **15 M3** Vagos 2

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINA LOS BARRANCOS

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
12	07	25	

Nº 1528

Razón Social: Jorge Pablos

Obra: Paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
12	07	25	

Nº 0276

Razón Social: Jorge Pablos

Obra: Paseo vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINA LOS BARRANCOS

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACION PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACION
 PAISAJISTICA)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
12	07	25	0277

Razón Social: Ingerebio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
12	07	25	0278

Razón Social: Ingerebio

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
14	07	25	1535

Razón Social: Jorge Pabloc

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: **15 M3** 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA "LOS BARRANCOS"

RECIBIDO MATERIAL RETROLLENADO

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
14	07	25	1534

Razón Social: Jorge Pabloc

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: **15 M3** 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

RECIBIDO MATERIAL RETROLLENADO

17199

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
14 07 25	1533

Razón Social: Jorge Reboloc

Obra: Paso Vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 15 M3 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

17454

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
14 07 25	1532

Razón Social: Jorge Reboloc

Obra: Paso Vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: 15 M3 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

17199

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
14 07 25	1531

Razón Social: Jorge Reboloc

Obra: Paso Vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YAB 572

Cantidad: 15 M3 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

17454

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
14 07 25	1530

Razón Social: Jorge Reboloc

Obra: Paso Vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: 15 M3 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
CAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
14 / 07 / 25 N° 0279

Razón Social: jorgero bro

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROYECTO DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
14 / 07 / 25 N° 0280

Razón Social: jorgero bro

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SDm 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROYECTO DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
14 / 07 / 25 N° 0281

Razón Social: jorgero bro

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROYECTO DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA
14 / 07 / 25 N° 0282

Razón Social: jorgero bro

Obra: pasovehicularsanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN) 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO DE MANEJO
AMBIENTAL POR LA CAR
(PROYECTO DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17455 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1542

Razón Social: Jorge Paboc
 Obra: paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: JVH 655
 Cantidad: 15 M3 2 Viajes

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1541

Razón Social: Jorge Paboc
 Obra: paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SRH 797
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17001 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1540

Razón Social: Jorge Paboc
 Obra: paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: YAB 572
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1539

Razón Social: Jorge Paboc
 Obra: paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SRH 791
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJÍSTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17435 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1538

Razón Social: Jorge Robo c.
 Obra: Paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: LVH 655
 Cantidad: 15 M3 2 Viges

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

17001 ✓

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1537

Razón Social: Jorge Robo c.
 Obra: Paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: YAB 572
 Cantidad: 15 M3 2 Viges

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	1536

Razón Social: Jorge Robo c.
 Obra: Paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SRM 791
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	No.
15 07 25	0283

Razón Social: Jorge Robo c.
 Obra: Paso vehicular San Jorge
 Municipio: Girardot
 Placa: SRM 191
 Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
 EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
 DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
 (PIT) ABANDONADOS EN
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
 AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
 (PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
 PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
 COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
16/07/25	0284

Razón Social: joigerabio

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXCAVACION MINERA
(PIT) DE LOS BARRANCOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
16/07/25	0285

Razón Social: joigerabio

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: TN)838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXCAVACION MINERA
(PIT) DE LOS BARRANCOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
16/07/25	0286

Razón Social: joigerabio

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: SAM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXCAVACION MINERA
(PIT) DE LOS BARRANCOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
16/07/25	0287

Razón Social: joigerabio

Obra: pasovehicular sanjorge

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXCAVACION MINERA
(PIT) DE LOS BARRANCOS EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17003.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1215
18	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: YA 8572

Cantidad: 7 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE SENCILLO
COPIA OBRA (GENERADOR)

12456

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1543
18	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: JVH 655

Cantidad: 15 M3 2 Veces

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 0288
18	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TM 838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 0289
18	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 0290
13	07	25	

Razón Social: Jaigerabro

Obra: pasos vehicular en jaiger

Municipio: Girardot

Placa: USE360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1544
22	07	25	

Razón Social: Jaiger Pba c

Obra: pasos vehicular en jaiger

Municipio: Girardot

Placa: SRH 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1545
22	07	25	

Razón Social: Jaiger Pba c

Obra: pasos vehicular en jaiger

Municipio: Girardot

Placa: SRH 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No. 1546
22	07	25	

Razón Social: Jaiger Pba c

Obra: pasos vehicular en jaiger

Municipio: Girardot

Placa: SRH 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1547
22	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

RECIBIDO MATERIAL

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1548
22	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

RECIBIDO MATERIAL

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1549
22	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

RECIBIDO MATERIAL

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.	1550
22	07	25		

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS

RECIBIDO MATERIAL

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
22	07	25

 N° 0291

Razón Social: JOGE RUBIO

Obra: Paso vehicular en San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TIV 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
22	07	25

 N° 0292

Razón Social: JOGE RUBIO

Obra: Paso vehicular en San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
23	07	25

 N° 0151

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular en San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
23	07	25

 N° 0150

Razón Social: Jorge Rubio C.

Obra: Paso vehicular en San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TIV 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0152
23	07	25		

Razón Social: Jorge Rbuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRH 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0153
23	07	25		

Razón Social: Jorge Rbuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0154
23	07	25		

Razón Social: Jorge Rbuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº	0155
23	07	25		

Razón Social: Jorge Rbuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRH 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
23	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 1838

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
23	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
23	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			No.
23	07	25	

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: 15 M3

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACIÓN PARA RETROLLENADO
DE ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VÁLIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0111

Razón Social: Jorge Lebano C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0112

Razón Social: Jorge Lebano C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0113

Razón Social: Jorge Lebano C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0114

Razón Social: Jorge Lebano C.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

17551
PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0115

Razón Social: Jorge Rebo C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0116

Razón Social: Jorge Rebo C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0117

Razón Social: Jorge Rebo C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0293

Razón Social: Jorge Rebo C

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
24	07	25	0294

Razón Social: pergerobro

Obra: pasacarril en san jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0118

Razón Social: jorge Rebro c.

Obra: Paso Vehicular San jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 197

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0119

Razón Social: jorge Rebro c.

Obra: Paso Vehicular San jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0120

Razón Social: jorge Rebro c.

Obra: Paso Vehicular San jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 197

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
25/07/25	0121

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
25/07/25	0122

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
25/07/25	0123

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
25/07/25	0124

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0125

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0127

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
25	07	25	0126

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SLM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0128

Razón Social: Jorge Lebuc

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
26/07/25	0129

Razón Social: Jorge Peño c.

Obra: Peso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

INTERNO.

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
26/07/25	0130

Razón Social: Jorge Peño c.

Obra: Peso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA VOLQUETA(TRANSPORTADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
26/07/25	0157

Razón Social: Jorge Peño c.

Obra: Peso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
26/07/25	0159

Razón Social: Jorge Peño c.

Obra: Peso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0148

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0149

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0158

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 797

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0295

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA (GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCIÓN CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
26	07	25	0296

Razón Social: Jorge Robo

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCIÓN CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0131

Razón Social: Jorge Robo

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCIÓN CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0132

Razón Social: Jorge Robo

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 177

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCIÓN CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0133

Razón Social: Jorge Robo

Obra: Paso vehicular en Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0134

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0135

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0137

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0136

Razón Social: Jorge Rubio c

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: USE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0297

Razón Social: Jorge Robio

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
28	07	25	0298

Razón Social: Jorge Robio

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SRM 191

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
29	07	25	0138

Razón Social: Jorge Robio c.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
29	07	25	0139

Razón Social: Jorge Robio c.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCION MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACION
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
29	07	25	0299

Razón Social: Jorge Robio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: DSE 360

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
29	07	25	0300

Razón Social: Jorge Robio

Obra: Paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
30	07	25	0140

Razón Social: Jorge Robio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA			Nº
30	07	25	0141

Razón Social: Jorge Robio c.

Obra: Paso Vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
30/07/25	0142

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
30/07/25	0144

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
30/07/25	0146

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA	Nº
30/07/25	0145

Razón Social: Jorge Lebrija C.

Obra: paso vehicular San Jorge

Municipio: Girardot

Placa: TNJ 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
30	07	28

Nº	0147
----	------

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Revolución San Jorge
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS
RECIBIDO MATERIAL RETROLLENADO

Municipio: Girardot.

Placa: TN 838

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PMA MINA LOS BARRANCOS
RESOLUCION CAR 1946 DE 2014
GIRARDOT - TOCAIMA

FECHA		
30	07	25

Nº	0143
----	------

Razón Social: Jorge Rubio c.

Obra: Revolución San Jorge

Municipio: Girardot.

Placa: SSI 777

Cantidad: **15 M3**

CONTROL INGRESO MATERIAL DE
EXCAVACION PARA RETROLLENADO
DE AREAS DE EXTRACCIÓN MINERA
(PIT) ABANDONADOS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL APROBADO POR LA CAR
(PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
PAISAJISTICA)

VALIDO POR UN VIAJE DOBLE
COPIA OBRA(GENERADOR)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MINA LOS BARRANCOS
RECIBIDO MATERIAL RETROLLENADO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MINA LOS BARRANCOS
APROBACIÓN CAR MEDIANTE RESOLUCION 1946 DEL 03/09/2014
PROGRAMA DE RESTAURACION MORFOLOGICA Y PAISAJISTICA

El suscrito responsable del desarrollo del PMA predio los Barrancos
del municipio de Girardot.


CERTIFICA QUE:

La razón social **JORGE EDGAR RUBIO CALDERON**, identificado con NIT 93.936.950-1 depositó en el predio los Barranco ubicado sobre la via Km8 sentido Girardot –Tocaima vereda presidente del municipio de Girardot, la cantidad de tres mil treientos noventa y cuatro (3.394m³) de material de excavación, provenientes de la obra **“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDAS KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA”**, ubicada en el municipio de Girardot, los cuales fueron destinados al retro llenado de áreas excavadas dentro de la actividad minero extractiva ya finalizadas y actualmente en proceso de restauración ambiental y paisajística.

El material de excavacion componente básico y esencial para el proceso de restauración morfológica y paisajística del inmueble rural, se recibió en el periodo comprendido a los meses de junio y julio del 2025.

La presente certificación se entrega a solicitud del interesado, dada en el municipio de Girardot el día (31) del mes de julio del año 2025.

firma:


CARLOS ENRIQUE GALEANO REYES

C.C. No. 11.300.921

FINCA LOS BARRANCOS – VEREDA PRESIDENTE
GIRARDOT – CUNDINAMARCA – COLOMBIA

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 02 Contrato De Obra N° 742 DEL 2025	
---	---	--

ANEXO 6



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:	742 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
INTERVENIOR:	H.V. INGENIERIA SAS
REGISTRO No.	02
FECHA	17 06 2025
ELABORÓ	Juane Palacios Palma
REVISÓ	Jan Pablo A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROYECTUADO	Juane Palacios
ARRENDATARIO	Cra 5 # 35-96 local 101-108 Estacion Terpel Kennedy
DIRECCION	3232941679
TELEFONO	10
FECHAS (MM)	10
ESTRATO	Comercial
SERVICIOS PUBLICOS	
AGUA	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGIA	SI
TELEFONIA	NO
CABLE	NO
TELEVISION	NO
OTRO	¿CUAL?
CLASIFICACION DE PREDIOS	
RESIDENCIAL	URBANIZADO NO EDIFICADO
COMERCIAL	URBANIZABLES NO URBANIZADOS
FINANCIERO	NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL	RURAL
DEPOSITO Y PARQUEaderos	RURAL DESTINADO A PRODUCCION
OTRO	¿CUAL?

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, paredes, pisos, pintura de exterior, cubiertas, etc.)

Fachada en vidrio templado, muros en bloque paretados y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pintados, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en porcelanato

Firma: *Juane Palacios*
Nombre: Juane Palacios Palma
C.C. 39.835.333
PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: *Jorge Edgar Rubio*
Nombre: Jorge Edgar Rubio
Cargo: Residente de obra
CONTRATISTA

Firma: *Juan Pablo A*
Nombre: Juan Pablo A
Cargo: U.E. Inter
INTERVENIORIA

Firma: *Juane Palacios P.*
Nombre: Juane Palacios Palma
Cargo: Trabajadora Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**

CONTRATO No.:	742 DE 2025		
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVIERA DE LA GUERRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA		
CONTRATISTA:	ING JORGE EDGAR RUISO CALDERON		
INTERVENIOR:	H.V. INGENIERIA SAS		
REGISTRO No.	03	FECHA	17 DE AGOSTO DE 2025
		ELABORÓ	Tuane Palacio Palma
		REVISÓ	Juan Pablo A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

PROPIETARIO	Talia Barrios		
ARRENTUARIO	Cra 5 # 35-96 Estacion del Kennedy		
DIRECCION	Cra 5 # 35-96 Estacion del Kennedy		
TELEFONO	3232941679		
FRENTE (m²)	6		
ESTRATO	Comercial		
SERVICIOS PUBLICOS			
AGUA	SI	OBSERVACIONES	
ALCANTARILLADO	SI		
ENERGIA	SI		
TELEFONO	NO		
GAS	NO		
TELEVISION - CABLE	SI		
OTRO - CUAL ?			
CLASIFICACION DE PRECIOS			
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EQUIPADO	
COMERCIAL	X	URBANIZADO NO EQUIPADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
OTRACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPORTIVO Y PLEASURE		OTRO	CUAL ?
OBSERVACIONES - LE OFRECEN Cheque para liquidar, dentro en el Asiento No. 28 de 2005.			

3. **Decoración y estado del interior de la obra:** (Laminado, pintura, vitrolas, muros, techos, piso, pintura de imprimas, etcétera, etcétera)

fachada en vidrio templado, muros en bloques pautados y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pautados, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en porcelanato

[illegible]

Firma Nombre: Cargo:	 Borgia Vera 93 Resident club	CONTRATISTA
----------------------------	---	-------------

Firma: 
Nombre: Juan C. Ariza
Cargo: Director
INTERVENTORIA

nome: Yvonne Palacio P
 endereço: Yvonne Palacio Palma
 cargo: Trabaladora social
 ACOMPANHAMENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:	747 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUERRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
INTERVENIENTE:	H.V. INGENIERIA SAS
REGISTRO No.	04
FECHA	13 DE 2025
ELABORÓ	Lyanne Palacio Palma
REVISÓ	Juan Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRAS



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Tobias Barrios		
DIRECCIÓN	Cra 5 # 35-96 Local 102 Edificio Koppel Kennedy		
TELÉFONO	3233941619		
FRONTE (m)	6	ESTRATO	Comercial
SERVICIOS PÚBLICOS			
AGUA	NO	SEÑALIZACIÓN	NO
ALCANTALLADO	SI	URBANO	NO
ENERGÍA	SI	URBANO	NO
TELÉFONO	NO	URBANO	NO
GAS	NO	URBANO	NO
TELEVISIÓN - CABLE	NO	URBANO	NO
OTRO - CUAL?	NO	URBANO	NO
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
URBANO	NO	URBANO	NO
COMERCIAL	NO	URBANO	NO
FINANCIERO	NO	URBANO	NO
INDUSTRIAL	NO	URBANO	NO
EXTRACURRICULAR	NO	URBANO	NO
OTRO Y PARCELA	NO	URBANO	NO
OBSERVACIONES: DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE RECIBIR EL PROYECTO (fachada, paredes, muros, escaleras, piso, pautas de estigmas, califas, etc.)			

Fachada en vidrio templado, muros en bloque pautados y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pautados, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en parquetado.

Firma: Tobias Barrios
Nombre: Tobias Barrios Ortiz
C.C. 29573933
PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: [Firma]
Nombre: Sergio Vera
Cargo: Residente obra
CONTRATISTA

Firma: [Firma]
Nombre: Juan P. Aulia
Cargo: Interventor
INTERVENTORIA

Firma: Lyanne Palacio Palma
Nombre: Lyanne Palacio Palma
Cargo: Trabajo Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUERRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

INTERVENIOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.

05

FECHA

13 de 06 de 2025

ELABORÓ

Juan Pablo Palma

REVISÓ

Juan Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXISTENCIA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Tadalia Barrios
ARRENDATARIO: Cra 5 #35-96 Estación Tenet Kennedy
DIRECCIÓN: 3233941679
TELÉFONO: 1
FRENTE (m): Comercial
ESTIATO: Comercial

SERVICIOS PÚBLICOS

OBSERVACIONES

AGUA

NO

ALCANTARILLADO

SI

ENERGIA

SI

TELÉFONO

NO

GAS

NO

TELEFONIA CABLE

NO

OTRO - ¿CUAL?

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL

SI

COMERCIAL

NO

INDUSTRIAL

NO

AGRICOLA

NO

OTRO

¿CUAL?

USOS DESTINADOS A PRODUCCIÓN

AGRICOLA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

OTRO

¿CUAL?

USOS DESTINADOS A PRODUCCIÓN

AGRICOLA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

OTRO

¿CUAL?

USOS DESTINADOS A PRODUCCIÓN

AGRICOLA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

OTRO

¿CUAL?

USOS DESTINADOS A PRODUCCIÓN

AGRICOLA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

OTRO

¿CUAL?

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, etc., para poder de este tipo de edificios, etc.)

Fachada en vidrio templado, muros en bloque pintados y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pintados, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en parquetado

Firma

Nombre:

C.C.

Propietario o Arrendatario del Predio

Contratista

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Interventoría


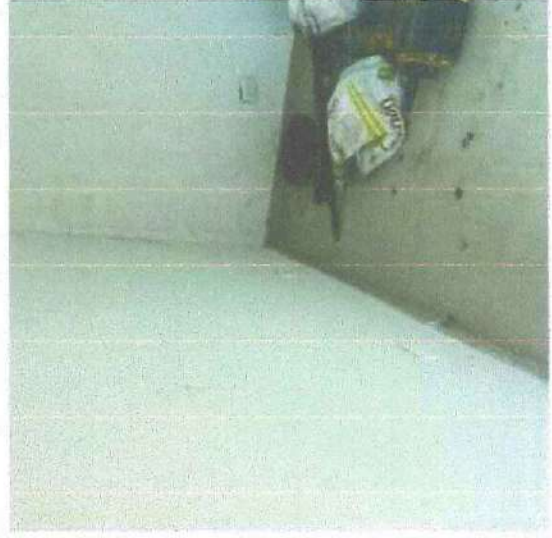
Interventoría

Interventoría



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

INTERVENTOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.:

08

FECHA:

13 de 2025

ELABORÓ

Juanne Palacio Palma

REVISÓ

Juan Palacio A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO O ARRENDATARIO: **Idalia Barrrios**
DIRECCION: **Local 101**
TELEFONO: **Cra 5 # 35-96 Estacion Terminal Kennedy**
PRENTE (M): **3233941679**
ESTRATO: **5**
CONEXION: **CONEXION**

SERVICIOS PUBLICOS

SIN	CON
AGUA	NO
ALCANTARILLADO	SI
ENERGIA	SI
TELEFONO	NO
GAS	NO
TELEVISION - CABLE	NO
OTRO - ¿CUAL?	NO

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	URBANIZADO NO EMPLAZADO
COMERCIAL	URBANIZADO EMPLAZADO
FINANCIERO	NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL	RURAL
DOTACIONAL	RURAL DESTINADO A PRODUCCION
DEPOSITO Y PARQUEaderos	OTRO
CONSERVACIONES - ESPECIFICAR	¿CUAL?

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, portada, arriales, muros, escaleras, pisos, placas de señalamiento, señalización, etc.)

fachada en vidrio templado, muros en bloque pautado y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pintado, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en porcelanato

Firma

Jorge Edgar Rubio
Nombre: **Jorge Edgar Rubio**
C.C. **3938173**

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma

Sergio Uribe
Nombre: **Sergio Uribe**
Cargo: **Residente obra**

CONTRATISTA

Firma

Juan P. Avila
Nombre: **Juan P. Avila**
Cargo: **DT. INCC**

INTERVENTORIA

Firma

Juanne Palacio P.
Nombre: **Juanne Palacio Palma**
Cargo: **Trabajo Social**

ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA CUERBADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUERO CALDERON

INTERVENIOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.

01

FECHA

13

06

2025

ELABORÓ

Juanne Palacio Palma

REVISÓ

Juan Pablo A

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PRESENCIA O
ARRENDATARIO
DIRECCION
TELÉFONO
FRONTE (M2)
No. Pisos
ESTRATO
SERVICIOS PUBLICOS
OBSERVACIONES

Idalia Barrera

Cra 5 #35-96 Estación Terrel Kennedy

3232941679

5

comercial

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fotos, planos, videos, etc.)

Tachada en vidrio templado, muros en bloque panelados y pintados en buen estado, muros interiores en bloque pintados, pintura deteriorada, cubierta en metaldeck, pisos interiores en porcelanite.

Firma: Idalia Barrera
Nombre: Idalia Barrera
C.C. 39.574.733

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: Sergio Vera
Nombre: Sergio Vera
Cargo: Residente don

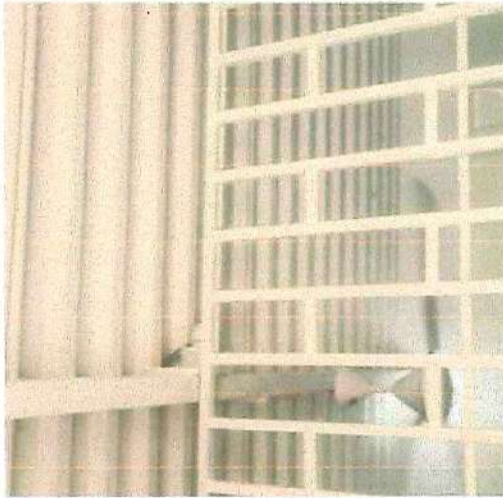

CONTRATISTA

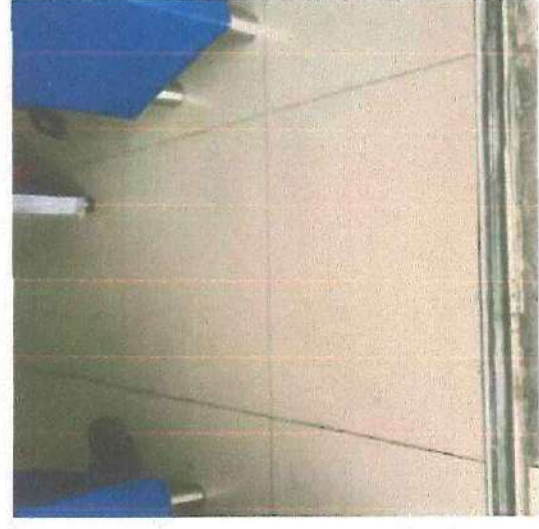
Firma: Juan P. Ayala
Nombre: Juan P. Ayala
Cargo: Int. Int.

INTERVENTORIA

Firma: Juanne Palacio P.
Nombre: Juanne Palacio Palma
Cargo: Trabajadora Social

ACOMPANAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT







Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

H.V. INGENIERIA SAS

INTERVENTOR:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

REGISTRO No.

09

FECHA

13/06/2025

ELABORÓ

Juanne Palacios Palma

REVISÓ

Juan Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PRECIO

PROPIETARIO O ARRENDATARIO	Edalicia Barrantes
DIRECCIÓN	Cra. 5 #35-96 Estación Te. Al Kennedy
TELÉFONO	323 394 1639
PROYECTO	3
ESTRATO	5
SERVICIOS PÚBLICOS	Comercial

SERVICIOS PÚBLICOS		OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISIÓN - CABLE	NO	
OTRO - CUAL	7	

CLASIFICACIÓN DE PRECIOS	
REGISTRO	URBANO NO EDIFICADO
COMERCIAL	URBANO NO EDIFICADO
FINANCIERO	URBANO NO EDIFICADO
INDUSTRIAL	URBANO NO EDIFICADO
EDUCACION	URBANO NO EDIFICADO
DEPORTE Y RECREACION	URBANO NO EDIFICADO
OTRO	URBANO NO EDIFICADO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, gradería, veredales, muros, escaleras, puentes, obras de arte, etc.)

Fachada en vidrio templado y aluminio, pisos interiores en concreto y porcelanato, muros interiores en bloque, paneles y pintados, estructura metálica de muros cubierta en metaldeck

Firma:
Nombre: Juanne Palacios Palma
C.C. 39.385.933

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PRECIO

Firma:
Nombre: Jorge Edgar Rubio Calderon
Cargo: Representante de obra

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Juanne Palacios Palma
Cargo: Trabajadora Social

ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT


Firma:
Nombre: Juan P. Avila
Cargo: Interventor

INTERVENTORIA



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**

CONTRATO No.:	742 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PISO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA CUERBADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERÓN
INTERVENIOR:	H.V. INGENIERIA SAS
REGISTRO No.	10
FECHA	13 de 1025
ELABORÓ	Juanne Palacio Palma
REVISÓ	Juan Pablo A

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE TACHUNA



2 DATOS DEL PROYECTO

PROYECTARIO	Tadalia Barrios	
ARRENDATARIO	C/O 5 #35-96 302a BAY	
DIRECCIÓN	3733914639	
TELÉFONO	10	
FUENTE (M)	Carretera	
SERVICIOS PÚBLICOS		
AGUA	SI	NO
ALCANTRILLADO	SI	NO
ENERGÍA	NO	NO
TELÉFONO	NO	NO
GAS	NO	NO
TELEVISIÓN - CABLE	NO	NO
OTRO (¿CUAL?)		
OBSERVACIONES		
RESIDENCIAL		
COMERCIAL	X	
FINANCIERO		
INDUSTRIAL		
EDUCACIONAL		
DEPORTIVO Y RECREATIVOS		
OBSERVACIONES - DE SOPORTE - Describe según pautas definidas en el Acuerdo No. 031 de 2023		

Fachada en mampostería con parte frontal con fisuras, fachada muro parte de atrás se evidencia hueco y toral, se encuentra en el aire, baria en mampostería y mesos en concreto enchupado con fisuras, pisos en concreto enchupados con agrietamiento graves y voladizo, cubierta en teja de zinc con estructura metálica con cielo raso en PVC.

Firma: Tadalia Barrios
Nombre: Tadalia Barrios
C.C. 39.575.933

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PIEDO

Firma: Jorge Rubio
Nombre: Jorge Rubio
Cargo: Asistente de obra

CONTRATISTA

Firma: Juan P. A.
Nombre: Juan P. A.
Cargo: Interventor

INTERVENTORIA

Firma: Juanne Palacio Palma
Nombre: Juanne Palacio Palma
Cargo: Trabajadora Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**

CONTRATO No.:	742 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
INTERVENTOR:	H.V. INGENIERIA SAS
REGISTRO No.	11
FECHA	03 06 2025
ELABORÓ	Juanne Palacio Palma
REVISÓ	Juan Pablo A.

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



PROPIETARIO O ARRENDATARIO		2 DATOS DEL PRECIO	
DIRECCIÓN		Palacio Baniós	
TELÉFONO		Cra 5 # 35-96 Lavadero	
FRONTE (M)		2228941679	
		ESTADO	
		12	
		Comercial	
SERVICIOS PÚBLICOS		OBSERVACIONES	
AGUA	SI		
ALCANTILLADO	SI		
BIENES	SI		
TELÉFONO	NO		
GAS	NO		
TELÉFONO - CABLE	NO		
OTRO - ¿CUL?	NO		
CLASIFICACIÓN DE PRECIOS			
RESIDENCIAL	URBANIZADO NO ENCONTRADO		
COMERCIAL	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO	NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL	RURAL		
EDUCATIVO	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPORTIVO Y PARQUEADEROS	OTRO		
OBSERVACIONES: (Escriba aquí cualquier otro dato relevante de acuerdo al artículo 105 de la Ley 1733 de 2014)			

3 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PRECIOS ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (Ladrillo, piedras, arena, grava, etc.)

Muros en rojo metálico, estructura de cubierta metálica y teja metálica, estructura columnas metálicas, pisos en concreto y esmaltados, se evidencian fisuras y grietas

Firma:
Nombre: Juanne Palacio Palma
Cargo: PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PRECIO

Firma:
Nombre: Contratasta
Cargo: CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Interventor
Cargo: INTERVENTORIA

Firma: Juanne Palacio Palma
Nombre: Juanne Palacio Palma
Cargo: ACOMPAÑAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUERRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

INTERVENIOR:

REGISTRO No.

H.V. INGENIERIA SAS

FECHA

13 06 2025

ELABORÓ

Juane Palacio Palma

REVISÓ

Juan Pablo A.

12

1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRAZADO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO O
ARRENDATARIO
Talaria Barríos
Cra 5 # 35-96 Zpps Carvajal 151a
Estación Talaria Kennedy
323941639
No. Pisos 1
ESTADO Comercial

SERVICIOS PUBLICOS

SIN	OBSERVACIONES
SI	
SI	
SI	
NO	
NO	
NO	
NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	URBANO	NO URBANO
COMERCIAL	URBANO	NO URBANO
FINANCIERO	URBANO	NO URBANO
INDUSTRIAL	URBANO	NO URBANO
POTENCIAL	URBANO	NO URBANO
DEPOSITO Y PARQUEaderos	URBANO	NO URBANO
OTROS	URBANO	NO URBANO

3 DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (Fecha, plantas, vedados, muros, escaleras, piscinas, piscinas de estacionamiento, etc.)

Zona de 151a en cubierta metálica, estructura de columnas metálicas, pisos en concreto con afectaciones de fisuras y grietas

Firma

Nombre:

C.C.

Talaria Barríos
3981433

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma

Nombre:

Cargo:

Benigno
Remedios

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Cargo:

Juan P. Aulá
D.C. Interv.

INTERVENTORIA

Firma

Nombre:

Cargo:

Juane Palacio P.
Juane Palacio Palma
Trabajadora Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**







Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 2

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA CUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

INTERVENTOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.:

13

FECHA

12-06-2025

ELABORÓ

Juane Palacios Palma

REVISÓ

Jon Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carlos Julio Carranza MUY
DIRECCIÓN	Cra 7 # 35-28 San Jorge
TELÉFONO	3143633048
FRONTE (M)	12.50
PROFUNDIDAD (M)	1
ÁREA	12.50
ALCANTARILLADO	SI
TENERÍA	SI
TELÉFONO	SI
SANITARIO	NO
TELÉFONO - CABLE	SI
OTRO - ¿CUAL?	
CLASIFICACIÓN DE PREDIO	
RESERVA	URBANIZADO NO EDIFICADO
AGRICOLA	URBANIZABLES NO URBANIZADOS
INDUSTRIAL	NO URBANIZABLE
COMERCIAL	RURAL
OTRO	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN
OTRO - ¿CUAL?	
REMARKS	DECEPCION - Cliente según (verificar) en el Anexo No. 105 de 2025.

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (Indicar, por cada vertiente, los datos de terreno, edificación, etc.)

Fachada: Portón y Puertos metálicos, muro ante jardín en bloques, estructura y techo metálicos con vidrio, muro en bloque pintado con fachada en bloques cerámicos.

Firma: *Carlos Julio Carranza MUY*
Nombre: Carlos Julio Carranza MUY
C.C. 5966868
PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: *Sergio A. Vera*
Nombre: Sergio A. Vera
Cargo: ING. Residente obra
CONTRATISTA

Firma: *Juan P. Avila*
Nombre: Juan P. Avila
Cargo: INTERVENTORIA

Firma: *Juane Palacios Palma*
Nombre: Juane Palacios Palma
Cargo: Trabajadora Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA CUERPO SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERÓN

INTERVENIOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.

14

FECHA

12 06 2025

ELABORÓ

Yvonne Palacio Palma

REVISÓ

Juan Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO O ARRENDATARIO: **Idalia Barrón**
UBICACIÓN: **Cra 5 # 35-96 Estación Terpel Kennedy Admin**
TELÉFONO: **3733941679**
PRENTE (M): **6**
ESTRATO: **Comercial**
SERVICIOS PÚBLICOS: **SI**
OBSERVACIONES:

AGUA	SI
ALCANTARILLADO	SI
SEWERS	SI
TELÉFONO	NO
GAS	NO
TELEVISIÓN / CABLE	NO
OTRO (CUAL ?)	NO

RESIDENCIAL	NO
COMERCIAL	SI
INDUSTRIAL	NO
AGRICOLA	NO
OTRO (CUAL ?)	NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, portales, veredas, muros, malla, pava, plaza de estacionamiento, etc.)
fachada en bloque pintada y pintada, ventanas y puertas metálicas con vidrio, pisos interiores en concreto y periferia muros interiores en bloque pintados y pintados, estructura metálica de cubierta en metaldeck, todo en buen estado

Firma: **Idalia Barrón**
Nombre: **Idalia Barrón**
Cargo: **Propietaria**

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: **Jorge Vera**
Nombre: **Jorge Vera**
Cargo: **Residente obra**

CONTRATISTA

Firma: **Yvonne Palacio Palma**
Nombre: **Yvonne Palacio Palma**
Cargo: **Trabajadora Social**

ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Firma: **Juan Pablo A.**
Nombre: **Juan Pablo A.**
Cargo: **Interventor**

INTERVENTORIA



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:	742 DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVIERA DE LA CUERNA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON
INTERVENIOR:	H.V. INGENIERIA SAS
REGISTRO No.	15
FECHA	13 OS 2025
ELABORÓ	Juane Palacio Palma
REVISÓ	Juan Pablo A.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Idalia BARRIOS
ARRENDATARIO	
DIRECCIÓN	Cra 5 #35-96 Estación Total Kennedy
TELÉFONO	3233941619
PRENTE (M)	5
ESTRATO	1 Comercial

SERVICIOS PÚBLICOS	
SI	NO
AGUA	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	NO
GAS	NO
TELEVISIÓN CABLE	NO
OTRO - ¿CUAL?	

CLASIFICACIÓN DE PRENOS	
RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL
COMERCIAL	URBANIZABLES NO ORGANIZADOS
INDUSTRIAL	NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL	SIN PLAN
COMERCIO Y SERVICIOS	SIN PLAN DESTINADO A PRODUCCIÓN
OTRO - ¿CUAL?	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, pisos, ventanas, muros, etc.). (Señalar, describir, medir, etc.).

Fachada en bloque pintura y afectación de humedad, acceso a la unidad sanitaria en concreto con pasillos, pisos interiores en porcelanato, divisiones en aluminio, mesón en concreto y baldosa, espejos, cuarenta en metal dec, muros en bloque porcelanato y pintados en buen estado

Firma: *[Firma]*
Nombre: Idalia BARRIOS
C.C. 39.86.713

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma: *[Firma]*
Nombre: Sergio Vera
Cargo: 93133403619

CONTRATISTA

Firma: *[Firma]*
Nombre: Juan C. Ruiz
Cargo: D.E. Inge. Juan C. Ruiz

INTERVENORIA

Firma: *[Firma]*
Nombre: Juane Palacio Palma
Cargo: Trabajador Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

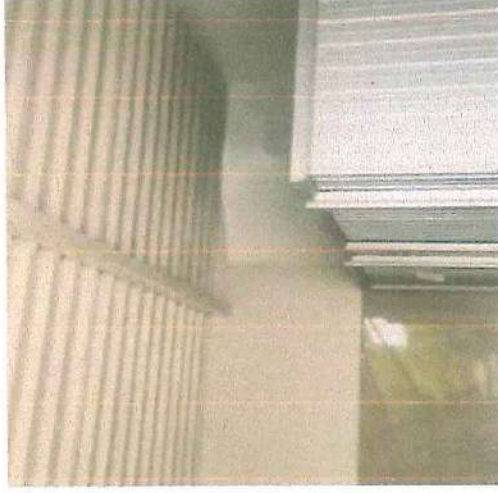
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUERRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

INTERVENIOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.

16

FECHA

13/06/2025

ELABORÓ

Ivonne Palacio Palma

REVISÓ

Juan Pablo A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO O ARRENDATARIO	Wilson Benavides	
DIRECCIÓN	Cra 7 # 35-28 San Jorge Av Kennedy	
TELÉFONO	3027101048	
FUENTE (MA)	7.70	
Nº PISO	1	
ESTRATO	1	
SERVICIOS PÚBLICOS	OBSERVACIONES	
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	NO	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?		
CLASIFICACIÓN DE PREMIOS		
RESIDENCIAL	☒ URBANIZADO NO EMPLAZADO	
COMERCIAL	☐ URBANIZABLES MOLIGERANZADOS	
FINANCIERO	☐ NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL	☐ RURAL	
INDUSTRIAL	☐ RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEaderos	☐ OTRO	
OBSERVACIONES - DESCRIPCION cuando según lo que se define en el Artículo No. 105 del D.T. 1073		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, paredes, ventanas, muros, escaleras, pisos, plomo de techos, calafates, etc.)

Fachada. Cerramiento con puerta metálica y muros metálicos deteriorados y sin pintura, cubierta en teja de zinc, estructura en madera, se evidencia deterioro, piso andén en cemento con fisuras. Pisos interiores en cemento con fisuras.

Firma:

Nombre: Wilson Benavides
C.C. 707060877
PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

Firma:

Nombre: Sergio Ortiz
Cargo: Residente de obra
CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Juan P. Avila
Cargo: Dir. Intec.
INTERVENTORIA

Firma: Ivonne Palacio Palma
Nombre: Ivonne Palacio Palma
Cargo: Trabajadora Social
ACOMPANIAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

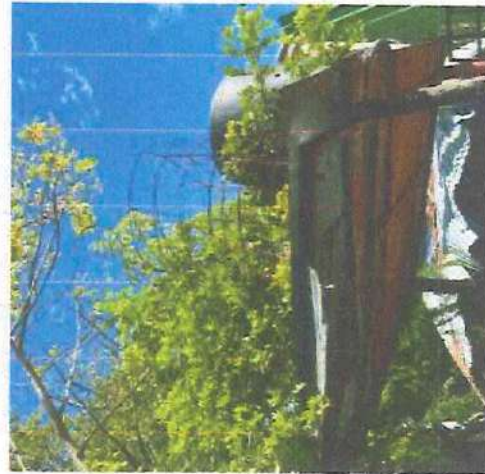
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No. :	742 DE 2025						
OBJETO:	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA:	ING. JORGE EDGAR RUÍLO CALDERÓN						
INTERVENTOR:	H.V. INGENIERIA SAS						
REGISTRO No. :	18	FECHA	14 de 2025	ELABORÓ	Juanne Salgado Palma	REVISÓ	Juan Pablo A.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

2. NATIONAL COMMISSION

PREMIUNDO O FABRICATARIO		No. PISO		ESTADO	
CORRECCION		1 Lote		3	
TELEFONO		3724430482		20	
FIBENTE (MA)					
SERVICIOS PUBLICOS					
OBSERVACIONES					
AGUA		SI	NO		
ALCANTARILLADO		NO	NO		
ENERGIA		NO	NO		
TELEFONO		NO	NO		
LUS		NO	NO		
TELEVISION - CABLE		NO	NO		
OTRO - ¿CIVIL ?		NO	NO		
CLASIFICACION DE PERROS					
URBANIZADO		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
BOTANICA		RURAL DESTINADO A PRODUCCION			
DEPORTIVO Y RECREATIVOS		OTRO : ¿CIVIL ?			

lote baldío afectado por la grieta en los taludes, taludes afectados por escombros, protegidos por Abales

Find	Normal	C.C
------	--------	-----

Rating:
 Nombre:
 C.C.

Name:
 Number:
 C.C.

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PRECIO

PROPRIETARIO O ARRENDATARIO DEL PRECIO

10

Nombre:

Current:

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Figure 1

November

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

INTERVENTORIA


INTERVENTORIA

INTERVENTORIA



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:

742 DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION Y PASO VEHICULAR EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA SAN JORGE EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:

ING. JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

INTERVENIOR:

H.V. INGENIERIA SAS

REGISTRO No.

01

FECHA

17/06/2025

ELABORÓ

Juan Pablo Palma

REVISÓ

Juan Pablo Palma

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Tobalia Barrios	
ARRENDUARIO	Cra 5 #3596 Segundo Bloq Estacion Kennedy	
DIRECCION	3233941619	
TELEFONO	1	
PRETENCION	Comercial	
SERVICIOS PUBLICOS		
AGUA	SI	NO
ALCANABILIDAD	SI	NO
ENERGIA	SI	NO
TELEFONO	SI	NO
CAS	SI	NO
TELEVISION - CABLE	SI	NO
OTRO - (CUAL ?)		
CLASIFICACION DE PREDIOS		
RESIDENCIAL		
COMERCIAL		
INDUSTRIAL		
AGRICOLA		
OTRO		
USOS PERMITIDOS		
URBANIZABLE NO EDIFICADO		
URBANIZABLE NO URBANIZADO		
NO URBANIZABLE		
RURAL		
RURAL DESTINADO A PRODUCCION		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		
OTRO		
OTRO		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (Incluida pintura, ventanas, muros, acabados, piso, planta de arripiado, cubiertas, etc.)

Muros en bloque pautados y pintados, ventaneria en aluminio y vidrio, puertas metálicas, estructura de la cubierta metálica, tejá arquitectónica, cielo raso en drywall con fisuras y humedad, banco entrapado zona de baño, sanitario y lavamanos

Firma

Nombre:

C.C.

Firma

Nombre:

Cargo:

Firma

Nombre:

Cargo:

Firma

Nombre:

Cargo:

PROPIETARIO O ARRENDATARIO DEL PREDIO

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Firma

Nombre:

Cargo:

Juan Pablo Palma

Juan Pablo Palma

ACOMPANAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT



Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**





Alcaldía de
Girardot

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA**



ANEXO 6.

SOPORTE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
DIRECTOR DE DISEÑO	JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ	93.412.960
ASESOR E S T R U C T U R A L	RAÚL ERNESTO ARANGO YEPES	1.136.887.818
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO	BRYAN STEVEN CARDENAS LOZANO	1.069.178.480

PERSONAL DE OBRA:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
DIRECTOR DE OBRA	JHONNY FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ	93.412.960
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	SERGIO ANDRÉS VERA ACOSTA	93.133.403
GEOTECNISTA	CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA	11.226.681
TOPÓGRAFO	JOSE ORLANDO CARMONA DURAN	93.124.814
ASESOR SISO	ERIKA CONSTANZA WAGNER ARIAS	52.411.616
MAESTRO DE OBRA	MARIO GOMEZ VASQUEZ	93.128.134

PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DATOS DEL APORTANTE								EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	CIUDAD / MUNICIPIO	SH	
NI	900266929-7	JAVI INGENIERIA SAS		carretera 10 # 25-53 local 5	3134458687	javiingenieria@info@yahoo.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	GIRARDOT	
ÚNICA	B – menos de 200 c								

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	UPG
2025-08		2025-07	E	04/08/2025	896969364	5	0
						TOTAL A PAGAR	
						\$2.380.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Coltacción Obligatoria
EPS002	Salud Total EPS	800139907-4	57.000
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.000
EPS017	Famisanar EPS	8310038564-7	57.000
EPS037	Nueva EPS	900150204-2	82.400

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	57,000	1
0		0		0	0	0	0	177,000	2
0		0		0	0	0	0	57,000	1
0		0		0	0	0	0	82,400	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Parvenir	800274005-8	785.200
25-14	Colpensiones	900335000-7	707.500

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0		765,200	3
0	0	0	0	0	0		707,600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NIT
14-11	ARL SURA	890903790-5
		140.600

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Ratificado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor										
			140.600	0	0	140.000			1.406	140.600	5

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF22	Contenido

INT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
860007336-1	373,400	0	0	373,400	5

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	4	373.400	373.400
Pensión	2	1.493.000	1.493.000
Riesgos Laborales	1	140.600	140.600
COF	1	373.400	373.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.380.400	2.380.400

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	90025629-7	JIMY INGENIERIA SAS	carretera 10 y 25-53 local 5	3134485867
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				
SI				
CORREO				
jwingenieria101@yahoo.com				
CIUDAD / MUNICIPIO				
GIRARDOT				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONAL			
2025-08	2025-07	E	04/09/2025	88668364
CANTIDAD EMPLEADOS				UPC
6				0
TOTAL A PAGAR				\$2.350.400

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
				CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
1	CC	107656693	RESTREPO RAMOS YEMMER YATIANA																													
2	CC	11036349	RODRIGUEZ GONZALEZ ALIBES																													
3	CC	30115259	TRUJILLO YEPES ALIANA QUELT																													
4	CC	38767579	GUMBAYO LUZ ADRIANA																													
5	CC	83112660	VASQUEZ RODRIGUEZ JOHNNY FERNANDO																													

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 93366550	1	JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE (TOLIMA)	CRA 4 B 23	IBAGUE-TOLIMA	2623590	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-07	2025-08	89976615	948976615		E	2025/08/14	2025/08/05	2025/08/05	\$2,569,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS		
H/o.	Identificación	Nombre	Ingreso	Salida	Acción	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	Salida	
SUCURSAL: GIRARDOT (5 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: GIRARDOT (5 Afiliados)																			
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDIBAMARCA (5 Afiliados)																			
1	CC	1069176680	CAROLINA LOZANO	25-14	30	\$1,423,500	\$27,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000
2	CC	93124814	CARMONA DUFAN JOSE ORLANDO	25-14	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5002	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$76,000
3	CC	93181114	GOMEZ VASQUEZ WABO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5003	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000
4	CC	93131303	VERA ACOSTA SERGIO ANDRES	23039	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5005	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$76,000
5	CC	94421616	WAGNER ARBAS ENKA CONSTANZA	X	23	\$1,380,000	\$220,800	EP5005	23	\$1,380,000	\$55,200	CCF22	23	\$1,380,000	\$55,200	14-11	23	\$1,380,000	\$55,200
6	CC	94421616	WAGNER ARBAS ENKA CONSTANZA	X	7	\$420,000	\$67,200	EP5003	7	\$420,000	\$16,800	CCF22	0	\$40	\$0	14-11	7	\$420,000	\$6,000
Total Afiliados (5)						\$6,447,000	\$1,351,600			\$6,447,000	\$318,000			\$6,037,000	\$318,000			\$6,417,000	\$318,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 93366550	1	JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE (TOLIMA)	CRA 4 B 23	IBAGUE-TOLIMA	2623590	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2025-07	2025-08	89976615	948976615		E	2025/08/14	2025/08/05	2025/08/05	\$2,569,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,351,600	\$0	\$0	\$1,351,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$759,600	\$0	\$0	\$759,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$304,000	\$0	\$0	\$304,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	5	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	\$558,900	\$0	\$0	\$558,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$321,200	\$0	\$0	\$321,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$321,200	\$0	\$0	\$321,200	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$338,000	\$0	\$0	\$338,000	
TOTAL				5	\$2,569,700	\$0	\$0	\$2,569,700	

PERSONAL DE OBRA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPG
				5	0
TOTAL A PAGAR				\$2,300,400	

TOTALES SALUD

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Colizaden Obligatoria
230301	Parvenir	800224800-9	785.200
25-14	Colpensiones	800336000-7	707.600

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES CAJAS		
Código CCF	Nombre	NIT
CCF22	Colsubsidio	850007336-1
		Valor Aporte
		373.400

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	373.400	373.400
Pensión	2	1.493.000	1.493.000
Riesgos Laborales	1	140.600	140.600
GCF	1	373.400	373.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.380.400	2.380.400

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENDIENTES	E	04/03/2025	88659364
2025-08	2025-07			
				EMPLEADOS
				0
				07/2
				TOTAL A PAGAR
				\$2,390,400

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal/Principi	Dirección	Ciudad/Departamento
NIT 9190950	1	JORGE EDGAR RUIRO CALDERON	8 - MENOS DE 200 CONTRANTES	IBAGUE (TOLIMA)	CRA 4 B 23	IBAGUE-TOLIMA
					2423500	SI

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pemiden	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-08	69978615	940978615	E	2025/04/14	2025/08/05	BANCO AV VILLAS	0	\$2,569,200

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN			SALUDO			CCF			RIESGOS			PANAFCRALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos de base	Dependencias	Categoría	BOC	Aporte	Categoría	BOC	Aporte	Categoría	BOC	Aporte	Categoría	BOC	Aporte	Tarifa	Aporte	Otras	BOC	Aporte	Bonificado SUDIC CCF	Total Puntos					
SUCUBSAI GIRAROD (5 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: GIRAROD (5 Afiliados)																												
Cuidado: GIRAROD Doble: CHUMIMORCA (5 Afiliados)																												
1	CC	1009176400	CRIBERUS LOZANO BERRA STREET		25-14	30	\$1,423,500	\$227,600 EP\$1017	10	\$1,423,500	\$51,000	CCF\$2	30	\$1,423,500	\$37,000	14-11	\$1,423,500	6.96%	\$99,100	30	\$0	\$0	\$1	\$440,750				
2	CC	91324814	CARRONA DULAY ACE OCLARDO		25-14	30	\$1,900,000	\$304,000 EP\$1007	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF\$2	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	\$1,900,000	6.96%	\$112,300	30	\$0	\$0	\$1	\$580,700				
3	CC	91318134	GOMEZ VASQUEZ MARIO		05-14	30	\$1,423,500	\$227,600 EP\$1005	30	\$1,423,500	\$51,000	CCF\$2	30	\$1,423,500	\$51,000	14-11	\$1,423,500	6.96%	\$99,100	30	\$0	\$0	\$1	\$494,700				
4	CC	91313403	PERA ACOSTA SERGIO JUANES		22-09	30	\$1,980,000	\$304,000 EP\$1003	20	\$1,980,000	\$76,000	CCF\$2	30	\$1,980,000	\$76,000	14-11	\$1,980,000	6.96%	\$112,300	30	\$0	\$0	\$1	\$588,700				
5	CC	92426216	MAGUIEN ARAN ENYA CONSTITUZA	X	22-09	23	\$1,380,000	\$220,000 EP\$1005	23	\$1,380,000	\$55,200	CCF\$2	23	\$1,380,000	\$55,200	14-11	\$1,380,000	6.96%	\$96,100	23	\$0	\$0	\$1	\$427,200				
6	CC	92426216	MAGUIEN ARAN ENYA CONSTITUZA		22-09	7	\$410,900	\$64,200 EP\$1005	7	\$410,900	\$4,800	CCF\$2	0	\$0	\$0	14-11	\$410,900	0.00%	\$0	0	\$0	\$0	\$1	\$86,000				
Total Afiliados(5)							\$8,447,800	\$1,351,600		\$8,447,800	\$238,000		\$8,027,000	\$241,200		\$8,447,800	\$358,200		\$858,400		1-30	\$0	\$0	\$2,828,700				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento
NIT 93396950	1	JORGE EDGAR RUBIO CALDERON	B - MENOS DE 200 COLTZAÍRES	IMAGUE (TOLIMA)	CHA 4 8 21	IMAGUE TOLIMA
						2623590
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2025-07	2025-08	88978615	9409970615	E	2025/09/14	2025/08/05	
						Banco	
						Banco AV VILLAS	
						Dias Mora	0
						Valor	\$7,560,700

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
				VALOR LIQUIDAD
				INTERESES MORA
				SALDOS E INCAPACIDADES
				VALOR A PAGAR

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)		5	\$1,351,600	\$0	\$0
COMPENSACIONES	25-14	7	\$759,600	\$0	\$0
POVENIR	230301	8	\$304,000	\$0	\$0
PROTECCION	230301	0	\$288,000	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		5	\$558,900	\$0	\$0
ARL SUR4	14-11	5	\$558,900	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		5	\$321,200	\$0	\$0
CONSUBSIDIO	CCF22	1	\$321,200	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)		5	\$338,000	\$0	\$0
FAMISANAR	EPS017	7	\$57,000	\$0	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	4	\$76,000	\$0	\$0
SANITAS	EPS005	6	\$205,000	\$0	\$0
TOTAL		5	\$2,569,700	\$0	\$2,569,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLICUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Substitución	CÓDIGO ARL	ISC ARL	TARIFA ARL	CLASE ARE	APORTES ARL
1	CC 11226611	NETO LAGUNA CARLOS ANDRES	\$0	14/23	\$1,423,500	0.96%	5	\$95,100
			\$0					\$95,100

ANEXO 7. ✓

BITACORA DE OBRA

Fecha 29 y 30 Junio 2025

No se laburo por ser días festivos.

Fecha 1 de Julio 2025. Martes


Estado del tiempo: Soleado todo el día.


Personal contratado: Director obra, Residente obra SST, Topógrafo, Ayudante, oficial operario máquina.

Personal interentorno: Director interentorno.

Máquina y Equipos: Mini excavadora carga (grupo) topografía, Herramienta menor, Volquete.

Actividades Realizadas: Se verifican movimientos de tierra. Acceso variable con topografía, se realiza Abco, adecuación Ceramita lona y señalización puntos críticos obra. Demolicion Andenes existentes, ciclo rta bordillos, sardinetas y sacado de materiales con colquetas, muro sosteniendo ciclo rta existente. Salio de la excavación.


Sergio Vera
Residente obra


Inter.

Fecha 2 Julio de 2025 Miércoles

Estado del tiempo: Soleado-nublado.

Personal contratado: Director obra, Residente obra SST, Topógrafo, Ayudante, oficial operario Máquina.

Personal interentorno: Director interentorno, R. interentorno.

Máquina y Equipos: Mini excavadora carga.

Grupo topografía, colquetas.

Actividades Realizadas: Se continúa con demolición de muros soporte ciclo rta existente, excavación de la misma, visita ing. Jacinto Acuña y reunión Rad tubería PVC 12" Agua Potable. Sacado de material y transporte con máquina del material y carga y retiro material a la Escombrera Autorizada. Medición de muros soporte ciclo rta existente. Con topografía se saca la caja.

Iluminación de Agua Rio Bogotá con Personal desde la obra. hasta desembocadura de la quebrada.
Visita por Parte Inge. y con Dujillo Supervisor delegado Alcaldía Municipal.

Fees
Supervisor
Residente obra

Apoyo Supervisor SIG

Inter.

Fecha 03 de Julio 2025. Jueves

Estado del tiempo: Nublado moderado mañana y tarde.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST; Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Máquina.

Personal Intercomunal: Director intercomunal P. Intercomunal Máquina y Equipos: Minicargadora Oruga, Volquete, Equipo topografía.

Actividades Realizadas: Se continúa con demolición zona tubería red Agua potable, excavación con máquina cargue y Retiro de material. Durante todo el día se realizó los labores. Se realizó visita por parte del ingeniero Hidráulico para inspección del proceso de diseño.

Fees
Supervisor
Residente obra

Inter.

Fecha 04 - Julio 2025 Viernes.

Estado del tiempo: Soleado y nublado.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra.

SST: Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Máquina.

Personal Intercomunal: Director intercomunal P. Intercomunal.

Máquina y Equipos: Minicargadora Oruga, Volquete.

Equipo topografía. Plante eléctrico, Volquete.

Actividades Realizadas: Se realizó excavación para tubería PVC 14" Agua potable para instalación de válvula a la tubería de 14" PVC Por tanto se demolió part. Andén y cicloruta existente contra muro de unicentro por presencia de alumbre por la profundidad y se desestabiliza. Se como Nivel de Pozo existente es separador con tubería Novafort 7e viene de unicentro. Se retiró material con volquete. el material excavado, se demolió muerto que sostiene la tubería PVC 14" debido que está desplazando la tubería y se desmonta.

Por
Scribiera
R. obra

Intel.

Fecha 05-Julio 2025 Sábado.

Estado del tiempo: Soleado durante todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST; Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Maquina.

Personal Interventoria: Directa interventoria P. Interventoria Maquinaria y Equipo: Mini excavadora cargo, Volquete, Fgr. 00 topografía, Planta Eléctrica, volquetes

Actividades Ejecutadas: Se demarco con cinta de peligro la zona excavaciones que todas las noches la gente le dañan. Se realizó traslado de material cerca muro unicentro para cargarlo a volquete. y llevarlo para es compactar, se realizó replanteo Aproximado para box Goalvert nuevo.

Por
Scribiera
R. obra

Intel.

Fecha 07 - de Julio 2021 Lunes

Estado del tiempo: Día Soleado todo el día

Personal Contratista: Director obra, Residente obra


SST, Topógrafo, Agudente, Oficial, Operario Mecánico

Personal Interventoría: Director de Interventoría e Interventor


Maquinaria y Equipos: Minicargadora oruga, Equipo topográfico, Planta eléctrica, Volquetes.

Actividades Realizadas: Se realiza excavación y demolición de Asfalto y Concreto de colzada derecha sentido Homecenter hacia univento. Se realiza carga y retiro material de la excavación y de la demolición. Se realiza visita por parte del ingeniero Vernon Supervisor delegado Alcaldía municipal.

Se encuentran tuberías Metálicas de 14" sin servicio en zona de excavación donde se va a construir el nuevo BOX Culvert. Y se Autoriza la Corte de del mismo y Retiro por parte del Supervisor delegado Alcaldía Secretaría Infraestructura. Se están realizando nuevas tuberías existentes con topografía.



Vernon Pajillo
Ayudo Supervisor SIG


Roberto

Intel:

Fecha 08 - Julio 2021 Martes.

Estado del tiempo: día Soleado

Personal Contratista: Director obra Residente, SST


Topógrafo, Agudente, Oficial, Operario Mecánico


Personal Interventoría: Director Interventoría e Interventor

Maquinaria y Equipos: Minicargadora oruga, Equipo de topografía, Planta eléctrica, Volquetes.

Actividades Realizadas: Se hacen Secciones Longitudinales con topografía via Glorieta univento y via hacia Glorieta Kennedy y de la via del proyecto

Se esta demoliendo Asfalto para el cajon del Box existente y poder demolerlo. Ya se debe realizar terrazas para llegar al nivel de la cota de Profin Jidad de la quebrada. Se instalo la protección del tubo presión PUC 14" para evitar que se Safe y produzca daños a la excavación. Se realiza excavación para terrazas para la estabilización del terreno. Se realiza Corte y transporte del material excavado y demoliciones. Se realiza el corte de la tubería Metálica existente encontrando y Autorizada demantarlo o cortarlo. Y se realiza la respectiva señalización de las zonas de excavación.


J. Obros


J. Obros

Fecha 07 - Julio - 2025 Miércoles

Estado del clima: Soleado todo el día.


Personal Contratista: Director obra Residente SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario.


Personal Interventoría: Director Interventoría. D. Interventoría.

Máquina y Equipo: Miniexcavadora oruga Equipo de topografía. Planta eléctrica, Vidutos.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación zona del Box colector existente para posteriormente demoler el box. Se hace transporte con máquina para cargarlos a U/I gruta para transporte y llevarlo a Escombrera. Visita técnica por parte del Supervisor delegado Secretaría Infraestructura Ciudad para inspeccionar los avances de la obra el Ing. Yeison Trujillo. Se realiza soporte para tubería PUC 14" por que esta en el Aire. Esto lo realiza la empresa Acva-gyr.

Se encuentra tubería de 18" del Centro Comercial
 un caño que descarga en la quebrada y está en zona
 de influencia del proyecto y este en funcionamiento
 se debe realizar una provisional y de ello mientras
 se construye el nuevo box culvert. Se coloca terreno
 Se realiza demarcación de la zona de excavación
 con para prevención.


 Sergio Lara
 Residente obra


 J. M. L.

Fecha: 10 de julio de 2025 Jueves.

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal del Contratista: Director obra Residente
 SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario.

Personal de Interventoría: Director de
 Interventoría y Interventoría.


Maquinaria y Equipos: Minicargadora, Oruga, Grupo
 topográfico, Plante eléctrico, Volquete.


Actividades Realizadas: Se robot topografía de
 zona Inspección de Aguas Nuevas que descarga en la que-
 brada. Se visualiza aumento de caudal tipo

Agua Agua abajo quebrada. Caudal del Box existente.

Se Continúa con excavación zona influencia del
 Box culvert existente para su demolición como también
 transporte carga y Retiro material excavado y de
 material. Demolición Asfalto y Placa concreto Ura.

Se realiza señalización y Cerroamiento zona
 de excavación para prevención.


 Sergio Lara
 D. obra



 J. M. L.


Fecha 11 de Julio de 2025 Viernes

Estado del tiempo: Soleado todo el día
 Personal del Contratista: Director de obra, Residente
 SST, Topógrafo, Ayudante, oficial, operario
 Personal de Interventoría: Director de
 Interventoría. D. Interventoría

Mañana y Equipos: Minicargador, grúa
 Equipo topografía, planta eléctrica, alfileres.

Actividades Realizadas: Se encuentra caja de
 teléfono empresa ETR y también se ciñe tubería
 para el cable que pasa por el Proyecto del Box
 Culvert existente. Se avisó a ETR y no respondie-
 ron la llamada que se realiza al encargado Juan
 Pablo. Se toman puntos con topografía de caja
 telefonica. Se realiza demolición de Asfalto a
 por 0.17 promedios y Placa concreto a por 0.22
 en la Calzada izquierda Via Homicenter-unicen-
 to. Cargue, Transporteo y Retiro material de
 demolición y excavación. La gente este cru-
 zando por la zona de trabajo del Box Culvert
 sin hacer caso debido a que las excavaciones
 son profundas y que esta prohibido el paso por
 la zona del proyecto.


 Sergio Vera
 D. Obra


 Intel

Fecha 12 de Julio - 2025 Sábado.

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra Residente
 topógrafo, Ayudante, oficial, operario

Personal Interventoría: Director de interven-
 toria. D. Interventoría

Maquinaria y Equipos: Mini excavadora oruga, (grupos de topografía, Plante eléctrico, Volquete).

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación zona de influencia del Box culvert existente para llegar a la tapa superior del mismo, se realiza Retiro y transporte de material con la máquina por posteriormente cargado a la Volqueta y retirarlo por la Escombrera. Se realizó visita por parte del Ingeniero Hidráulico Revisando las propuestas de la implementación del nuevo box culvert que se va a construir. Revisando entrada y salida del mismo.

Pres.
Supervisor
P. obra

Int.

Fecha 14 de Julio - 2025 Lunes

Estado del tiempo: Soleado nublado

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Maquina.

Personal Interventoría: Dir. de Interventoría. P. Interventoría Maquinaria y Equipos: Mini excavadora oruga, grupos de topografía, Plante eléctrico, Volquetes.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación sobre box culvert existente para su demolición, (grape Retiro material excavado por Escombrera, se realiza transporte con Mini excavadora doblado a tubería Sanitaria, Huevo Uica, teléfono, 60). Llegaron los Señores de Aguajir para realizar el bypass de la tubería Agua potable de 14" con el tubo de 20" para dejarlos trabajar sin obstáculos en las excavaciones por el nuevo Box culvert. Realizo visita por parte del Ing. Version trabajo Supervisor Apoyo a la supervisión de SIG con el motivo de revisar Avances de la obra. Se implanta nuevamente la nueva propuesta del Ing. Hidráulico del nuevo Box culvert. Se le informa

al Ing. Yelson ya la Empresa E+B no responden para el tema caja y tubería pvc Corrugada por donde pasa cable Fibra optica y realizar lo respectivo. Por parte Alcalde en-
no oficio.

[Signature]
Sergio Vera
E. Bora

[Signature]
Intel

Fecha 15 de Julio. 2025 Martes.

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST Topografos, Ayudante, Oficial, Operario Maquina

Personal Interlocutoria: Director Interlocutoria, P. Interventoría Maquinaria y Equipos: Minirecadora, Equipos de topografía, Plante eléctrica voltajes.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación de Box Alvert existente para su posterior demolición con su respectivo carga y retiro material. Se realiza trans-pulsa con la maquina por temas de tubería presión pvc Agua potable y sanitario aguas lluvias. Los Señores de Acuagyr si-
gan con los trabajos para realizar by pass a la tubería PK 13" y realizarla con tubería de 20" este trabajo es por parte de la Empresa Acuagyr. Realiza visita técnica el Ing. Carlos Nieto Especialista de suelos y realiza las siguientes recomen-
daciones. Realizar mampio de Aguas de las Uls. Acero al proyecto para evitar socavaciones y derrumbes que por el talud del nuevo box. Recomendando un terrazo de 4.Mts a cada Costado del Proyecto del box por la profundidad que tenemos a la Cota del nuevo box que son aproximadamente 7.48 Mts. de profundidad donde hay que hacer terrazo para evitar socavación y posibles desestabilización de taludes y derrumbes. que el material de la fochacha no se puede utilizar como re-
lleno de terrazo. la recomendación de los taludes y terrazos son preliminares mientras se tiene el estudio correspondiente.

[Signature]
Sergio Vera
E. Bora

[Signature]
Esp. Geotécnica

[Signature]
Intel

Fecha 16-Julio-2025 Miércoles.

Estado del tiempo: Soleado, nublado

personal contratista: Director obra Residente obra SST
topógrafo, Ayudante, oficial, operario Mayura.

personal interventoría: Director interventoría P. Interventoría
Majunana y Equipos: Miniexcavadora oruga, Equipos
de topografía, Planta Eléctrica.

Actividades Realizadas: Se Continúa con demolición
Alcotas y laberinto de box Calvert existente durante todo el
día con la demolición y organizando para posteriormente
cargarlo y retirarlo. Se cubre visita al sitio y se da el
Apoyo a la Supervisión geotécnica Infraestructura Giratoria.
Para ver Avance de obra y se convoca Comité de obra
para el día de mañana 17 de Julio 2025 con especialistas Estructu-
ras, Suelos, Hidráulico, Directores obra, interventoría, Se
continúa Infraestructura Giratoria y la Supervisión contrato.

Se
sigue
P. obra

Fin

Fecha 17-Julio-2025 Jueves.

Estado tiempo: Soleado todo el día.

personal Contratista: Director obra Residente obra SST
topógrafo, Ayudante, oficial, operario Mayura.

personal interventoría: Director interventoría, P. Interventoría
Majunana y Equipos: Miniexcavadora oruga, Equipos
topografía, Planta eléctrica.

Actividades Realizadas: Se Continúa con demolición
de muros Alcotas Box existente costado derecho vía Home
Center a un centro, Verificación Señalización zonas de
Circulación. Se realizó visita por parte Acogir para unificar
con el tema tubería PVC 18" Aguas lluvias para realizar un pro-
yecto y demarcarla de la zona de trabajo. porque este es
un cruceamiento que es la que viene de un centro.

Se realizó Comité de obra en el sitio de trabajo. Por parte de Alcaldía municipal con Secretaría de Infraestructura, Supervisor de Apoyo Secretaría Infraestructura, por parte Contratista Director de obra, Residente obra, Especialista Geotécnica, Especialistas Hidráulico, por parte Interventoría Director Interventoría, y también estuvieron la Gerente de Unicentro, Director Operaciones Unicentro y Especialista Estructuras Unicentro. el ING Ramón Sequevela. Para verificar el muro pantalla que en su época el centro Comercial lo construyó y se está viendo afectado por el nuevo Box culvert que se va a construir por que una parte de soporte del muro pantalla especialmente 1 de los Keison queda en el Aire por ello se realizó el Comité con todos los partes para determinar el procedimiento a realizar donde se determinó el proceso para demolición del muro pantalla donde se realizarán 2 cortes internos y externos del muro para demolerlos hasta encontrar el Acero y dejarlo libre de concreto y posteriormente cortar los Aceros y posteriormente demoler la parte afectada por la obra.

Se recibió el planteo o Esquema propuesto por el Ing. Hidráulico ING. Camilo Corvajal. modelado programa y se aceptó por todos los partes y se propuso que como la excavación es de 8 mts. por recomendación del Ing. Geotécnico Ing. Carlos Nieto realizar terrazas de 1 mt de Ancho como mínimo para estabilizar el talud y 1 mts para zona de trabajo. Para formalizar el box culvert a construir y quede Aprobado por las partes que intervinieron en el Comité Supervisor Contrato, Interventoría.

Se
Eduardo
Eduardo

Se
Se
Se

Fecha 18 de julio de 2025 Viernes.

Estado del tiempo: Soleado todo el día

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Maquinaria

Personal Interventoría: Director Interventoría, E. Interventoría

Maquinaria y Equipos: Miniexcavadora Orya, Equipo de topografía, Planta Eléctrica.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación zona derecha Box existente de la Vía Home Center a un metro. Para quitar escombros de la demolición muro, demoliciones muro. Cisternas aguas abajo. Se elabora y organiza la zona para estudios suelos. Acortar muelle la tee 20" y el tapon para la tubería PVC 20" para realizar el bypass con la tubería PVC presión 14" o 12". Se replantea con topografía desde donde inicie las terrazas para continuar con las excavaciones.

Residente obra

Interv.

Fecha 19 de julio - 2025 Sábado

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director de obra, Residente obra SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Maquinaria

Personal de Interventoría: Director Interventoría, E. Interventoría

Maquinaria y Equipos: Mini excavadora Orya, Equipo de topografía, Planta Eléctrica.

Actividades Realizadas: Se realiza perfil transversal en terreno y dibujo por parte topografía entrada y salida de box culvert existente. Se realiza Conexión Válvula de 12" y Arreglos para tee instalada de 20" por parte de la Empresa Hecagye y el Corte de Agua para desmontar la tubería PVC 12" fue hecho por la Hecagye el día martes 22 de julio 2025.

Residente obra

Interv.

Fecha 21 de Julio de 2025 Lunes.

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal Interventoría: Director Interventoría, P. Interventoría

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST

Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Maquinaria.

Maquinaria y Equipos: Minicargadora oruga, Equipo topografía, Plante eléctrica.

Actividades Realizadas: Se continúa con demolición placa en Asfalto y Placa de concreto por la fresa doble Placa en zona de Box Culvert existente, para las terrazas que se autorizaron en Comité de obra y se continúa con excavación para terrazas. Se inicia con perforaciones para estudio Suelo, del nuevo box Culvert. Con equipo perforaciones profundas.

Residente obra

Inter.

Fecha 22 de Julio de 2025 Martes

Estado del tiempo: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director de obra, Residente obra,

SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial Operario Maquinaria

Personal Interventoría: Director Interventoría P. Interventoría.

Maquinaria y Equipos: Minicargadora oruga, Equipo topografía, Plante eléctrica, Volvuta, Equipo de Suelos.

Actividades Realizadas: Se continúa con demolición para terrazas de excavación del nuevo box Culvert a construir. Se retira el material excavado para la Escombrera a sitio autorizado. Se continúa con los estudios de Suelos. Por la cimentación del nuevo Box Culvert con sondajes con equipo de perforación aguas arriba cerca del box existente. Siendo eso de los 4:40 PM se presenta un incidente ajeno a la obra donde una

Ratón excavadora externa a la obra al parecer se quedó sin freno y ingreso a la obra y luego a la excavación que estamos realizando donde afectó a dicho tuberío PVC 28" de Aguas Ilustras fue llenado de concreto. Y un maletín de prevención. No se presentaron afectación a ninguna persona de la obra ni ajena a la obra.

Apoyo Supervisión SIG

Interventoría

Progr.
Según Carta
P. Obra

Fecha 23 - Julio de 2025 Miércoles.

Estado del Clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST Topógrafo, Ayudante, Ofical, Oficiano Mayorano,

Personal Interventoría: Director Interventoría, D. Interventoría, Magunaria y Equipo: Mini excavadora oruga, Equipo topografía, Equipo suelos, Volantes, Planta eléctrica.

Actividades Realizadas: Se continúa con demolición placa en Asfalto y Placa en concreto que sobre la placa de Asfalto se encuentra debajo placa de concreto de espesor 0.20mts. Se continúa con excavación y Retiro material de la excavación y de la demolición para sitio Autorizado de disposición Final del material. Se continúa con Sando de Estudio Suelos para la Comenzación de nuevo Box Alvert. en zona derecha vía Homecenter a un ciento axes arriba. Se realizó Comité de obra con Secretario Infraestructura, Prodesemollo, inspectores de Pluma, interventoría, contratista para determinar el espacio que se requiere para las terrazas que se deben construir por la profundidad del nivel Comenzación del box Alvert.

Progr.
R. Obra

Interv.

Fecha 24 Julio - 2025: Jueves

Estado del Clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST, Topógrafo, Ayudante, Oficial, Operario Máquina.

Personal Interventoría: Director Interventoría B. Interventoría Maguana y Equipos: Mini excavadora oruga, Equipos topografía, Equipos suelos, Volquetes, Planta eléctrica.

Actividades Realizadas: Se desmonta tubería PVC 12" Agua Potable zona box culvert, se continúa con excavación para terratenas para el box nuevo que se implanta. Para llegar a la placa superior box existente. Señalización zonas de excavación y adecuación con cerramiento. Se continúa con sondeo para estudio suelos para cimentación del nuevo box culvert. Se realizó Retiro de material excavado.

Jefe Obra

Interventor

Fecha 25 Julio - 2025 - Viernes

Estado del Clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST Topógrafo, Oficial, Operario Máquina.

Personal Interventoría: Director Interventoría B. Interventoría Maguana y Equipos: Mini excavadora oruga, Equipos topografía, Planta eléctrica, Volquetes, Equipos suelos.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación para terratenas para talud de llegar al nivel de cimentación del nuevo box culvert. Se realizaron retiro de material de la excavación, se cortó tubería en Julietiano para desmontarlo de 20". Se continúa con perforación para estudio suelos para la cimentación del nuevo box culvert en castillo a pie de talud. No se ha determinado el tema de la caja de telefonía C.T.B. para esta obteniendo el talud para

Construir la terraces.

Pres.
D. obra

J. J. J.

Fecha 26-Julio-2025 sábado.

Estado del Clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST, Topógrafo, Oficial, Operario Máquina.

Personal Interentoría: Director interentoría II, interentoría Maquinaria y Equipos: Mini excavadora carga, Equipo de topografía, Planta eléctrica, albañiles.

Actividades Realizadas: Se continúa con excavación de terraces para llegar al nivel de cimentación del nuevo Box Alvert y del existente. Se continúa con perforación para estudio de suelos para la cimentación del nuevo Box Alvert con equipo de perforación profunda. Se realizó recorrido con Director obra.

Zona de la quebrada aguas abajo para identificar los estancamientos se tiene la quebrada y poder desaguar zona donde se realizarán los muros Altitis del nuevo box porque la zona tiene como 90 cm aproximadamente y toda ella está el Culman TIR0 Aja.

Pres.
D. obra

J. J. J.

Fecha 28-Julio-2025 Lunes.

Estado del Clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST, Topógrafo, Oficial, Operario Máquina.

Personal Interentoría: Director interentoría II, interentoría Maquinaria y Equipos: Mini excavadora carga (Equipo)

de topografía, planta eléctrica, Estación de bombeo.

Actividades Realizadas: Se Continúa con excavación para terrazo para llegar al nivel placa superior del box colector existente. Se le comienza a colocar para pronunciar del tubo PVC Agua lluvias unicentro de 18" para guiarlo del sitio de trabajo del nuevo box colector se desmonta tubería en polietileno de 20" de zona donde se están realizando los terrazos para llegar al nivel de construcción del Box nuevo. Se retiraron Retiro de material de la excavación.

F. J. S. J. S.
Supervisor
D. obra

J. J. S. J. S.

Fecha 29-Julio - 2025 Martes

Estado del clima: Sin Sol y nublado.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra SST, TO, Jefe de obra, Oficial, Operarios.

Personal Intermunicipal: Director Intermunicipal, D. Intermunicipal.

Máquinaria y Equipos: Mini excavadora, Grupos de topografía, planta eléctrica, Estación de bombeo.

Actividades Realizadas: Se Continúa con excavación para terrazo para llegar al nivel placa superior del Box colector existente. Se inicia con personal Acueductos montando tubería PVC 18" Agua lluvias de la red que viene de unicentro. Se realiza retiro material excavado No se ha pronunciado la Empresa de ETS para la Caja de teléfono que pasa por la zona donde se va a construir el nuevo Box colector.

F. J. S. J. S.
Supervisor
D. obra

J. J. S. J. S.

Fecha 30-Julio 2025 Miércoles.

Estado clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST, Topógrafo, Oficial, Operario.

Personal Interventoría: Director Interventoría R. Interventoría. Maquinaria y Equipo: Minicargadora oruga, equipo de topografía, planta eléctrica, volquete.

Actividades Realizadas: Se continuó con excavación de terrajes para llegar al nivel de cimentación del box existente y la cimentación del nuevo box. Se realizó Retiro de material excavado. Se continuó con cambio de tubería tubería PVC 18" Agua. Lluvias por la empresa Aceagyr Desapare del corte con el unicornio que se repien mader porfir en la zona donde se construye el nuevo box c/vert.

Res.
D. obra.

Q. inter.

Fecha 31 Julio 2025 Jueves.

Estado clima: Soleado todo el día.

Personal Contratista: Director obra, Residente obra, SST, Topógrafo, Oficial, Operario.

Personal Interventoría: Director Interventoría R. Interventoría. Maquinaria y Equipo: Minicargadora oruga, equipo de topografía, planta eléctrica, volquete.

Actividades Realizadas: Se continuó con excavación de terrajes para llegar al nivel de cimentación del box existente y cimentación del nuevo box c/vert. y se realizó Retiro de material de excavación en angulo faja de agua de tubería PVC 12" Agua potable. Se está terminando de Arreglar el diseño provisional de la tubería por Sanitización. Agua Lluvia unicornio de 18" todos estos trabajos hechos por la empresa Aceagyr. no se ha demolido Caja telefónica por parte de GDS Ni por parte alguna.

Res.
D. obra.

Q. inter.

Fecha 01-Agosto-2025 Viernes.

Estado clima:


Personal Contratista: Director obra. Residente obra, SST, Topogra-

Fa. Oficial, Operario Maguana.


Personal intercomunicación:

Maguana y Grupos: Mimi Ejecutora.

Actividades Realizadas: Se procedió a demorar la caja
Telefonica perteneciente a ETB. Se mediante oficios
enviados por Alcaldia Municipal parte Secretaría Infraestructu-
ra se le informó que la caja quedaba en el Aire y por eso
se rogaba para que ellos tomaran cartas en el asunto y hoy
del asunto no se han manifestado.


Párraga Supervisor SSB


J. Obra


J. Inter.
