

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 1 de 17

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONSORCIO CONSULTÉCNICOS** **ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2**

INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS **DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.**

MES DE MAYO DE 2025

CARRETERAS A CARGO:

2513: CAUCASIA – PLANETA RICA

2514: PLANETA RICA – LA YE

7403: EL VIAJANO – SAN MARCOS



	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 2 de 17

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1879 DE 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL

GRUPO 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1435 DE 2024
CONTRATO 1451 DE 2024
CONTRATO 1444 DE 2024

NOMBRE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No: 12

CONSORCIO CONSULTECNICOS

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

MAYO 2025

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 3 de 17

ITEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	María Correa Díaz	Camilo Benítez	Camilo Benítez
Cargo:	Ing. Auxiliar II	Ing. Residente	Ing. Residente
Firmas:			



INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12.
PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

Fecha: 5/06/2025

Versión: 0

Página 4 de 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 1435- 2024, 1451-2024 y 1444-2024

Contratista: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL

Contrato de Interventoría No. 1879-2024

Interventoría: CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Objeto Contrato de Obra: COOTRAC - COOTRAPAZ - COOTRACOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 12

MES O PERIODO: MAYO DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	6
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	3
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	3
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	3
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	6
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	6
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	3
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	3
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-6-FR-2	
		MEPI-MN-IN-14-FR-1	
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	2
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	2
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	2
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 1824 de fecha 27 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 5 de 17

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	OBJETIVO	7
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
3.1	LOCALIZACIÓN	7
4.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.....	8
4.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.	8
4.2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COTRAPAZ” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.....	10
4.3	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.....	11
4.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	12
5.	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.....	13
6.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	14
6.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	14
6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	16
8.	ANEXOS.....	17

ANEXOS

1. INFORME MENSUAL DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
2. PROGRAMACIONES SEMANALES DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
3. BITACORAS DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
4. ANEXOS TÉCNICOS EN RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS COOPERATIVAS.

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICAS

1. **TABLA 1:** INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.
2. **TABLA 2:** INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 6 de 17

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de Administración Vial van encaminados, entre otros aspectos, a liderar, vigilar y marcar el orden de las actividades de Mantenimiento Rutinario que desempeñan los trabajadores que laboran en las vías a cargo, evaluando el trabajo realizado por ellos a través de los indicadores que han sido establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 2, Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS, se realiza el presente Informe de Interventoría, el cual corresponde a la vigilancia de las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario de las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ y COOTRACOL en el período comprendido entre el primero (01) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 7 de 17

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo la responsabilidad de la Administración Vial Grupo 2.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Las vías del proyecto se encuentran localizadas al oriente del Departamento de Córdoba sobre la carretera 2513: Caucasia – Planeta Rica (paso nacional por Caucasia, Puente San Jorge antiguo y paso nacional por Planeta Rica); la carretera 2514: Planeta Rica – La Ye y la carretera 7403: El Viajano – San Marcos.

A continuación, se muestra la localización del proyecto y detalle del sector de las vías contratadas.

Imagen 1. Localización de las vías 2513, 2514 y 7403.

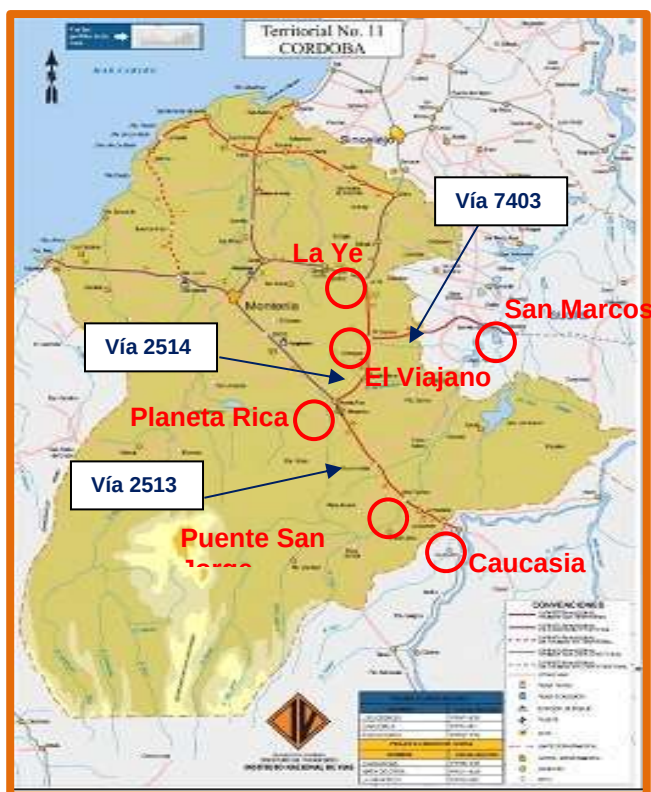

Las vías objeto de la Administración Vial de la Dirección Territorial Córdoba del INVÍAS y que han sido delegadas mediante el contrato de consultoría 1879 de 2024 al CONSORCIO CONSULTÉCNICOS, son: la vía Caucasia – Planeta Rica (Código 2513), Sectores (paso nacional por Caucasia), PR0+0000 – PR2+0780, (Puente San Jorge antiguo y sus accesos), PR18+0876 – PR19+0546, (paso nacional por Planeta Rica), PR62+0000 – PR66+0894, la vía Planeta Rica – La Ye (Código 2514), sector Planeta

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 8 de 17

Rica – La Ye, PR0+0000 – PR52+0000 y la vía El Viajano – San Marcos (Código 7403), sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815, (Incluye nuevo puente San Jorge y sus accesos).

La importancia de esta malla vial radica principalmente en que, al conectar al departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre, sumado al hecho de que se encuentra ubicada en una zona que se reconoce como destino turístico nacional, son vías que permanentemente tiene afluencia de usuarios, constituyendo así una fuente importante de ingreso para el departamento de Córdoba y la región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 2 encargadas del Mantenimiento Vial Rutinario son las siguientes:

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.**

La cooperativa COOTRAC encargada del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección territorial Córdoba. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

○ **COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA- COOTRAPAZ.**

La cooperativa COOTRAPAZ encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo los sectores:

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY – COOTRACOL.**

La cooperativa COOTRACOL encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo el sector de la Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, PR14+0000 – PR52+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 9 de 17

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0300-PR27+0500 y PR12+0000-PR15+0500, con 42 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR20+0000-PR21+0000, PR21+0800-PR25+0000 y PR11+0500-PR14+0300, 3500 metros con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR21+0800-PR25+0000 y PR11+0500-PR13+0500, 13 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR14+0700-PR15+0350, 8 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR27+0500-PR29+0500 y PR38+0200-PR44+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR25+0000-PR28+0200 y PR39+0000-PR40+0000, 2750 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR25+0000-PR25+0150, 150 metros con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR29+0500-PR38+0800, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR33+0400-PR39+0400, 2500 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza puente Monte Grande PR31+0016, con 4 jornales de trabajo.
- Poda de ramas PR39+0600-PR40+0000, 10 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR0+0000-PR12+0000, con 42 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR2+0350-PR6+0300 y PR7+0150-PR9+0800, 3000 metros con 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR2+0350-PR6+0300 y PR7+0150-PR8+0650, 13 unidades con 9 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en El Crucero, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 10 de 17

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAPAZ” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000-PR4+0400 y PR64+0000-PR64+0500, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR4+0800-PR4+0900 y PR64+0000-PR64+0500, 600 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0000, 1000 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR0+0000-PR4+0000, PR0+0000-PR2+0750, 91 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR1+0100-PR2+0700, 12 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales PR0+0000-PR2+0000, 28 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Retiro de ramas PR0+0900-PR2+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR18+0876-PR19+0546, 3 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Corte de rama peligrosa PR64+0300, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Tapa huecos PR66+0100-PR66+0540, 0.5 m³, con 3 jornales de trabajo.
- Aplomado de señales verticales PR0+0000-PR2+0750, 4 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR4+0400-PR11+0000 y PR0+0300-PR2+0780, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR4+0700-PR5+0500, PR1+0400-PR1+0800 y PR0+0900-PR2+0780, 3659 metros con 12 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR4+0600-PR8+0000 y PR62+0000-PR66+0894, 60 unidades con 24 jornales de trabajo.
- Capacitaciones internas los días 12 y 14 del mes de mayo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR9+0500-PR14+0000 y PR65+0725-PR66+0725, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR1+0400-PR1+0500, 100 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650 y PR10+0400-PR12+0450, 2680 metros con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR10+0500-PR12+0500 y PR64+0425, 33 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR1+0150-PR2+0700 y PR62+0000-PR64+0425, 19 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente San Jorge PR18+0786-PR19+0546, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR66+0725-PR66+0740, 15 metros con 3 jornales de trabajo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 11 de 17

- Aplomado de señales verticales PR11+0000-PR12+0500, 3 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación interna el día 20 de mayo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR62+0000-PR64+0800 con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR0+0000-PR2+0780, 2600 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650 y PR9+0700-PR10+0500, 3160 metros con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol PR6+0100, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR0+0000-PR12+0000 y PR0+0000-PR2+0780, 57 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en Planeta Rica, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR44+0000-PR52+0000 con 36 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR44+0300-PR44+0500, PR46+0000-PR46+0400, PR46+0900-PR47+0350, PR14+0000-PR15+0300 y PR16+0000-PR16+0600, 1850 metros con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR50+0300-PR51+0700, 7 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR19+0700-PR28+0000, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR22+0600-PR22+0750 y PR24+0750-PR25+0000, 500 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR20+0000-PR20+0900 y PR26+0000-PR26+0500, 6 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente Santiago, PR25+0771, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR21+0100-PR22+0700, 300 metros con 2 jornales de trabajo.
- Corte de árbol peligroso PR24+0450, 1 unidad con 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 12 de 17

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR28+0000-PR39+0500, con 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR28+0300-PR29+0000, PR31+0500-PR32+0200 y PR35+0050-PR35+0200, 1250 metros con 13 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR28+0200-PR28+0650, 4 unidades con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR33+0100-PR35+0000 y PR26+0400-PR37+0000, 800 metros con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR39+0500-PR43+0500, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR34+0200-PR34+0300, 700 metros con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR42+0200-PR42+0700, 800 metros lineales con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR40+500-PR41+0200, 4 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Corte de árbol PR30+0450, 1 unidad con 11 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera PR24+0450, 50 metros con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en Colomboy, tema: comunicación asertiva para una buena relación laboral, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la Administración Vial se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas, se corrobora que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 13 de 17

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	COOTRAC	COOTRAPAZ	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
CONTRATO	1435 de 2024	1451 de 2024	1444 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO P/PAL.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO P/PAL	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
ESTADO DEL CONTRATO:	41.3%	41.3%	41.3%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 14 de 17

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
CONTRATO N°:	1879 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de Junio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 3.985.035.229
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.035.229
ESTADO DEL CONTRATO:	24.05%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 15 de 17

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de Mantenimiento Rutinario de las carreteras a cargo.
- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas, las cuales se adjuntan al presente informe.
- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.
- Las cooperativas informaron sobre los accidentes ocurridos en las vías a su cargo.
- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna en las vías a cargo.
- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.
- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.
- Durante el mes las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 16 de 17

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez finalizado el periodo, respecto al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que se refiere a sus labores de mantenimiento rutinario, cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS.

Adicionalmente, se hizo énfasis en reforzar las actividades de embellecimiento y ornato de las vías mediante la poda periódica de árboles, el despeje de la zona de carretera, despeje de señales verticales y la recolección de basuras.

Durante el mes de mayo se realizaron a cabalidad las programaciones sugeridas a las cooperativas, dando un cierre satisfactorio al mes, habiendo tenido en este muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo. Todo esto para el ideal funcionamiento de las vías correspondientes a la AMV grupo 2.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 12. PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.	Fecha: 5/06/2025
		Versión: 0
		Página 17 de 17

8.ANEXOS.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAC"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 13.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA
“COOTRAC”
CONTRATO No. 1435 DE 2024**

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC, Módulo 2, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía entre el primero (1) de mayo al treinta (31) de mayo de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

El contrato No. 1435 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAC.

La cooperativa COOTRAC encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ **COOTRAC**

- Vía El Viajano – San Marcos, Código 7403, Sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815 (Incluye nuevo puente de San Jorge y sus accesos).

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAC” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCIÓN DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAC (CONTRATO No. 1435 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0300-PR27+0500 y PR12+0000-PR15+0500, con 42 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR20+0000-PR21+0000, PR21+0800-PR25+0000 y PR11+0500-PR14+0300, 3500 metros con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR21+0800-PR25+0000 y PR11+0500-PR13+0500, 13 unidades con 10 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR14+0700-PR15+0350, 8 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR27+0500-PR29+0500 y PR38+0200-PR44+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR25+0000-PR28+0200 y PR39+0000-PR40+0000, 2750 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR25+0000-PR25+0150, 150 metros con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR29+0500-PR38+0800, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR33+0400-PR39+0400, 2500 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza puente Monte Grande PR31+0016, con 4 jornales de trabajo.
- Poda de ramas PR39+0600-PR40+0000, 10 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR0+0000-PR12+0000, con 42 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR2+0350-PR6+0300 y PR7+0150-PR9+0800, 3000 metros con 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR2+0350-PR6+0300 y PR7+0150-PR8+0650, 13 unidades con 9 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en El Crucero, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de mayo al treinta (31) de mayo de 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Sobre los comités exigidos en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento; los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya está en funcionamiento, incluso ya se tiene implementado el Plan de Acción y los exámenes médicos ocupacionales para elaborar el Plan de Prevención.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento El Crucero, en el PR10+0800, vía 7403, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootrac ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
- Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.
- Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
- Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
- Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
- Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootrac con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRAC
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
NÚMERO DEL CONTRATO	1435 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.431.874.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de mayo de 2025 se ejecutaron con las actividades de rocería, despeje de zona de carretera, etc en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias como: poda de ramas, despeje de derrumbe y mantenimiento de jardín. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAPAZ"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 13.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRAPAZ”
CONTRATO No. 1451 DE 2024.**

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente al largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ, Módulo 7, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

El contrato No. 1451 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAPAZ.

La cooperativa COOTRAPAZ encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

COOTRAPAZ.

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAPAZ.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAPAZ” se encarga de realizar las actividades de mantenimiento vial rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAPAZ. (CONTRATO No. 1451 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000-PR4+0400 y PR64+0000-

- PR64+0500, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR4+0800-PR4+0900 y PR64+0000-PR64+0500, 600 metros con 6 jornales de trabajo.
 - Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0000, 1000 metros con 3 jornales de trabajo.
 - Poda, corte y/o retiro de árboles PR0+0000-PR4+0000, PR0+0000-PR2+0750, 91 unidades con 15 jornales de trabajo.
 - Limpieza de obras de arte PR1+0100-PR2+0700, 12 unidades con 3 jornales de trabajo.
 - Limpieza de señales verticales PR0+0000-PR2+0000, 28 unidades con 6 jornales de trabajo.
 - Retiro de ramas PR0+0900-PR2+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
 - Despeje de señales verticales PR18+0876-PR19+0546, 3 unidades con 3 jornales de trabajo.
 - Corte de rama peligrosa PR64+0300, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
 - Tapa huecos PR66+0100-PR66+0540, 0.5 m3, con 3 jornales de trabajo.
 - Aplomado de señales verticales PR0+0000-PR2+0750, 4 unidades con 3 jornales de trabajo.
 - Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR4+0400-PR11+0000 y PR0+0300-PR2+0780, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR4+0700-PR5+0500, PR1+0400-PR1+0800 y PR0+0900-PR2+0780, 3659 metros con 12 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR4+0600-PR8+0000 y PR62+0000-PR66+0894, 60 unidades con 24 jornales de trabajo.
- Capacitaciones internas los días 12 y 14 del mes de mayo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR9+0500-PR14+0000 y PR65+0725-PR66+0725, con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR1+0400-PR1+0500, 100 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650 y PR10+0400-PR12+0450, 2680 metros con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR10+0500-PR12+0500 y PR64+0425, 33 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR1+0150-PR2+0700 y PR62+0000-PR64+0425, 19 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente San Jorge PR18+0786-PR19+0546, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.

- Limpieza de defensas metálicas PR66+0725-PR66+0740, 15 metros con 3 jornales de trabajo.
- Aplomado de señales verticales PR11+0000-PR12+0500, 3 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación interna el día 20 de mayo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR62+0000-PR64+0800 con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR0+0000-PR2+0780, 2600 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650 y PR9+0700-PR10+0500, 3160 metros con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol PR6+0100, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR0+0000-PR12+0000 y PR0+0000-PR2+0780, 57 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en Planeta Rica, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo de 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, la protección de las enfermedades en general o a las enfermedades profesionales que son capaces de producir daños a las personas.

Se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario lo que exige el Instituto Nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios,

la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención. Además, ya se tiene implementado el Plan de Acción.

La sede de la cooperativa está ubicada en el municipio de La Apartada en donde se tiene el control de la documentación.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootrapaz ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
- Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.
- Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
- Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
- Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
- Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootrapaz con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para la ejecución de las actividades se cuenta con la señalización temporal que se utiliza en la jornada de trabajo para poder cumplir con lo que exige el Instituto Nacional de Vías, para brindar una buena protección a los trabajadores y los usuarios que transitan por la vía.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 2 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA.

COOPERATIVA	COOTRAPAZ
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.
NÚMERO DEL CONTRATO	1451 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 718,300,769
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 718,300,769

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la revista correspondiente al presente informe el Administrador Vial dio el visto bueno a las actividades que se realizaron en el campo ya que se cumplió con los indicadores de mantenimiento rutinario exigidos por INVIAS.

En el transcurso de este periodo, se realizó la actividad de rocería, poda de árboles y despeje de zona de carretera en varios puntos de la vía para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Se realizaron actividades complementarias como: Aplome de señales verticales, tapa huecos y despeje de señales verticales. Todo esto con el fin del funcionamiento optimo y mitigar daños en la vía.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRACOL"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 13.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRACOL”
CONTRATO No. 1444 DE 2024.**

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MAYO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL, Módulo 4, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo del año 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

El contrato No. 1444 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA-SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000” LOTE 4.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACOL.

La cooperativa COOTRACOL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, Sector Planeta Rica – La Ye, PR14+0000 – PR52+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACOL.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRACOL” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRACOL (CONTRATO No. 1444 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Jueves 1 – Domingo 11 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR44+0000-PR52+0000 con 36 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR44+0300-PR44+0500, PR46+0000-PR46+0400, PR46+0900-PR47+0350, PR14+0000-PR15+0300 y PR16+0000-PR16+0600, 1850 metros con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR50+0300-PR51+0700, 7 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 12 – Domingo 18 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR19+0700-PR28+0000, con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR22+0600-PR22+0750 y PR24+0750-PR25+0000, 500 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR20+0000-PR20+0900 y PR26+0000-PR26+0500, 6

unidades con 10 jornales de trabajo.

- Limpieza de puente Santiago, PR25+0771, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR21+0100-PR22+0700, 300 metros con 2 jornales de trabajo.
- Corte de árbol peligroso PR24+0450, 1 unidad con 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 19 – Domingo 25 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR28+0000-PR39+0500, con 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR28+0300-PR29+0000, PR31+0500-PR32+0200 y PR35+0050-PR35+0200, 1250 metros con 13 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR28+0200-PR28+0650, 4 unidades con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR33+0100-PR35+0000 y PR26+0400-PR37+0000, 800 metros con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 26 – Sábado 31 de Mayo de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR39+0500-PR43+0500, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR34+0200-PR34+0300, 700 metros con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR42+0200-PR42+0700, 800 metros lineales con 5 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR40+500-PR41+0200, 4 unidades con 5 jornales de trabajo.
- Corte de árbol PR30+0450, 1 unidad con 11 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera PR24+0450, 50 metros con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en Colomboy, tema: comunicación asertiva para una buena relación laboral, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo del año 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Salud y la Seguridad en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitaciones de riesgos enfocados en la protección de las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo.

De acuerdo a lo que requiere y exige el Instituto Nacional de Vías – INVIAS se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.
- Cascos.
- Delantales de cuero de protección para las guadañas.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención, el Plan de Acción ya se encuentra implementado.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento de Colomboy en donde se tiene el control de la documentación.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootracol ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
- Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.
- Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
- Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
- Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
- Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootracol con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para brindar una adecuada protección a los trabajadores y a los transeúntes de la vía mientras se ejecutan las actividades de mantenimiento rutinario, se está utilizando una adecuada señalización temporal acorde con lo exigido por el Instituto Nacional de Vías.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
NÚMERO DEL CONTRATO	1444 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.327.682.209

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de mayo la cooperativa de mantenimiento rutinario cumplió con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso de este periodo se continuó con la actividad rocería, de poda, corte y/o retiro de árboles y por ende despeje de señales verticales en varios puntos para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Así mismo, realizaron actividades complementarias como: Despeje de zonas de carretera y corte de árboles peligroso. Todo esto para el funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL

NIT. No. 812.003.389-9

CONTRATO No. 1444 DE 2024

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR44+0000	PR52+0000	9.45	9.74	8.00	15.35	36	0.43	
PR19+0700	PR43+0500	8.51	8.45	23.80	40.36	66	0.61	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR34+0200	PR34+0300	X		I-D	700	5	140.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR44+0300	PR44+0500	X		Triangular	200	5	40.00	
PR46+0000	PR46+0400	X		Triangular	400	5	80.00	
PR46+0900	PR47+0350	X		Triangular	450	5	90.00	
PR14+0000	PR15+0300	X		Triangular	500	5	100.00	
PR16+0000	PR16+0600	X		Triangular	300	5	60.00	
PR22+0600	PR22+0750	X		Triangular	150	3	50.00	
PR24+0750	PR25+0000	X		Triangular	350	3	116.67	
PR28+0300	PR29+0000	X		Triangular	800	3	266.67	
PR31+0500	PR32+0200	X		Triangular	300	5	60.00	
PR35+0050	PR35+0200	X		Triangular	150	5	30.00	
PR42+0200	PR42+0700	X		Triangular	800	5	160.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES				
PR50+0300	PR51+0700	7		DESCOLES	5	1.40	
PR20+0000	PR20+0900	3			5	0.60	
PR26+0000	PR26+0500	3			5	0.60	
PR28+0200	PR28+0650	4			2	2.00	
PR40+0500	PR41+0200	4			5	0.80	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR25+771	SANTIAGO	25.0	2	12.50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD


PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR21+0100	PR22+0700	X	X	300	2	150.00	
PR33+0100	PR35+0000	X	X	200	5	40.00	
PR36+0400	PR37+0000	X	X	600	5	120.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024
PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

OTRAS ACTIVIDADES
Corte de árbol peligroso PR24+0450 y PR30+0450 L.I, 2 unidades con 22 jornales de trabajo.
Despeje de zona de carretera PR24+0450, 50 metros con 6 jornales de trabajo.
Capacitación con la cooperativa en Colomboy, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral, 11 jornales de trabajo.
Vigilancia de la vía en los sectores a cargo.

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	55.7	102	0.55	95%
2	LIMPIEZA DE BERMA		ML	700	5	140.00	92%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4400	49	89.80	93%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE		UND	21	22	0.95	96%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	1100	12	91.67	94%
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	2	22	0.09	100%
7	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		ML	50	6	8.33	100%

OBSERVACIONES
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1444 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 13.
Se recomienda continuar priorizando la actividad de rocería
Continuar con la limpieza de las obras de drenaje, cunetas, puentes y pontones.
Continuar con actividades relacionadas con el ornato y embellecimiento de la vía.
Priorizar las actividades de limpieza de defensas metálicas y cunetas.



COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal



Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL



ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
 CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
 FECHA: MAYO 2025

LOTE: 4
 SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
 PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS




REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

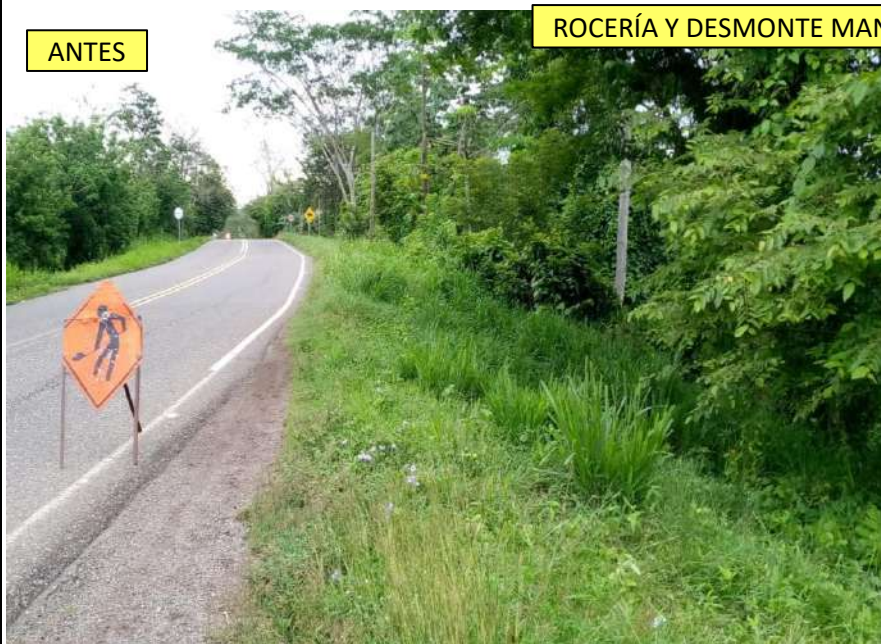

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS




REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

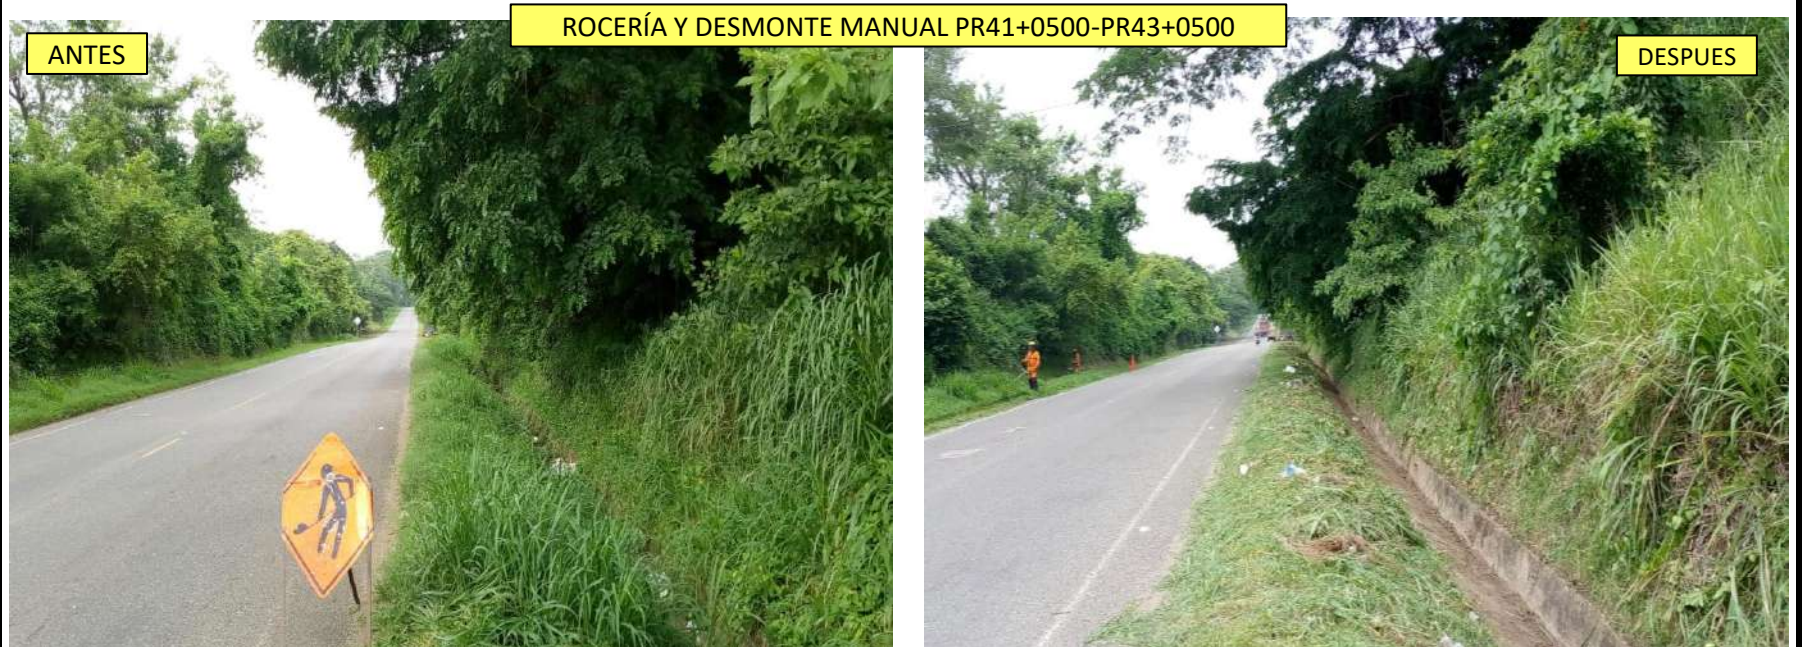

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: MAYO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN CON LA COOPERATIVA EN COLOMBOY



PROGRAMACIÓN SEMANAL



COOTRAC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE MAYO AL 3 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													PODA DE ÁRBOLES
		ROCERÍA	REPOSICIÓN DE PINTURA EN RESALTOS DE CONCRETO	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
JUEVES	1/05/2025	DÍA FESTIVO (VIGILANCIA EN LA VÍA)													
VIERNES	2/05/2025	PR0+0000-PR2+0000			PR9+0000-PR9+0700						PR9+0000-PR9+0700				
SÁBADO	3/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 5 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR											
		ROCERÍA	REPOSICIÓN DE PINTURA EN RESALTOS DE CONCRETO	ABSCISADO	LIMPIEZA DE								
					CUNETAS	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES
LUNES	5/05/2025	PR22+0800-PR24+0500			PR21+0800-PR23+0000						PR21+0800-PR23+0000		
MARTES	6/05/2025	PR24+0500-PR26+0000			PR23+0000-PR24+0000						PR23+0000-PR24+0000		
MIÉRCOLES	7/05/2025	PR26+0000-PR27+0500			PR24+0000-PR25+0000						PR24+0000-PR25+0000		
JUEVES	8/05/2025	PR12+0000-PR13+0500			PR11+0500-PR13+0300						PR11+0500-PR13+0300		
VIERNES	9/05/2025	PR13+0500-PR15+0500			PR13+0300-PR14+0300						PR13+0300-PR14+0300		
SÁBADO	10/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR														
		ROCERÍA	REPOSICIÓN DE PINTURA EN RESALTOS DE CONCRETO	ABSCISADO	LIMPIEZA DE											PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	12/05/2025	PR27+0500-PR29+0500			PR25+0000-PR26+0000								PR25+0000-PR26+0000			
MARTES	13/05/2025	PR42+0500-PR44+0000				PR44+0150-PR47+0600										
MIÉRCOLES	14/05/2025	PR41+0000-PR42+0500			PR26+0000-PR27+0000								PR26+0000-PR27+0000			
JUEVES	15/05/2025	PR39+0500-PR41+0000			PR27+0000-PR28+0200								PR27+0000-PR28+0200			
VIERNES	16/05/2025	PR38+0000-PR39+0500			PR29+0000-PR40+0000								PR29+0000-PR40+0000			
SÁBADO	17/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	REPOSICIÓN DE PINTURA EN RESALTOS DE CONCRETO	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	19/05/2025	PR37+0000-PR38+0800													PR39+0600-PR40+0000
MARTES	20/05/2025	PR35+0300-PR37+0000			PR38+0000-PR39+0400							PR38+0000-PR39+0400			
MIÉRCOLES	21/05/2025	PR33+0500-PR35+0300			PR36+0400-PR38+0000							PR36+0400-PR38+0000			
JUEVES	22/05/2025	PR31+0500-PR33+0500			PR34+0800-PR36+0400							PR34+0800-PR36+0400			
VIERNES	23/05/2025	PR29+0500-PR31+0500			PR33+0400-PR34+0800							PR33+0400-PR34+0800	MONTE GRANDE PR31+0010		
SÁBADO	24/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	DESPEJE DE DERRUMBE	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	26/05/2025	PR0+0000-PR2+0500	PR1+0650												
MARTES	27/05/2025	PR2+0500-PR4+0700			PR2+0350-PR3+0500							PR2+0350-PR3+0500			
MIÉRCOLES	28/05/2025	PR4+0700-PR6+0700			PR3+0500-PR5+0000							PR3+0500-PR5+0000			
JUEVES	29/05/2025	CAPACITACIÓN EN EL CRUCERO													
VIERNES	30/05/2025	PR8+0700-PR10+0700			PR7+0150-PR8+0650							PR7+0150-PR8+0650			
SÁBADO	31/05/2025	PR10+0700-PR12+0000			PR8+0850-PR9+0800							PR8+0850-PR9+0800			

COOTRAPAZ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE MAYO AL 3 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	REPOSICIÓN DE PINTURA EN ABCISA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
JUEVES	1/05/2025	DÍA FESTIVO (VIGILANCIA EN LA VÍA)												
VIERNES	2/05/2025							2513: PR18+0876-PR19+0546	2514: PR13+0000-PR13+0500			2513: SAN JORGE PR18+0876		
SÁBADO	3/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 5 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ROCEÍA	APLOMADO DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	ACTIVIDAD A EJECUTAR									PODA DE ÁRBOLES	
					LIMPIEZA DE										
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	5/05/2025	2514: PR2+0000-PR2+0600													
MARTES	6/05/2025														2514: PR1+0120 2513: PR64+0300
MIÉRCOLES	7/05/2025	2514: PR2+0500-PR4+0000					2513: PR0+0900-PR2+0650								
JUEVES	8/05/2025								2514: PR4+0000-PR4+0600		2513: PR1+0120-PR2+0700				
VIERNES	9/05/2025		2513: PR0+0150-PR2+0780	2513: PR0+0150-PR2+0780					2514: PR3+0000-PR4+0000					2513: PR0+0150-PR2+0780	
SÁBADO	10/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ROCEÍA	APLOMADO DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
					LIMPIEZA DE									
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
LUNES	12/05/2025	2514: PR4+0400-PR6+0500												
MARTES	13/05/2025	2514: PR6+0500-PR9+0600												
MIÉRCOLES	14/05/2025	2514: PR9+0600-PR10+0500					2513: PR0+0900-PR2+0650							
JUEVES	15/05/2025	2513: PR0+0400-PR2+0780									2513: PR62+0000-PR64+0500			
VIERNES	16/05/2025						2514: PR4+0600-PR10+0600					2513: PR18+0876-PR19+0546 P. SAN JORGE		
SÁBADO	17/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCEÍA	APLOMADO DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DE RUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
LUNES	19/05/2025	2514: PR9+0500-PR11+0500												
MARTES	20/05/2025	2514: PR11+0500-PR13+0000												
MIÉRCOLES	21/05/2025	2514: PR13+0000-PR14+0000									2514: PR1+0150-PR2+0620			
JUEVES	22/05/2025						2513: PR0+0900-PR2+0640 2514: PR4+0800-PR10+0600							
VIERNES	23/05/2025										2513: PR62+0000-PR64+0600	SAN JORGE PR18+0876- PR19+0546		
SÁBADO	24/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROGERÍA	APLOMADO DE SEÑALES VERTICALES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DE RUMBBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	26/05/2025	2513: PR62+0000-PR64+0800												
MARTES	27/05/2025												2514: PR6+0100	
MIÉRCOLES	28/05/2025					2513: PRO+0900-PR2+0650				2514: PRO+0000-PRS+0000				
JUEVES	29/05/2025	CAPACITACIÓN EN PLANETA RICA												
VIERNES	30/05/2025									2514: PR5+0000-PR12+0000				
SÁBADO	31/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRACOL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 1 DE MAYO AL 3 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	COLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICAL	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
JUEVES	1/05/2025	DÍA FESTIVO (VIGILANCIA EN LA VÍA)										
VIERNES	2/05/2025	PR42+0500-PR44+0000				PR42+0200-PR42+0700						
SÁBADO	3/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 5 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	COLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICAL	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	5/05/2025	PR46+0000-PR48+0000				PR46+0000-PR46+0600						
MARTES	6/05/2025	PR48+0000-PR50+0000				PR46+0900-PR47+0350						
MIÉRCOLES	7/05/2025	PR50+0000-PR52+0000							PR45+0100-PR50+0700			
JUEVES	8/05/2025	PR14+0000-PR16+0000				PR14+0000-PR15+0300						
VIERNES	9/05/2025	PR16+0000-PR18+0000				PR15+0500-PR16+0000						
SÁBADO	10/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 12 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROGERÍA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	COLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICAL	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	12/05/2025	PR19+0700-PR21+0700							PR20+0000-PR20+0900			
MARTES	13/05/2025											CORTE DE ÁRBOL SECO PR23+0450
MIÉRCOLES	14/05/2025	PR21+0700-PR24+0000					PR21+0100-PR22+0700					
JUEVES	15/05/2025	PR24+0000-PR26+0000				PR24+0800-PR25+0000						
VIERNES	16/05/2025	PR26+00000-PR28+0000							PR24+0200-PR26+0000			
SÁBADO	17/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 19 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	COLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICAL	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	19/05/2025	PR28+0000-PR31+0000				PR28+0300-PR29+0000						
MARTES	20/05/2025	PR31+0000-PR33+0000					PR31+0100-PR32+0850					
MIÉRCOLES	21/05/2025	PR33+0000-PR35+0000					PR33+0100-PR35+0000					
JUEVES	22/05/2025	PR35+0000-PR37+0000					PR36+0400-PR37+0000		PR36+0000-PR36+0200			
VIERNES	23/05/2025	PR37+0000-PR39+0000				PR37+0500-PR38+0000						
SÁBADO	24/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	26/05/2025											PR30+0450
MARTES	27/05/2025			PR23+0450								
MIÉRCOLES	28/05/2025	PR39+0500-PR41+0500				PR40+0300-PR40+0600						
JUEVES	29/05/2025	CAPACITACIÓN EN COLOMBOY										
VIERNES	30/05/2025	PR41+0500-PR43+0500				PR42+0200-PR42+0700						
SÁBADO	31/05/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

BITÁCORAS



COOTRAC



CONSULTECNICOS



Microempresa: COOTRAC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

2 DE MAYO 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO							
		PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.			
Reverle	M2																																						
Limpeza de Borneos	M																																						
Limpeza de Carreteras	M																																						
Bacheo	M2																																						
Despeje de derrumbes	Un																																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																						
Reposición y/o Pintura PR	Un																																						
Limpeza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un																																						
Limpeza de Puertas	Un																																						
Limpeza de Barandas y Defensa Metálicas	M																																						
Limpeza de Calzados	M2																																						
Limpeza de Señales Verticales y PR	Un																																						
Parcheo	M2																																						
Seto de faenas	M																																						
COMENTARIOS																																VIGILANCIA EN LA VIA							

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

CONTRAC

SEVANA CEL

[illegible]

12 DE 16 DE MAYO 2025

[illegible]

NOTA: Aproximadamente el 70% de los accidentes en la vía pública se producen entre las 6 y las 9 horas de la mañana y entre las 4 y las 8 de la tarde.

19 A 23 MAYO 2025

Vermerk: _____ CONTRACT

NOTA: Antes cualquier otro trabajo sobre eventual caso de estudio en la vía, se requiere un documento escrito firmado, por el PR, Catedrante de la asignatura. Firmas de docentes y personal de planta.

CONSULTECNICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO I
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Mantenimiento:

COTRAC

SEMANA DEL

26 AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO									
		PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.					
Recepción	KG	0+100	2+100	x	x	3			2+100	4+100	x	x	7			4+100	6+100	x	x	7			6+100	8+100	x	x	7			8+100	10+100	x	x	7			10+100	12+100	x	x	7
Limpieza de Barras	M																																								
Limpieza de Cunetas	ML								2+100	3+100	500	ML	4			3+100	5+100	800	ML	4			5+100	6+100	700	ML	4			7+100	8+100	300	M	4			8+100	9+100	500	ML	4
Desarrollo	ML																																								
Desarrollo de cunetas	ML	1+600		1	ML	4																																			
Poda, corte y retiro de árboles	Un																																								
Reposición de Puntos de	Un																																								
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, pozos, cunetas y drenajes)	Un								2+100	3+100	4		3			3+100	5+100	4		2			5+100	6+100	4		2			6+100	8+100	1		2							
Limpieza de Puentes	Un																																								
Limpieza de Barreras y Delimitadores Metálicos	M																																								
Limpieza de Calzadas	KG																																								
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																								
Parqueo	KG																																								
Señal de fisuras	ML																																								
COMENTARIOS																																									
																				VIGILANCIA EN LA VÍA.																					

VIGILANCIA EN LA
VIA.

NOTA: Antes de iniciar el trabajo debe verificarse que el clima sea adecuado para el trabajo. Si se detecta un accidente o cualquier otro incidente, se debe detener el trabajo y avisar a la autoridad competente.

COOTRAPAZ





SEMANA DEL

01 91 03 May 0 2025



NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



Microempresa:

COOTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL:

05 al 10 Mayo 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Directo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Directo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Directo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Directo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Directo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rozas	MC	0400	2400	X	3	6	1,2,3,2514											2100	3150	X	3	6	23,24,2514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

NOTA:

Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Ocho de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Tapado de huecos del PR 66+100 al PR 66+540, 2UN, Ruta 2513. 3 jornales. Fotos = 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Microimpresa

COOTRAPAZ

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO						
		PR Inicial	PR Final	Inclinado Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Inclinado Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Inclinado Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Inclinado Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Inclinado Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta							
Recepción	MO	4400	5800	2	3	6	1,2,3,7,14								51800	84150	2	3	6	24,25,26,27,28	1309	1000	1	3	3	22,23,24,25,26,27,28	1400	11300	2	3	3	46,47,25,14											
Limpieza de Barras	MI																																										
Limpieza de Correas	MI							4400	57500	2000	6	14,11,15	2514																														
Bachos	MO																																										
Despeje de derrumbes	UN																																										
Proa, corte y retro de árboles	UN	3700	6700	3	UN	6	4,5,6	62700	66708	9426	UN	6	17,18	2513	6700	8700	3	UN	6	27,28	2514																						
Reposición y/o Pintura por	UN																																										
Limpieza de Obras de arte (acuarelas, bocaneros y personas)	UN																																										
Limpieza de Puertas	UN																																										
Limpieza de Barridos y Defensas Metálicas	MI																																										
Limpieza de Calzados	MO																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	UN																																										
Parcheo	MO																																										
Seto de Taurus	MI																																										
COMENTARIOS		Capacitación en manejo de guadua y todo el personal. 8, 9-10							Retirada de árbol caído en el PR 47600 al PR 67150. 60 árboles. Ruta 2514. 10, 21, 32							Capacitación en manejo de residuos. Todo el personal. 20, 21, 32														Vigilancia permanente ca la vía.													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar fecha, hora, FR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



Microempresa:

COOTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEMANA DEL: 19 al 24 Mayo 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO											
		PR Inicial	PR Final	Equivalente	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equivalente	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equivalente	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equivalente	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equivalente	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta							
Rosario	M	9+500	14:300	X	3	6	5.2.7	2514	11:00	12:00	2	3	6	22-23	24	2514	12:00	14:00	X	3	3	15	76	28	514	65	25	66	172	X	3	3	34	35	2513													
Limpieza de Barreras	M																																															
Limpieza de Concretos	M																																															
Bachos	M2																																															
Despeje de derrumbes	Un																																															
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	10+500	11+300	20	UN	6	7.8.9.	11:00	12:00	12	UN	6	16.17.	18	2514																																	
Reparación y/o Pintura PRT	Un																																															
Limpieza de Ollero de agua (plomerías, bocanillas y perforaciones)	Un																																															
Limpieza de Puertas	Un																																															
Limpieza de Barreras y Delineaciones Verticales	M																																															
Limpieza de Calles	M2																																															
Limpieza de Superficies Verticales y PRT	Un																																															
Parcheo	M2																																															
Sello de Bordes	M																																															
COMENTARIOS		Enderezo de señales del pr 11:00 al pr 12:00 Ruta 2514, 6 jornales 3 UN							Retiro de tierra en el pr 1+400 Ruta 2513, 3 jornales. Fotos = 28. 24.30																					Vigilancia permanente en la vía																		
		Fotos = 19. 20. 21																																														

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

- Capacitación uso de herramientas y elementos de protección personal.
Todo el personal.
Fotos = 13. 14. 15



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTARIO



Microcentros

COTRPAZ

SEMANA DEL:

26 al 31 Mayo

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derretido	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derretido	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derretido	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derretido	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derretido	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Pavimento	M2	62100	64100		3	6		2513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Vigilancia permanente en la vía.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRACOL





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL: 2 de Mayo del 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SABADO				
		PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derribo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derribo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derribo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derribo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Seguimiento Derribo	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocera	M2																			74	46	x	x	13	6						
																									1 2 3						
Limpieza de Borneos	Mi																														
Limpieza de Cunetas	Mi																			441300	441500	200m	x		5	4					
Bacheo	M2																														
Despeje de derrumbes	Un																														
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																														
Reposición y/o Pintura PR	Un																														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y sifones)	Un																														
Limpieza de Puentes	Un																														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Mi																														
Limpieza de Calzada	M2																														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																														
Parcheo	M3																														
Sello de Isuras	Mi																														
COMENTARIOS																															

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

5 al 9 de Mayo del 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	izquierda	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Rocío	M2	46	48	x	x	20	6	1/3	48	50	x	x	21	6	1/3	50	52	x	x	16	6	1/3	14	16	x	x	12	6	1/3	16	17	x	x	14	6	22	
							3							9															19					24			
Limpieza de Bermen	M																																				
Limpieza de Cunetas	M	46	46+400 4400 m	x			5	4 5 6	46+900	47+570 450 m	x	x		5	10 11 12							14	15+300 500 m	x	x	5	19 20 21	16	16+600 300 m	x		5	25 26 27				
Bacheo	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un															50+300 m 51+700 10 uni	5																				
Limpieza de Puertas	Un																																				
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																				
Limpieza de Calzados	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parcheo	M3																																				
Sello de Rutas	M																																				
COMENTARIOS																																					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

12. al 16 de Mayo del 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO							
		PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.			
Rocío	M2	19700	21700	x	x	15	6	1							21700	24	x	x	19	6	1	9	24	26	x	x	16	6	17	18	26	28	x	x	17	6	25	26	27
Limpieza de Bordes	M1																																						
Limpieza de Cunetas	M1														22600	22750	150m	x	3	13	14	15	24750	25	300m	x	3	19	20	21									
Bacheo	M2																																						
Despeje de derrumbes	Un																																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																						
Reposición y/o Pintura PR	Un																																						
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un	20 al 204900 ID					5	6-7																				26 al pr 26750 ID			5	28	29	30					
Limpieza de Puentes	Un																																						
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M1														21100 al 22700	20	300m		2	10	11	12																	
Limpieza de Calzada	M2																																						
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																						
Percheo	M3																																						
Sello de fisuras	M1																																						
COMENTARIOS		Corte de árbol en el pr 24450 I. Jor (11) Foto 789																																					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

19 al 23 de Mayo del 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR Final	Isquiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Isquiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Isquiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Isquiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Isquiendo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Recorte	M2	28	31	x	x	11	C	3	31	33	x	x	16	6	10 11 12	33	35	x	x	17	6	14 15 16	35	37	x	x	15	6	22 23 24	37	39+500	x	x	14	6	23 24 25	
Limpieza de Bordes	M																																				
Limpieza de Carreteras	M	28+300	29 800m	x	x	2	C	5	31+300	32+200 300m	x	y	5	13 14 15								35+650	37+200 150m	x	5	25 26 27											
Bacheo	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un	28+200 a/	27+650 20 uni	4		2	2	3																													
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Delineamientos Metálicos	M														53+100 a/ PR 35	10	20 21	5						36+400 a/	37 20	600m	5	NO									
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parcheo	M2																																				
Señal de Obras	M																																				
COMENTARIOS																																					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

26 al 30 de Mayo del 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SABADO				
		PR Inicial	PR final	Isquierto	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Isquierto	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Isquierto	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Isquierto	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.		
Recepción	M2																														
Limpieza de Bermen	M																														
Limpieza de Carreteras	M																														
Bacheo	M2																														
Despeje de derrumbes	Un																														
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																														
Reposición y/o Pintura PR	Un																														
Limpieza de Ocas de este (alcantarillas, box culvert y similares)	Un																														
Limpieza de Puertas	Un																														
Limpieza de Barandas y Defensa Metálicas	M																														
Limpieza de Calzada	M2																														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																														
Parcheo	M3																														
Sello de fisuras	M																														
COMENTARIOS	Corte de árbol					Retiro de árboles										Capacitación en															
	Pr 30+450 Z.					Cortado en la zona										Colombay															
	Jur (11) Foto 123					de carretera										Jur (11) Foto 131415															
						Pr 24+450 ZD																									
	Jur (6) Foto NO																														

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

ANEXOS TECNICOS EN
RELACIÓN DE CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LAS COOPERATIVAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPHMN-IN-15-FR-2																																																																																			
				VERSION	1																																																																																			
				PÁGINA	1 DE 2																																																																																			
					FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 1,431,874,333																																																																																				
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																				
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		\$																																																																																				
		FECHA DE REANUDACIÓN:		\$ 1,431,874,333																																																																																				
		FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO CONCEDIDO: \$																																																																																				
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																				
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km 49.815</td></tr></table>				ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción		Mejoramiento		Rehabilitación		Estructuras	Túneles		Puentes		Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49.815	<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km 49.815</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49.815																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																																							
	Mejoramiento																																																																																							
	Rehabilitación																																																																																							
Estructuras	Túneles																																																																																							
	Puentes																																																																																							
	Pontones																																																																																							
Mantenimiento																																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49.815																																																																																						
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																					
Pavimentación	Construcción																																																																																							
	Mejoramiento																																																																																							
	Rehabilitación																																																																																							
Estructuras	Túneles																																																																																							
	Puentes																																																																																							
	Pontones																																																																																							
Mantenimiento																																																																																								
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km 49.815																																																																																						
AVANCE FINANCIERO																																																																																								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																				
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1,407,561,900.18</td><td>\$ 24,312,432.82</td><td>\$ 1,431,874,333.00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 1,407,561,900.18</td><td>\$ 24,312,432.82</td><td>\$ 1,431,874,333.00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 48,813,000.00</td><td>\$ 843,133.64</td><td>\$ 49,656,133.64</td><td>\$ 591,696,647.27</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 48,813,000.00</td><td>\$ 843,133.64</td><td>\$ 49,656,133.64</td><td>\$ 591,696,647.27</td></tr></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 591,696,647.27	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 591,696,647.27
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																					
OBRAS	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00																																																																																					
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00																																																																																					
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																				
OBRAS	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 591,696,647.27																																																																																				
AJUSTES																																																																																								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																								
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																								
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																								
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)																																																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 591,696,647.27																																																																																				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																								
INVERSIÓN EN OBRA																																																																																								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):		\$ 1,431,874,333.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ 591,696,647.27																																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		41.3%																																																																																						
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																								
MANO DE OBRA CALIFICADA:		11																																																																																						
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:		11																																																																																						
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		11																																																																																						
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		11																																																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPH-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	2 DE 2
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025				
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	
			FECHA DE SUSPENSIÓN:	
			FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.			FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
			PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
			VALOR INICIAL (Incluido IVA) : \$ 1.431.874.333	
			VALOR ADICIONALES (Incluido IVA):	
			VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 1.431.874.333	
			ANTICIPO CONCEDIDO: \$ +	
			ANTICIPO AMORTIZADO: \$ +	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div><p>ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL</p><p>VÍA 7403; PR22+0800</p><p>2/5/2025</p></div><div><p>LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE</p><p>VÍA 7403; PR42+0000</p><p>15/5/2025</p></div><div><p>MANTENIMIENTO JARDIN</p><p>VÍA 7403; PR1+0350</p><p>16/5/2025</p></div><div><p>PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES</p><p>VÍA 7403; PR40+0000</p><p>19/5/2025</p></div><div><p>LIMPIEZA DE CUNETAS DERRUMBE</p><p>VÍA 7403; PR1+0650</p><p>27/5/2025</p></div></div>				
Indicar la localización y actividad.				
Indicar la localización y actividad.				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div> <div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div> <div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div>				
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEPI-MN-R-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

31/05/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.:

1451-2024

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIO:

20 DE MAYO DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

\$ 718,300,769.00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

\$ 718,300,769.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$ -

ANTICIPO CONCEDIDO:

\$ -

ANTICIPO AMORTIZADO:

\$ -

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0540 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATISTA:

COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

1879-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Km	22.471

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento	Otros (Especificar cuales)	Km	22.471	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 296,827,781.30
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 296,827,781.30

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 718,300,769.00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 296,827,781.30

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 41.3%

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6


EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6


TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION 1
			PÁGINA 2 DE 2
			FECHA 31/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
		PERIODO MES:	1 AL 31 DE MAYO DE 2025
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000, LOTE 7.		FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 718.300.769.00
		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 718.300.769.00
		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar la localización y actividad.		Indicar la localización y actividad.	
			
			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)			
<div><div></div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																					
					VERSION 1																																																																																					
					PÁGINA 1 DE 2																																																																																					
					FECHA 31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025																																																																																						
CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 1,327,682,209.00																																																																																						
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4		FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024		VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$																																																																																						
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1,327,682,209.00																																																																																						
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO: \$																																																																																						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL		FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO: \$																																																																																						
		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1879-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																					
<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38.00</td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00	<table><thead><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38.00</td><td></td></tr></tbody></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																							
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00																																																																																							
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00																																																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 1,305,138,900.71</td><td>\$ 22,543,308.29</td><td>\$ 1,327,682,209.00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 1,305,138,900.71</td><td>\$ 22,543,308.29</td><td>\$ 1,327,682,209.00</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 45,261,100.00</td><td>\$ 781,782.64</td><td>\$ 46,042,882.64</td><td>\$ 548,641,047.01</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 45,261,100.00</td><td>\$ 781,782.64</td><td>\$ 46,042,882.64</td><td>\$ 548,641,047.01</td></tr></tbody></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 548,641,047.01	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 548,641,047.01
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00																																																																																							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 548,641,047.01																																																																																						
AJUSTES																																																																																										
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																																																																																										
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																																																																																										
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)																																																																																										
VALOR EJECUTADO	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 548,641,047.01																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 1,327,682,209.00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 11																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 548,641,047.01				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11																																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 41.3%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11																																																																																						
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11																																																																																						

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MV-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA 2 DE 2</div>		
		<div>FECHA 31/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small></div>		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025		
<div>CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL</div> <div>PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026</div> <div>VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 1.327.682.209.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1.327.682.209.00 ANTICIPO CONCEDIDO: ANTICIPO AMORTIZADO:</div>				
<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA</div>				
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<div><div>LIMPIEZA DE CUNETAS VIA 2514; PR44+0500 2/5/2025</div></div>	<div><div>PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL VIA 2514; PR23+0450 18/5/2025</div></div>	<div><div>LIMPIEZA PUENTE SANTIAGO VIA 2514; PR25+0800 18/5/2025</div></div>	<div><div>ROCERÍA Y DESMONTES MANUALES VIA 2514; PR31+0000 19/5/2025</div></div>	<div><div>DESPEJE ZONA DE CARRETERA VIA 2514; PR33+0500 27/5/2025</div></div>
Indicar la localización y actividad.		Indicar la localización y actividad.		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div><div></div><div>Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>				

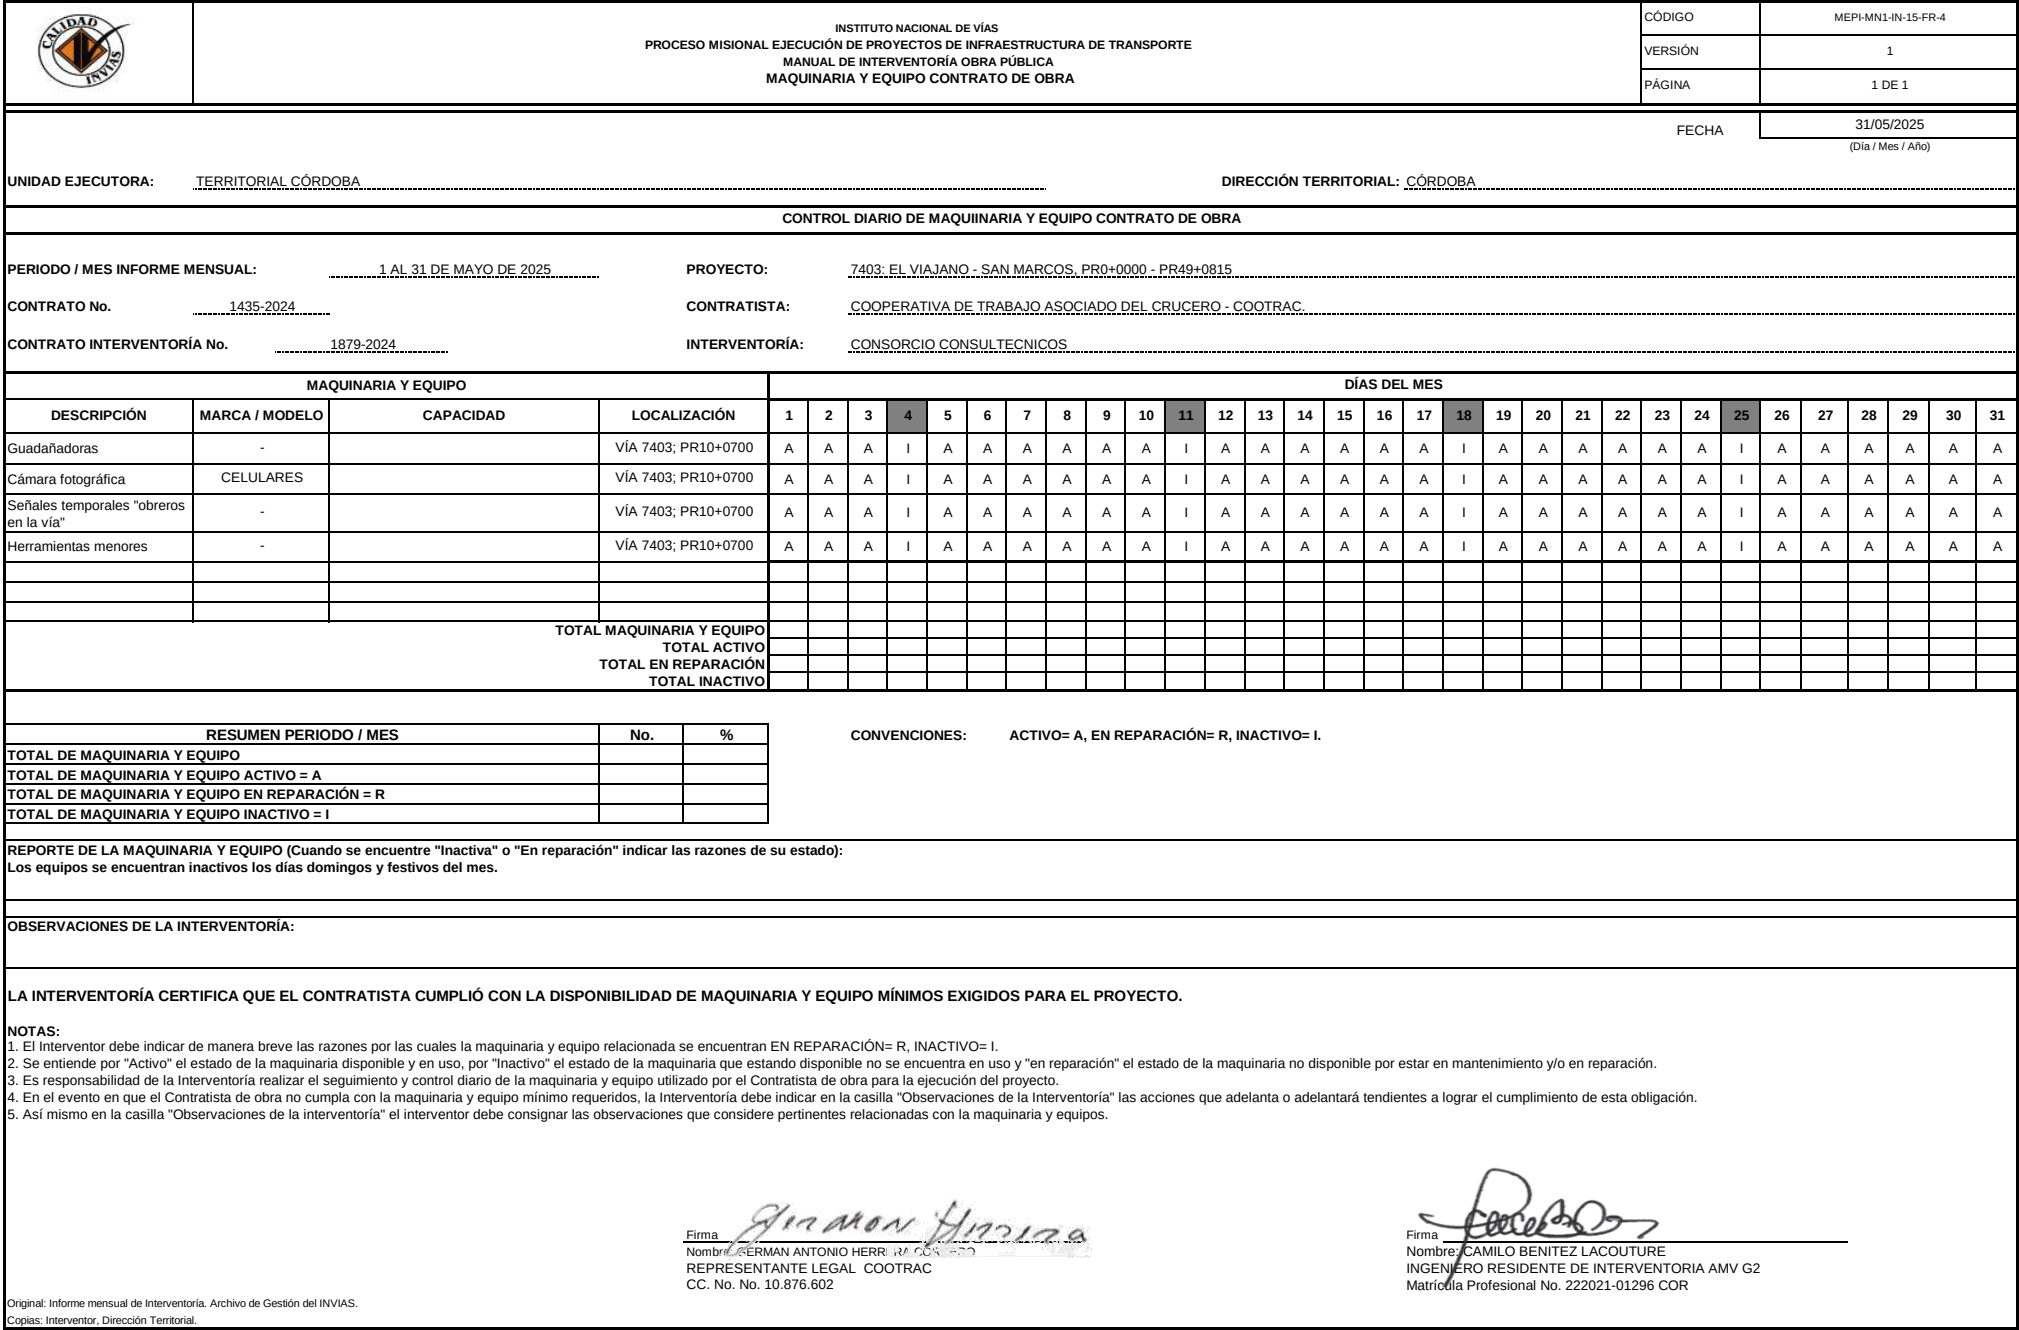

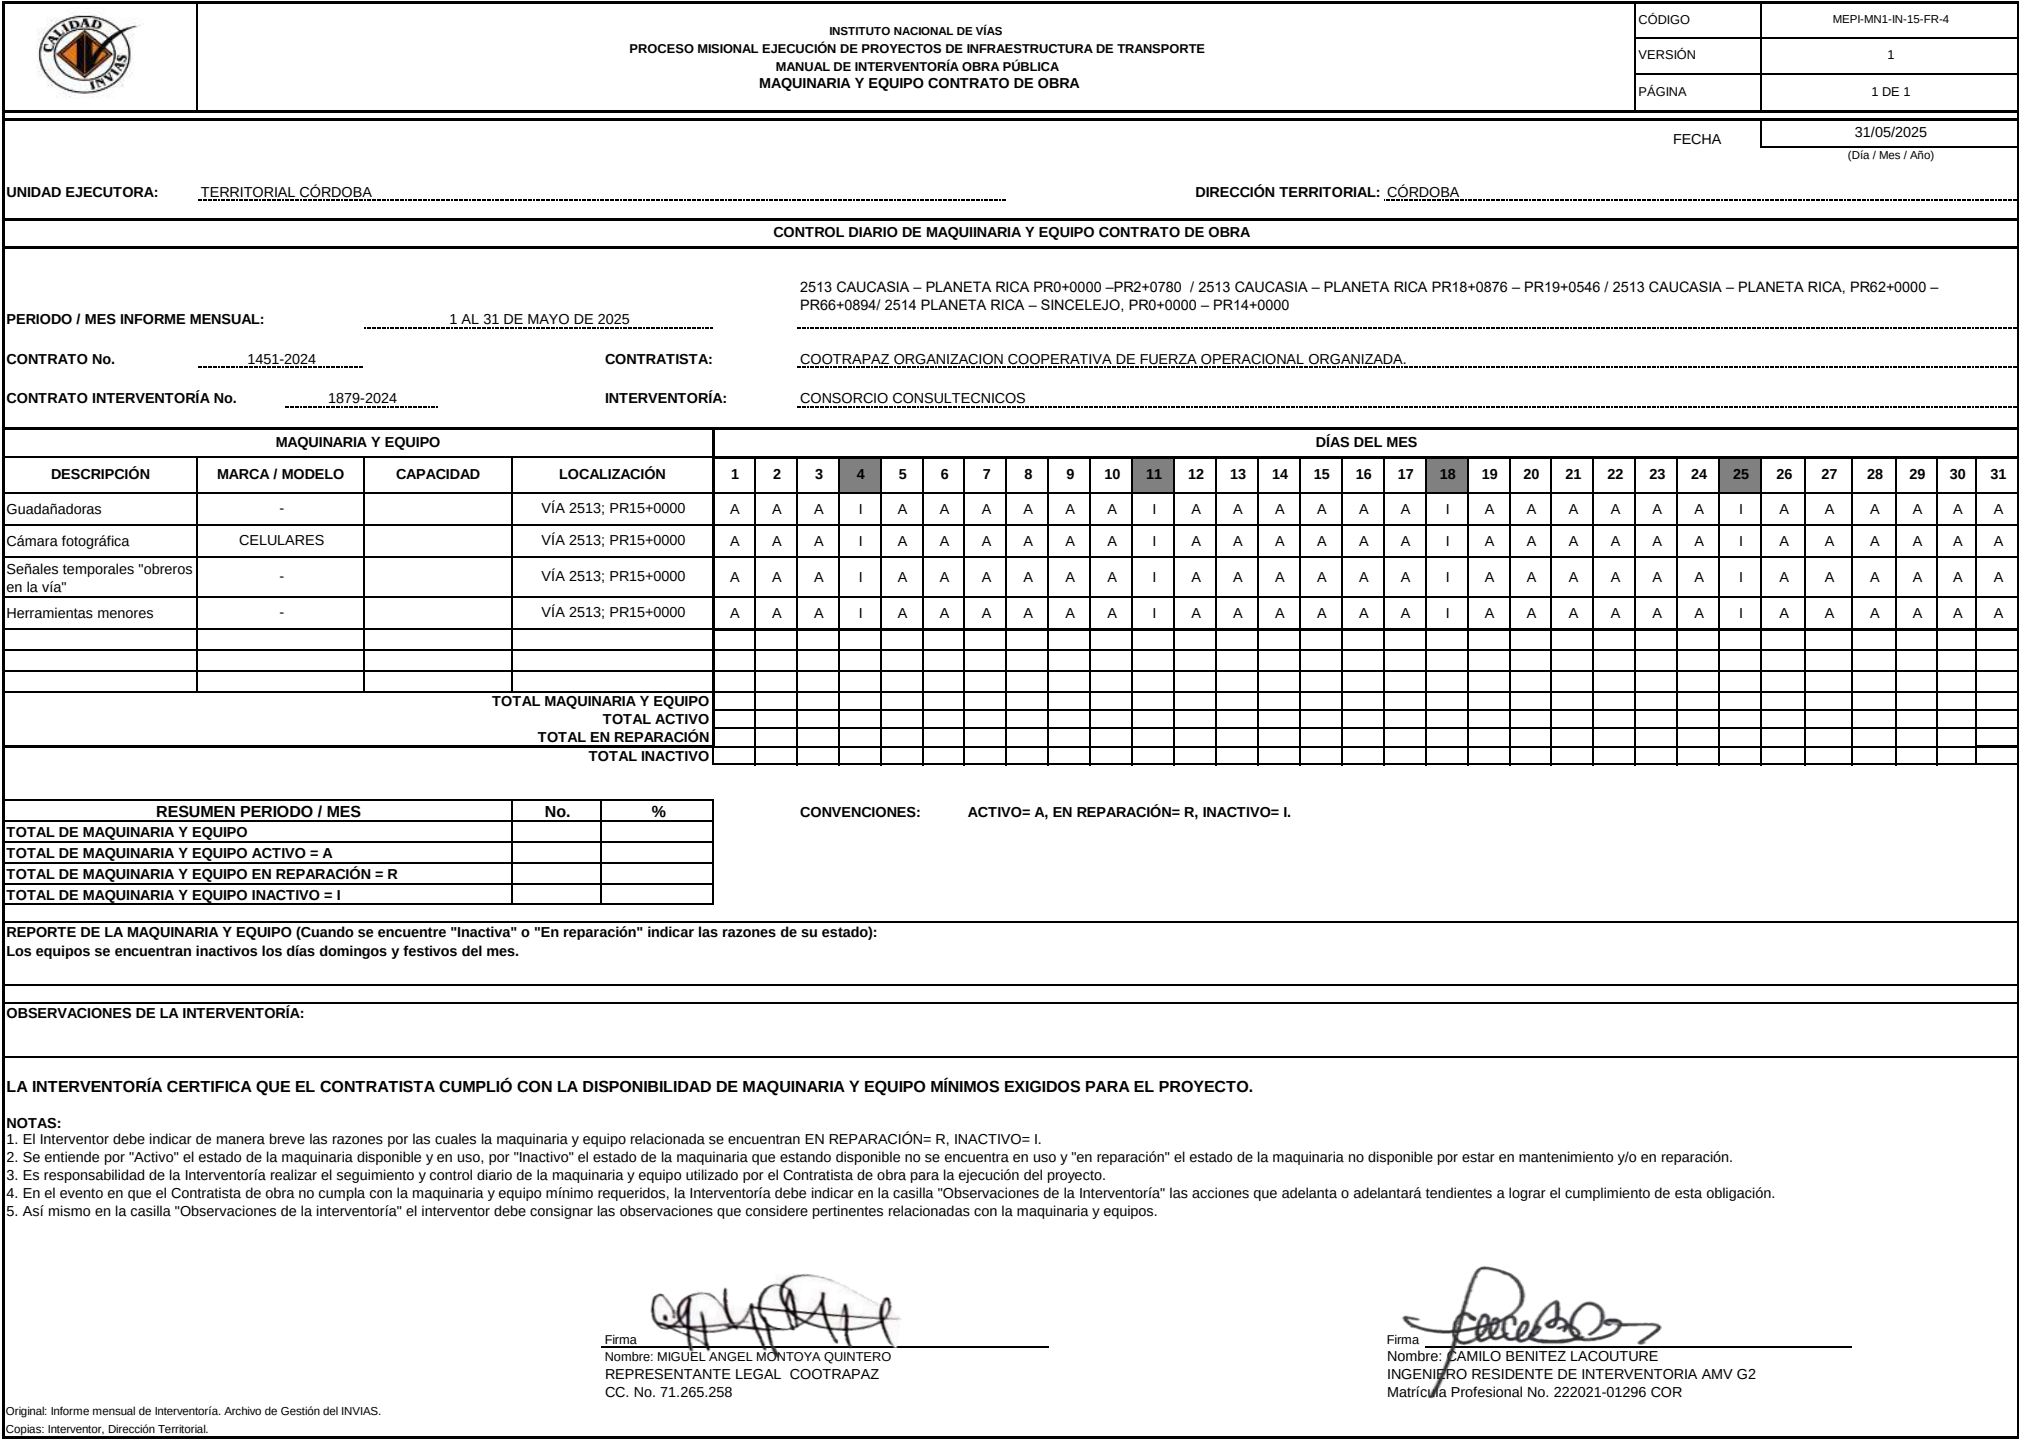



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	PROYECTO:	2514: PLANETA RICA - LA SINCELEJO; PR14+0000 - PR52+0000
--------------------------------	-------------------------	-----------	--

CONTRATO No.	1444-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
---------------------	-----------	---------------------	--

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
----------------------------	-----------	----------------	--------------------------

[illegible]

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:	
------------------------------------	--

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Remberto A. Guzman
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN-ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

Firma 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1 DE 1																												
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE MAYO DE 2025			PROYECTO: 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024			INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																													
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATISTA:																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETAS >2000 CC.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
OFICINAS Y CAMPAMENTOS (EQUIPOS).		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div><div>Firma Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula No: 22202-204005 COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2020		PROYECTO: /001 EL VAJANGO - SAN MARCOS, PA0+0000 - PA08+0015
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO: 1879-2004		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTING COS

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL					

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:	
---	--

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/06/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

<p>  Firma _____ Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERO CORDERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC CC. No. 10.876.602 </p>	<p>  Firma _____ Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matr. de Profesional No. 222021-01296-COR </p>
--	---

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo, GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero (Cootrac C.T.A.), identificado con NIT 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2025.

Dado en Sahagún a los cinco (5) días del mes de junio de 2025.

FIRMA:


GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre)
Representante Legal


Revisó: Carlos Mario Guevara Betancourt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOTRACL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TÉLFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4607114338		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DÍAS DE MORA:			0	junio AÑO	2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992897506

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 455.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400
SUBTOTALES:										\$ 1.139.000	\$ 0	\$ 1.139.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
SUBTOTALES:													\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 594.600	\$ 594.600	\$ 0	\$ 0	\$ 594.600
SUBTOTALES:									\$ 594.600	\$ 0	\$ 0	\$ 594.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	APORTES		MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR		6	\$ 342.000	\$ 0
SUBTOTALES:				\$ 342.000	\$ 0

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 2.417.600
----------------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOTRACL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TÉLFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4607115660		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	MES	junio AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992897476

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 911.200	\$ 0	\$ 911.200
SUBTOTALES:										\$ 1.139.000	\$ 0	\$ 1.139.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
SUBTOTALES:									\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 495.500	\$ 495.500	\$ 0	\$ 0	\$ 495.500
SUBTOTALES:									\$ 495.500	\$ 0	\$ 0	\$ 495.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	\$ 285.000	\$ 0	\$ 285.000
SUBTOTALES:			\$ 285.000	\$ 0	\$ 285.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SEGURO SOCIAL								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC					ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 10876602	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
2	CC 10880222	LIPARELA MONTES ALFARO APOLINAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
3	CC 15038568	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
4	CC 15047061	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL PAGADO:	\$ 2.204.500
----------------------	---------------------

[illegible]



COOTRAPAZ
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
ORGANIZADA
NIT 812004609 - 9
CALLE 29 N° 09 - 10 .BARRIO EL ORIENTE- LA APARTADA
CORDOBA - TELEFONO: 3105281703 - 3137509940
e-mail: Cootrapaz@hotmail.com

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 55 No 6 -195
Montería.

Yo **MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO** identificado con cédula de ciudadanía No.**71.265.258** de Medellín , en calidad de Representante legal de la empresa **COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA**, identificada con Nit 812004609-9, declaro bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de Mayo de 2025.

Dado en Montería Córdoba, a los treinta dias (30) día del mes de Mayo de 2025.

MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
CC. 71.265.258 DE MEDELLIN
Representante Legal de COOTRAPAZ

Revisor: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				812004609		NÚMERO PLANILLA:		7972807707		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA						MES		mayo AÑO		2025		2025			
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA APARTADA		DEPARTAMENTO:		CORDOBA								MES		junio AÑO			
DIRECCIÓN:		CALLE 29 NO 9-10 BARRIO EL ORIENTE		TELÉFONO:		8104307				DÍAS DE MORA:				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					
TIPO APORTANTE:		05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1516320348			
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de otras asociaciones n.c.p.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):								NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 851.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 851.800	\$ 0	\$ 851.800		
230301	230301-PORVENIR	6	\$ 1.451.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.451.000	\$ 0	\$ 1.451.000		
SUBTOTALES:										\$ 2.302.800	\$ 0	\$ 2.302.800		

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000			
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 243.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.800			
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000			
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.199.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.199.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.199.600			
SUBTOTALES:												\$ 1.799.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.799.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-25	14-25-COLMENA	9		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 625.200	\$ 625.200	\$ 0	\$ 0	\$ 625.200	
SUBTOTALES:									\$ 625.200	\$ 0	\$ 0	\$ 625.200	


TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES					
CÓDIGO		NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA		2	\$ 135.000	\$ 0		\$ 135.000		
CCF16	CCF16-COMFACOR		7	\$ 441.000	\$ 0		\$ 441.000		
SUBTOTALES:				\$ 576.000	\$ 0		\$ 576.000		


TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	\$ 432.300	\$ 0	\$ 432.300	
PASENA	PASENA - SENA	9	\$ 288.000	\$ 0	\$ 288.000	
SUBTOTALES:			\$ 720.300	\$ 0	\$ 720.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003288158	PEREZ BETIN MIGUEL ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF16-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
2	CC 1003288426	JARABA TAMARA JOSE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF16-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
3	CC 10998406	PETRO CORDERO LEANDRO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF16-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
4	CC 1196964549	VALERIO SIERRA EDUARDO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF03-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
5	CC 15675919	GARCIA CONDE JUAN MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF16-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
6	CC 15678186	GAMBOA DE HOYOS FERNANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-CCF16-1.423.500	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
7	CC 39281785	MORENO ARRIETA AUDIBET	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-23-CCF16-1.950.000	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0
8	CC 50942980	PATERNINA CENTENO ERIKA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-23-CCF03-1.950.000	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD										ARP						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE									
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
9	CC 71265258	MONTOYA CUNTERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	1	\$ 10.200	30	\$ 1.950.000	SCCF-16-COMFACOR	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 6.023.700
----------------------	---------------------





UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBIOY - COOTRACOL	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2025		PROYECTO: 2514- PLANETA RICA - LA SINCELEJO, PR14+0000 - PR92+0000	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 1879-2024		INTERVENITOR: CONSORCIO CONSULTA TÉCNICOS	
NOMBRE ARL: ARL SURA		NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR	

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/06/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría reaccionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó a adelantado tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afectación de los recursos de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder a la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Contratista debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Rubén A. Guzmán
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
C.C. No. No. 15.590.257


Firma

Nombre CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INMIAS
Copias: Interventor. Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, correspondientes a la nómina del mes de mayo de 2025.

Dado en Sahagún a los cinco (5) días del mes de junio de 2025.

FIRMA



REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)

Representante Legal



Revisor Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1532033284	9487191587	E	2025/06/24	2025/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$5,290,800


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: PRICIPAL (12 Afiliados)						\$17,082,000	\$2,733,600							\$17,082,000	\$684,000							\$17,082,000	\$1,189,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)						\$17,082,000	\$2,733,600							\$17,082,000	\$684,000							\$17,082,000	\$1,189,200			\$0	\$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (12 Afiliados)						\$17,082,000	\$2,733,600							\$17,082,000	\$684,000							\$17,082,000	\$1,189,200			\$0	\$0
1	CC	15663798	ARRIETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
2	CC	15051676	BERNAL VELASQUEZ MILTON MANUEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
3	CC	15045497	BOHORQUEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
4	CC	15590343	GUZMAN ARRIETA JORGE LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
5	CC	15050112	GUZMAN VERBEL OVER LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
6	CC	1069475826	GUZMAN ARROYO RAFAEL EDUARDO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
7	CC	15590257	GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
8	CC	78740234	GUZMAN LOPEZ YORLY JOSE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
9	CC	15051922	PEREZ ZABALA EVER IGNACIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
10	CC	78763428	SIERRA NARVAEZ JUAN MANUEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
11	CC	2761413	VERBEL CONTRERAS LUIS FIDEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
12	CC	15590293	VERGARA NAVARRO EUGUARIO MANUEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0					
Total Afiliados(12)						\$17,082,000	\$2,733,600							\$17,082,000	\$684,000							\$17,082,000	\$1,189,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1532033284	9487191587	E	2025/06/24	2025/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$5,290,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$2,733,600	\$0	\$0	\$2,733,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,050,200	\$0	\$0	\$2,050,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,189,200	\$0	\$0	\$1,189,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$1,189,200	\$0	\$0	\$1,189,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$627,000	\$0	\$0	\$627,000
TOTAL				12	\$5,290,800	\$0	\$0	\$5,290,800



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1 DE 1
--------	--------

FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	MAYO 2025	PROYECTO:	2513: CALICASIA - PLANETA RICA 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403: EL VIAJERO - SAN MARCOS
--------------------------------	-----------	-----------	---

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

NOMBRE ARL:	SEGUROS BOLIVAR S.A	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFACOR
-------------	---------------------	------------------------------	----------

VERIFICACIÓN PERSONAL DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/04/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectivo.
2. El Interventor debe justificar en la columna "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la descripción detallada del personal asignado al contrato, las cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la adscripción a contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la columna "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el responsable que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado por contrato laboral.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normalidad vigente y la certificación prestada por el contratista.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la información en los días que prestó el servicio.

Firma 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matricula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma: 
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ AZUNA
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula No: 22202-20-4005 COR

CONSORCIO CONSULTECNICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Mayo de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los Cinco (04) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,



JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901783107				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					VILLETA					DEPARTAMENTO:					CONSORCIO CONSULTECNICOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6					TELÉFONO:					CUNDINAMARCA				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					6360308				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										003 - VIAL CORDOBA				
															SI				

NÚMERO PLANILLA:										7973041791									
PERIODO COTIZACIÓN OTROS										MAYO AÑO 2025									
DÍAS DE MORA:										0									
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):										2025/06/03									
TIPO DE PLANILLA:										PERIODO COTIZACIÓN SALUD:									
										MAYO AÑO 2025									
NÚMERO AUTORIZACIÓN:										1526725480									

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 823.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.300	\$ 0	\$ 0	\$ 823.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 2.086.400	\$ 0	\$ 0	\$ 39.400	\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.165.200	\$ 0	\$ 0	\$ 2.165.200
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 516.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.000	\$ 0	\$ 0	\$ 516.000
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 548.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 548.400	\$ 0	\$ 0	\$ 548.400
SUBTOTALES:												\$ 4.052.900	\$ 0	\$ 0	\$ 4.052.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 600.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.300	\$ 0	\$ 0	\$ 600.300
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.500	\$ 0	\$ 0	\$ 57.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 206.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.800	\$ 0	\$ 0	\$ 206.800
SUBTOTALES:													\$ 993.600	\$ 0	\$ 0	\$ 993.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.629.100	\$ 1.629.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.629.100	
SUBTOTALES:								\$ 1.629.100	\$ 1.629.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.629.100	


TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF16	CCF16-COMFACOR	8	\$ 993.600	\$ 0	\$ 993.600				
SUBTOTALES:			\$ 993.600	\$ 0	\$ 993.600				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES									SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD										ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE							
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
9	CC 78751256	BENITEZ LACOUTURE CAMILO	DEPEND		\$ 7.420.000	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 7.870.000	\$ 1.259.200	\$ 39.400	\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.338.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 7.870.000	\$ 314.800	\$ 0	\$ 314.800	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 7.870.000	\$ 3	\$ 547.800	\$ 30	\$ 7.870.000	\$ CCF16- COMFACOR	\$ 314.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 7.669.200
----------------------	---------------------



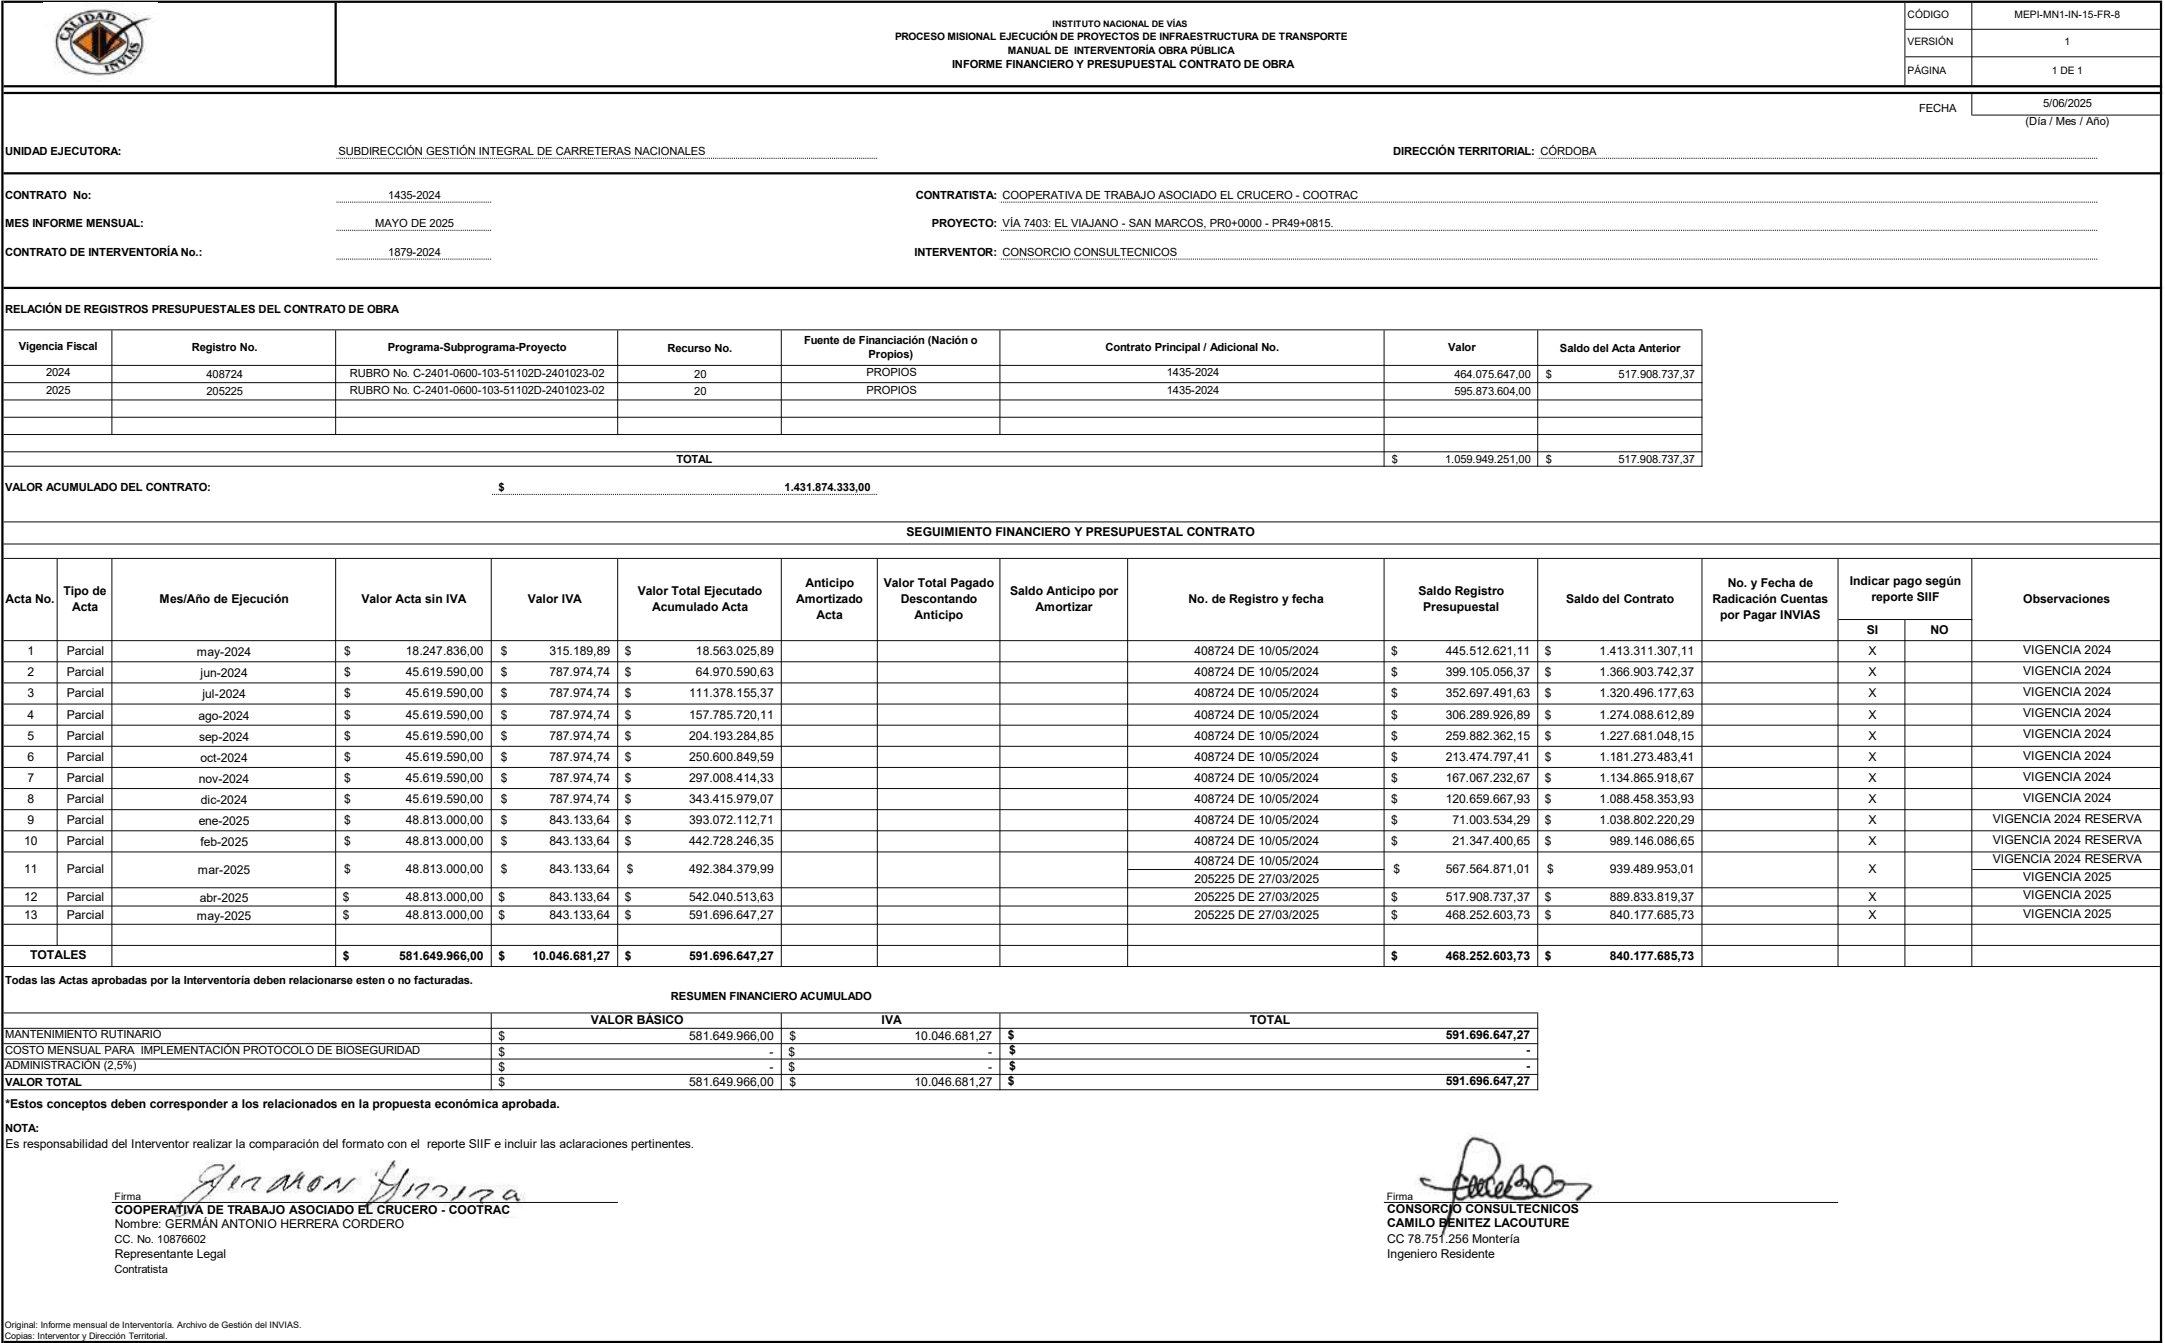



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO
NIT 800.085.654-3
CORR EL VIAJANO VDA LOS LAURELES
Tel: (undefined) 3106146512 - Ext. undefined
Sahagún - Colombia
rojacamor16@hotmail.com

No. 422

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(034) 7850062
Dirección	CALLE 55 No 6 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 13 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1435 DE 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. EN EL PERIODO DE MAYO DE 2025. R.P.: 205225 A.I.U.:10% I.V.A.:19% Favor consignar ala cuenta de ahorro N° 220-310-23117-0 del banco popular	1.00	44,375,454.55	0.00	44,375,454.55
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	4,437,545.45	0.00	5,280,679.09

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 49,656,133.64

Observaciones:

#\$24-02-00;1435-2024;nlemus@invias.gov.co#\$

Total Bruto	48,813,000.00
IVA 19%	843,133.64
Total a Pagar	49,656,133.64

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 13

Pre-acta ☐ No.

FECHA

5/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1435-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

PROYECTO: VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

En Montería; en el mes de JUNIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de MAYO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JUNIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 48.813.000,00

VALOR IVA \$ 843.133,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC \$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%) \$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ -

VALOR TOTAL BÁSICO \$ 48.813.000,00

TOTAL IVA \$ 843.133,64

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 49.656.133,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 48.813.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 48.813.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 49.656.133,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. 10876602

Firma:

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

126



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1435-2024

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE SERVICIO ☒	13	MAYO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
			OTRO ☐	_____	_____
			CUAL? _____	_____	_____
No. COMPROMISO	205225	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$49.656.133,64
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	\$49.656.133,64

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN	1																																																																						
			PÁGINA	1 DE 1																																																																						
			FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		PERIODO MES: MAYO DE 2025																																																																						
ACTA PARCIAL No. 13 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.813.000,00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																										
ORDEN DE PAGO																																																																										
CONTRATO No.: 1435-2024																																																																										
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.																																																																										
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC NIT. 800.085.654-3																																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC (Indicar el ordenador del pago)																																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 49.656.133,64 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 13 DEL PERIODO MAYO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																										
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																							
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																										

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

CERTIFICA:


Que se suscribió Contrato No 1435 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de mayo de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 13, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$48.813.000) sin IVA.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

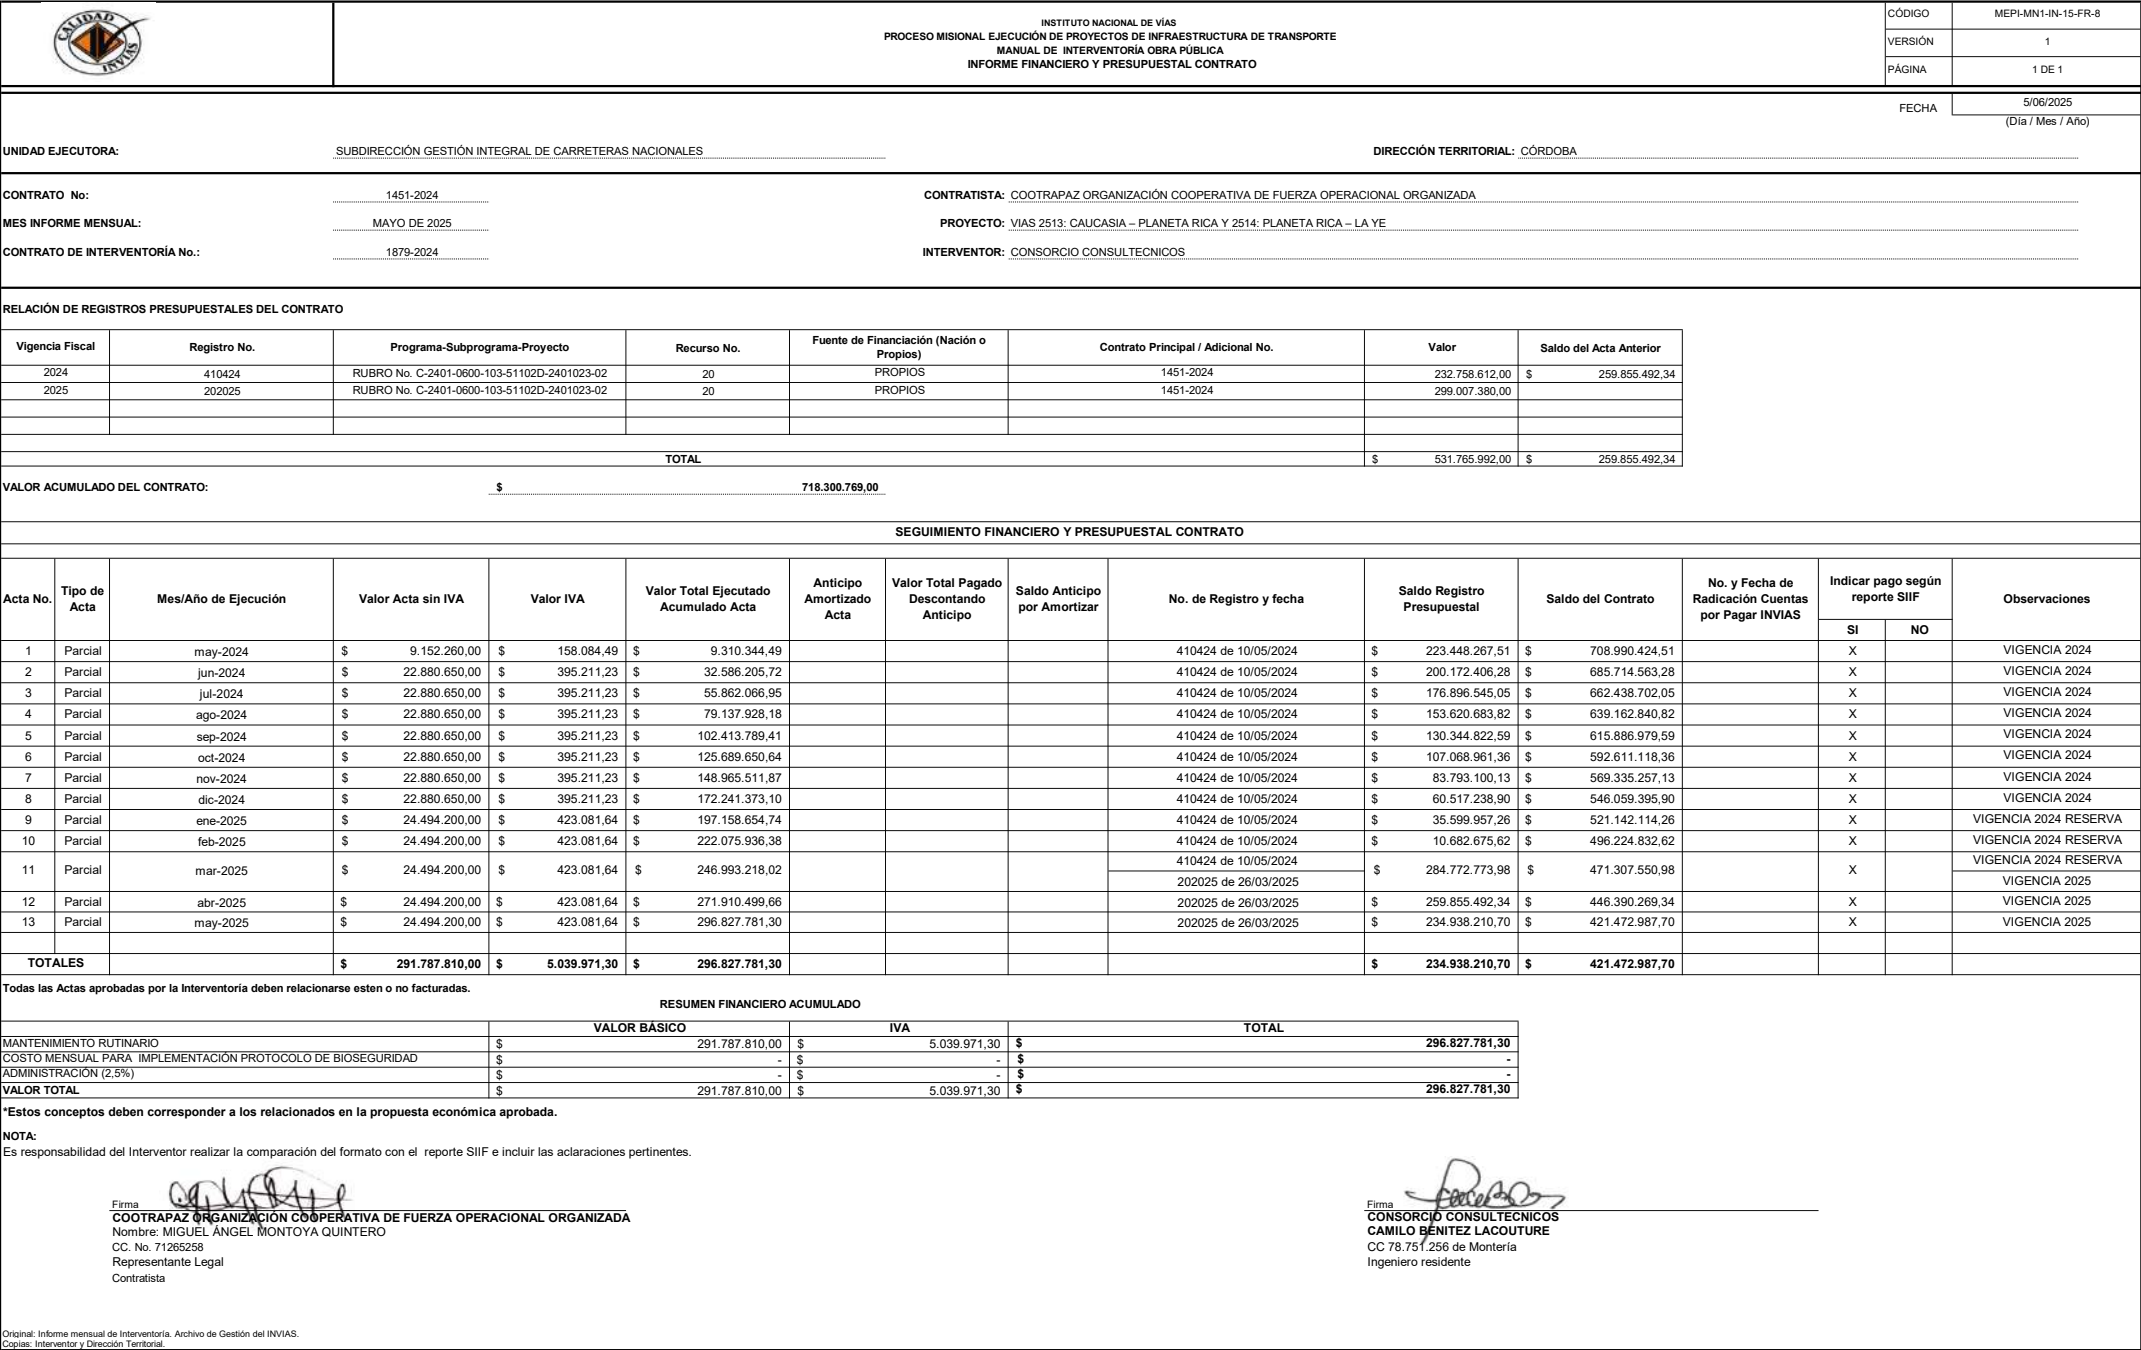

COOTRAPAZ - NIT 812004609-9

ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
CEL:3105281703 - EMAIL: cootrapaz@hotmail.com - DIRECCION: Calle 29 No 09-10 La
Apartada Cordoba

Factura electrónica de venta
No. FEC16

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		30/05/2025	\$ 24.917.281,64
NIT No. : 800215807-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 55 No 6-195 BARRIO LA CASTELLANA		812004609 - ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA	
TELEFONO : (604) 7850062		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia		29/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	4130950102	VALOR BASICO MENSUAL	1	\$ 22.267.454,55			\$ 22.267.454,55
2	4130950105	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1	\$ 2.226.745,45		IVA 19%	\$ 2.226.745,45
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 24.494.200,00	CxC # 1	Vence: 29/06/2025	\$ 24.917.281,64
IVA liquidado	\$ 2.226.745,45	19%	\$ 423.081,64			
VALOR TOTAL :			\$ 24.917.281,64			

VALOR (en letras) : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON 64 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No 013.

CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL No 1451 DE 2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 - PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

EN EL PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025..

RP No 202025

A.I.U:10%
IVA: 19%

Notas finales: #\$24-02-00;1451-2024;nlemus@invias.gov.co#\$
Persona jurídica y asimiladas, Régimen común ó régimen especial y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764071015664. Prefijo: FEC. Rango: 1 al 500. Vigencia: 20/05/2024 hasta 20/05/2026.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 29/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 13

Pre-acta ☐ No.

FECHA5/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1451-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.

PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 718.300.769,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE N/A DE N/A
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 718.300.769,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE N/A DE N/A
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de JUNIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO, representante legal de la firma contratista COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de MAYO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JUNIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL\$ 24.494.200,00

VALOR IVA\$ 423.081,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC\$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%)\$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN\$ -

VALOR TOTAL BÁSICO\$ 24.494.200,00

TOTAL IVA\$ 423.081,64

VALOR TOTAL A PAGAR\$ 24.917.281,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 24.494.200,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 24.494.200,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 24.917.281,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAPAZ
CC. No. 71265258

Firma:

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1451-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE SERVICIO ☒	13	MAYO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
		OTRO ☐	_____	_____
		CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO	202025	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$24.917.281,64
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	\$24.917.281,64

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN	1																																																																						
			PÁGINA	1 DE 1																																																																						
			FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		PERIODO MES: MAYO DE 2025																																																																						
ACTA PARCIAL No. 13 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 24.494.200,00																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																										
ORDEN DE PAGO																																																																										
CONTRATO No.: 1451-2024																																																																										
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.																																																																										
CONTRATISTA: COTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA NIT. 812.004.609-9																																																																										
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA																																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 24.917.281,64 VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE																																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 13 DEL PERIODO MAYO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																										
<table><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td>Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td>Nombre:</td><td>Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td></tr><tr><td>Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR</td><td>Matrícula profesional No.: 22202097095 COR</td><td>Matrícula profesional No.:</td><td>Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha de Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></table>					Firma	Firma	Firma	Firma	Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Nombre:	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR	Matrícula profesional No.: 22202097095 COR	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																															
Firma	Firma	Firma	Firma																																																																							
Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Nombre:	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																							
Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR	Matrícula profesional No.: 22202097095 COR	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR																																																																							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																																							
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:																																																																							
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																										

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

**LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE
INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.**

CERTIFICA:


Que se suscribió Contrato No 1451 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.


Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de mayo de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 13, el valor del servicio correspondiente en letras es VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$24.494.200) sin IVA.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

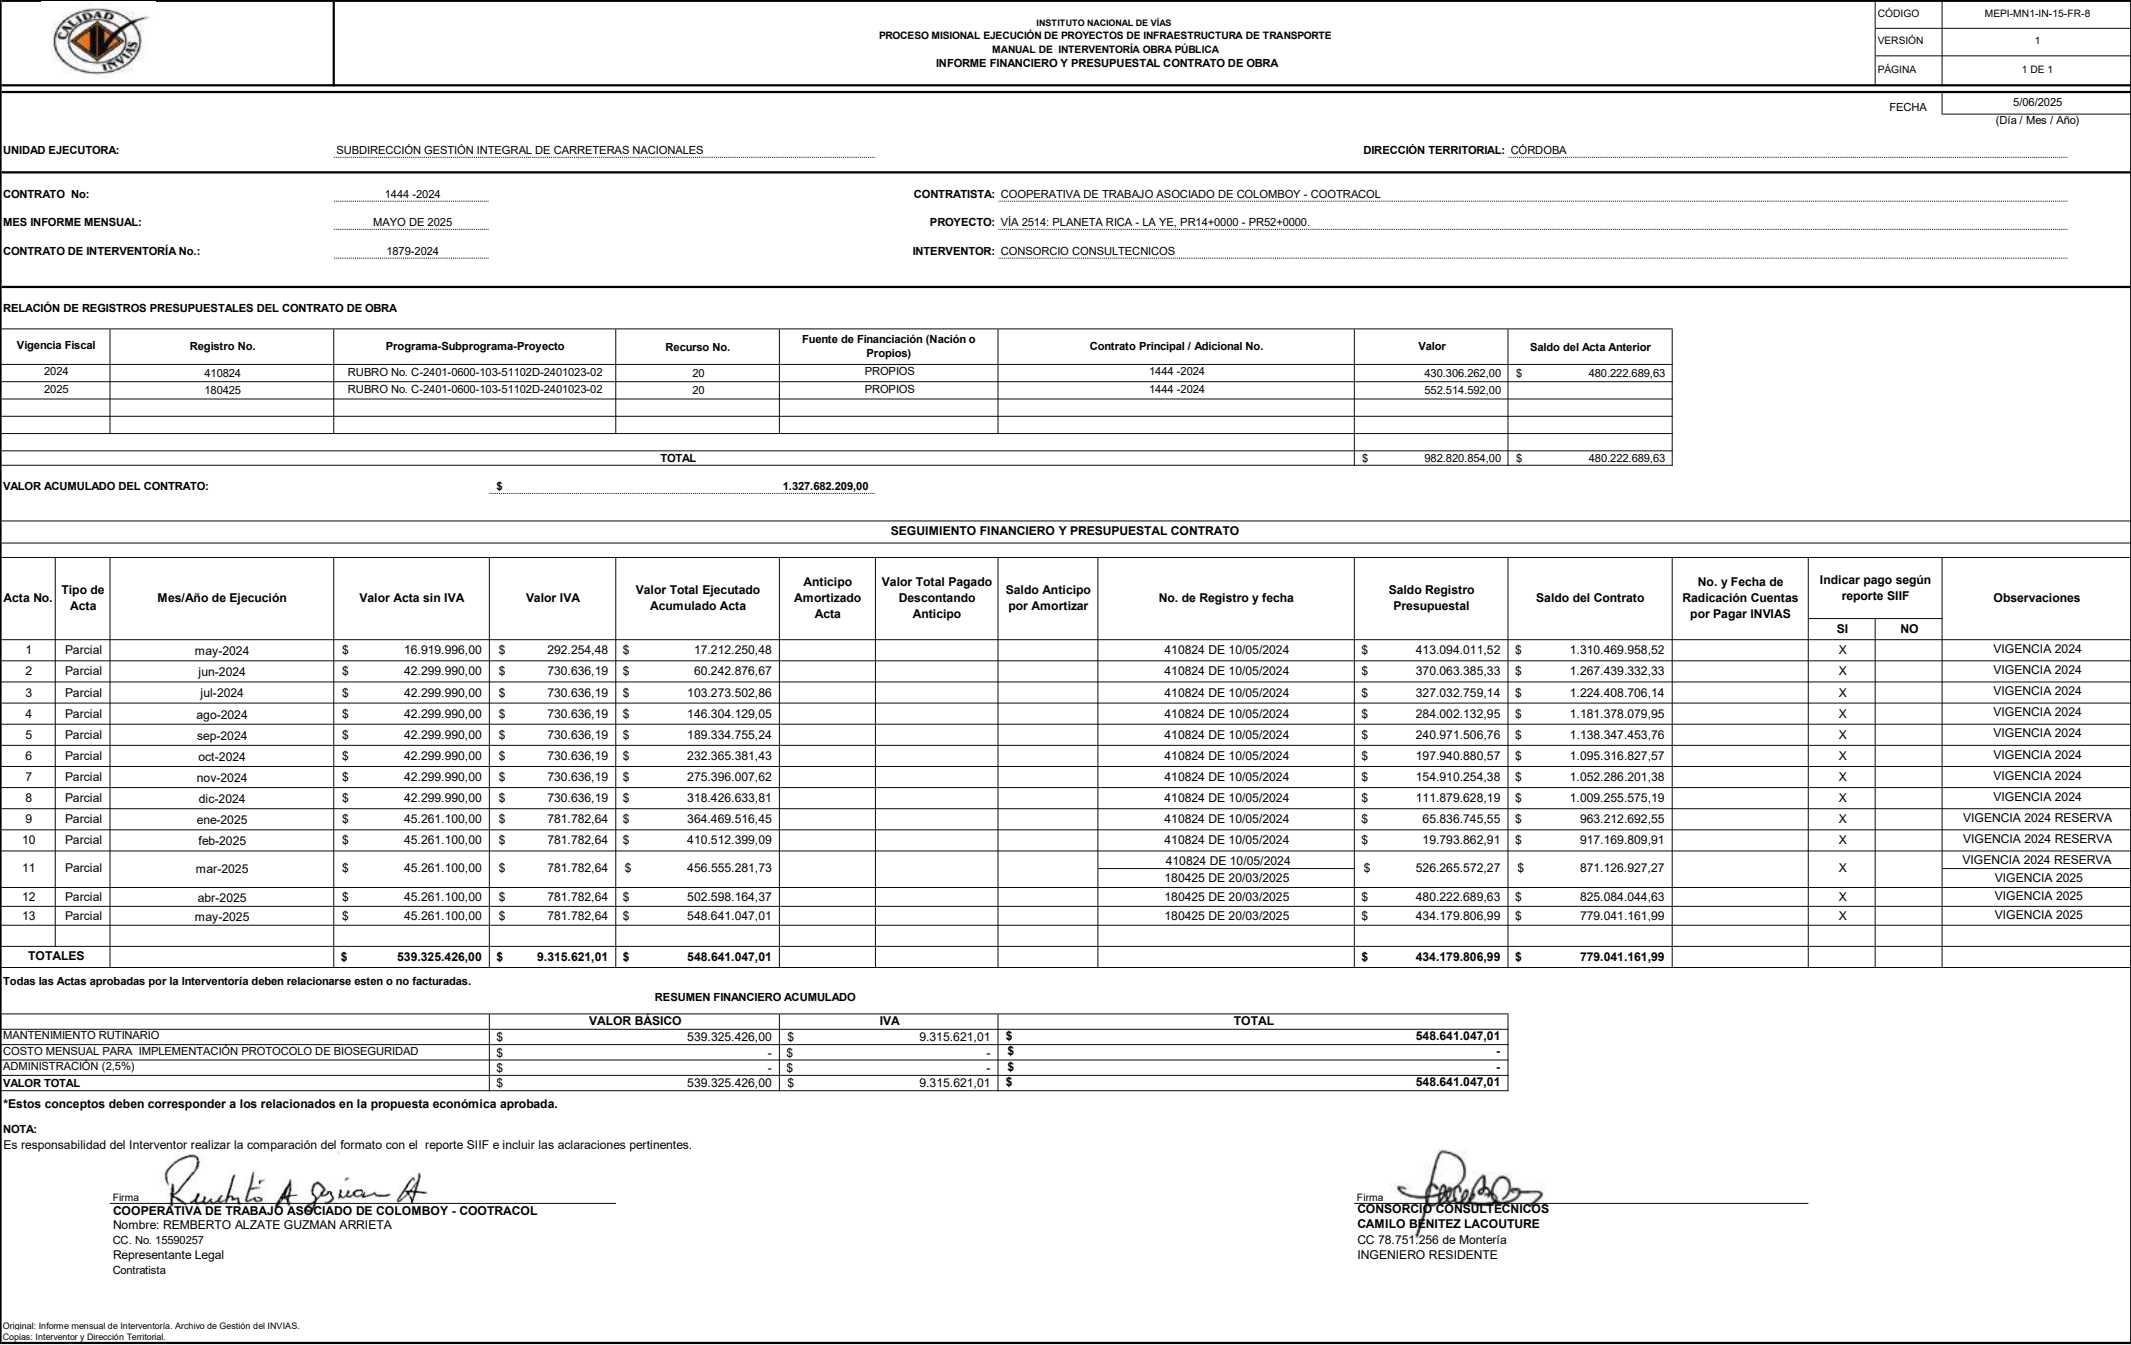



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
COLOMBOY
NIT 812.003.389-9
CRA 3 2 59 P CORR COLOMBOY
Tel: 3137476855
Sahagún - Colombia
cootracolcta99@gmail.com

No. PRTE 72

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(095) 7850062 - Ext. 000
Dirección	CALLE 56 N 6 - 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-06-05	--

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA PARCIAL No. 13 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1444 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCÓRDOBA. EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000 LOTE 4, PERIODO MAYO DE 2025. R.P.: 180425	41,146,454.55	0.00	41,146,454.55
2	02	A.I.U. COSTO BASICO DE LA OBRA	4,114,645.45	781,782.64	4,896,428.09

Total items: 2

Total Bruto	45,261,100.00
IVA 19%	781,782.64
Total a Pagar	46,042,882.64

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 46,042,882.64

Observaciones:

Responsable de IVA - Régimen Tributario Especial ESAL

#\$24-02-00;1444-2024;nlemus@invias.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente No. 310-17228-3 del Banco Popular

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 13

Pre-acta ☐ No.

FECHA

5/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1444 -2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

PROYECTO:

VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:

20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 1.327.682.209,00

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 1.327.682.209,00

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

En Montería; en el mes de JUNIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de MAYO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JUNIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 45.261.100,00

VALOR IVA \$ 781.782,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC \$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%) \$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ -

VALOR TOTAL BÁSICO \$ 45.261.100,00

TOTAL IVA \$ 781.782,64

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 46.042.882,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 45.261.100,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 45.261.100,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 46.042.882,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Remberto Alzate Guzman Arrieta

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACOL
CC. No. 15590257

Firma: Camilo Benitez Lacouture

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

140



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1444 -2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE SERVICIO ☒	13	MAYO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
		OTRO ☐	_____	_____
		CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO	180425	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$46.042.882,64
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	\$46.042.882,64

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 DE 1																																																																						
			FECHA 5/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																							
ACTA PARCIAL No. 13 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: MAYO DE 2025 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 45.261.100,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>5/06/2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO No.: 1444 -2024																																																																									
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.																																																																									
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL NIT. 812.003.389- 9.																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL (Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 46.042.882,64 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 13 DEL PERIODO MAYO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE
INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1444 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de mayo de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 13, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS (\$45.261.100.00) sin IVA.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 1879-2024 INTERVENOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2025 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA. GRUPO AMV 2. LOTE 2

CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1,383,849,572.00	\$ 796,117,165.27
			TOTAL			1,383,849,572.00	\$ 796,117,165.27

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	3.985.035.229
-------------------------------	----	---------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagor INVIAS	Observaciones
1	JUNIO	3.456.000,00	656.640,00	4.112.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	523124 de (11/06/2024)	\$ 1.379.736.932,00	3.980.922.589,00		VIGENCIA 2024
2	JULIO	52.128.580,00	9.904.430,00	66.145.650,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.387.962.212,00	3.918.889.579,00		VIGENCIA 2024
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	148.044.401,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.235.805.171,00	3.836.990.828,00		VIGENCIA 2024
4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	230.084.881,20				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.153.764.690,80	3.754.950.347,80		VIGENCIA 2024
5	OCTUBRE	73.289.616,00	13.925.027,04	317.299.524,24				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.066.550.047,76	3.667.735.704,76		VIGENCIA 2024
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	399.934.956,84				523124 de (11/06/2024)	\$ 983.914.615,16	3.585.100.272,16		VIGENCIA 2024
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	483.331.989,44				523124 de (11/06/2024)	\$ 900.517.582,56	3.501.703.239,56		VIGENCIA 2024
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	587.732.406,73				523124 de (11/06/2024)	\$ 796.117.165,27	3.397.302.822,27		VIGENCIA 2025
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	676.330.703,23				523124 de (11/06/2024)	\$ 707.518.868,77	3.308.704.525,77		VIGENCIA 2025
10	MARZO	84.179.243,11	15.994.056,19	776.504.002,53				523124 de (11/06/2024)	\$ 607.345.569,47	3.208.531.226,47		VIGENCIA 2025
11	ABRIL	75.276.750,00	14.302.582,50	866.083.335,03				523124 de (11/06/2024)	\$ 517.766.236,97	3.118.951.893,97		VIGENCIA 2025
12	MAYO	73.519.450,00	13.968.695,50	953.571.480,53				523124 de (11/06/2024)	\$ 430.278.091,47	3.031.463.748,47		VIGENCIA 2026
	TOTALES	801.320.572,21	152.250.908,32	866.083.335,03	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 430.278.091,47	3.031.463.748,47		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	\$ 801.320.572,21	\$ 152.250.908,32	\$ 953.571.480,53
*			
*			
VALOR TOTAL	\$ 801.320.572,21	\$ 152.250.908,32	\$ 953.571.480,53

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal
Cédula No. 9.147.873 de CTG

Firma 
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



VERSIÓN	
---------	--

PÁGINA 1 DE 2

FECHA	5/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA No. DOCE (12)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 73.519.450.00

1 PERIODO: MAYO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1879-2024
--------------------------------	-----------

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026
----------------	---------------------------

PLAZO ACUMULADO:

29 MESES

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO 2024
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)

(indique diâmetros em m)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A) \$ 3.985
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B).	\$
-------------------------------------	----

CONTRATISTA: _____

CONTRATO DE OBRA Nº: _____

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$

147

148



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO N°: **1879-2024**

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____
			OTRO	☐	_____
			CUAL? CONSULTORIA	☒	DOCE (12)
					MAYO 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 87.488.145,50
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	\$ 87.488.145,50

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR



AFINCO-FR-13

1

1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1 DE 1																												
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																													
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2025			PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	23	21	22	23	24	24	24	24	22	24	24	24	24	22	21	24	24	24	24	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div>Firma Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC CC.No. 10.876.602</div>																<div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div>																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA	1 DE 1										
																				FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA												
CONTRATO DE OBRA No: 1451-2024																				CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2025																				PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	24	23	24	24	24	21	24	24	24	24	24	22	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	733
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL Contratista: COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA	1 DE 1																												
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																													
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024			CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2025			PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	23	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	22	24	21	24	24	22	23	24	23	24	24	22	24	23	22	24	24	24	24	725
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	13
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
Firma Nombre: Remberto Guzman Arrieta Contratista: COOTRACOL CC. No. 15.590.257																Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1 DE 1	
							FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.:							CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2025							PROYECTO: 1435-2024; 1451-2024; 1444-2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024							INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
				NO APLICA					
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
				NO APLICA					
OBSERVACIONES:									
LAS MICROEMPRESAS NO EJECUTAN OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DEBAN EFECTUAR ENSAYOS DE LABORATORIO.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:	Firma:			Firma:			Firma:		
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDEIRO	Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO			Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN A.			Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE		
Representante Legal Cootrac	Representante Legal Cootrapaz			Representante Legal Cootracol			INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2		
C.C. No. 10.876.602	CC. No. 71.265.258			C.C. No. 15.590.257			Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		
Contratista	Contratista			Contratista					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		31/05/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333.00
VALOR ACUMULADO:	(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 143,187,433.30	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 286,374,866.60	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 429,562,299.90	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031767
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			-	-	-	-	-	-

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101010422	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/08/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		31/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
---------------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024	CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
--------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
				Desde			Hasta		
Cumplimiento									
Buen manejo y correcta inversión del anticipo									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones									
Calidad de Estudios y Diseños									
Estabilidad y/o Calidad de Obra									

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES
OBSERVACIONES:
NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																													
		VERSIÓN	1																																																													
		PÁGINA	1 DE 2																																																													
		FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																													
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																																																														
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024		COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA CONTRATISTA: OPERACIONAL ORGANIZADA																																																														
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.																																																																
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 718,300,769.00 VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 71,830,076.90</td><td>26</td><td>4</td><td>2024</td><td>30</td><td>11</td><td>2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 143,660,153.80</td><td>26</td><td>4</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 215,490,230.70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 71,830,076.90	26	4	2024	30	11	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 143,660,153.80	26	4	2024	31	7	2029	Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 215,490,230.70	31	7	2026	31	1	2027
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																													
			Desde			Hasta																																																										
Cumplimiento	10%	\$ 71,830,076.90	26	4	2024	30	11	2026																																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 143,660,153.80	26	4	2024	31	7	2029																																																								
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-																																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 215,490,230.70	31	7	2026	31	1	2027																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100017987 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/05/2024																																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>26</td><td>4</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	26	4	2024	31	7	2026	Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																													
			Desde			Hasta																																																										
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	26	4	2024	31	7	2026																																																								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005574 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/05/2024																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

	FECHA
	31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
---------------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024	CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
--------------------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	---------------	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA												
			<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">Desde</th> <th style="width: 15%;">Hasta</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Desde	Hasta										
Desde	Hasta														
Cumplimiento															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones															
Calidad de Estudios y Diseños															
Estabilidad y/o Calidad de Obra															

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____
Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES
OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma: 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

	FECHA	31/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
---------------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - CONTRATISTA: COOTRACOL
--------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 1,327,682,209.00
VALOR ACUMULADO:	 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS
---	---------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 132,768,220.90	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265,536,441.80	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398,304,662.70	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031759
Certificado de modificación o anexo No.:	1 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010416	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:	1 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

	FECHA	31/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
---------------------------------------	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - CONTRATISTA: COOTRACOL
--------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

 A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																
Cumplimiento			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Desde	Hasta		10												
Desde	Hasta																		
	10																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																			
Calidad de Estudios y Diseños																			
Estabilidad y/o Calidad de Obra																			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

 A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.: 4	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Desde</th> <th style="width: 10%;">Hasta</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </table>	Desde	Hasta			Día Mes Año	Día Mes Año
Desde	Hasta								
Día Mes Año	Día Mes Año								
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
 Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA	1 DE 2																																																			
		FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																			
OBJETO DEL CONTRATO:																																																						
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.																																																						
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024																																																						
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																						
VALOR INICIAL: \$ 3,985,035,229.00																																																						
VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)																																																						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 398,503,522.90</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 797,007,045.80</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1,195,510,568.70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2029</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 398,503,522.90	29	5	2024	31	1	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -							Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 797,007,045.80	29	5	2024	31	7	2029	Calidad del servicio	30%	\$ 1,195,510,568.70	31	7	2026	31	1	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 398,503,522.90	29	5	2024	31	1	2027																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 797,007,045.80	29	5	2024	31	7	2029																																														
Calidad del servicio	30%	\$ 1,195,510,568.70	31	7	2026	31	1	2029																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227320																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	2 DE 2

FECHA		31/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:
CORDOBA		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
--------------------------------	-----------	--------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.	

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	
<small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px;"></div> </div> <p style="font-size: small;"> Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR </p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px;"></div> </div> <p style="font-size: small;"> Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor Contrato de Interventoría Matricula No: 22202-204005 COR </p>
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
---------------------------------------	--	--------------------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024 <small>(Indicar número y año)</small>
----------------------	--

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC			
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024 <small>(Indicar día, mes y año)</small>	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024 <small>(Indicar número y año)</small>
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS

1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:			
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			

2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:			
NO APLICA			

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:		
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO		

OBSERVACIONES:			
NO APLICA			

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

	FECHA	31/05/2025 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	

OBSERVACIONES:
NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.


OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
NO APLICA

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

 Firma: _____ Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC CC. N° 10.876.602	 Firma: _____ Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR	Firma: _____ Nombre: _____ Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____
---	---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA			31/05/2025
(Día) (Mes) (Año)			

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026
 (Indicar día, mes y año) (Indicando número y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:
 NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
 PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:
 NO APLICA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:


CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:
 NO APLICA

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	2 DE 2				
		FECHA	31/05/2025 (Día) (Mes) (Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA				
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.							
4. REPORTE DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:					
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:					
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES: NO APLICA							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:					
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:					
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:					
OBSERVACIONES:							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
NO APLICA							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma:		Firma: N.A.		Firma:		Firma: N.A.	
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258		Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:		Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	31/05/2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.	1444-2024 (Indicar número y año)		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL			
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1879-2024 (Indicar número y año)		
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:
OBSERVACIONES:			
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
OBSERVACIONES:			
NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO:	SI NO	APROBADO:	SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO		
OBSERVACIONES:			
NO APLICA			
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	2 DE 2				
		FECHA	31/05/2025 (Día) (Mes) (Año)				
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA						
	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA						
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024 (Indicar número y año)							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4							
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES							
No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:					
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:					
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:							
OBSERVACIONES:							
NO APLICA							
5. QUEJAS Y RECLAMOS							
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:					
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:					
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:					
OBSERVACIONES:							
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.							
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
NO APLICA							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma:  Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL CC. N° 15.590.257		Firma: N.A. Nombre: _____ Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.: _____		Firma:  Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		Firma: N.A. Nombre: _____ Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		31/05/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024 (Indicar número y año)
--------------------------------	-------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2, LOTE 2.	
---	--

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
--------------	--------------------------	--	--

FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2024 (Indicar día, mes y año)	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
------------------	---	----------------	------------------------------	-----------------------	---

CONTRATO DE OBRA No:	1435-2024, 1451-2024 Y 1444-2024 (Indicar número y año)
----------------------	--

CONTRATISTA:	COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL		
--------------	--------------------------------	--	--

1. PLAN DE CALIDAD									
PRESENTADO:	SI	NO	APROBADO:	SI	NO	VERSIÓN No.		FECHA DE VERSIÓN:	

OBSERVACIONES: NO APLICA									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


2. AUDITORIAS DE CALIDAD									
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI	NO	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:				
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI	NO	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:				

OBSERVACIONES: NO APLICA									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)									
PRESENTADO:	SI	NO	APROBADO:	SI	NO	FECHA DE APROBACIÓN:			
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:			No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:						
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI	NO							

OBSERVACIONES: NO APLICA									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MINFRA-MNI-IN-15-FR-15</div>																																																								
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>																																																								
		<div>PÁGINA</div> <div>2 DE 2</div>																																																								
		<div>FECHA</div> <div>31/05/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																								
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>TERRITORIAL CORDOBA</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CÓRDOBA</div>																																																										
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>1879-2024</div> <div>(Indicar número y año)</div>																																																										
<div>OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.</div>																																																										
<div>4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES</div> <div>No. de No Conformidades reportadas en el mes:</div> <div>No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:</div> <div>No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:</div> <div>No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:</div> <div>No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
<div>5. QUEJAS Y RECLAMOS</div> <div>No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:</div> <div>No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:</div> <div>No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:</div> <div>No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:</div> <div>No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:</div> <div>No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.</div>																																																										
<div>6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)</div> <table><tr><th>Título indicador de Gestión:</th><th>Valor del IG mes</th><th>Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)</th></tr><tr><td>IG1: Índice de gestión 1 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG2: Índice de gestión 2 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG3: Índice de gestión 3 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG4: Índice de gestión 4 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IG5: Índice de gestión 5 =</td><td></td><td></td></tr><tr><td>IGn: Índice de gestión n =</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>NO APLICA</div>			Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)	IG1: Índice de gestión 1 =			IG2: Índice de gestión 2 =			IG3: Índice de gestión 3 =			IG4: Índice de gestión 4 =			IG5: Índice de gestión 5 =			IGn: Índice de gestión n =																																					
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)																																																								
IG1: Índice de gestión 1 =																																																										
IG2: Índice de gestión 2 =																																																										
IG3: Índice de gestión 3 =																																																										
IG4: Índice de gestión 4 =																																																										
IG5: Índice de gestión 5 =																																																										
IGn: Índice de gestión n =																																																										
<div>7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).</div> <table><tr><th>No.</th><th>Tipo de Equipo</th><th>Marca</th><th>Serie</th><th>Fecha de Calibración</th><th>No. y Fecha Certificado de Calibración</th><th>Fecha de Vencimiento Calibración</th><th>Comentarios</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>NO APLICA</div>			No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																																
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios																																																			
<div>NOTA:</div> <div>Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div><div>INGENIERO PRESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div><div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div><div><div>Firma N.A.</div><div></div><div>Nombre:</div><div>Profesional en Calidad Contrato de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ AZUNA</div><div>Supervisor del contrato de Interventoría</div><div>Matrícula No: 22202-204005 COR</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>																																																										


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					


FECHA		31/05/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1435-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.					
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:		Firma:					
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO Representante Legal Cootrac Contratista CC.N° 10.876.602		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA		31/05/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)		

DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)	CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA						
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
	TOTAL						100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: 		Firma: 					
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz Contratista CC. No. 71.265.258		Nombre: CAMILO BENÍTEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 DE 1				
		FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL					
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS					
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma:  Nombre: REMBERTO ALZATE GOZMAN ARRIETA Representante Legal Cootracol Contratista CC.N° 15.590.257		Firma:  Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 DE 1		
			FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA				
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____		MES: _____		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ DE _____ (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)		ENTIDAD FINANCIERA: _____				
CUENTA BANCARIA No. _____ BANCO _____ (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)		SUCURSAL: _____				
ANTICIPO OTORGADO: _____ %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ _____ - (M/CTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.						
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.						
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () : \$ _____ (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ _____ (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)						
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)						
OBSERVACIONES: LA COOPERATIVA NO SOLICITÓ ANTICIPO						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.</u>						
Firma:  Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz Contratista CC. No. 71.265.258		Firma:  Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

177

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-3-FR-2</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div>1 DE 1</div>				
		<div>FECHA</div> <div>31/05/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				
DATOS GENERALES						
<div>INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO☐</div> <div>INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO☐</div> <div>(Indique si corresponde)</div> <div>(Indique si corresponde)</div>						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024						
(Indicar número y año)						
CUENTA BANCARIA No.:	BANCO	SUCURSAL:				
ANTICIPO OTORGADO:	%					
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	(M/CTE)				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.						
NOTA:						
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____):				\$		
				(Indicar el mes)		
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:				\$		
				(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)		
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)						
NOTA:						
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.						
Firma: 			Firma: 			
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE			Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA			
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2			Supervisor del contrato de Interventoría			
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR			Matricula No: 22202-204005 COR			
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.						
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
PERIODO DE MAYO DE 2025



OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LAS COOPERATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.

ENVIADA						
No	Fecha	Remitido Por	Recibido Por	Asunto	Consecutivo	Fecha Recibido
1	5-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Informe de Capacitación a Microempresa de Mantenimiento Vial.	CCO-462-130-2025	5-may-25
2	5-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 5 de mayo al 10 de mayo del 2025.	CCO-462-131-2025	5-may-25
3	7-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Entrega de informe de interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario – Abril de 2025	CCO-462-137-2025	7-may-25
4	8-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Informe mes de abril de 2025 política de embellecimiento y ornato.	CCO-462-138-2025	8-may-25
5	12-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 12 de mayo al 17 de mayo del 2025.	CCO-462-145-2025	12-may-25
6	19-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 19 de mayo al 24 de mayo del 2025.	CCO-462-149-2025	19-may-25
7	26-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2	CCO-462-157-2025	26-may-25
8	26-may-25	ADMINISTRACIÓN VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Programación semanal del 26 de mayo al 31 de mayo del 2025	CCO-462-158-2025	26-may-25
RECIBIDA						
1	No hubo correspondencia recibida.					

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, mayo 05 de 2025

CCO-462-130-2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Director Territorial Córdoba (E)

nlemus@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe de Capacitación a Microempresa de Mantenimiento Vial.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la AMV se realizó capacitaciones a las distintas Cooperativas en el tema:

TEMA:	HIGIENE POSTURAL.
EXPOSITOR:	CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT
LUGAR:	COLOMBOY, PLANETA RICA Y EL CRUCERO
PARTICIPANTES:	COOTRAC COOTRACOL COOTRAPAZ
DURACION:	CUATRO (4) HORAS
FECHA:	MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2025

CONSORCIO CONSULTECNICOS

OBJETIVOS

Capacitar a los trabajadores de las Cooperativas Cootrac, Cootracol y Cootrapaz en la correcta aplicación de principios de higiene postural, promoviendo prácticas ergonómicas que prevengan lesiones musculoesqueléticas y fomenten el bienestar físico en sus espacios de trabajo.

DESARROLLO DEL TEMA

Se explicó la importancia de la higiene postural en la prevención de dolores y lesiones laborales, especialmente aquellas relacionadas con la columna vertebral, cuello y extremidades. Durante la capacitación se abordaron aspectos clave como la biomecánica corporal, posturas adecuadas al estar sentado o de pie, y recomendaciones para levantar, cargar y mover objetos correctamente.

Los participantes recibieron formación teórica sobre la ergonomía y los riesgos posturales, y posteriormente realizaron ejercicios prácticos donde identificaron errores comunes en su entorno laboral. Se enfatizó la importancia de hacer pausas activas, adaptar el puesto de trabajo y mantener una postura neutra para evitar lesiones.

Los temas abordados fueron los siguientes:

1. → Introducción a la higiene postural.
2. → Identificación de riesgos posturales en el entorno laboral.
3. → Técnicas para levantar y cargar objetos adecuadamente.
4. → Posturas recomendadas al estar sentado, de pie y en movimiento.
5. → Pausas activas y ejercicios de estiramiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La capacitación permitió sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de mantener una buena higiene postural para prevenir lesiones y mejorar su calidad de vida laboral. Se evidenció el interés por adoptar hábitos.

Al final de la capacitación se realiza pausas activas y actividad dinámica.

Atentamente,



CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURTH
INSPECTOR SISO - AMV2

Anexo: Registro Fotográfico
Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Registro fotográfico:

CAPACITACION



Fuente: Propia



Fuente: Propia

PAUSAS ACTIVAS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

CONSORCIO CONSULTECNICOS

ACTIVIDAD DINAMICA



Fuente: Propia



Fuente: Propia

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

CONSORCIO CONSULTECNICOS

		REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1
FECHA: 30/04/2025		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2		HORA INICIO: 09:30 am FINAL: 11:00 am
NOMBRE FACILITADOR: CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT		COOPERATIVA: COOTRACOL		
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - HIGIENE POSTURAL		TIPO Capacitación ☒ Calidad / Técnica ☐ Reunión ☐ Ambiental ☐ Otro ☐ Seguridad y Salud ☒		
		Cuat?		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	OVER LUIS GUZMAN VERBEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Over Guzman V.
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Yorly Guzman
3	EVER IGNACIO PEREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Ever Perez
4	MILTON BERNAL VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Milton Bernal
5	EQUIARIO MANUEL VERGARA NAVARRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Eguarria Vergara
6	LUIS FIDEL VERBEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Luis Fidel
7	RAFAEL EDUARDO GUZMAN ARROYO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Rafael Guzman Arroyo
8	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Remberto Alzate
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Cesar Bohorquez
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Jorge Guzman
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	Pedro Arrieta
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES:				

CONSORCIO CONSULTECNICOS

		REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 11/09/19 Versión: 00 Página 1 de 1
FECHA: 30/04/2025		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INMAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2		HORA INICIO: 11:30 AM FINAL: 12:30 PM
NOMBRE FACILITADOR:		CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT		COOPERATIVA: COOTRAC
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - HIGIENE POSTURAL		TIPO Capacitación ☒ Reunión ☐ Otro ☐		ASPECTO Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ☒
CUAL?		FIRMA		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	FRANCISCO RAFAEL CANCHILA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Francisco Canchila
2	CARLOS BENJAMIN VIÑAS CALDAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Carlos Benjamín Viñas
3	JULIO ENRIQUE ARRIETA ALVAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Julio Arrieta
4	ANUAR DAVID MERCADO GONZALEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Anuar Mercado
5	OSQUIDE MIGUEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Osquide Contreras
6	LUIS CARLOS PACHECO MADARRIAGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Luis Pacheco
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario Herrera
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	German Antonio Herrera
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Robison Zabala
10	DIóGENES DE LA CRUZ SALGADO ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Diógenes Salgado
11	ALFARO APOLINAR UPARELA MONTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Alfaro Uparela
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES:				

CONSORCIO CONSULTECNICOS

		REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1	
FECHA: 30/04/2025		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2		HORA INICIO: 07:30 am FINAL: 09:30 am	
NOMBRE FACILITADOR:		CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT		COOPERATIVA: COOTRAPAZ	
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - HIGIENE POSTURAL				TIPO ASPECTO Capacitación ☒ Calidad / Técnica ☐ Reunión ☐ Ambiental ☐ Otro ☐ Seguridad y Salud ☒ Cual?	
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA	
1	EDUARDO ENRIQUE VALERIO SIERRA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Eduardo Valerio</i>	
2	MIGUEL ANTONIO PEREZ BETIN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Miguel Perez</i>	
3	FERNANDO JOSE GAMBOA DE HOYOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Fernando Gamboa</i>	
4	LEANDRO MANUEL PETRO CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Leandro Petro</i>	
5	JOSE MIGUEL JARABA TAMARA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Jose Miguel Jaraba</i>	
6	JUAN MIGUEL GARCIA CONDE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	<i>Juan Miguel Garcia</i>	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
OBSERVACIONES:					

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 5 de mayo de 2025

CCO-462-131-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 5 de mayo al 10 de mayo del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 5 de mayo al 10 de mayo del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, mayo 7 de 2025

CCOT-462-137-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba (e)
nlemus@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Entrega de informe de interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario – Abril de 2025.

Cordial saludo.

En relación al asunto, se realiza el envío en formato PDF del informe mensual de Interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario No. 1435-2024, 1451-2024 y 1444-2024 correspondiente al mes de abril de 2025.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: un (1) documento

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, mayo 8 de 2025

CCO-462-138-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba (e)
nlemus@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe mes de abril de 2025 política de embellecimiento y ornato.

Cordial saludo,

En el presente informe se describen los avances efectuados en el mes de abril de 2025 para el embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la Administración Vial 2 Grupo 2.

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Registro fotográfico	
Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual.	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero – Cootrac, se realizó la actividad de rocería y desmonte manual, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero – Cootrac, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.	A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual.	A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de rocería y desmonte manual, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual.	A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz, se realizó la actividad de rocería y desmonte manual, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar actividad de poda, corte y/o retiro de árboles.	A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realiza la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar empedrado con semillas.	Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empedrado con semillas.	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con las semillas apropiadas que se ajusten a las condiciones climáticas de la costa atlántica.	

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Servicio de mano de obra para realizar emperadización con cespiones	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer emperadización con cespiones	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con cespiones para la emperadización.
---	---	---

OTRAS ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de las Políticas de Embellecimiento y Ornato descritas en el anexo al pliego de condiciones, y teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se desarrollan a través de los contratos de mantenimiento rutinario, se tienen contempladas acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo de INVIAS, tales como: rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, emperadizarían con semillas y jardinería.

Con estas acciones se pretende mejorar el paisaje urbano existente y mejorar el entorno natural de las mismas, redundando estas acciones para mejorar el medio ambiente.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 12 de mayo de 2025

CCO-462-145-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 12 de mayo al 17 de mayo del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 12 de mayo al 17 de mayo del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 19 de mayo de 2025

CCO-462-149-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 19 de mayo al 24 de mayo del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 19 de mayo al 24 de mayo del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Planeta Rica, mayo 26 de 2025

CCO-462-157-2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor de la administración vial

lmgonzalez@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2.

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato de la referencia y dando cumplimiento a los compromisos contractuales, me permito solicitar aprobación para dictar capacitación a las microempresas de mantenimiento rutinario, en el tema y expositor que se relacionan seguidamente:

Tema: Comunicación asertiva para la buena relación laboral.

Expositor: Cheyla Margarita León Gutiérrez.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 26 de mayo de 2025

CCO-462-158-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 26 de mayo al 31 de mayo del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 26 de mayo al 31 de mayo del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A
