



Al contestar cite Radicado 2025334010036728 Id: 2335340
Folios: 1 Fecha: 2025-09-08 15:59:41
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remite: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
R4D1C4D0

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO
Coordinadora Grupo Administrativa y Financiera
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira - Valle

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE COBO No 2 CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 2025

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de Acta de la SEGUNDA cuenta de cobro del contrato No 25000689 H4, cuyo objeto es:
53400C0488 REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA
Muchas gracias.

Atentamente,

DRA. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente

Elaboró: Ing John Pablo Villegas - Contratista
Revisó: Dra Jenny Hisbelia Bravo Villota
Aprobó: Dra Victoria Eugenia Murilo Polo

*Recibido: Cristian Vélez
10/09/2025.*

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 1

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Captura de pantalla del Secop II.
25000689 H4, para pago #2

- [1 Información general](#)
- [2 Condiciones](#)
- [3 Bienes y servicios](#)
- [4 Documentos del Proveedor](#)
- [5 Documentos del contrato](#)
- [6 Información presupuestal](#)
- [7 Ejecución del contrato](#)
- [8 Modificaciones del Contrato](#)
- [9 Incumplimientos](#)

Volver
Evaluar proveedor Imprimir Modificar

Ejecución del contrato

☐ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	GHS-41	31/07/2025 9:31 p.m. (UTC-5 hora)	-	131.899.403,05 pesos	132.682.555,76 pesos	132.682.555,76 pesos	Enviado por el proveedor
Pago 002	GHS-42	25/08/2025 9:34 a.m. (UTC-5 hora)	05/02/2025 12:00 p.m. (UTC-5 hora)	304.544.457 pesos colombianos	306.352.699,77 pesos	306.352.699,77 pesos	Enviado por el proveedor

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	512.630.925,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagador:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	512.630.925,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	512.630.925,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	5. RP MITO BUENAVENTURA.pdf	5. RP MITO BUENAVENTURA.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	6. aprobación polizas 25000589-H4.pdf	6. aprobación polizas 25000589-H4 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	8. 25000589-H4 ACTA DE RECIBO.pdf	8. 25000589-H4 ACTA DE RECIBO.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	8.1. 25000589-H4 PAGO 01 PARCIAL.pdf	8.1. 25000589-H4 PAGO 01 PARCIAL.pdf	Comprador	Descargar Detalle

Captura de pantalla del Secop II.
25000689 H4, para pago #2



República de Colombia
Ministerio de Economía y Finanzas
Sistema de Contratación Pública
Contratación por Encargos

UTC-5 - 17:35:11

AEROCIVIL

Procesos
Proveedores
Contratos
Menú
Ir a

Busca

Expediente
Menú
Administración de contratos
Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del contrato

☐ Porcentaje
☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	GHS-41	31/07/2025 5:31 UTC-5 (hora)	-	131.899.403,05 pesos	132.682.555,76 pesos	132.682.555,76 pesos	Enviado por el proveedor	Detalle
Pago 002	GHS-42	25/08/2025 5:34 UTC-5 (hora)	09/02/2025 12:00 p. ml. (UTC-5 hora)	304.544.457 pesos colombianos	306.352.699,77 pesos	306.352.699,77 pesos	Enviado por el proveedor	Detalle

Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Palmira, agosto 29 de 2025

Doctora

JENNY HISBELIA BRAVO

Coordinadora administrativa y financiera

Regional Occidente

Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la **SEGUNDA** cuenta de cobro del contrato **No. 25000689 H4**, cuyo objeto es: "53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remitido a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Informe de Supervisión.
7. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
8. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
9. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009).
10. Formato 65 Acta de Recibo Parcial No.2

Atentamente;



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Directora Aeronáutica Civil

Regional Occidente

Supervisora Contrato

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000689 H4
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	GHS INGENIERIA SAS NIT. 901.126.166-4
OBJETO	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.
VALOR	QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) iva sobre la utilidad.
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025
CDP	No. 4025 DEL 09 DE ABRIL DE 2025
RP	No. 49425 DEL 20 DE JUNIO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

En la ciudad de Palmira, el 25 de agosto de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción del presente contrato: el señor **GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO**, identificado con cedula de ciudadanía No.7.318.154 de Chiquinquirá Boyacá obrando en representación legal de de **GHS INGENIERIA S.A.S** NIT 901.126.166-4 y **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO** identificada con cedula de ciudadanía No. 38.566.824 de Cali (valle) supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

SUSENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSENSIONES: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

Fecha de aprobación:
2/11/2023

FORMULARIO 1 AEROPUERTO LADO TIERRA BUENAVENTURA
PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1 AEROPUERTO LADO TIERRA BUENAVENTURA
PRESUPUESTO OFICIAL

6340000488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

Adicionalmente, cuando el proceso de construcción es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar los ítems 1, 2 y 3 del presente formulario y los casillas de "Descripción", "Porcentaje de la Administración, Imprevisto, Utilidad y otros A.I.U.", resultantes en este sentido. Tratándose de otros modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos ítems.

N°	ITEM DE PAQ. D	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	CANT ACTA PARCIAL NO. 2	BALDO CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
			TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL							
			ANDENES VIA DE ACCESO							
		81001	DESMONTE ANDEN (E+L)	M2	136.67	0.00		136.67	\$ 0.414.00	\$ -
		190001	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74.88	0.00	74.88	0.00	\$ 20.141.00	\$ 1,587,438.08
		190010	RELLENO COMPACTADO	M3	14.00	0.00	14.00	0.00	\$ 30.700.00	\$ 550,754.08
		190132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	136.67	0.00	83.07	53.60	\$ 87,180.00	\$ 4,847,706.00
		100905	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200.00	0.00		200.00	\$ 11,318.00	\$ -
		180018	TELA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 3MM	M2	200.00	0.00		200.00	\$ 122,235.00	\$ -
		290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1,200.00	1,200.00		0.00	\$ 21,383.00	\$ -
		290104	ESTUCCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1,200.00	1,200.00		0.00	\$ 10,685.00	\$ -
		290018	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	800.00	800.00		0.00	\$ 30,363.00	\$ -
		180411	C.FALSO LAMINA PVC 4X25CM E-10MM	M2	100.00	0.00		100.00	\$ 96,439.00	\$ -
		210292	DESTROQUE-PULIDA-GRILLADA FISO (E)	M2	400.00	0.00		400.00	\$ 23,577.00	\$ -
			RETRIO DE SALDOS EN SITIO	M3	700.00	0.00		700.00	\$ 13,942.00	\$ 2,768,490.00
			SUB TOTAL						\$ -	\$ 10,143,800.78
			CERRAMIENTOS PERIMETRALES						\$ -	\$ -
			SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPARACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELABORADA						\$ -	\$ -
			BLANDITIVO E INSTALACION MALLA ELABORADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	\$ 53,760.00	\$ 68,919,200.00
			POSTE TUBO GALV. 2" x2 3MM C.13"	ML	400.00	84.00	12.00	304.00	\$ 41,820.00	\$ 601,000.00
			DIAGONAL, ANCHULO 1-14"X 3-18" - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	878.00	0.00	878.00	0.00	\$ 15,933.00	\$ 10,802,574.00
			ALAMBRE DE PUAS # 12.6 - 3 MILIOS	ML	800.00	0.00	800.00	0.00	\$ 3,180.00	\$ 1,911,000.00
			PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200.00	0.00		200.00	\$ 29,876.00	\$ -
			TAPA DE 2"	UND	100.00	0.00		100.00	\$ 11,890.00	\$ -
			SUB TOTAL						\$ -	\$ 86,135,874.00
			EDIFICACIONES DE USO TECNICO / AERONAUTICO						\$ -	\$ -
		290018	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	120.00	120.00		0.00	\$ 30,363.00	\$ -
		290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	120.00	120.00		0.00	\$ 18,606.00	\$ -
			SUB TOTAL						\$ -	\$ -
			ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS						\$ -	\$ -
			PINTURA GENERAL						\$ -	\$ -
		290104	ESTUCCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	508.37	508.37		0.00	\$ 10,685.00	\$ -
		290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	508.37	508.37		0.00	\$ 21,383.00	\$ -
		290018	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	180.46	189.48		0.00	\$ 30,363.00	\$ -
		290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	176.89	100.00	76.89	0.00	\$ 31,983.00	\$ 2,454,758.00
			SUB TOTAL						\$ -	\$ 2,454,758.00
			TORRE DE CONTROL						\$ -	\$ -
		330002	MODULO ANDAMIO H - 2000 M+1 4X3 5 AL TURA	M2	60.00	60.00		0.00	\$ 17,878.00	\$ -
		290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180.00	180.00		0.00	\$ 18,606.00	\$ -
		180310	IMPERMEANTO 800XT-FOL ALUMINIO (CUBIERTA + CIRCULACION)	M2	67.50	0.00		67.50	\$ 50,633.00	\$ -
		290018	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	182.00	182.00		0.00	\$ 23,896.00	\$ -
		290401	CONALTE GARANDA TUBO 2-3 LINDAS+PARALES	ML	250	250.00		0.00	\$ 12,024.00	\$ -
			SUB TOTAL						\$ -	\$ -
			CUARTEL BE						\$ -	\$ -
		290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400.00	400.00		0.00	\$ 18,606.00	\$ -
		APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12.00	12.00		0.00	\$ 144,344.00	\$ -
		290018	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400.00	400.00		0.00	\$ 30,363.00	\$ -
		290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60.00	60.00		0.00	\$ 17,500.00	\$ -
			SUB TOTAL						\$ -	\$ -
			ARREGLÓ PARQUADERO PARA TAXISTAS						\$ -	\$ -
			EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	602.26	0.00	202.76	299.50	\$ 27,564.00	\$ 8,688,876.04

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

31	DASC COMPAMAT. TRITURAD GRANUL NORTE E-20 CM	M3	337.50	0.00	337.50	0.00	\$ 140.774,00	\$ 47.510.868,26
000310	PAY CONCRET. PREMEZCLADO NR 45 E-20 CM	M3	200.00	0.00	200.00	0.00	\$ 700.838,00	\$ 154.001.771,88
100072	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577.80	0.00	577.80	0.00	\$ 8.049,00	\$ 4.848.116,97
	SUB TOTAL							\$ 211.810.633,73
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 244.544.267,06
							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 1.828.237,77
							VALOR TOTAL	\$ 306.352.699,77

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el IVA.	DESCRIPCION						
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se debe pjar en porcentaje (%).	ADMINISTRACION	Ar				21%	
	IMPREVISTO	Im				3%	
	UTILIDAD	Un				4%	
	TOTAL A.I.U.	A.I.U. =				28%	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					18%	\$

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO : QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) IVA sobre la utilidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) IVA sobre la utilidad.

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las obras objeto de la misma, soportadas en informes por parte del supervisor del contrato y se encuentren cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

De igual manera, el último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal.

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

<u>ACTA No.</u>	<u>V/R BRUTO</u>	<u>V/R NETO</u>	<u>V/R IVA</u>	<u>VR. OTROS DTOS</u>
001	\$ 132.682.555,76	\$131.899.403,06	\$783.151,71	
002	\$ 306.352.699,77	\$304.544.467,00	\$1.808.232,77	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de otros descuentos corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, rete fuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VR. EJECUTADO \$439.035.255,53
 VR PENDIENTE EJECUTAR: \$ 73.595.669,47

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 512.630.925
 VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL \$ _____
 VALOR CONTRATOS REAJUSTES \$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO \$439.035.255,53
 VALOR NO EJECUTADO \$ 73.595.669,47

VALOR PAGADO \$132.682.555,76
 VALOR DESCUENTOS \$ _____
 VALOR PENDIENTE PAGO \$ 379.948.369,24

TOTALES \$512.630.925 \$512.630.925 \$ 512.630.925

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.


GARANTÍAS

Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Garantía de cumplimiento	21-44-101472729	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 101985002
Amparos			
Detalle		Vigencia	Valor
Cumplimiento de contrato		12/04/2026	\$ 102.526.185
Pago de Salarios		12/12/2028	\$ 102.526.185
Estabilidad y calidad de la obra		12/12/2030	\$ 102.526.185
Calidad del servicio		06/06/2026	\$ 102.526.185


Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Responsabilidad civil extracontractual	21-40-101256909	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 127.873.005

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023


Amparos		
Detalle	Vigencia	Valor
Por daños a bienes a terceros, y lesiona es persona (Predios, labores, operaciones, contratistas, perjuicios extrapatrimoniales, responsabilidad civil patronal, vehículos propios – no propios,)	06/12/2025	\$ 127.873.005



GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO.
 Representante Legal
 GHS INGENIERIA SAS
 Contratista.



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 Directora Aeronáutica Regional Occidente
 U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
 Supervisora



JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
 Aeronáutica Regional Occidente
 Apoyo de la Supervisión

 AERONAUTICA CIVIL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: 31 / Julio / 2025

Información Beneficiario de Pago	
Nombre beneficiario de pago:	GHS INGENIERIA S.A.S
NIT/CC No.:	801126166-4

Información Contractual	
Contrato No.:	25000689 H4
Objeto del contrato:	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA
Fecha de suscripción:	03 / Jul / 2025
Fecha de terminación:	12 / Dic / 2025

Estado financiero del contrato			
Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 512.630.925		\$ 439.035.255,53	\$ 73.595.669,47

Información para pago																			
Concepto de Pago: ☐ ASEO ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN ☐ INTERVENTORIA	☐ MANTENIMIENTO ☒ OBRA ☐ RESOLUCIÓN ☐ SERVICIOS PÚBLICOS																		
☐ TRANSPORTE DE CARGA ☐ TRANSPORTES PASAJEROS ☐ VIGILANCIA ☐ OTRO:																			
RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>No. Factura</th> <th>Fecha factura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Factura Electrónica</td> <td>GHS-42</td> <td>25-ago-25</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Factura Electrónica	GHS-42	25-ago-25													ANTICIPO - AMORTIZACIÓN El presente pago ¿es un anticipo? ☐ No Valor inicial del anticipo: Valor total amortizado a la fecha: Amortización presente pago: Saldo pendiente de amortizar:
Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura																	
Factura Electrónica	GHS-42	25-ago-25																	
INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA																			
¿El pago se realiza a fiducia? ☐ No	NIT Fiducia:																		
¿Se requiere endosar el pago? ☐ No	NIT beneficiario de endoso:																		
Tipo cuenta bancaria: Ahorros	Cuenta bancaria No. 024399941																		
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTÁ																			

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato			
Vigencia presupuestal: Vigencia Actual			
No. Compromiso presupuestal / RP 1:	49425	No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)	Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (Incluido IVA)
C-2403-0600-32-52104E-2403025-02	\$ 306.352.699,77		
Total a pagar:	\$ 306.352.699,77	Total a pagar:	\$ -

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor(es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los Informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este Instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Cargo: Apoyo a la Supervisión
Dependencia: INFRAESTRUCTURA

Firma:
Nombre: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo: DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia: AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		 Seguridad y salud en el trabajo
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CERTIFICA

Que el contratista: GHS INGENIERIA SAS., realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.º de Contrato: 25000689 H4
Objeto del contrato: 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA
Nombre del supervisor designado por Aerocivil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

La anterior se expide a los 23 días del mes de JULIO del año 2025 por el Servidor Público.


Maryluz Martínez Largo

Profesional Aeronáutico II



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjbravo

JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA

Unidad ó Subunidad

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

20/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49425	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	512.630.925,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	512.630.925,00	Saldo x Obligar:	512.630,9	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901126168	Razón Social:	GHS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	024399941	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000689 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-06-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLI
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE SYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF					
						512.630.925,00	0,00		
Total:						512.630.925,00	0,00	512.630.925,00	512.630,9

Objeto: 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	512.630.925,00	512.630.925,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1



GHS INGENIERIA SAS

FACTURA DE VENTA GHS42

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

04533b1732b105191ab34759d62e3fe1c361914d63009133337a5862b3288ad6f01c67a29c44e98d56ac359e7f8134c7

Número de Factura: GHS-42

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 25/08/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Fecha de Vencimiento: 09/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GHS INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: GHS INGENIERIA SAS

NIT del Emisor: 901126166

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 66 108 66 AP 401 BRR VILLA DEL DORADO

Actividad Económica: 4112

Teléfono / Móvil: 3016364412

Correo: ghsingenierasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999059

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-23

Dirección: AV EL DORADO N 112-09

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 4251000

Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72121103	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 237.925.364,84	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 237.925.364,84
2	72121103	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 49.964.326,62	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.964.326,62
3	72121103	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 7.137.760,95	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.137.760,95
4	72121103	UTILIDAD GRAVADA	NIU	1,00	\$ 9.517.014,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.808.232,77	19,00			\$ 9.517.014,59

Notas Finales

#\$24-12-00-500;25000689;victoria.murillo@aerocivil.gov.co#\$ ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO N° 2. Contrato de obra No 25000689 H4, OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ D E BUENAVENTURA.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 13:57:59
Documento validado por la
DIAN:
25/08/2025 13:58:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	304544467
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	304544467
IVA	1808232,77
INC	0,00
Bolss	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1808232,77
Total neto factura (=)	306352699,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 306352699,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	304.544.467,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	304.544.467,00
IVA	1.808.232,77
INC	0,00
Bolss	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.808.232,77
Total neto factura (=)	306.352.699,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$306.352.699,77

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093568986 Rango desde: 41 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-26



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
04533b1732b105191ab34759d62e3fe1c361914d63009133337a5862b3288ad6f01c67a29c44e98d56ac359e7f8134c7
Número de Factura: GHS-42
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GHS INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: GHS INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 901126166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 66 108 66 AP 401 BRR VILLA DEL DORADO
Teléfono / Móvil: 3016364412
Correo: ghsingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVEL DORADO N 112-09
Teléfono / Móvil: 4251000
Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72121103	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 237.925.364,84	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 237.925.364,84
2	72121103	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 49.964.326,62	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.964.326,62
3	72121103	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 7.137.760,95	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.137.760,95
4	72121103	UTILIDAD GRAVADA	NIU	1,00	\$ 9.517.014,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.808.232,77	19,00			\$ 9.517.014,59

Notas Finales

##\$24-12-00-500;25000689;victoria.murillo@aerocivil.gov.co##\$ ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO N° 2. Contrato de obra No 25000689 H4, OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 13:57:59
Documento validado por la
DIAN:
25/08/2025 13:58:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nrt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	304544467
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	304544467
IVA	1808232,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1808232,77
Total neto factura (=)	306352699,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 306352699,77

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	304.544.467,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	304.544.467,00
IVA	1.808.232,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.808.232,77
Total neto factura (=)	306.352.699,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$306.352.699,77

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093568986 Rango desde: 41 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-26



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, el suscrito GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO representante legal de la empresa GHS INGENIERIA SAS, identificada con Nit 901.126.166- 4, se permite certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide el día 30 de agosto de 2025

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo Armando Acosta Camargo', is written over a horizontal line.

GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
Representante Legal
GHS INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA
7318154
 NUMERO
ACOSTA CAMARGO
 APELLIDOS
GUILLERMO ARMANDO
 NOMBRES


 FIRMA


 FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1982**
CHIQUEQUIRA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
 ESTATURA **O+** **M**
 O.B. RH SEXO
16-MAY-2000 CHIQUEQUIRA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADOR NACIONAL
 PARA SUOYOT ESEBOBO
 INDICE DERECHO

 P:0706700-70065443-M-0007318154-20001012 11061002858 02 071084350

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARATRICIALES Y SALUD
NI	901126166-4	GHS INGENIERIA SAS	Calle 66 # 108 66	0315382233	GHSINGENIERIASAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 2 0
2025-06	2025-07	E		86728480	TOTAL A PAGAR \$713.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
231001	Cotizados	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903780-5	29.800				29.800	0	0	29.800			298	29.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066042-7	114.000	0	0	114.000	2

TOTALES PARATRICIALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	29.800	29.800
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	713.400	713.400

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901126166-4	GHS INGENIERIA SAS		Calle 66 # 108 86	0318362233	GHSINGENIERIASAS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2 0
2025-06	2025-07	E		68726480	\$713.400

VALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIONES						SALUD			RETENCIONES LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción



GHS INGENIERIA SAS

Bogotá DC, 31 de agosto de 2025

Supervisor contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Apoyo Supervisor contrato

JOHN PABLO VILLEGAS V

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 DE 2025- Objeto - 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

Asunto: Tramite de pago acta parcial No. 2

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contenida en la cláusula octava – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, comedidamente me permito presentar documentación para tramite del acta parcial de obra No. 2 por valor de \$306.352.699,77, correspondiente al 59,76% del valor total del contrato, se adjunta factura No. GHS42, acta parcial de pago, certificado de pago de parafiscales y demás documentos requeridos por la Entidad.

GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		
	Clave: M5ER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO 15080689 HA	VALOR INICIAL: \$ 512.630.925,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.02 CONTRATISTA: GHS INGENIERIA S.A.S INTERVENIDOR: N/A SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO APOYO A LA SUPERVISIÓN: JOHN PABLO VILLEGAS V
	OBJETO: EMENDAR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA PLAZO INICIAL: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2023. FECHA DE INICIACIÓN: 03/07/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 12/12/2023 PLAZO FINAL: 12/12/2023	VALOR ADICIONAL: \$ 0,00 VALOR FINAL: \$ 512.630.925,00	

El día 25 de julio de 2023, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Gerardo Tovar Lopez de la Ciudad de Buenaventura, el Ingeniero GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO, en representación del contratista GHS INGENIERIA S.A.S y el Ingeniero JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ, como apoyo a la supervisión de la Aeronautica Civil, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 25 de agosto de 2023, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALORES

1. Valor Inicial contrato		512.630.925,00
2. Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		512.630.925,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		512.630.925,00
6. Valor presente acta		306.352.689,77
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		306.352.689,77
9. Acumulado pagos actas anteriores		132.682.656,78
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+6+9)		439.035.255,53
12. Saldo por pagar del presente contrato		73.595.669,47
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		59,84%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA


RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1. C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Mantenimiento	512.630.925
2.	Otro	-
3.	Adquisición de equipos	-
4.	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		512.630.925


AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403000X Mantenimiento

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.


 NOMBRE: GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
 NOMBRE CONTRATISTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA


 JOHN PABLO VILLEGAS V
 Apoyo a la Supervisión



 VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 Directora Regional
 SUPERVISOR

 ASERNAUTICA CIVIL		FORMATO	
ACTA DE COSTOS DE OBRA No.2			
Clave: M3ER-7.0-12-010		Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023
VALOR DE ANTICIPO	%	\$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	\$	132 682,556
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	\$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	\$	306,352,899.77
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	\$	-
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	\$	306,352,899.77
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	\$	439,035,255.54
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	\$	-
SALDO POR EJECUTAR	%	\$	73,595,969.46
SALDO POR AMORTIZAR	%	\$	-

VALOR TOTAL EN LETRAS


CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, CUARENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

OBSERVACIONES



NOMBRE GUILLERMO ACOSTA


CONTRATISTA



NOMBRE ROGER LUNA

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA



JOHN PABLO VILLEGAS V

Aprobo a la Supervisión



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Supervisora

(I): Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda

(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.

(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada

(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.

(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades

(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el período relacionado.

(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.

(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.

Los valores no pueden llevar número decimales



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

Clave: MSER-7.0-12-009

Versión: 02

Fecha de
aprobación:
31/08/2023

CONTRATO No.

25000689 H4

SUPERVISOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA
(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 304.544.467,00

Porcentaje estimado para el A.I.U.

28,00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto
1 + % A.I.U.

304.544.467,00

237.925.384,84

UTILIDAD

(Costo Directo x 4% estimado Utilidad)

9.517.014,59

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

1.808.232,77

TOTAL IVA

1.808.232,77

GHS INGENIERIA S.A.S
GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Regional
Supervisora

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 19

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	7
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	7
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000689 H4
 Nombre del Contratista: GHS INGENIERIA S.A.S
 Periodo informe: 01 de agosto al 25 de agosto del 2025
 Nombre de Supervisor: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 Nombre del Interventor: No aplica
 Área perteneciente: _____

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL ACTA No.2

Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 19

PERÍODO: día 01 de agosto al día 25 de agosto de año 2025

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
ANDENES VIA DE ACCESO - EXCAVACION TIERRA A MANO - RELLONO COMPACTADO - ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI - RETIRO DE SALDOS EN SITIO	Se iniciaron actividades de excavación, conformación, rellenos y fundida en concreto con acabado a la vista de andenes y separadores parqueadero.	TERMINAL AEREO
CERRAMIENTO PERIMETRAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" - POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" - DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16- TENSOR MALLA SUPERIOR - ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	Se iniciaron las actividades de pintura ángulos metálicos para instalación de malla. Realce de cerramiento con la instalación de 1 metro de postes en tubo galvanizado, desmonte e instalación de malla galvanizada asegurada a Angulo metálico en la parte superior inferior de cada sección de cerramiento. Realce 50 cm cerramiento con la instalación de postes en tubo galvanizado e instalación de malla galvanizada asegurada a Angulo metálico.	COSTADO ORIENTE PISTA AEREA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 19

ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	Repinte con pintura en esmalte color gris de láminas microperforadas fachada.	ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS - COSTADO NORTE PISTA AEREA
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS - EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL) - BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM - PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM - RETIRO DE SALDOS EN SITIO	Demolición de asfalto y excavación subbase, proceso de cargue escombros en volquetas, Conformación y Compactación de subbase en recebo previo a fundir concreto, Toma de densidades base en recebo, Mezcla y fundida de concreto MR 45, Pasa juntas en acero liso de 3/4, Toma de muestras viga MR 45 para ser fallada en laboratorio, Acabado final de placas de concreto flotado y cepillado, Corte de placas en concreto para dilataciones	UBICACIÓN DE TERMINAL AEREO

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 2	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL					
ANDENES VIA DE ACCESO					
DEMOLANDEN E=0,10	M2	138,67		\$ 5.414,00	\$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	74,88	\$ 26.141,00	\$ 1.957.438,08
RELLONO COMPACTADO	M3	14,98	14,98	\$ 36.766,00	\$ 550.754,68
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	55,60	\$ 87.180,00	\$ 4.847.208,00
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00		\$ 11.315,00	\$ -
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM	M2	200,00		\$ 122.235,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1.200,00		\$ 21.383,00	\$ -
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1.200,00		\$ 10.885,00	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 19

KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	800,00		\$ 30.383,00	\$ -
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00		\$ 98.439,00	\$ -
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00		\$ 23.577,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	200,00	\$ 13.942,00	\$ 2.788.400,00
SUB TOTAL				0	\$ 10.143.800,76
CERRAMIENTOS PERIMETRALES				\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	1.200,00	\$ 55.766,00	\$ 66.919.200,00
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	12,00	\$ 41.825,00	\$ 501.900,00
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	678,00	678,00	\$ 15.933,00	\$ 10.802.574,00
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	600,00	\$ 3.186,00	\$ 1.911.600,00
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00		\$ 29.875,00	\$ -
TAPA DE 2"	UND	100,00		\$ 11.950,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 80.135.274,00
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				0	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00		\$ 30.383,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00		\$ 16.606,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ -
ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELÉCTRICAS				0	
PINTURA GENERAL				\$ -	\$ -
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	598,37		\$ 10.885,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	598,37		\$ 21.383,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	199,46		\$ 30.383,00	\$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	176,80	76,80	\$ 31.963,00	\$ 2.454.758,40



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL ACTA No.2

Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 19

SUB TOTAL				0	\$ 2.454.758,40
TORRE DE CONTROL				0	
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00		\$ 17.975,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180,00		\$ 16.606,00	\$ -
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50		\$ 59.633,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	192,00		\$ 23.596,00	\$ -
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250		\$ 12.624,00	\$ -
SUB TOTAL					\$ -
CUARTEL SEI					
VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400,00		\$ 16.606,00	\$ -
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00		\$ 144.344,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00		\$ 30.383,00	\$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00		\$ 17.500,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ -
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	202,76	\$ 27.564,00	\$ 5.588.876,64
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	337,50	337,50	\$ 140.774,00	\$ 47.510.868,26
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	200,90	\$ 766.839,00	\$ 154.061.771,86
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	577,60	\$ 8.049,00	\$ 4.649.116,97
SUB TOTAL					\$ 211.810.633,73
					\$ 304.344.467,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 1.808.232,77
VALOR TOTAL					\$ 306.352.699,77

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 19

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos de mantenimiento y adecuación de las diferentes infraestructuras fueron entregados por GHS INGENIERIA S.A.S en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
ANDENES VIA DE ACCESO				
EXCAVACION TIERRA A MANO	74,88 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
RELLONO COMPACTADO	14,98 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	55,60 M2	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	200,00 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
CERRAMIENTO PERIMETRAL				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	1.200,00 M2	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C.13"	12,00 ML	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
DIAGONAL - ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	678,00 ML	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
ALAMBRE DE PUAS # 12,5 - 3 HILOS	600,00 ML	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS				
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	76,80 M2	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	202,76 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 19

BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	337,50 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	200,90 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	577,60 M3	25 DE AGOSTO DEL 2025	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 19

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
16 de julio del 2025	31 de diciembre del 2025

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
23 de julio del 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2	x	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 19


Se ha ejecutado el 100% de la reconformación de canales en tierra, sobre el el costado sur del aeropuerto, con las actividades de perfilamiento de terreno, limpieza vegetal y retiro de material designado. Durante el horario nocturno se llevó a cabo la descontaminación de 6540,75 m2 de pista hacia el costado de la cabecera 24.

- Valor Contractual: \$ 512.630.925,00
- Valor ejecutado Acta Parcial No.1: \$ 132.682.555,76
- Valor ejecutado Acta Parcial No.2: \$ 306.352.699,77
- Porcentaje de Ejecución: 85.64%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 SUPERVISOR



JOHN PABLO VILLEGAS V
 Apoyo a la Supervisión

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 19

ANDENES VIA DE ACCESO – TERMINAL AEREO	
EXCAVACION TIERRA A MANO - RELLONO COMPACTADO - ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	
Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 19

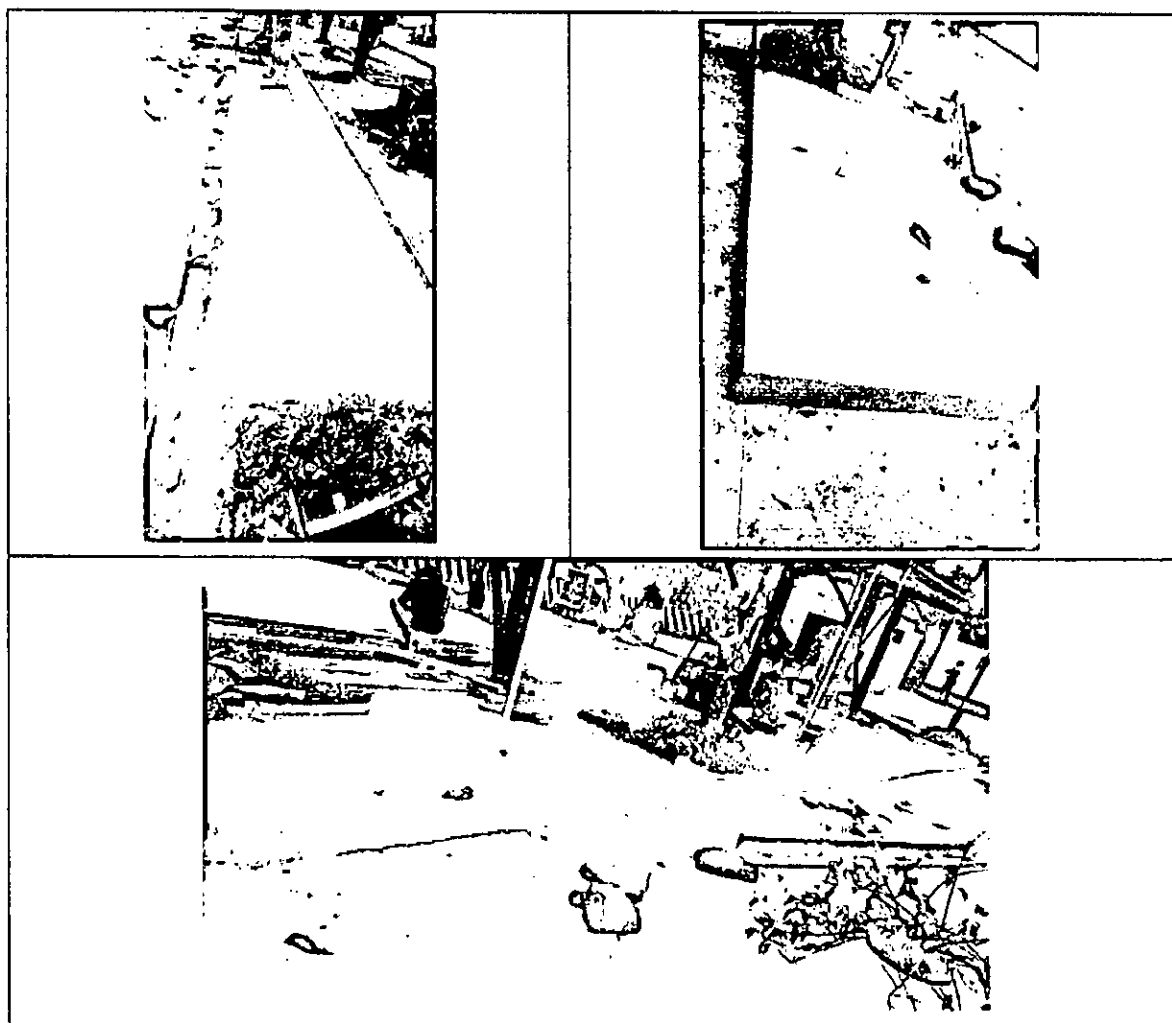

CERRAMIENTO PERIMETRAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" - POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" - DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR - ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS
Proceso de ejecución

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 19



ANTES	DESPUES
	
	

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 19




EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO	
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	
Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 14 de 19

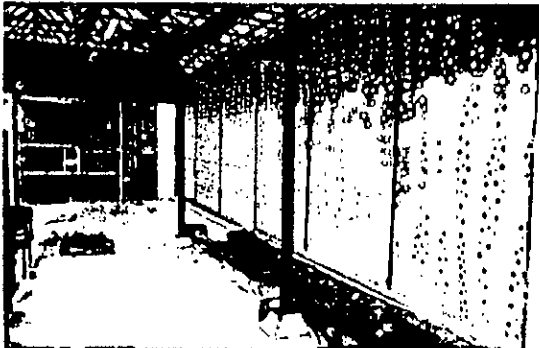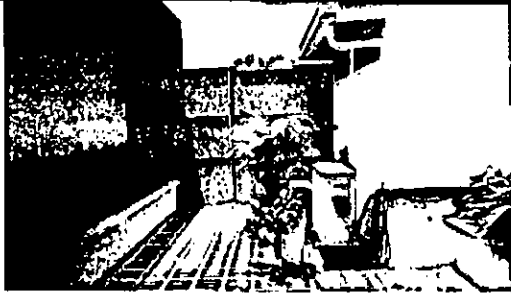	
	
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL) - BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM - PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM - RETIRO DE SALDOS EN SITIO Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 19

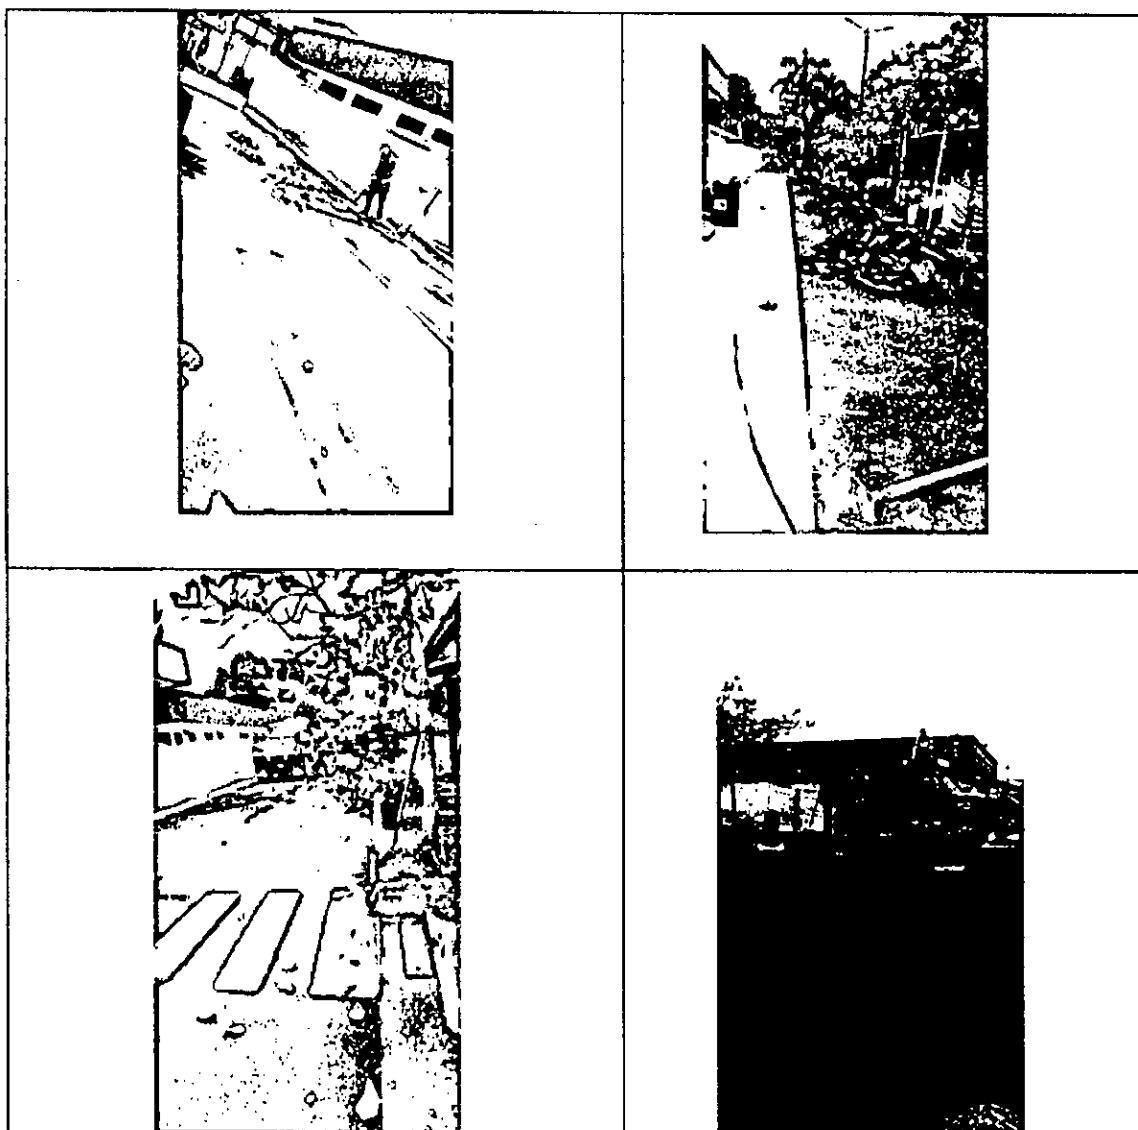



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL ACTA No.2


Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 16 de 19

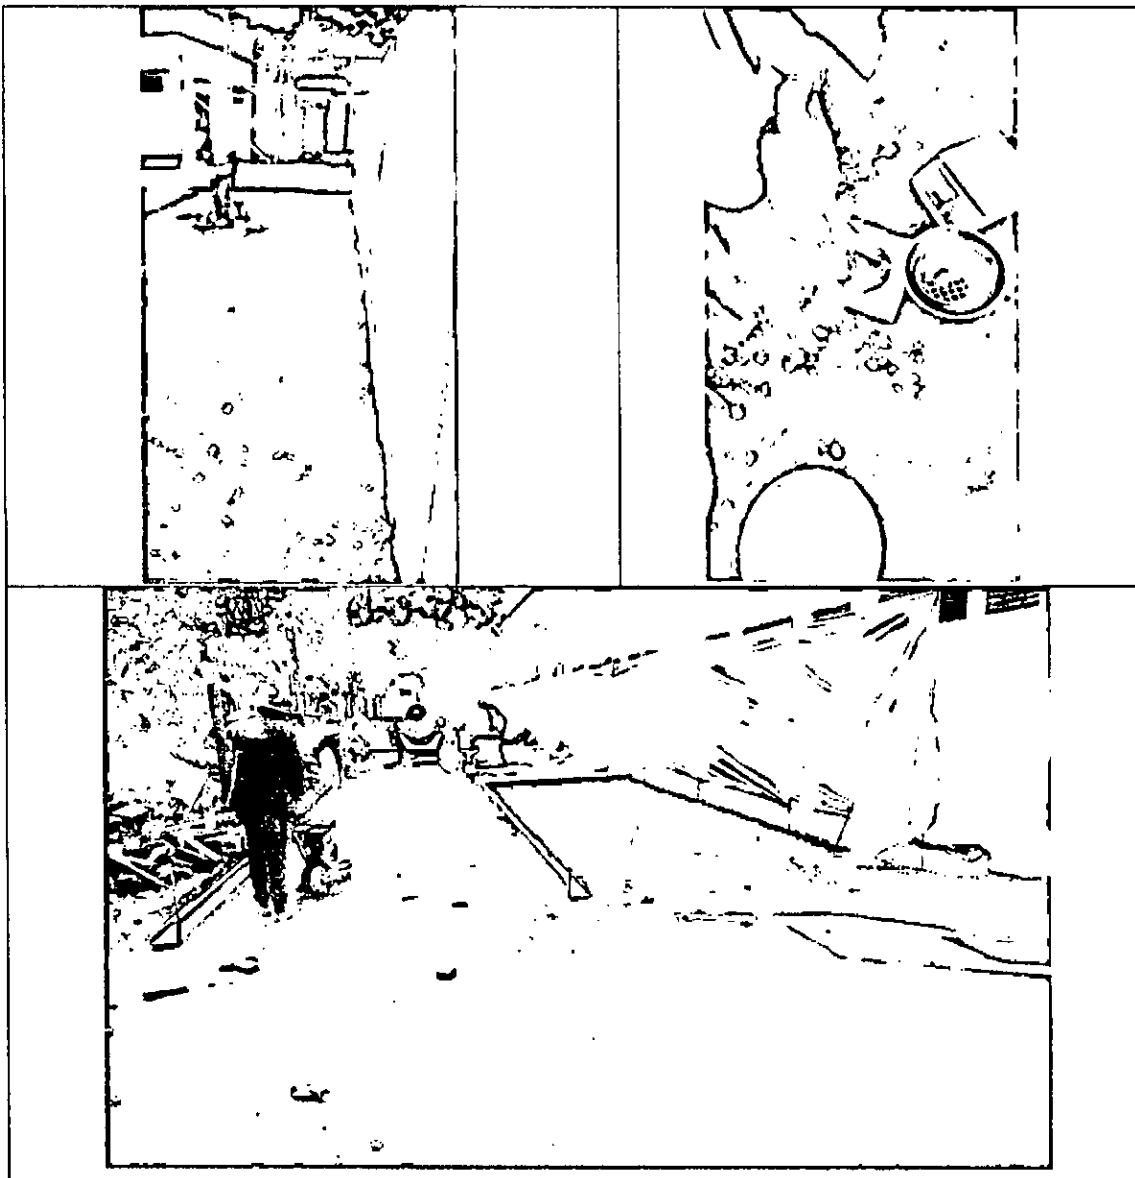

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 19

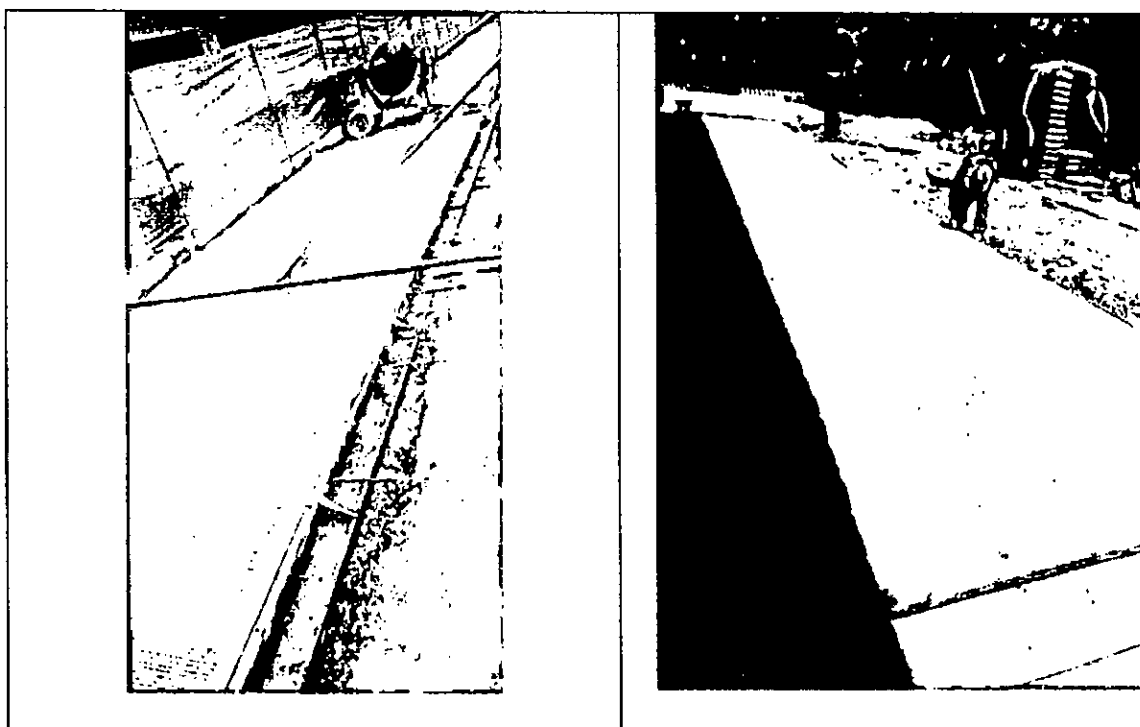



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2




Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 18 de 19

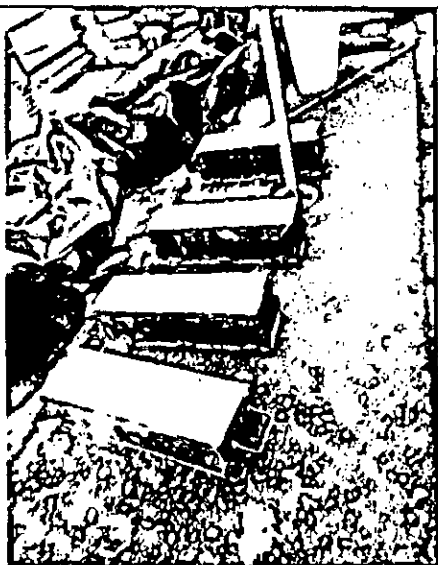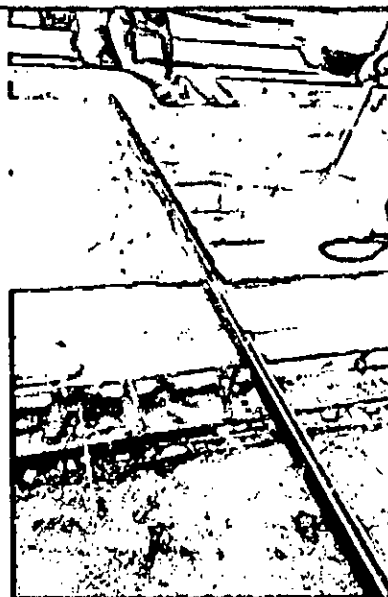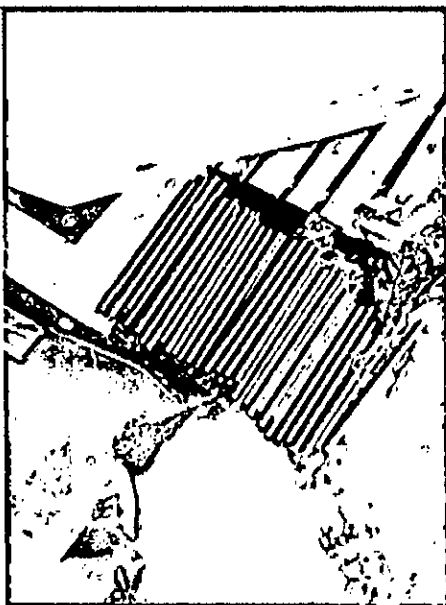

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.2			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 19 de 19

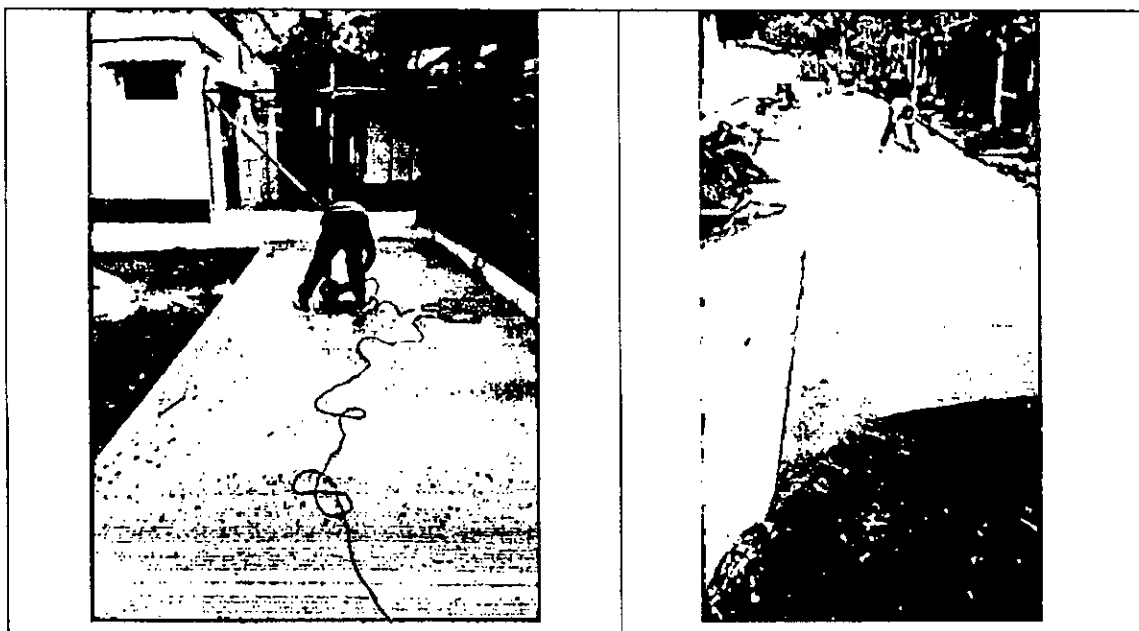

FORMULARIO 1 AEROPUERTO LADO TIERRA BUENAVENTURA
PRESUPUESTO OFICIAL

534000489 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	CANT ACTA PARCIAL NO. 2	SALDO CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
		GENERA	PARTICULAR								
				TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL							
				ANDENES VIA DE ACCESO							
			81001	DEMOLANDEN C=0.10	M2	138.07	0,00		138.07	\$ 5.414,00	\$ -
			100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74.88	0,00	74.88	0,00	\$ 26.141,00	\$ 1.957.438,08
			100619	RELLENO COMPACTADO	M3	14.88	0,00	14.88	0,00	\$ 38.768,00	\$ 550.754,88
			200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138.07	0,00	55.60	83.07	\$ 87.180,00	\$ 4.847.208,00
			100505	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00		200,00	\$ 11.315,00	\$ -
			180618	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	200,00	0,00		200,00	\$ 122.235,00	\$ -
			290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1.200,00	1.200,00		0,00	\$ 21.383,00	\$ -
			290104	ESTUCCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1.200,00	1.000,00		200,00	\$ 10.885,00	\$ -
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	800,00	800,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
			160441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00		100,00	\$ 98.439,00	\$ -
			310202	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00		400,00	\$ 23.577,00	\$ -
				RETRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	0,00	200,00	0,00	\$ 13.942,00	\$ 2.788.400,00
				SUB TOTAL						\$ -	\$ 10.143.800,76
				CERRAMIENTOS PERIMETRALES						\$ -	\$ -
				SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPARACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA						\$ -	\$ -
				SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	\$ 55.768,00	\$ 66.918.200,00
				POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	84,00	12,00	304,00	\$ 41.825,00	\$ 501.900,00
				DIAGONAL ANGULO 1-1/4"X 3-18 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	678,00	0,00	878,00	0,00	\$ 15.833,00	\$ 10.802.574,00
				ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	0,00	600,00	0,00	\$ 3.166,00	\$ 1.911.600,00
				PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00		200,00	\$ 29.675,00	\$ -
				TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00		100,00	\$ 11.950,00	\$ -
				SUB TOTAL						\$ -	\$ 80.135.274,00
				EDIFICACIONES DE USO TECNICO / AERONAUTICO						\$ -	\$ -
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	120,00	120,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
			290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	120,00	120,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
				SUB TOTAL						\$ -	\$ -
				ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS						\$ -	\$ -
				PINTURA GENERAL						\$ -	\$ -
			290104	ESTUCCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	598,37	598,37		0,00	\$ 10.885,00	\$ -
			290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	598,37	598,37		0,00	\$ 21.383,00	\$ -
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	189,46	189,46		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
			290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	176,80	100,00	76,80	0,00	\$ 31.893,00	\$ 2.454.758,40
				SUB TOTAL						\$ -	\$ 2.454.758,40
				TORRE DE CONTROL						\$ -	\$ -
			330602	MODULO ANDAMIO H = 2000 M=1,4X3,0 ALTURA	MWD	60,00	60,00		0,00	\$ 17.975,00	\$ -
			290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180,00	180,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
			180310	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	87,50	0,00		87,50	\$ 59.833,00	\$ -
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	192,00	192,00		0,00	\$ 23.596,00	\$ -
			290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00		0,00	\$ 12.624,00	\$ -
				SUB TOTAL						\$ -	\$ -
				CUARTEL SEI						\$ -	\$ -
			290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400,00	400,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
			APU	LUMINARIAS 80 X 80 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00		0,00	\$ 144.344,00	\$ -
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00	400,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
			290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	60,00		0,00	\$ 17.500,00	\$ -
				SUB TOTAL						\$ -	\$ -
				ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS						\$ 0,00	\$ -
			080105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	502,26	0,00	202,76	299,50	\$ 27.564,00	\$ 5.568.876,84

31	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	337,50	0,00	337,50	0,00	\$ 140.774,00	\$ 47.510.888,26
080310	PAV.CONCRET. PREMEZCLADO HR 45 E=20 CM	M3	200,80	0,00	200,80	0,00	\$ 766.839,00	\$ 154.081.771,80
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ 4.649.116,97
	SUB TOTAL							\$ 211.810.633,73


SUBTOTAL OBRAS \$ 304.544.467,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 1.808.232,77
VALOR TOTAL	\$ 306.352.699,77

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor del peso sea igual o superior a 5 se	DESCRIPCION						
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se	ADMINISTRACION	A=				21%	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=				3%	
	UTILIDAD	U=				4%	
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=				28%	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					18%	\$

Alientamento,

Nombre del proponente: GHS INGENIERIA SAS
 NR: 001.126.166-4
 Nombre del representante legal: Guillermo Armando Acosta Camargo
 C. C. No. 7.318.154 de Chiquinquirá Boyacá
 Matrícula profesional No. 25202157043 CHD
 Dirección de correo: Calle 66 No. 108-66 ofi 401
 Correo electrónico: ghsingenieriasas@gmail.com
 Telefax: 9382233
 Ciudad: Bogotá DC



(Firma del representante legal)



GHS INGENIERIA SAS

INFORME NO. 2

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO
TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.**



CONTRATO DE OBRA No. No. 25000689 H4 DE 2025 DEL 16 DE JUNIO DE 2025

**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO
TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA**

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

**FECHA
31 DE AGOSTO DE 2025**

Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1.	INFORME NO. 1.	4
2.	INTRODUCCION	5
3.	LOCALIZACIÓN	6
4.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
5.	DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES	8
6.	REGISTRO FOTOGRAFICO	13
7.	CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL	28
8.	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	29
9.	ANEXOS	30



GHS INGENIERIA SAS

1. INFORME NO. 2

PERIODO A EVALUAR

: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATANTE:

: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

CONTRATISTA

: GHS INGENIERIA SAS

SUPERVISOR

Supervisor contrato
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Apoyo Supervisor contrato
JOHN PABLO VILLEGAS V

FECHA DE ENTREGA DE INFORME

: 31 DE AGOSTO DE 2025



GHS INGENIERIA SAS

2. INTRODUCCION

La presente información corresponde al **INFORME NO. 2** para REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA., se describe en éste la situación del proyecto y el resumen de las actividades ejecutadas, en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 DE 2025 SUSCRITO ENTRE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL Y GHS INGENIERIA SAS**, cuyo objeto es: "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA."

El plazo de ejecución: el contrato tendrá una duración de seis meses o HASTA EL DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual fue suscrita el día 3 de julio de 2025.



GHS INGENIERIA SAS

3. LOCALIZACIÓN

El **Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tovar López)** se encuentra ubicado a 15 minutos del casco urbano del Distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. La infraestructura aeroportuaria se divide en dos áreas principales: **lado tierra** y **lado aire**, cada una con funciones específicas.

El **lado tierra** comprende las instalaciones accesibles al público, como el edificio terminal con salas de espera, mostradores de atención y áreas administrativas. También incluye las vías de acceso, zonas de estacionamiento y áreas de carga y descarga. Estas instalaciones están diseñadas para garantizar la conexión eficiente de los pasajeros y carga con el entorno urbano cercano.

Por su parte, el **lado aire** incluye la pista de aterrizaje y despegue, de aproximadamente 1.250 metros de longitud y con superficie asfáltica, así como las calles de rodaje y la plataforma. Estas áreas son exclusivas para la operación de aeronaves y actividades relacionadas con su mantenimiento, carga y embarque. La ubicación estratégica del aeropuerto permite su conectividad con otras terminales regionales y facilita el acceso a esta región del Pacífico colombiano, fomentando su desarrollo económico y social.

Ubicación general del proyecto

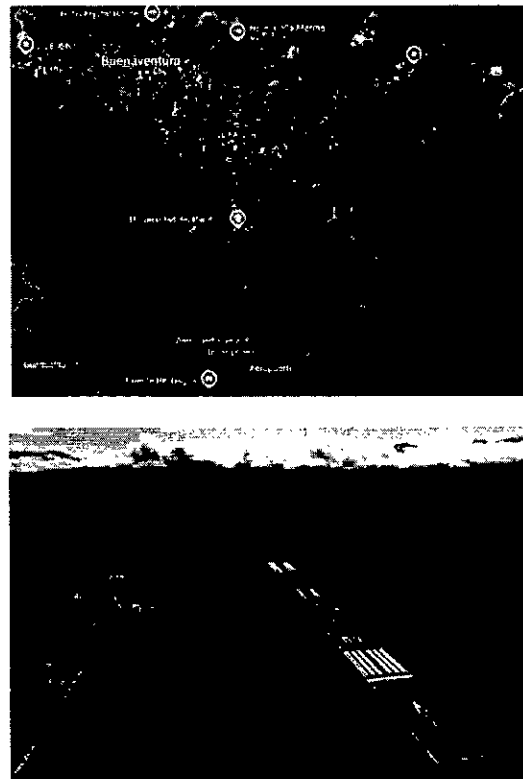


Figura 1.1. Foto aérea aeropuerto Gerardo Tovar Lopez - Imagen tomada de la página:
<https://x.com/AerocivilCol/status/1641906979701399552/photo/2>



GHS INGENIERIA SAS

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

GHS INGENIERIA SAS bajo la supervisión técnica, administrativa y financiera del Supervisor, desarrolla las actividades de mantenimiento y adecuaciones para el buen funcionamiento de las infraestructuras DEL AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA INCLUYENDO REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION DELTERRMINAL AEREO, INCLUYENND0 AREAS REFERENTES A VIAS DE ACCESO, PARQUEADERO, CERRAMIENTO PERIMETRAL, ADECUACION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE HACEN PARTE FUNDAMENTAL DE SU FUNCIONAMIENTO.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	No. 25000689 H4 DE 2025																								
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA																								
PLAZO	El plazo de ejecución: es de 180 DÍAS, sin exceder el 12 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual fue suscrita el día 3 de julio de 2025.																								
VALOR DEL CONTRATO	\$512.630.925, 00 COP																								
FECHA DE INICIO	3 DE JULIO DE 2025																								
FECHA DE TERMINACION	12 DE DICIEMBRE DE 2025																								
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL																								
CONTRATISTA	GHS INGENIERIA SAS																								
GARANTIAS	<table><tr><th></th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG</th></tr><tr><td>- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>17/06/2025</td><td>12/04/2026</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2028</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2028</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td><td colspan="3">SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00</td></tr><tr><td>- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2025</td><td>\$127,873.005.00</td></tr></table>		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2025	12/04/2026	\$102,526,185.00	- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00	- CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00	- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00			- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	17/06/2025	12/12/2025	\$127,873.005.00
	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG																						
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2025	12/04/2026	\$102,526,185.00																						
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00																						
- CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00																						
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00																								
- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	17/06/2025	12/12/2025	\$127,873.005.00																						



GHS INGENIERIA SAS

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL:

Se iniciaron actividades de demolición y excavación de andenes y del separador ubicado en el área de parqueadero, realizando actividades de excavación, conformación, rellenos y fundida en concreto con acabado a la vista.

Asimismo, se realiza el retiro de escombros y disposición final.

CERRAMIENTO PERIMETRAL:

Se dio inicio a las actividades de desmonte y retiro de malla, instalación de postes en tubo galvanizado, suministro e instalación de malla galvanizada asegurada a Angulo metálico en la parte superior inferior de cada sección de cerramiento, Asimismo se realizó la instalación de alambre de púas a 3 hilos en las áreas requeridas en informadas por la supervisión.

ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS:

Se realizo la aplicación de pintura en esmalte color gris en los módulos de fachada en lamina microperforada, con los soportes de fijación y demás elementos que hacen parte de la fachada

ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS:

Se inicio la actividad de demolición de asfalto, excavación, conformación de banca, rellenos y compactación de la base, posterior fundida de concreto MR 45 en placas dilatadas con barras de amarre y pasa juntas en acero.

CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS



GHS INGENIERIA SAS

DESCRIPCION	UND.	CANT	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	CANT ACTA PARCIAL NO. 2	SALDO CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL							
ANDENES VIA DE ACCESO							
DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	138,67	0,00		138,67	\$ 5.414,00	\$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	0,00	74,88	0,00	\$ 26.141,00	\$ 1.957.438,08
RELLONO COMPACTADO	M3	14,98	0,00	14,98	0,00	\$ 36.766,00	\$ 550.754,68
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	0,00	55,60	83,07	\$ 87.180,00	\$ 4.847.208,00
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00		200,00	\$ 11.315,00	\$ -
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER ,35MM	M2	200,00	0,00		200,00	\$ 122.235,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1.200,00	1.200,00		0,00	\$ 21.383,00	\$ -
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1.200,00	1.000,00		200,00	\$ 10.885,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	800,00	800,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00		100,00	\$ 98.439,00	\$ -
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00		400,00	\$ 23.577,00	\$ -
RETIRO DE Saldos en sitio	M3	200,00	0,00	200,00	0,00	\$ 13.942,00	\$ 2.788.400,00
SUB TOTAL						0	\$ 10.143.800,76
CERRAMIENTOS PERIMETRALES						\$ -	\$ -



GHS INGENIERIA SAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA						\$ -	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	\$ 55.766,00	\$ 66.919.200,00
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	84,00	12,00	304,00	\$ 41.825,00	\$ 501.900,00
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3- 16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	678,00	0,00	678,00	0,00	\$ 15.933,00	\$ 10.802.574,00
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	0,00	600,00	0,00	\$ 3.186,00	\$ 1.911.600,00
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00		200,00	\$ 29.875,00	\$ -
TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00		100,00	\$ 11.950,00	\$ -
SUB TOTAL						0	\$ 80.135.274,00
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO						0	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	120,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	120,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
SUB TOTAL						0	\$ -
ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS						0	
PINTURA GENERAL						\$ -	\$ -
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	598,37	598,37		0,00	\$ 10.885,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	598,37	598,37		0,00	\$ 21.383,00	\$ -



GHS INGENIERIA SAS

KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	199,46	199,46		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	176,80	100,00	76,80	0,00	\$ 31.963,00	\$ 2.454.758,40
SUB TOTAL						0	\$ 2.454.758,40
TORRE DE CONTROL						0	
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	60,00		0,00	\$ 17.975,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	180,00	180,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	0,00		67,50	\$ 59.633,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	192,00	192,00		0,00	\$ 23.596,00	\$ -
ESMALTE BARANDA TUBO 2- 3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00		0,00	\$ 12.624,00	\$ -
SUB TOTAL						0	\$ -
CUARTEL SEI						0	
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	400,00		0,00	\$ 16.606,00	\$ -
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00		0,00	\$ 144.344,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	400,00		0,00	\$ 30.383,00	\$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	60,00		0,00	\$ 17.500,00	\$ -
SUB TOTAL						0	\$ -
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS						0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	0,00	202,76	299,50	\$ 27.564,00	\$ 5.588.876,64



GHS INGENIERIA SAS

BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	337,50	0,00	337,50	0,00	\$ 140.774,00	\$ 47.510.868,26
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	0,00	200,90	0,00	\$ 766.839,00	\$ 154.061.771,86
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ 4.649.116,97
SUB TOTAL							\$ 211.810.633,73
						SUBTOTAL OBRAS	\$ 304.544.467,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$ 1.808.232,77
VALOR TOTAL							\$ 306.352.699,77



GHS INGENIERIA SAS

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL:

Se iniciaron actividades de excavación, conformación, rellenos y fundida en concreto con acabado a la vista de andenes y separadores parqueadero.





GHS INGENIERIA SAS



Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96

Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96


Tel 312 3 79 31 96

1. *Phragmites* (Common Reed)

E. coli O157:H7 was isolated from ground beef samples collected from retail outlets in the United States during the outbreak period.




GHS INGENIERIA SAS

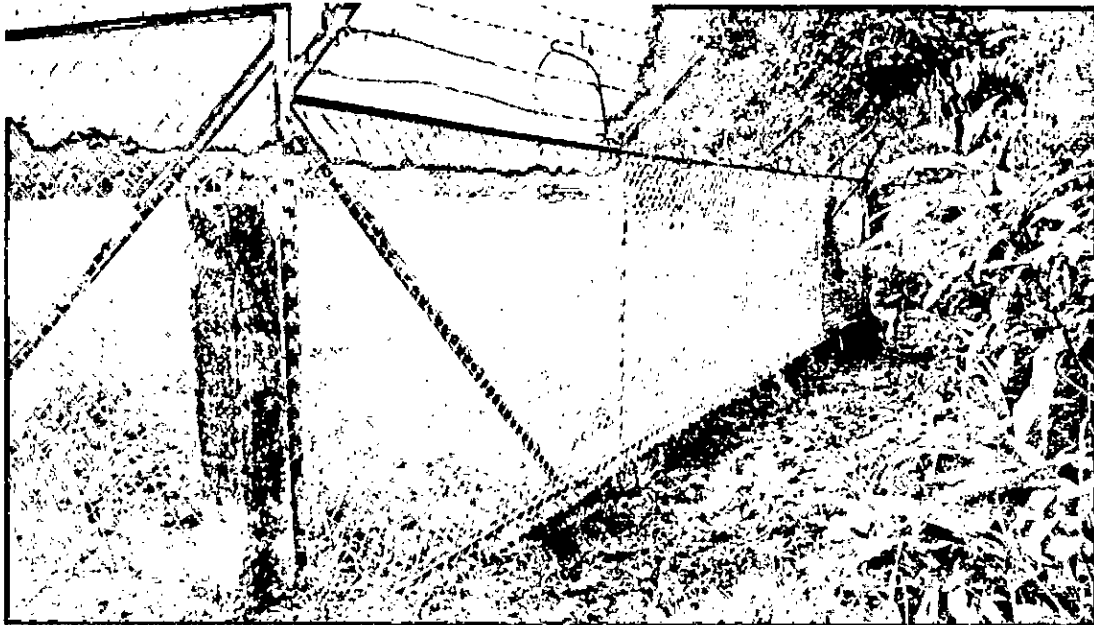



ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS:

Repinte con pintura en esmalte color gris de láminas microperforadas fachada.

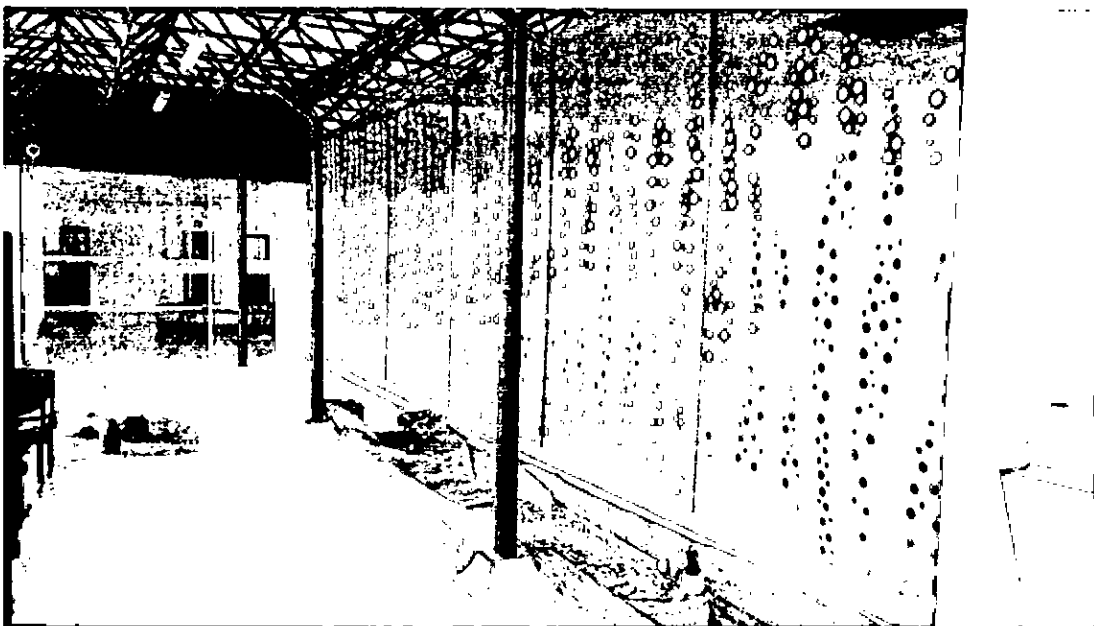





GHS INGENIERIA SAS

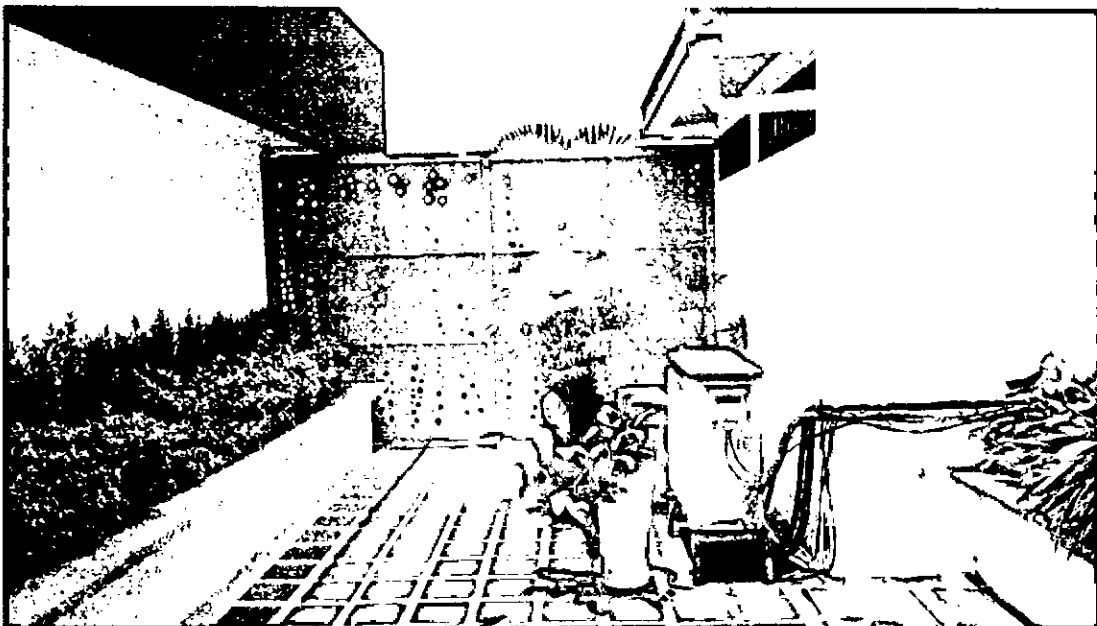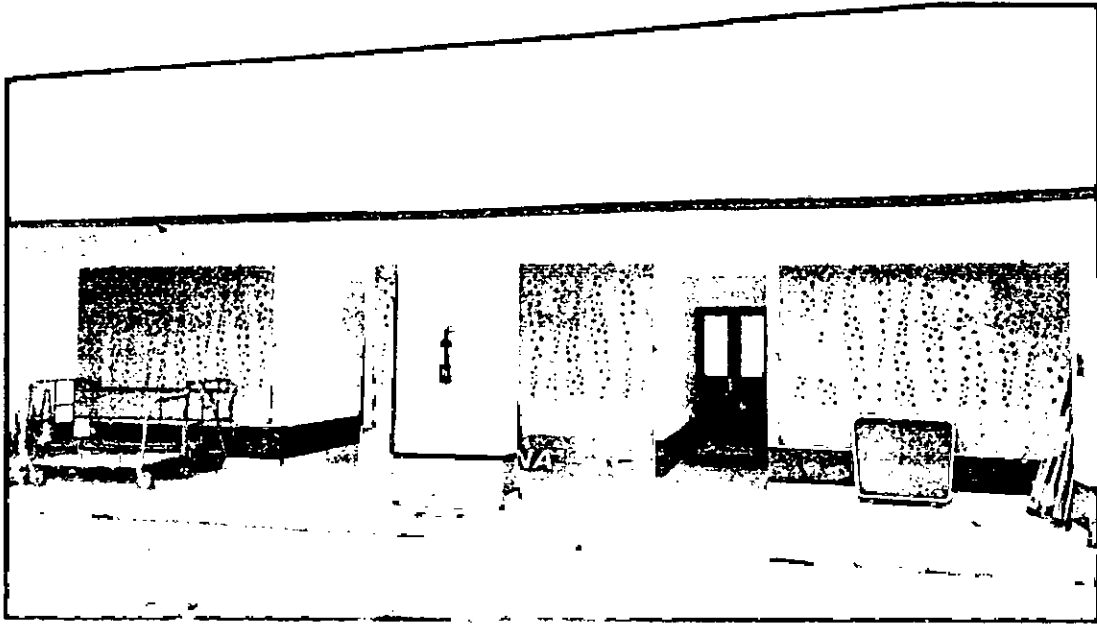

Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

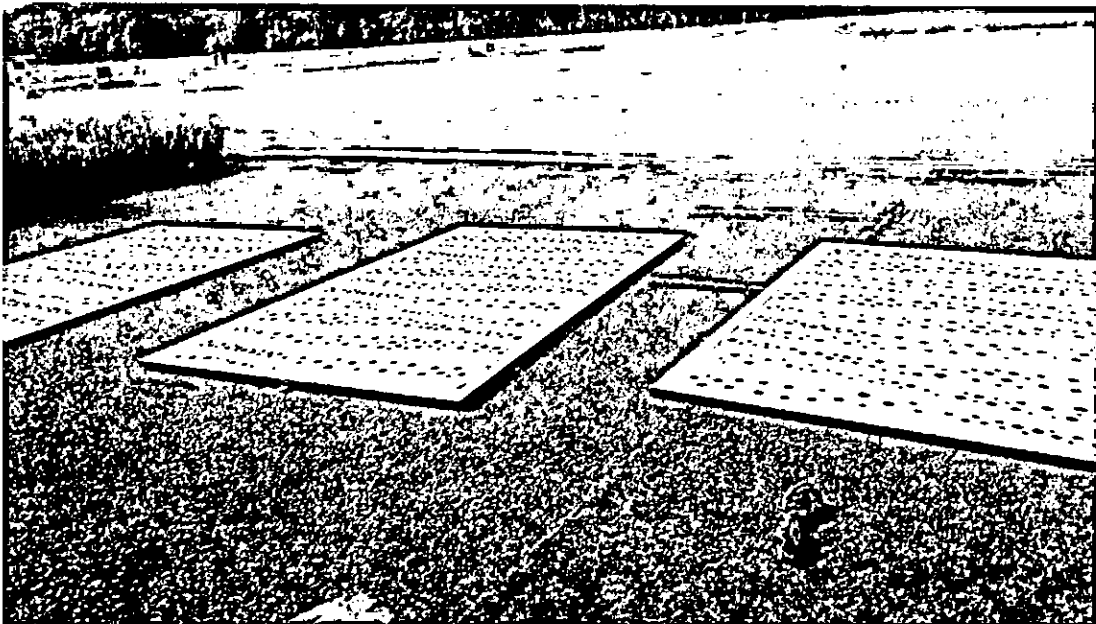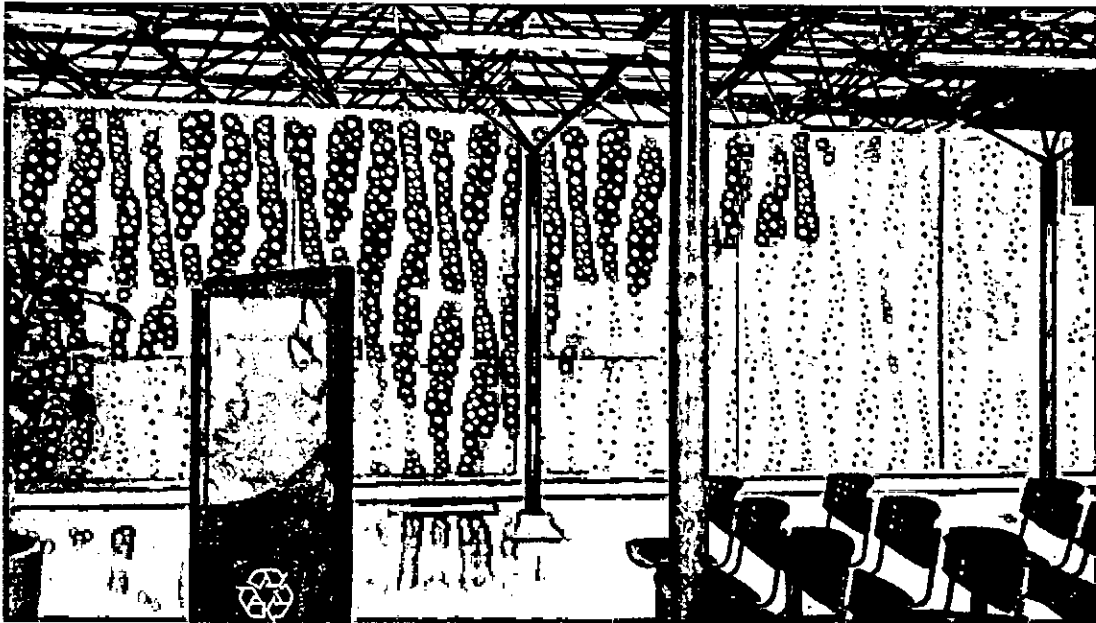

Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS:

Demolición de asfalto y excavación subbase



proceso de cargue escombros en volquetas




Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

Conformación y Compactación de subbase en recebo previo a fundir concreto

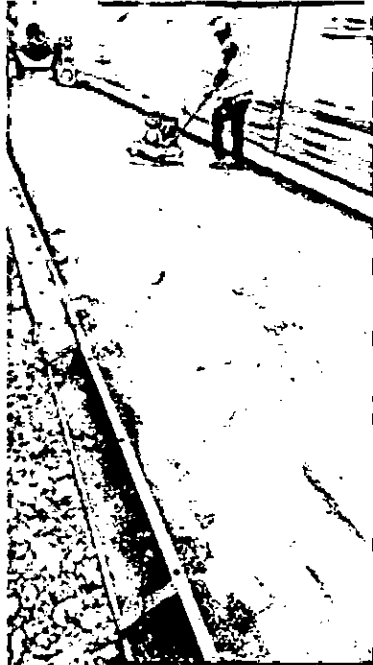

Toma de densidades base en recebo






Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

Mezcla y fundida de concreto MR 45

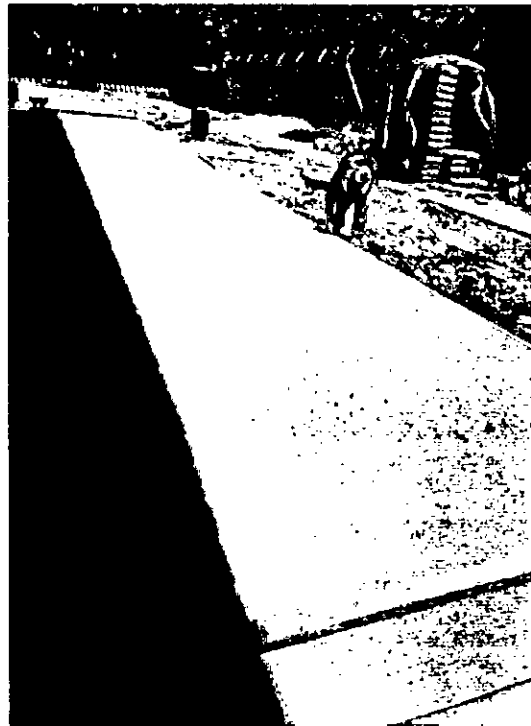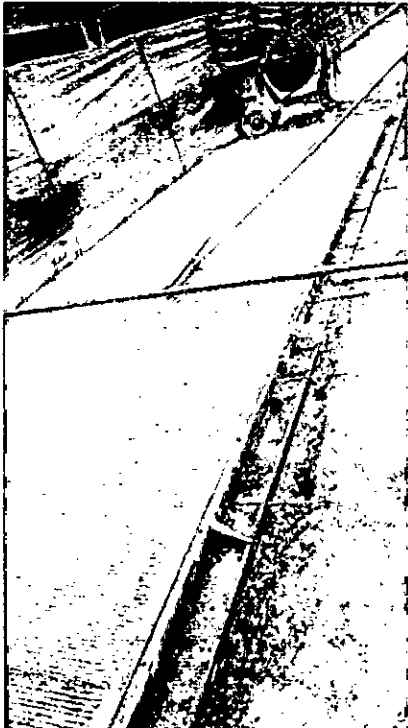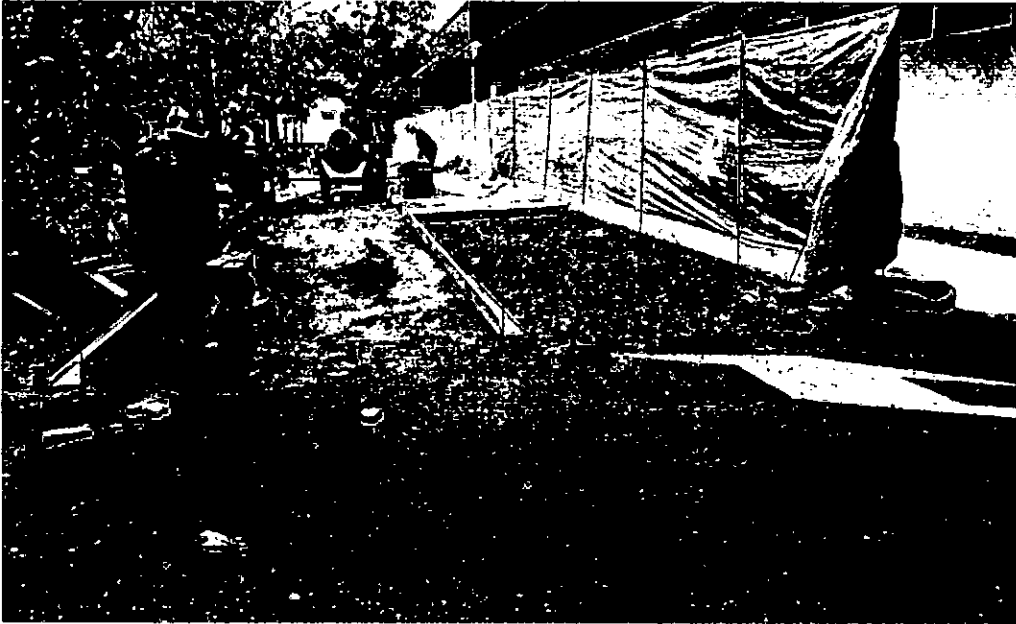



GHS INGENIERIA SAS

Pasa juntas en acero liso de $\frac{3}{4}$



Toma de muestras viga MR 45 para ser fallada en laboratorio





GHS INGENIERIA SAS

Acabado final de placas de concreto flotado y cepillado



Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS

Corte de placas en concreto para dilataciones.






GHS INGENIERIA SAS

7. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

- ✓ Durante el periodo se utiliza los elementos de protección personal tapabocas, guantes, asimismo dentro de las actividades el personal tiene curso de alturas, utilizan las medidas de seguridad según actividades que desarrollen y se les realizan las capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional.

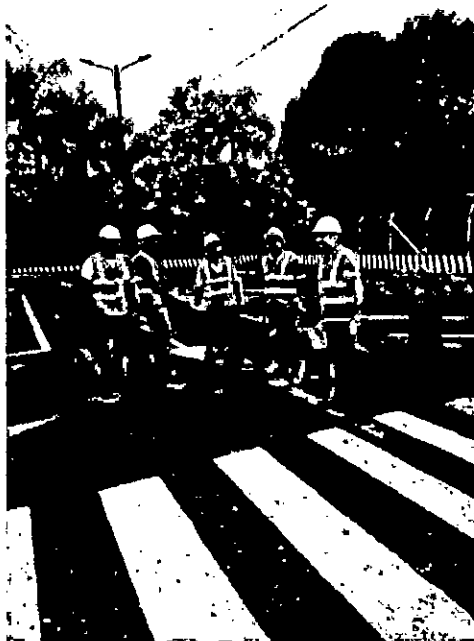



GHS INGENIERÍA SAS

8. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Durante el periodo se mantuvo en orden y aseo las zonas de trabajo, se acopio el material en sitios específicos, no se emitieron productos químicos que contaminen cuerpos de agua ni vegetación aledaña.
- ✓ Durante el periodo no se generaron RCD.
- ✓ Se dispuso de punto ecológico

REGISTRO FOTOGRAFICO

Punto ecológico





GHS INGENIERIA SAS

9. ANEXOS

1. FACTURA DE VENTA GHS42
2. ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 2
3. ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2
4. CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANILLAS SS
5. RUT GHS INGENIERIA SAS
6. SOPORTE TOMA DE DENSIDADES
7. DISEÑO MEZCLA MR-45
8. PROCTOR MODIFICADO BASE GRANULAR
