


ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Holgura total	Successors	Predecessors	Costo Directo	September 2025												October 2025												
1	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SAN ANTONIO CORREGIMIENTO O SAN ANTONIO Y MARCO FIDEL SUAREZ SEDE BLASS DE LESSO CORREGIMIENTO POTRERITO	42 days	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	0 days			177.902.403																									
2	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ SEDE SAN ANTONIO CORREGIMIENTO SAN ANTONIO	42 days	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	0 days			102.673.130																									
3	PRELIMINARES	42 days	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	Tue 9/09/25	Mon 20/10/25	0 days			4.262.544																									
4	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	4 days	Wed 10/09/25	Sat 13/09/25	Wed 10/09/25	Sat 13/09/25	0 days	12	5	3.670.800																									
5	RETIRO LAMPARA	1 day	Tue 9/09/25	Tue 9/09/25	Tue 9/09/25	Tue 9/09/25	0 days	4,36		272.081																									
6	RETIRO SOBRLANTES MANUAL-VOLQUETA <=10	1 day	Mon 20/10/25	Mon 20/10/25	Mon 20/10/25	Mon 20/10/25	0 days		32,37	319.663																									
7	ACABADOS DE MUROS	6 days	Wed 24/09/25	Mon 29/09/25	Wed 24/09/25	Mon 29/09/25	0 days			10.482.055																									
8	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	3 days	Wed 24/09/25	Fri 26/09/25	Wed 24/09/25	Fri 26/09/25	0 days	9SS	31	3.334.095																									
9	RASQUETEADA Y LLUADA MUROS	3 days	Wed 24/09/25	Fri 26/09/25	Wed 24/09/25	Fri 26/09/25	0 days	10SS	8SS	1.053.638																									
10	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	6 days	Wed 24/09/25	Mon 29/09/25	Wed 24/09/25	Mon 29/09/25	0 days	14SS+2 days	9SS	6.094.322																									
11	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	17 days	Sun 14/09/25	Tue 30/09/25	Sun 14/09/25	Tue 30/09/25	0 days			63.052.649																									
12	TEJIA UPVC 2.5 MM CRESTA ALTA	8 days	Sun 14/09/25	Sun 21/09/25	Sun 14/09/25	Sun 21/09/25	0 days	13FF	4	33.616.800																									
13	CABALLETE FC PLUS	1 day	Sun 21/09/25	Sun 21/09/25	Sun 21/09/25	Sun 21/09/25	0 days	28	12FF	1.807.800																									
14	C.FALSO LAMINA PVC A+25CM E=10MM	5 days	Tue 30/09/25	Tue 30/09/25	Fri 26/09/25	Tue 30/09/25	0 days	22FF	10SS+2 days	27.628.049																									
15	ADECUACION CERRAJERIA METALICA	8 days	Fri 10/10/25	Fri 17/10/25	Fri 10/10/25	Fri 17/10/25	0 days			3.790.922																									
16	MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO SILUCC	2 days	Fri 10/10/25	Fri 10/10/25	Fri 10/10/25	Sat 11/10/25	0 days	17	25	801.620																									
17	NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT.	3 days	Sun 12/10/25	Tue 14/10/25	Sun 12/10/25	Tue 14/10/25	0 days	18	16	1.849.131																									
18	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	1 day	Wed 15/10/25	Wed 15/10/25	Wed 15/10/25	Wed 15/10/25	0 days	19	17	190.302																									
19	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	1 day	Thu 16/10/25	Thu 16/10/25	Thu 16/10/25	Thu 16/10/25	0 days	20	18	147.384																									
20	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	1 day	Fri 17/10/25	Fri 17/10/25	Fri 17/10/25	Fri 17/10/25	0 days	32	19	802.485																									
21	INSTALACIONES ELECTRICAS	11 days	Mon 29/09/25	Thu 9/10/25	Mon 29/09/25	Thu 9/10/25	0 days			15.189.549																									
22	SAL LAMP PVC	2 days	Mon 29/09/25	Tue 30/09/25	Mon 29/09/25	Tue 30/09/25	0 days	23	14FF	4.359.150																									
23	LAMP LED 2X18 PANTALLA ACERO INOXIDABLE	1 day	Wed 1/10/25	Wed 1/10/25	Wed 1/10/25	Wed 1/10/25	0 days	24	22	5.285.980																									
24	SALIDA S1 PVC	4 days	Thu 2/10/25	Sun 5/10/25	Thu 2/10/25	Sun 5/10/25	0 days	25	23	2.230.719																									
25	SAL TOMA 120 PVC	4 days	Mon 6/10/25	Thu 9/10/25	Mon 6/10/25	Thu 9/10/25	0 days	16	24	3.313.700																									
26	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	28 days	Mon 22/09/25	Sun 19/10/25	Mon 22/09/25	Sun 19/10/25	0 days			5.895.411																									
27	PUNTO SANITARIO PVC 2	1 day	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	0 days	29SS	28	232.734																									
28	PUNTO SANITARIO PVC 4"	1 day	Mon 22/09/25	Mon 22/09/25	Mon 22/09/25	Mon 22/09/25	0 days	27	13	413.892																									
29	PUNTO AGUA FRIA , 1/2"	1 day	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	0 days	30SS	27SS	331.026																									
30	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I]	3 days	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Thu 25/09/25	Tue 23/09/25	0 days	31SS	29SS	4.419.094																									
31	VALVULA CIERRE RAPIDO , 1/2"	1 day	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	Tue 23/09/25	0 days	8	30SS	107.628																									
32	LIMPIEZA GENERAL	2 days	Sun 19/10/25	Sat 18/10/25	Sun 19/10/25	Sun 19/10/25	0 days	6	20	391.037																									
33	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ SEDE BLASS DE LESSO CORREGIMIENTO POTRERITO	36 days	Wed 10/09/25	Wed 15/10/25	Sun 14/09/25	Sun 19/10/25	4 days			75.229.273																									
34	PRELIMINARES	36 days	Wed 10/09/25	Wed 15/10/25	Sun 14/09/25	Sun 19/10/25	4 days			1.957.013																									
35	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	2 days	Fri 12/09/25	Sat 13/09/25	Tue 16/09/25	Wed 17/09/25	4 days	50SS	36	911.801																									
36	RETIRO LAMPARA	2 days	Wed 10/09/25	Thu 11/09/25	Sun 14/09/25	Mon 15/09/25	4 days	35	5	725.549																									
37	RETIRO SOBRLANTES MANUAL-VOLQUETA <=10	1 day	Wed 15/10/25	Wed 15/10/25	Sun 19/10/25	Sun 19/10/25	4 days	6	55	319.663																									
38	CUBIERTA Y ESTRUCTURA	15 days	Fri 26/09/25	Fri 10/10/25	Tue 30/09/25	Tue 14/10/25	4 days			50.256.578																									
39	TEJIA UPVC 2.5 MM CRESTA ALTA	6 days	Fri 26/09/25	Wed 1/10/25	Tue 30/09/25	Sun 5/10/25	4 days	40FF	54SS	8.404.200																									
40	CABALLETE FC PLUS	2 days	Tue 30/09/25	Wed 1/10/25	Sat 4/10/25	Sun 5/10/25	4 days	42SS	39FF	3.434.820																									
41	C.FALSO LAMINA PVC A+25CM E=10MM	6 days	Sun 5/10/25	Fri 10/10/25	Thu 9/10/25	Tue 14/10/25	4 days	45FF	43SS	32.303.564																									
42	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	5 days	Tue 30/09/25	Sat 4/10/25	Sat 4/10/25	Wed 8/10/25	4 days	43	40SS	5.039.995																									
43	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTE	2 days	Sun 5/10/25	Mon 6/10/25	Thu 9/10/25	Fri 10/10/25	4 days	41SS	42	1.073.999																									
44	INSTALACIONES ELECTRICAS	6 days	Thu 9/10/25	Tue 14/10/25	Mon 13/10/25	Sat 18/10/25	4 days			12.077.476																									
45	SAL LAMP PVC	2 days	Fri 10/10/25	Mon 13/10/25	Tue 14/10/25	Tue 14/10/25	4 days	46	41FF	1.188.859																									
46	LAMP LED 2X18 PANTALLA ACERO INOXIDABLE	3 days	Sat 11/10/25	Mon 13/10/25	Wed 15/10/25	Fri 17/10/25	4 days	47SS	45	7.208.154																									
47	SALIDA S1 PVC	4 days	Sat 11/10/25	Tue 14/10/25	Wed 15/10/25	Sat 18/10/25	4 days	48SS	46SS	2.230.719																									
48	SAL TOMA 120 PVC	2 days	Sat 11/10/25	Sun 12/10/25	Wed 15/10/25	Thu 16/10/25	4 days	55	47SS	1.449.744																									
49	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	33 days	Fri 12/09/25	Tue 14/10/25	Tue 16/09/25	Sat 18/10/25	4 days			10.938.206																									
50	EXCAVACION TIERRA A MANO	5 days	Fri 12/09/25	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25	Sat 20/09/25	4 days	52	35SS	1.150.946																									
51	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	4 days	Sat 20/09/25	Tue 23/09/25	Wed 24/09/25	Sat 27/09/25	4 days	53	52	7.042.537																									
52	RELLENO ARENA FINA + TRANSPORTE	3 days	Wed 17/09/25	Fri 19/09/25	Sun 21/09/25	Tue 23/09/25	4 days	51	50	1.216.166																									
53	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	2 days	Wed 24/09/25	Thu 25/09/25	Sun 28/09/25	Mon 29/09/25	4 days	54	51	964.388																									
54	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	2 days	Fri 26/09/25	Sat 27/09/25	Tue 30/09/25	Wed 1/10/25	4 days	39SS	53	282.064																									
55	LIMPIEZA GENERAL	2 days	Mon 13/10/25	Tue 14/10/25	Fri 17/10/25	Sat 18/10/25	4 days	37	48	282.105																									

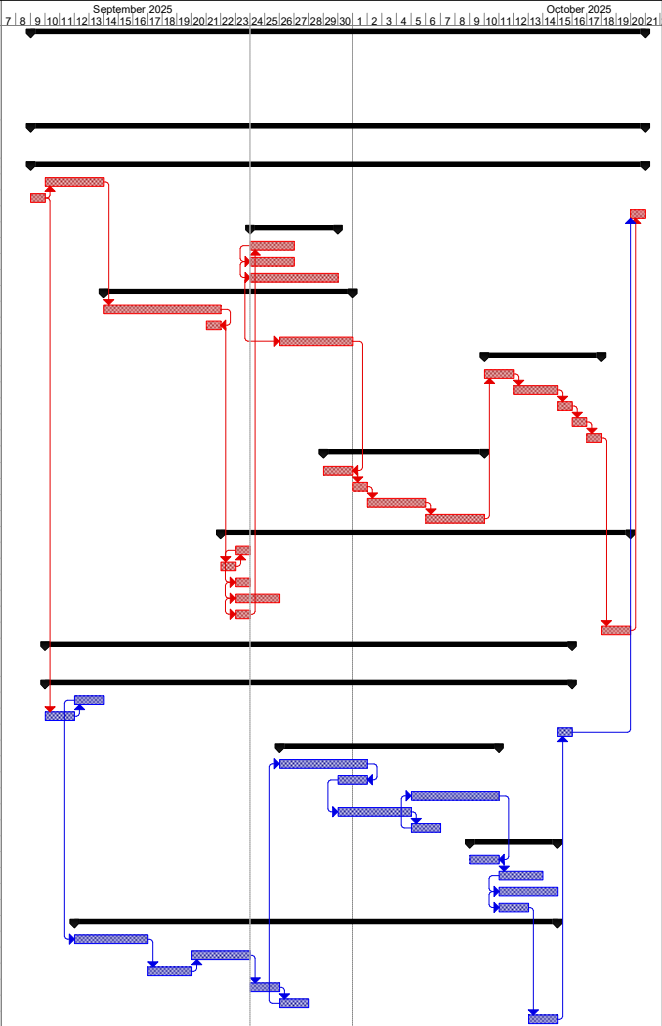

CONTRATO No. 300-CO-3980-2023

TAREA NO CRITICA  
TAREA CRITICA

Tarea inactiva  
 Tarea inactiva  
 Tarea manual  
 Hitos inactivos  
 Resumen inactivo  
 Tarea manual

Sólo duración  
 Informe de resumen manual  
 Sólo el comienzo  
 Sólo fin  
 Resumen manual
