

COP 740/2024.

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MUNICIPIO AGROPECUARIO, EL DISEÑO, ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LOS PLANOS DE PROYECTO DE LA LUGAR DE VISITA EN BOCAATÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VSTACEN 005/2024.

INTERVENIENTES: D.M. CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTES S.A.S.

DIRECCIÓN DE OBRAS: ANA MARÍA VÁSQUEZ

DIRECCIÓN DE INTERVENIENTES: ING. MARICELA GÓMEZ

DISEÑO DE OBRAS: JAVIER CUELLAR CORRALES 

USUARIO DE INTERVENIENTES: ING. ESPERANZA OLIVERA


CAPETI

Jueves 12 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instala cercamiento de obra (Barrido en perimetro de obra)

- Se inicia el desmonte de juegos infantiles

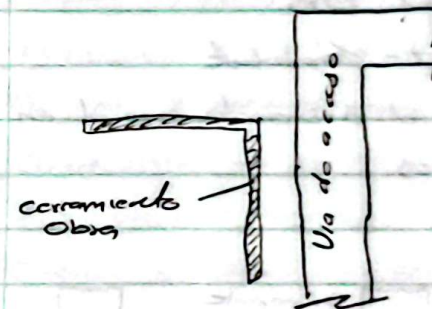

 
Maricela - Jm

Viernes 13 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia el desmonte de juegos existentes "Juegos en madera"

- Se recibe camion container "campesamento de obra"


En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 pm

Hora fin 2:30 pm

Hora inicio 4:00 pm


Hora fin 5:00 pm

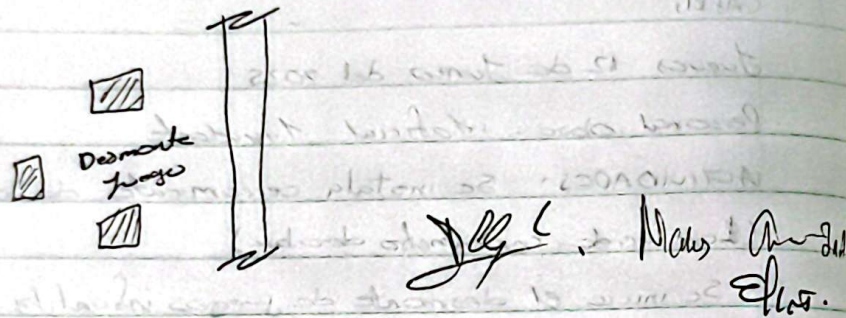

Sábado 14 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia el desmonte manual en zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:30 Am

JLC. Nivel An - 2nd Elev.

Lunes 16 de Junio 2025

Personal: 1 OF, 2 AY.

Clima: lluvia en la tarde.

ACTIVIDADES: - DESMONTA zona juegos.

- CONFIRMACIÓN DE TERCERO.

JLC. Nivel An - 2nd Elev.

Martes 17/06/2025.


PERSONAL: 1 OF + 2 AY + 1 OPERARIO.

TIEMPO: 1 MANIESTA.

Clima: lluvia en la tarde.

ACTIVIDADES: - EXCAVACIÓN mecánica zona juegos

- Inicio de ACTIVIDAD EN PLANTA DE FORMACIÓN

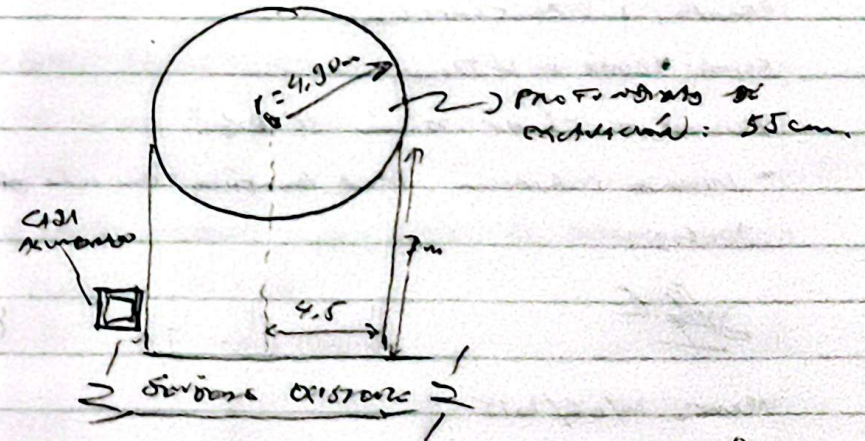

JLC. Nivel An - 2nd Elev.

MIÉRCOLES 18/06/2025

PERSONAL: 1 OF + 2 AY + 2 OPERARIOS.

TRABAJO: 1 MAQUINARIA + 1 VIBROCOMPACTADOR.

CLIMA: LUBIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - TERMINACIÓN EXCAVACIÓN MECÁNICA.

- MARCA DE REJEROS CON COMPACTADOR.

- TERMINACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE LOS DE LA TARDE. SE RETIRA MUY CARGADA.

JLC Nicolás Ch. Int El Int.

JUEVES 19/06/2025

PERSONAL: 1 OF + 2 AY + 1 OPERARIO.

TRABAJO: 1 VIBROCOMPACTADOR.

CLIMA: LUBIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - COMPACTACIÓN DE BQ.

- INICIO DE RECONSTRUCCIÓN PARA BORDILLO EN ZONA DE JUECOS.


JLC Nicolás Ch. Int El Int.

VIERNES 20/06/2025.

PERSONAL: 1 OF + 2 AY

ACTIVIDADES: - TRABAJO DE BORDILLOS EN TERRAZA.

Norma

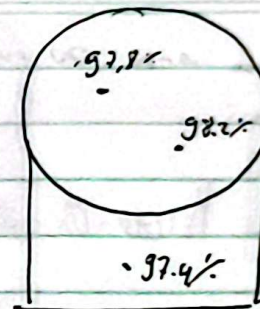

- INICIO DE INSTALACIÓN DE BORDILLO EN ZONA DE JUECOS INFANTILES.

- INICIO DE INSTALACIÓN DE BORDILLO EN PLAZA DE PROMENADAS EN LA ZONA.


JLC Nicolás Ch. Int El Int.

VIERNES 24/06/2025.

CLIMA: LUBIA TODA LA MAÑANA.

PERSONAL: 1 OF + 2 AY.

ACTIVIDADES: - INSTALACIÓN DE FOLIOS DE BORDILLO M-83 EN ZONA DE JUECOS.



BORDILLO M-83. El Int.

Norma

- Instrucción de Boquete A-P en materia de
Requerimientos en Asesoría.

[Signature]

Nicola Ch - 2da E. Int.



Miércoles 25 de Junio del 2015

Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se instala arena amarilla para aboguin
en plataforma de acceso a juegos infantiles

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 3:00 pm Hora fin 5:00 pm



[Signature]


Nicola Ch - 2da E. Int.

Jueves 26 de Junio del 2015

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de aboguin
en plataforma de acceso a zona de juegos infantiles

Norma



[Signature]


Nicola Ch - 2da E. Int.

Viernes 27 de Junio del 2015



Personal obra: 2 oficiales - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando aboguin en
plataforma de acceso a zona de juegos infantiles

- Se funde lote en concreto en zona de juegos
infantiles, se realizan muestras de concreto para
enviar a laboratorio.



Instalacion aboguin concreto



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 8:30 AM

Hora fin 11:30 AM

Hora inicio 3:00 PM

Hora fin 4:30 PM

[Signature]



E. Int.

Norma

Sábado 28 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se funden cunetas en concreto para confinamiento de pozos de adoguín en plaza de acceso a zona de juegos infantiles



[Signature]

[Signature]

Nicolas Chavez - Int

Monday 1 de Julio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inician los remates en pozos de adoguín (recinto perimetral) en zona de acceso a juegos infantiles

[Signature]

Nicolas Chavez - Int

[Signature]

Miércoles 2 de Julio

Personal obra: 2 modeladores, juegos infantiles

ACTIVIDADES: Se modela juego infantil.



[Signature]


[Signature]

Nicolas Chavez - Int

Thursday 3 de Julio del 2025

Personal obra: 2 ornamentalistas

ACTIVIDADES: Se instalan parrillas metálicas en baranda perimetral de zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se presentan 16 horas de trabajo

Hora inicio 10:00 AM

Hora fin: 11:40 AM

Hora inicio 2:40 PM

Hora fin: 4:00 PM

[Signature]

[Signature]

Nicolas Chavez - Int


Norma

Norma

Viernes 4 de Julio del 2025

Personal obra: 2 ornamentadores

ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de paneles de metalicos en baranda perimetral de juegos infantiles
- Se inicia la instalacion de pasamanos en baranda de juegos infantiles



En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:30 Pm

Hora fin 3:00 Pm

Hora inicio 3:40 Pm


Hora fin 5:00 Pm

 El J. Nicolas Chavez - Int

Sabado 5 de Julio del 2025

Personal obra: 2 ornamentadores - 2 pintores baranda.

ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de pasamanos en baranda de juegos infantiles
- Se pinta baranda perimetral de juegos infantiles


 El J. Nicolas Chavez - Int

Lunes 7 de Julio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se demuestran bancos existentes, para recibirlos

- Se realiza excavacion para instalacion de bancos



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 8:00 Am

Hora fin 11:30 Am

Hora inicio 3:00 Pm

Hora fin 4:30 Pm

 El J. Nicolas Chavez - Int

Martes 8 de Julio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instalan bancos en plaza de acceso a juegos infantiles y en sendero del castaño orient

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes



Hora inicio 10:30 Am

Hora fin 11:40 Am

Norma

Hora inicio 2:00pm

Hora fin 4:00pm



JLC



Nicolas Gant - Int

EJINT

Miércoles 9 de Julio del 2025

Personal obra: 2 instaladores granocacho

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de granocacho "fondo negro" en zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se pueben hacer fiestas

Hora inicio 7:00 AM

Hora fin 9:00 AM

JLC

EJINT

Nicolas Gant - Int

Jueves 10 de Julio del 2025

Personal obra: 1 obrero - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se hace excavacion para filtro vertical

Norma

de trabajo de zona de juegos infantiles

- se hacen remates en cantes de confinamiento en puros de adobes

JLC

EJINT

Nicolas Gant - Int

Viernes 11 de Julio del 2025

Personal obra: 2 instaladores granocacho

ACTIVIDADES: Se continua instalando granocacho en zona de juegos infantiles (granocacho de colores)

JLC

EJINT

Sábado 12 de Julio del 2025

Personal obra: 2 instaladores granocacho

ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de granocachos en zona de juegos infantiles (granocacho colores)

JLC

EJINT

Lunes 14 de Julio del 2025

Personal obra: 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Orden y limpieza

JLC

EJINT

Norma

CIENNE
BITACORA.

[Handwritten signature]
LIT
