

COP 740-2024.

OBJETO: "EL DIAGNÓSTICO, MONITORING, INTERVENCIÓN,
Y/O DATOS DE LOS TRÁMITS DE PRONUNCIADO DE
LA LECIÓN DE USUARIOS EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA: CONSARCO USACEN 005-2024

INTERVENCIÓN: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIÓNES S.A.S.


PARA: DESARROLLO ESTADOS DE MONIT - C/O 01-199

DIRECTOR DE OBRAS: ANDRÉS MORALES

RESPONSABLE DE OBRAS: ING. JUAN CARLOS CARRERA

AUSENTE DE INTERVENCIÓN: ING. MARGARITA GÓMEZ

RESPONSABLE DE INTERVENCIÓN: ING. ESPERANZA CARRERA



Norma

MAÑOS 11 DE MARZO DE 2025.

PERSONAL: 1 maestro + 3 ay + 1 topógrafo + 1 electricista.

Clima: Estación Total.

ACTIVIDADES: - SE REALIZA REVISIÓN CON EQUIPO

DEL ÁREA A INTERVENIR.

- SE REALIZA CONTINUA Y BASTO PODRÍA A LA OBRA.

- SE INICIA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE
VARIAS BOLLERAS PARA CERRAMIENTO.

- SE INICIA DEMOLICIÓN PARCIAL DE FUNDAMENTOS EN
CONCRETO EXISTENTES, CLIMA: LLUVA EN LA TARDE.

VIERNES 12 DE MARZO DE 2025.

PERSONAL: 1 maestro + 3 ayudantes.

Clima: Nublado en la mañana; Lluva a
partir de las 12:30 PM.

ACTIVIDADES: - SE CONTINÚA CON LA DEMOLICIÓN
DE FUNDAMENTOS EN CONCRETO.

- SE INSTALA P.M.T.

- SE TERMINA CERRAMIENTO DE OBRA.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2025.

PERSONAL: 2 AY.

ACTIVIDADES: - DEMOLICIÓN MANUAL DE SUPERFICIE EN
CONCRETO CON ESPESOR PROMEDIO DE 13 cm.

CLIMA: LLEUVA EN LA TARDE (1 PM - 4 PM).

VIERNES 14 DE MARZO DE 2025.

PERSONAL: 1 maestro + 3 ay.


Clima: mañana soleada; Lluva a partir de las 10.

ACTIVIDADES: - CARGA Y LLEVA DE MATERIAL
DE DEMOLICIÓN SE LLEVAN A SAN PATRICK
PARA SE UTILIZADO COMO MATERIAL PARA MEJORAR
EL TERRENO.

- EN COMITÉ DE OBRA SE OBSERVA QUE
LA PENDIENTE DEL TERRENO EN EL SENTIDO
QUE CONECTA LA BARRA (VIA CORRAL) CON
LOS JUECOS INFANTILES EN MUY BUENA, LO
QUE OBLIGA A HACER UNOS EJERCICIOS.
CONTRATISTA, INTERVENCIÓN Y APOYO A LA
SUPERVISIÓN ACORDAN MODIFICAR EL DISEÑO
Y MOVILIZAR UNOS METROS AL SUR LA UTILIDAD

Norma

AL ANDÉN SOBRE LA CAL 19B; ESTO
CON EL FIN DE SANEAR LA PAVIMENTACIÓN.

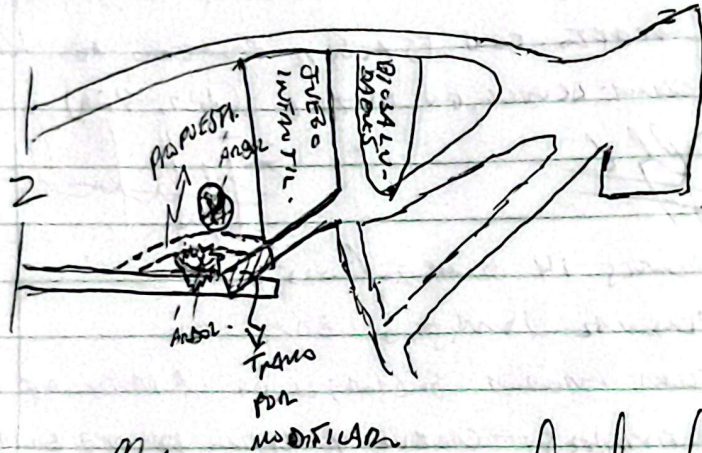

[Signature]

[Signature]

SABADO 15 DE MARZO/2025

PERSONAL: 1 AY.

ACTIVIDADES - ALOPO DE MATERIAL PARA CARGAR POSTERIOR.

[Signature]

[Signature]

LUNES 17 DE MARZO/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 3 AY.

CLIMA: NUBES EN LA MAÑANA; LLUVIA EN LA TARDE.


Norma

ACTIVIDADES: - DESARTE MANUAL SOBRE AREA DEL JARDIN LARGO (OCCIDENTAL).

- DESARTE DE JUEGO INFANTIL EN AREA

- DEMOLICION DE PIZONAS EXISTENTES EN CONCRETO.

- CARGUE DE VOLANTEA CON DESTINO A PARQUE SAN PATRICK.



LOS ESPERONES SE EMPIEZAN A SEMBRAR EN LAS AREAS DEMARCADAS SOBRE LAS QUE NO HABRA JARDIN EN AGUJON O PASEO DE JUEGOS O BARRIOBARRIOS.

[Signature]

[Signature]

MIÉRCOLES 18 DE MARZO/2025


PERSONAL: 2 AYUDANTES.

CLIMA: NUBES EN LA MAÑANA; LLUVIA A PARTIR DE LAS 2PM.

ACTIVIDADES: SE ACOMIENZA INTERVENCIÓN DEL ANDÉN SOBRE LA CAL 19B, POR LO QUE

Norma

SE PDM NUESTRA DEMOLICIÓN,
- SE CONTINUA CON REMEDIACIÓN DE CERRADÓN.



MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 4 AY.

CLIMA: NUBATA SUCADA; LLUVIA A PARTIR DE LAS 3PM.

ACTIVIDADES: DEMOLICIÓN SENDERO SOBRE CDA 190. LA MAÑANA TRABAJAMOS ENTRE 15 Y 20 CMS.

- SE CONTINUA CON REMEDIACIÓN DE CERRADÓN.
- SE CARBA Y ENVÍA CERRADÓN PARA PARQUE COBAYAS (20 m²).

JUEVES 20 DE MARZO DE 2025


PERSONAL: 1 AY.

CLIMA: NUBATA CON LLUVIZNOS.

ACTIVIDADES: SE APOYÓ MATERIAL DE DEMOLICIÓN PARA FACILITAR EL TRABAJO.

Norma

- LLEGA MATERIA DE BARRIO A-80 DEL PROYECTO NOVO (MEDIOS/MAESTROS).


 

VIERNES 21/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO + 1 AY.

CLIMA: SOLAR.

ACTIVIDADES: REPARACIÓN MATERIAL CERRADÓN NUEVO.



 

SÁBADO 22/03/2025.

PERSONAL: 1 AY.

CLIMA: SOLAR.

ACTIVIDADES: LLEGA MATERIA DE BARRIO A-80 A LA OBRA.

DOMINGO 23/03/2025.

PERSONAL: 1 AY.

Norma

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE

ACTIVIDADES: DESCARTE MANUAL

[Signature]

Nilda A. - Interventoría
[Signature]

JUEVES 28/03/2025

PERSONAL: IAY

CLIMA: LLUVIA

ACTIVIDADES: RELEVAMIENTO DE NIVELES

[Signature]

Nilda A. - Interventoría
[Signature]

VIERNES 29/03/2025

PERSONAL: IAY

CLIMA: LLUVIA

ACTIVIDADES: LA LLUVIA NO PERMITIÓ AVANCES EN
DESCARTE

[Signature]

Nilda A. - Interventoría
[Signature]

LUNES 31/03/2025

PERSONAL: IAY

CLIMA: LLUVIA

Norma

ACTIVIDADES: DESCARTE MANUAL, SECCION JUEVES

INFANTILES

[Signature]

Nilda A. - Interventoría
[Signature]

MIÉRCOLES 01/04/2025

PERSONAL: IAY, IAY, IAY

EQUIPO: 1 EXCAVADOR

CLIMA: NUBLOSO

ACTIVIDADES: SECELA EXCAVADORA A LAS 10 AM

- SE REANCIAN NUBLES EN SIEMPRE OCCASIONAL

MAÑANA INICIO A LAS OCAASIONALES

Esta interventoría hace acompañamiento al Cartógrafo
en la toma de niveles del sendero occidental, dando
inicio a las excavaciones en este.


Nilda A. - Interventoría
[Signature]

[Signature]


Norma

1-09-2025


TIERRAS. SE REALIZA REPLANTEO DE LA ZONA DE
DIBO-PLAZOLETA Y JUEGOS, POR LA UBICACION
DEL POSTE. CON EL FIN DE DEJAR ALINEADOS
EL POSTE CON EL BORDILLO DE LA ZONA DE
BIOALUMBRABLES, HACIA EL COSTADO SUR. 11,50mts.
RESPECTANDO LAS AREAS DE LA PLAZOLETA
CENTRAL - Y ZONA DE JUEGOS,
CON EL DESPLAZAMIENTO SE ALINEA EL
SENDERO QUE SALE DE LA PLAZOLETA
HACIA EL ORIENTE.

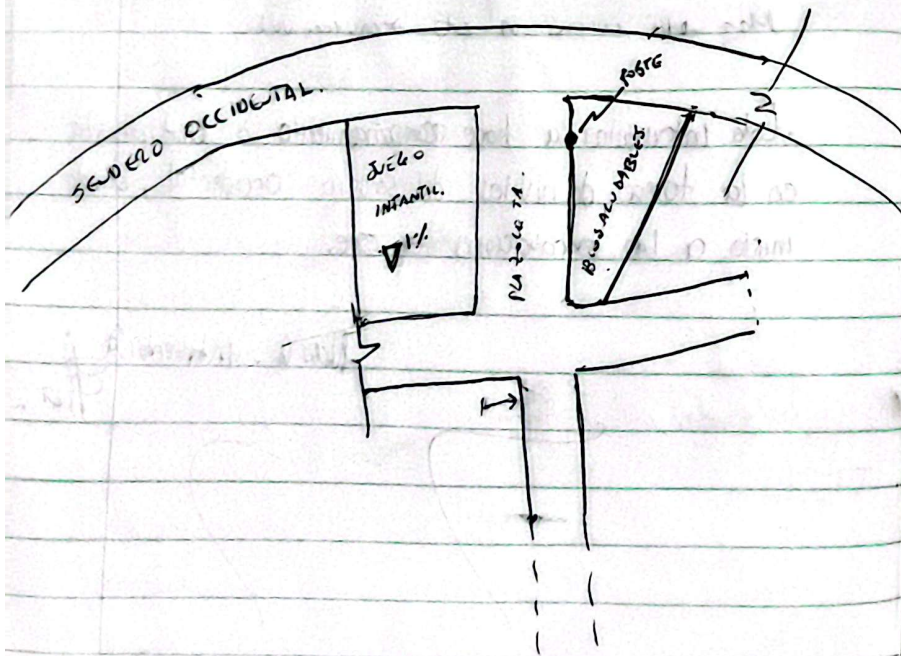

SENDERO OCCIDENTAL SE REALIZA MEJORA
MIENTRO CON LA DEMOLICION DE LOS ANDEDES,
YA QUE LA ESTRUCTURA EXCAVADA PARA
EL SENDERO CONTINUA CON TIERRA (M.O)
VERIFICADO CON UN APIQUE.



EN UNA LONGITUD DE 23,40 mts. en promedio
h: 0,90 mts. - P=3%.



PERSONAS EN OBRA: 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 1 OPERARIO.


EQUIPO: 1 EXCAVADORA.

CLIMA: LLOVIZNA DESDE LA 1:30 PM.

ACTIVIDADES: SE AVANZA CON EXCAVACION MECANICA EN
SENDERO OCCIDENTAL, PLAZOLETA DE JUEGOS Y BIOALUMBRABLES.

PARA EXCAVAR LA ZONA DE BIOALUMBRABLES SE MANTEN
EL MONTICULO EXISTENTE CON MAQUINA. LAS DIMENSIONES

DE ESTO SON: $L=12,90$; $A=3$; $H=0,80$



[Handwritten signature]
INT.

[Handwritten signature]

MIÉRCOLES 2/04/2025.

PERSONAL: INGENIERO, 2 AY, 1 OPERARIO / EQUIPO: 1 EXCAVADOR
Clima: LUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: DESARROLLO MANUAL EN SERVICIOS PROYECTOS
ENTRE PUZOS Y SERVICIOS DE SALIDA O RENTAR.

- AVANCE EN OBRERA MECÁNICA BONA PUZOS Y
SERVICIOS.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* Nelsa Due - Interv.

JUEVES 3/04/2025

PERSONAL: INGENIERO, 2 AY, 1 OPERARIO.

Clima: LUVIA EN LA TARDE.

EQUIPO: 1 EXCAVADOR.

ACTIVIDADES: - TERMINACIÓN DE OBRERA EN PUZOS Y SERVICIOS.

- COMPROBACIÓN Y PERFILADO EN FONDO DE EXCAVACIÓN.

Norma

- EXTENSIÓN DE GEOTEXTIL.

- LLEVAR VARIAS DE SBT PARA ACORRER SOBRE EL
GEOTEXTIL INSTALADO.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* Nelsa Due - Interv.

VIERNES 4/04/2025.

PERSONAL: INGENIERO, 2 AY, 1 OPERARIO.

Clima: LUVIA EN LA TARDE.

PERSONAL: EQUIPO: 1 EXCAVADOR.

ACTIVIDADES: - EXCAVACIÓN SUBCERRA EN LA OBRERA EN
PUZOS Y SERVICIOS O RENTAR.

- LLEVAR MÁS VARIAS SOBRE DE SBT.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* Nelsa Due - Interv.

VIERNES 7/04/2025

PERSONAL: INGENIERO, 2 AY.

Clima: LUVIA EN LA TARDE.

EQUIPO: 1 EXCAVADOR.

ACTIVIDADES: - RE PLANTEO DE NIVELES.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* Nelsa Due - Interv.

Norma


MAÑES 8/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 OPERARIOS, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE FUERTE; HOMBROS EN LA MAÑANA

EQUIPO: 1 MINICARGADOR + 1 VIBRO COMPACTADOR.

ACTIVIDADES: EXCAVACIÓN DE FANJA PARA MEJORAMIENTO EN SENDERO OCCIDENTAL, COSTADO SUR.



EN UNA LONGITUD DE 16,50m. SE SELLÓ CON SUELO DE SUELO.

J. Int. Nelsa Char - Interv.

VIERNES 9/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 OPERARIOS, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE Y LUNAR EN LA MAÑANA

EQUIPO: 1 MINICARGADOR, 1 VIBRO COMPACTADOR.

ACTIVIDADES: RECTIFICACIÓN Y REPUNTO DE NIVEL EN SENDERO Y PASEO

J. Int. Nelsa Char - Interv.

JUEVES 10/04/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 OPERARIOS, 1 OF, 1 AY.

CLIMA: LLUVIA FUERTE EN LA TARDE.

EQUIPO: 1 VIBRO COMPACTADOR + 1 MINICOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL (TEJIDO EN PRIMER FANJA DEL SENDERO OCCIDENTAL SE EXCAVÓ Y COMPACTA SUELO SOBRE ÉSTE.

MEJORAMIENTO EN COSTADO SUR.

J. Int. Nelsa Char - Interv.



VIERNES 11/04/2025

PERSONAL: 2 OPERARIOS, 1 OF, 1 AY.


CLIMA: NUBLADO.

EQUIPO: 1 MINICOMPACTADOR + 1 VIBROCOMPACTADOR.

ACTIVIDADES: - REPUNTO DE ACCESO MAESTRO

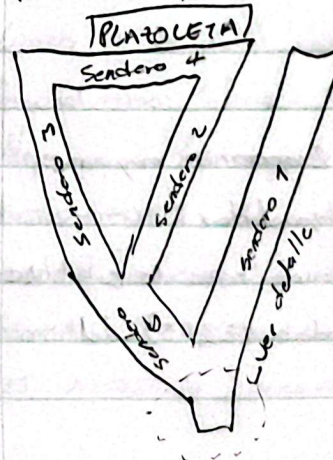

- Se encuentran nuevo ANTÁPIA en FRONTERA
NORTE del SENDERO OCCIDENTAL. SE EXCAVA PARA
MEDIR EL SUELO con ANÁLISIS DE CONTACTO
con espesor promedio de 25 cm, largo 9.3 m

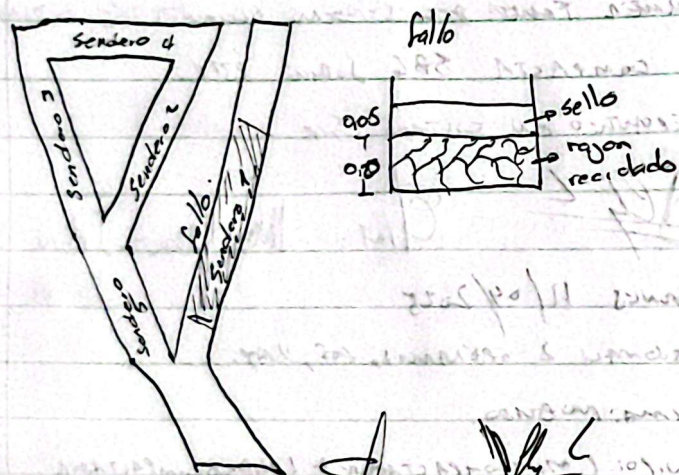

Pls. Nino P. - Interv.

Sábado 12 de abril del 2015


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador

ACTIVIDADES: Se inicia instalando capa de sub base
en los senderos peatonales (Senderos 1, 2, 3, 4, 5) del costado
norte del parque

Norma

En el sendero 5 del costado norte se presentan 2
fallos, los cuales se subsanaron con rayon reciclado
y una capa de sello con subbase granito.

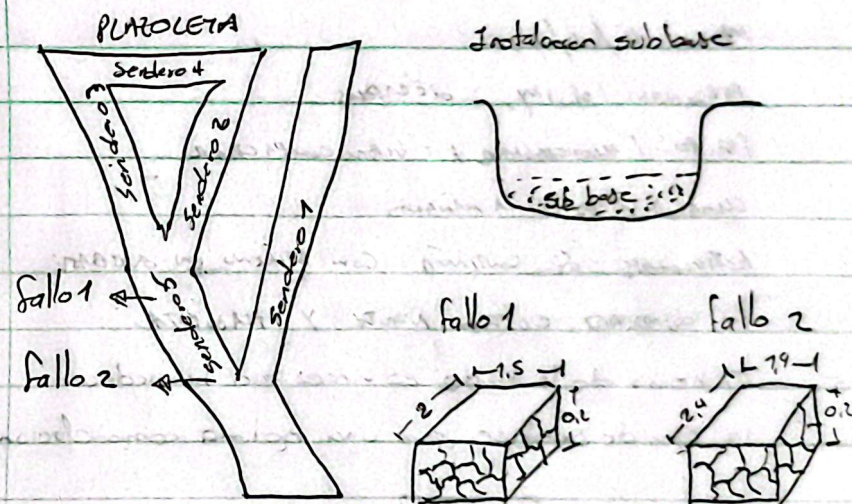

Pls. Nino P. - Interv.

Lunes 14 de abril del 2015

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 minicargador - 1 compactador

ACTIVIDADES: Se continúa instalando capa de sub base
en los senderos 1, 2, 3, 4, 5 del costado norte

CUMA: Se cu/sue a go.

ES NECESARIO Hacerse el ANÁLISIS PARA UNA

Norma

ÓPTIMA COMPACTACIÓN

USAR VIBRO DE S&B RECLAMADA Y S&B RECLAMADA

JLC EINT. Nels Rm - Interv

Martes 15/04/2025

PERSONAL: 1 of, 1 ay, 2 OPERARIOS


EQUIPO: 1 MINICARGADOR + 1 VIBRO COMPACTADOR

CLIMA: SECA EN LA MAÑANA

ACTIVIDADES: SE CONTINÚA CON RELEVO EN DIVISIÓN

EN DIVERSOS COSTADOS NOROCCIDENTAL Y PLAZA DE LA

En horas de la tarde es necesario humedecer la capa de subbase para una óptima compactación

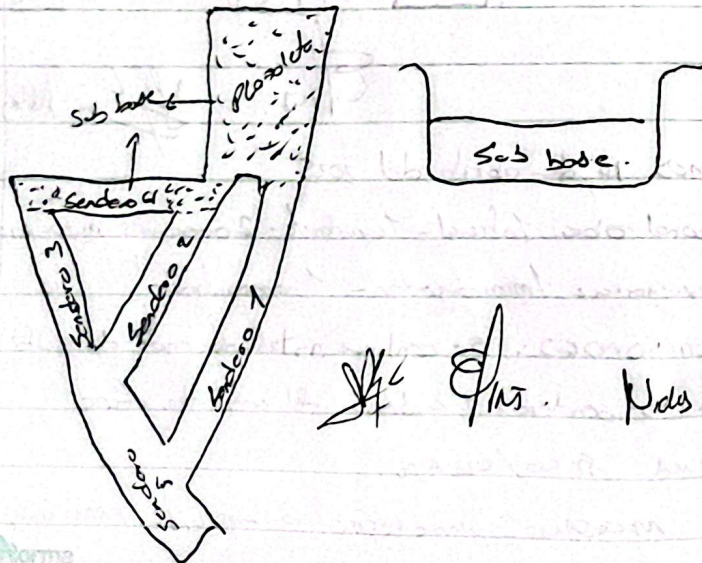


JLC EINT. Nels Rm - Interv

Miércoles 16 de abril del 2025

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 minicargador 1 compactador

ACTIVIDADES: Se continuó instalando capa de subbase en plaza de la y senderos perimetrales del costado norte

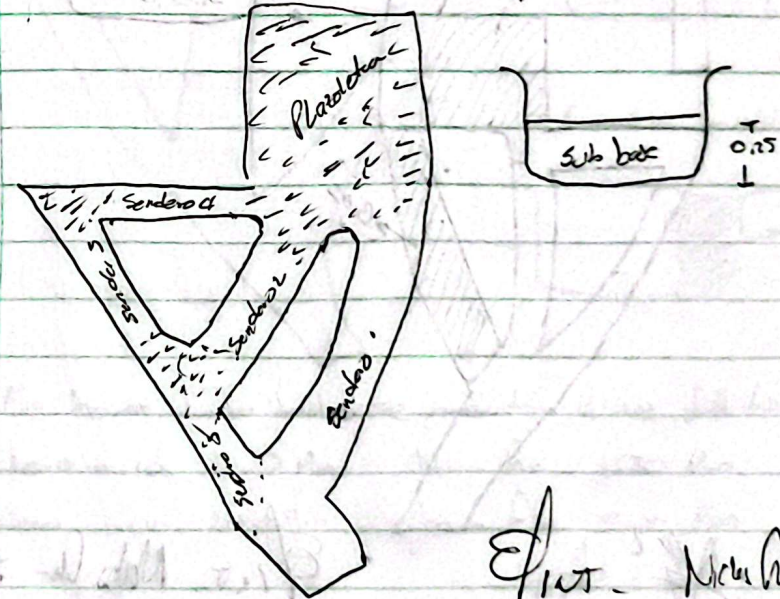

EINT. Nels Rm - Interv

JLC

Jueves 21 de abril del 2025

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios maquinaria

Maquinaria: 1 minicargador 1 compactador

ACTIVIDADES: Se inicia la instalación de base granular

Norma

en plazaleta y sendero del costado norte y sur.

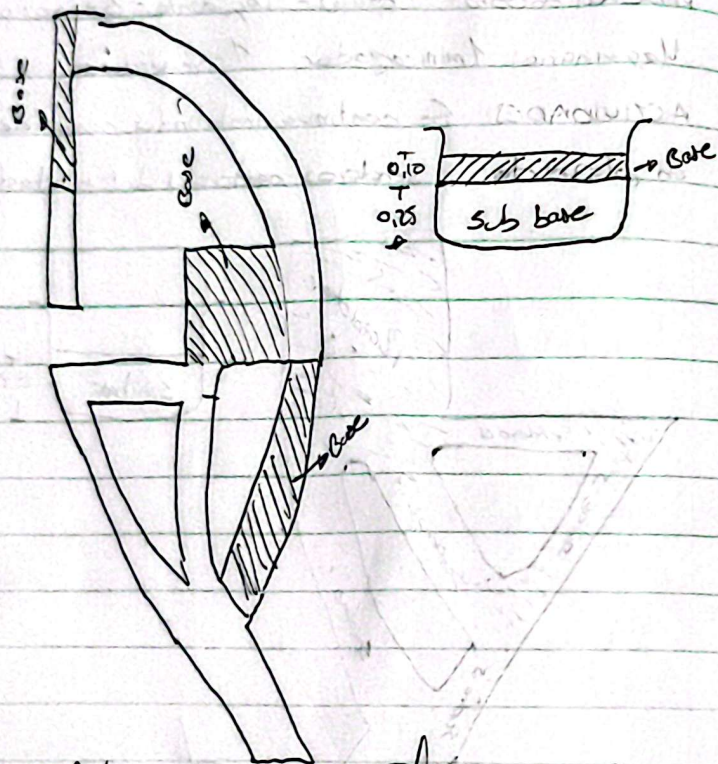



Fig. 1
Martes 22 de abril del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 3 operarios maguana
Maguana: 1 minicargador - 1 compactador - 1 retroexcavadora

ACTIVIDADES: Se continuo instalando capa de base en plazaleta y senderos del costado norte

Se inician excavaciones para bordillo en plazaleta

Norma

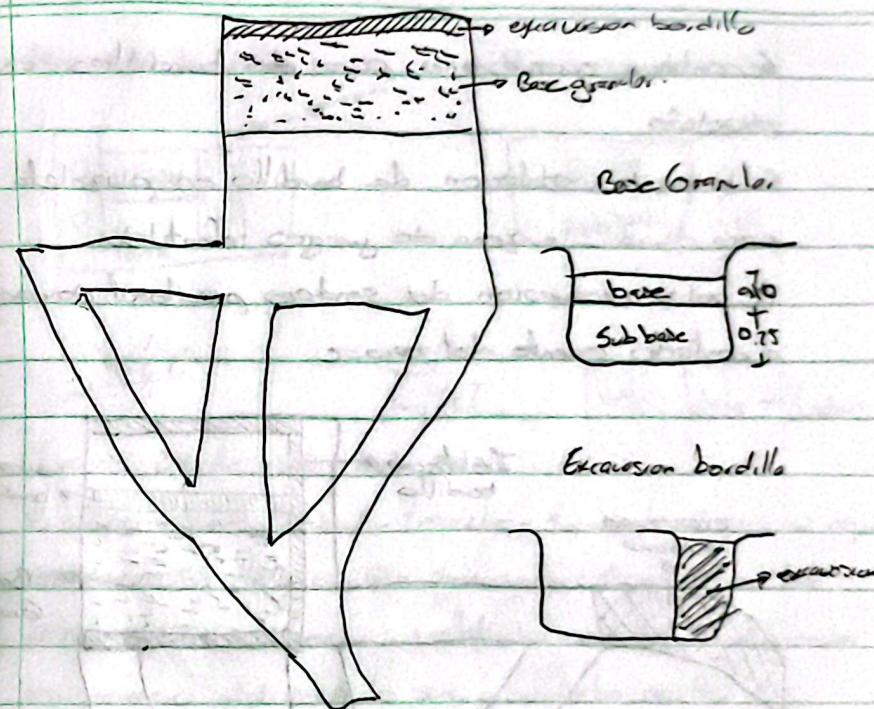

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 11:30 Am hora fin 1:30 Pm.

Hora inicio 2:00 Pm hora fin 5:00 Pm.

Fig. 2
Miércoles 23 de abril del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 maestro - 1 ayudante - 3 operarios maguana
Maguana: 1 minicargador - 1 compactador - 1 retroexcavadora

ACTIVIDADES: Se continuo instalando capa de base granular en plazaleta


Se inician excavaciones para bordillo en plazaleta

Norma


Se continúan excavaciones para dar bordillos en el plazoleta.

Se inicia la instalación de bordillo en plazoleta para dividir la zona de juegos infantiles.

Se realiza excavación del sendero peatonal ubicado al costado oriente del parque.

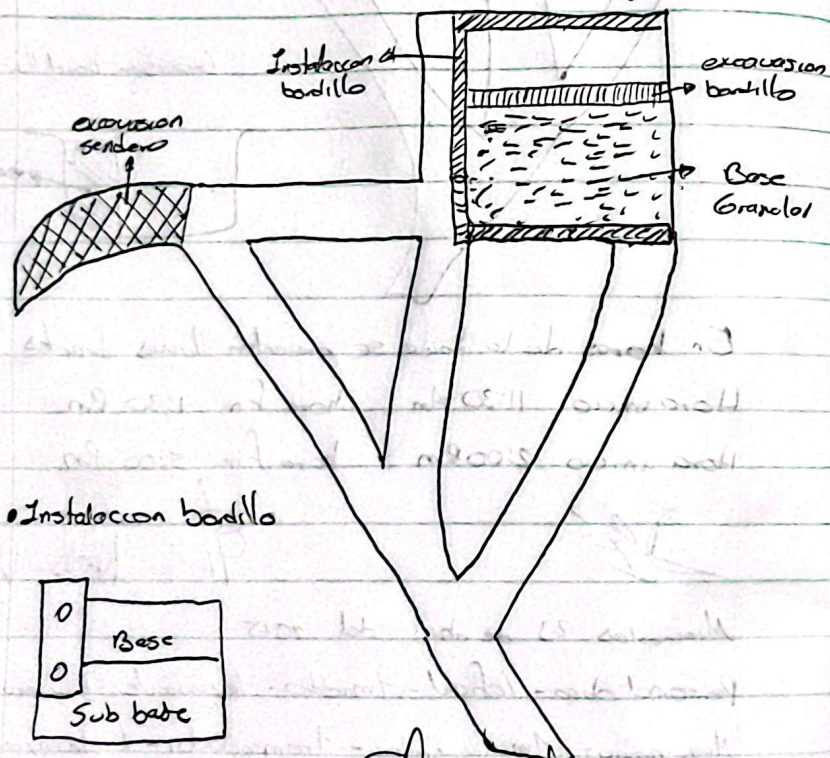


• Instalacion bordillo




[Signature]

Fin. Nels Cruz - Inter

• Excavacion bordillo



• Base Granular



[Signature]

Fin. Nels Cruz - Inter

Jueves 24 de abril del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 maestro - 1 ayudante - 3 operarios mayores

~~MAQUINARIA~~ MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador - 1 rolo

ACTIVIDADES: Se continúa instalando capa de base granular en sendero del costado sur y costado norte

- Se continúan excavaciones para bordillo en plazoleta para dividir zona de juegos infantiles - Sendero - Bordes de baldosas

- Se continúa instalando bordillo en plazoleta para dividir zona de juegos infantiles - Sendero - Bordes de baldosas

- Se continúa excavación en sendero oriental



En horas de la tarde se prevén lluvias fuertes

Horario inicio 4:00 pm hasta 5:00 pm

- Se hace excavación en sendero de ingreso del costado norte "reguste de cendero de acceso"

Norma

• Instalar Bndillo

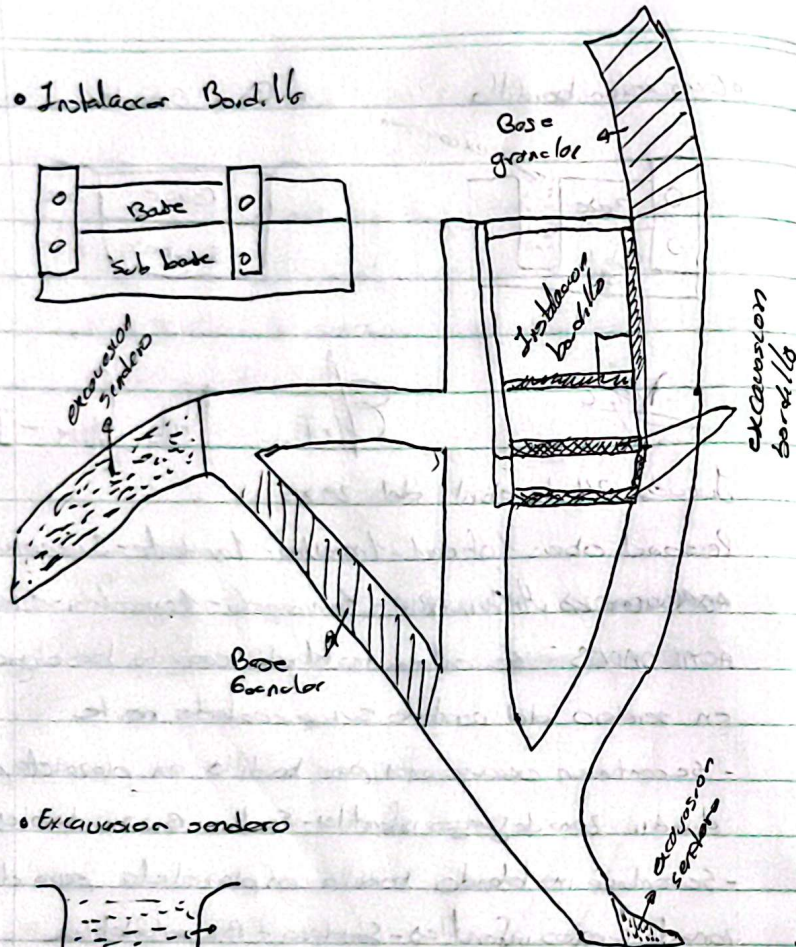


• Excavacion sendero



• Excavacion bndillo



• Base Granular Sendero



Norma

El. 1.00

El. 1.00

Nota Chav - Inter

Viernes 25 de abril del 2025


Personal obs = 1 maestro - 1 oficial - 3 operarios maquinarias

RECURSOS: MAQUINARIA = 1 minicargador - 1 compactador - 1 retro

ACTIVIDADES: Se realiza reparación con rejon recubierto en sendero peatonal del costado nor oriente

Se inicia instalacion de sub base granular en sendero del costado nor oriente

Se contina con las excavaciones para bndillos en doble y sendero del costado sur

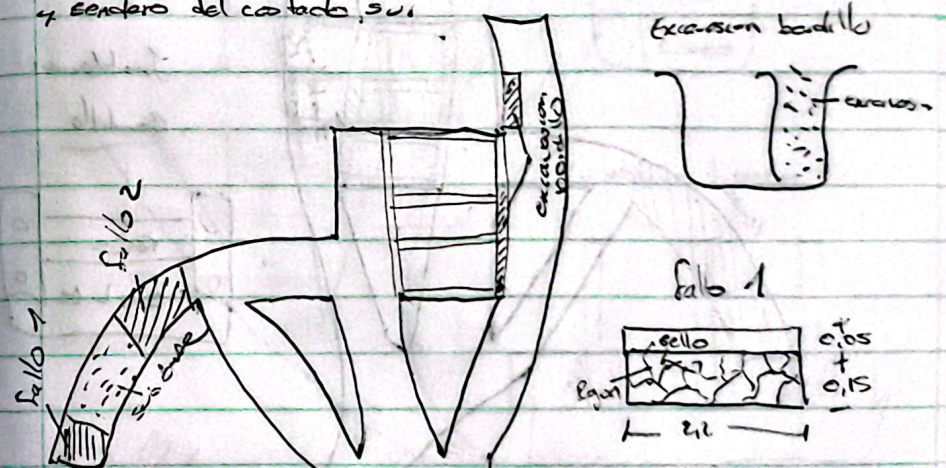

sub base



El. 1.00

El. 1.00

Nota Chav - Inter

Norma

Sábado 26 de abril del 2025


Personal obra: 1 oficial 1 ayudante 1 maestro

30 personas magister

MAQUINARIAS: 1 minicargador - 1 compactador - 1 retro cargador

ACTIVIDADES: Se continuo instalando bordillo en plaza de

se inicio instalacion de base granular en sendero del costado nor oriente

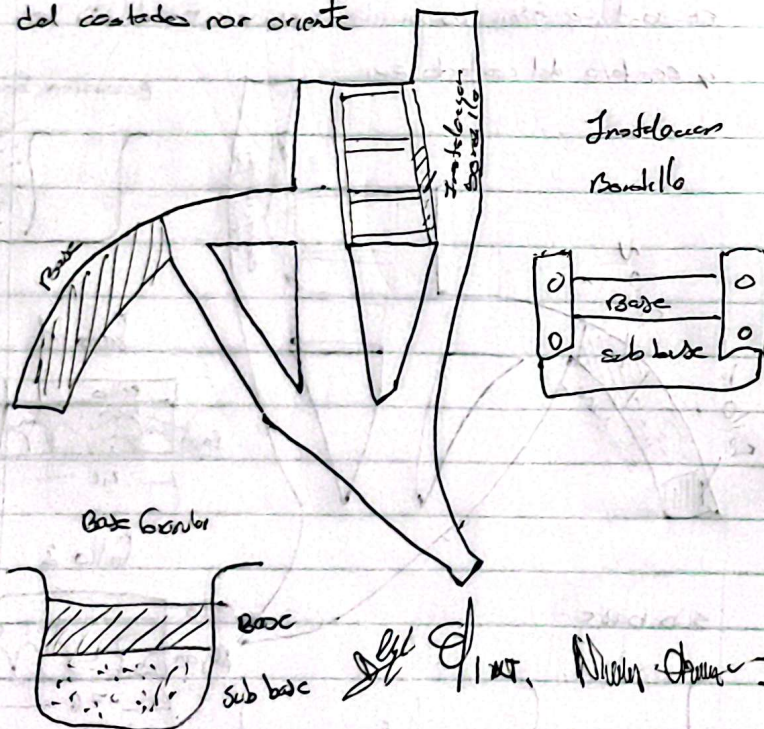


lunes 28 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: se instala tubería metálica en zona de juegos infantiles para baranda metálica

se continuan excavaciones en sendero del costado sur, para bordillos

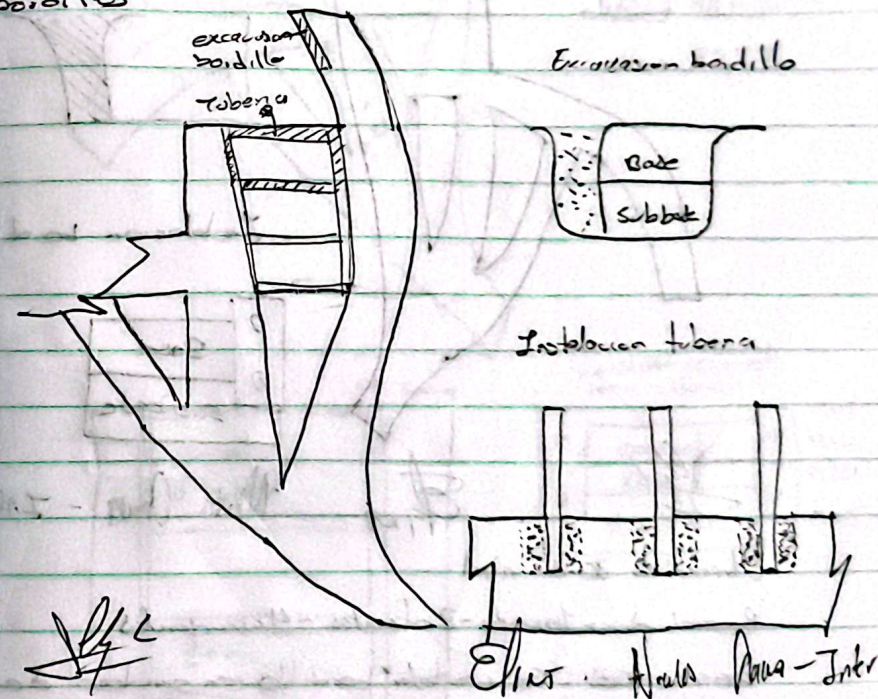


Mañana 29 de abril del 2025

Personal obra - 1 maestro - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: se instala bordillo en sendero del costado sur.

Norma

Se hace excavación en senda o sur oriente "zona de coque" para bordillo

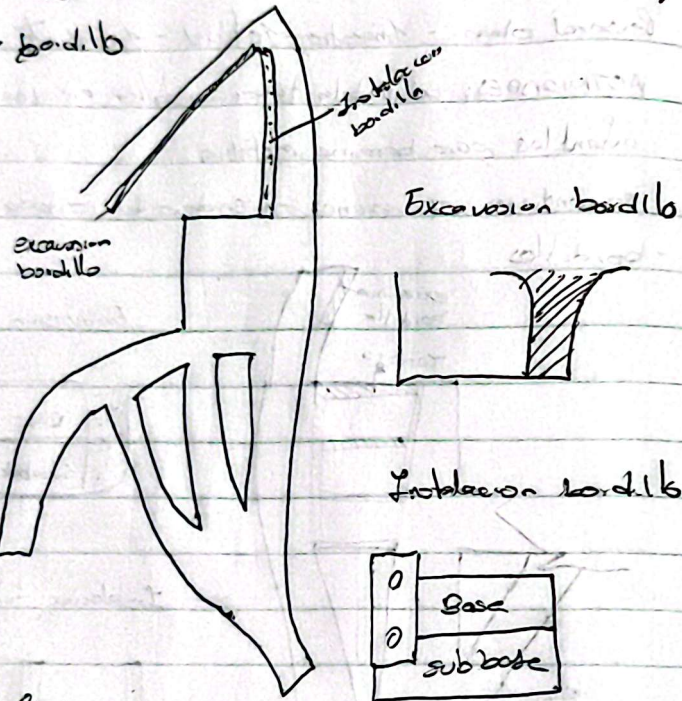

El

El

Maria Cruz - Inter

Miércoles 30 de abril

Reservado para: Tránsito - 20 personas - 40 estudiantes


ACTIVIDADES: Se instala bordillo en senda o sur oriente del costado sur oriente.

Se ~~hace~~ realiza toma de densidades en sendas y plazaleta

Se funda losa en concreto en plazaleta - losa

Norma

zona de juegos - Losa zona Brio

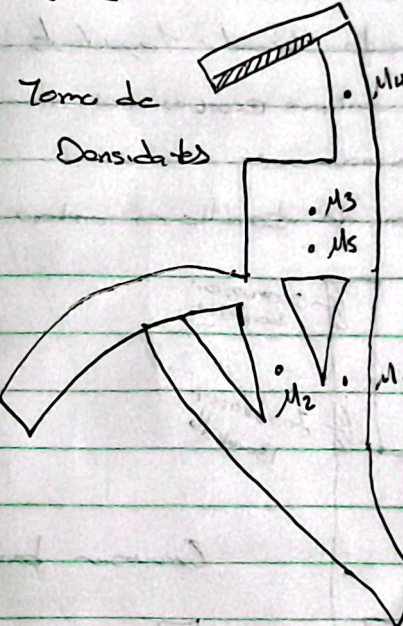


$M_1 = 97\%$

$M_2 = 96.2\%$

$M_3 = 97.9\%$

$M_4 = 98.4\%$

$M_5 = 97.2\%$

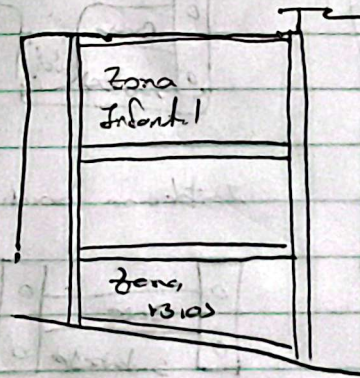

fundido concreto zona infantil

0	concreto	0	0.03
0	base	0	0.10
0	sub base	0	0.20
			0.25

fundido concreto oio salicabla

0	concreto	0	0.10
0	base	0	0.20
0	sub base	0	0.25

El

Maria Cruz - Inter

El


Norma

Viernes 2 de mayo del 2025

Personal obra: 1 maestro - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúan excavaciones para bordillo en sentido del costado sur.

Se inicia instalación de bordillo en sentido sur.

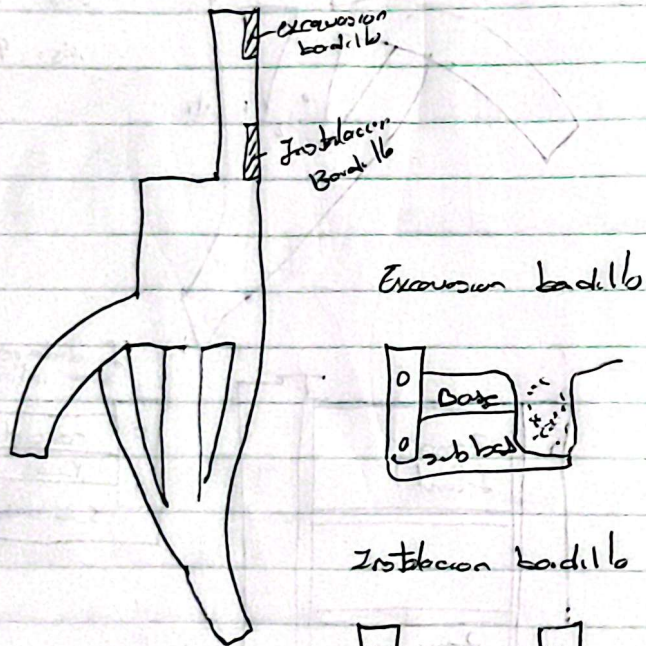

[Signature]

[Signature]


Maestro Obra - Int

Sábado 3 de mayo del 2025

Personal obra: 1 maestro - 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instalan bordillos en sentido paralelo del costado sur.

Se inicia empedrado en zona adyacente a bordsillables

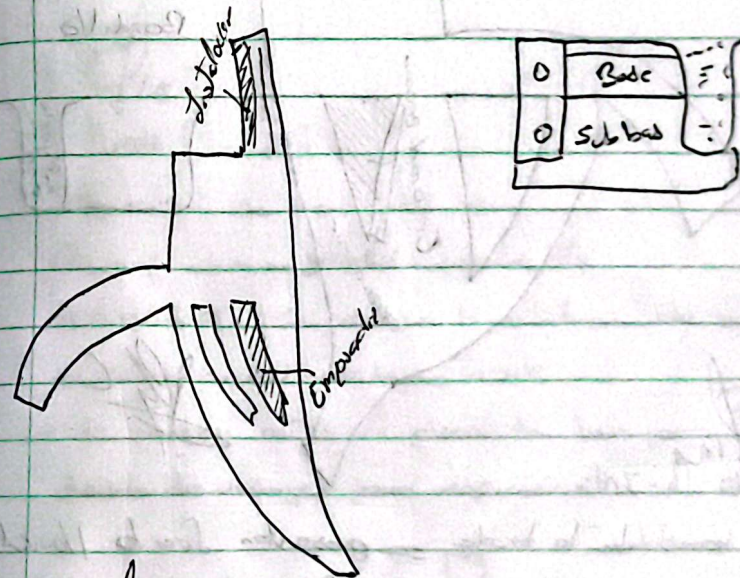

[Signature]

[Signature]

Maestro Obra - Int

Lunes 5 de mayo del 2025


Personal obra: 1 maestro - 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continúa empedrado en

Norma

Norma

Zona adecuada a bio-selecciones
Se inician excavaciones para bordillos en
senderos peatonales del costado norte

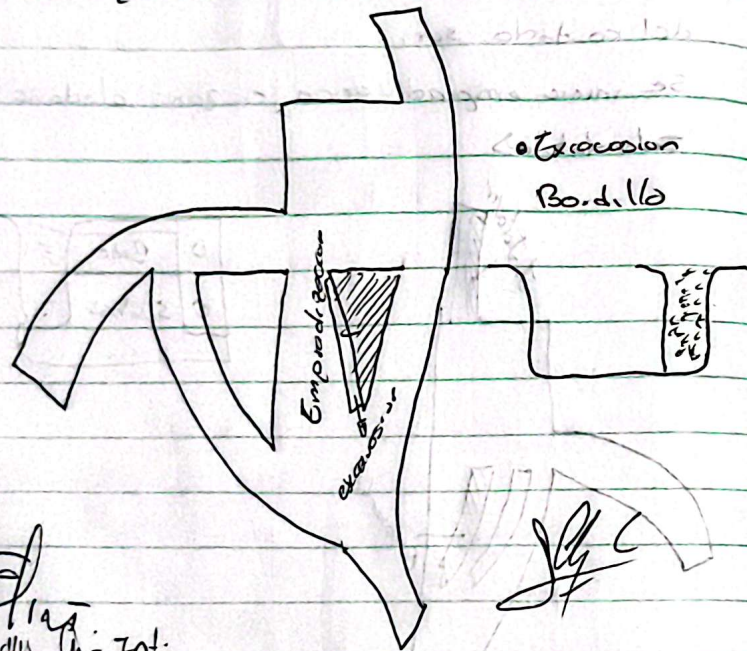

Plas
Nicola Oh - Int.

En horas de la tarde se presentan fuertes lluvias

Hora inicio: 2:00 PM Hora fin: 5:00 PM

Medio

JLC

Plas

Marzo 5 de mayo del 2025

Personal obra = 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillos

Norma

en senderos del costado norte y excavaciones para
bordillos.

- Se instala juego infantil

- Lluvias constantes a lo largo de la jornada.

Trabajamos a las 3:30 PM.

- LUEGA VAMOS DE LOSA Y PÉREL.

Plas

JLC

Nicola Oh - Int.


Marzo 7 de mayo del 2025

Personal obra = 1 oficial - 2 ayudantes


ACTIVIDADES: Se continua la instalacion de bordillo

en senderos del costado norte

- Se realizan cortes en placa de bus para fundir
dados de andajes para maquinaria.

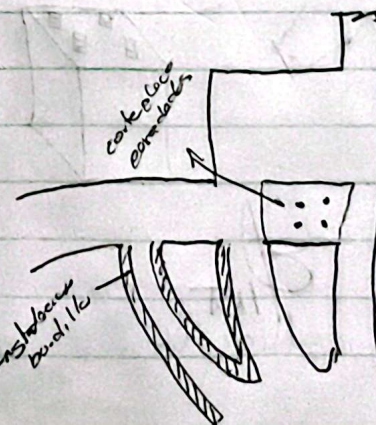

• Instalacion bordillo



Nicola Oh - Int.

JLC

Plas


Norma

Jueves 8 de mayo del 2025

Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se funden dados en concreto para andaje de magnaria (Biosaludables)

Se continuó con la instalación de bardillo en sendero del costado nor oriente.

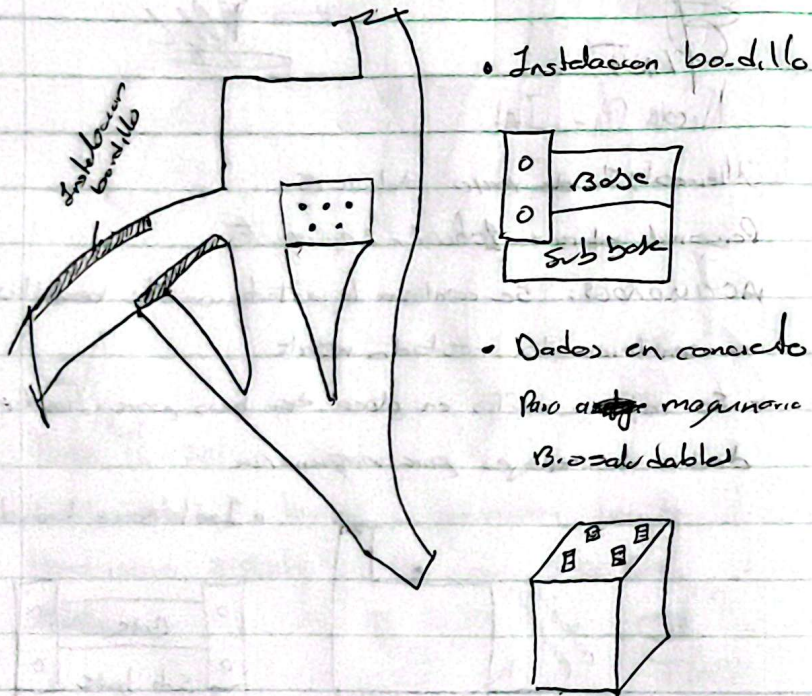

[Signature]

[Signature]
Nicolas Ch


Viernes 9 de mayo del 2025

Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia instalación de adogan en sendero del costado norte

En horas de la tarde se pegan los llaves de los

Hora inicio 11:00 pm Hora fin 4:00 pm

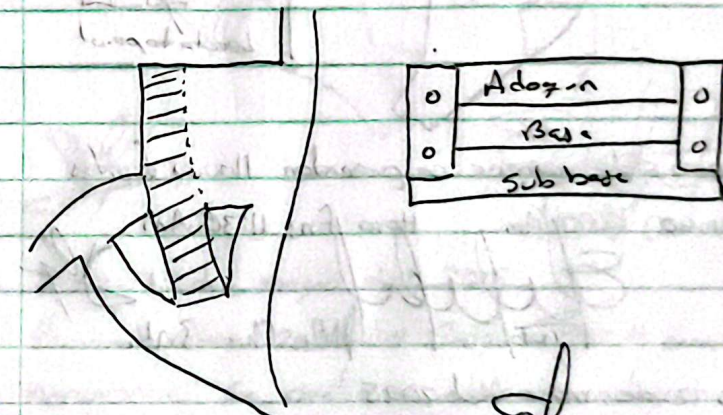

[Signature]


[Signature]
Nicolas Ch-Int.

Sabado 10 de mayo del 2025.

Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continúa instalando adogan en sendero ubicado entre zona de biosaludables y juegos infantiles

Se instalan lecta topical al ingreso de juego infantil

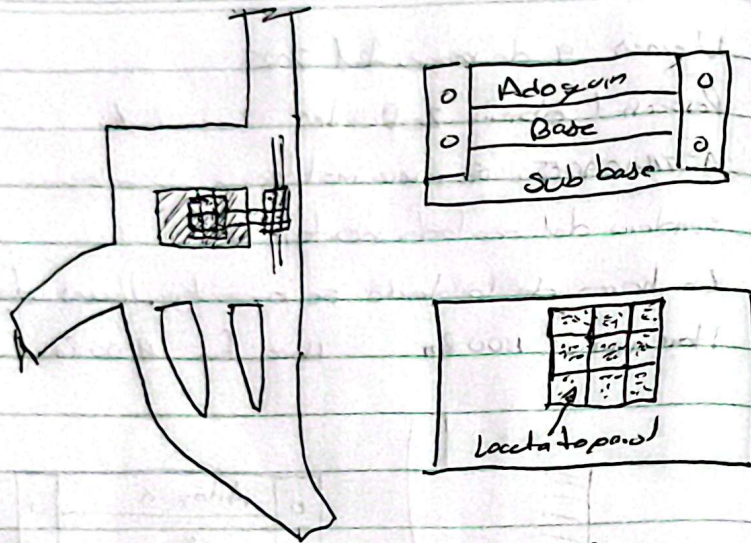

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:00 Am Hora fin: 11:30 Am.

[Signature]
Néstor Ch. Int.

Lunes 12 de mayo del 2025

Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes - 4 ornamentadores


ACTIVIDADES: Se continúa instalando adoguin en senderos del costado norte

- Se inicia instalación de arceles metálicos en baranda de juegos infantiles

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 1:30 Pm Hora fin 4:00 Pm

[Signature]

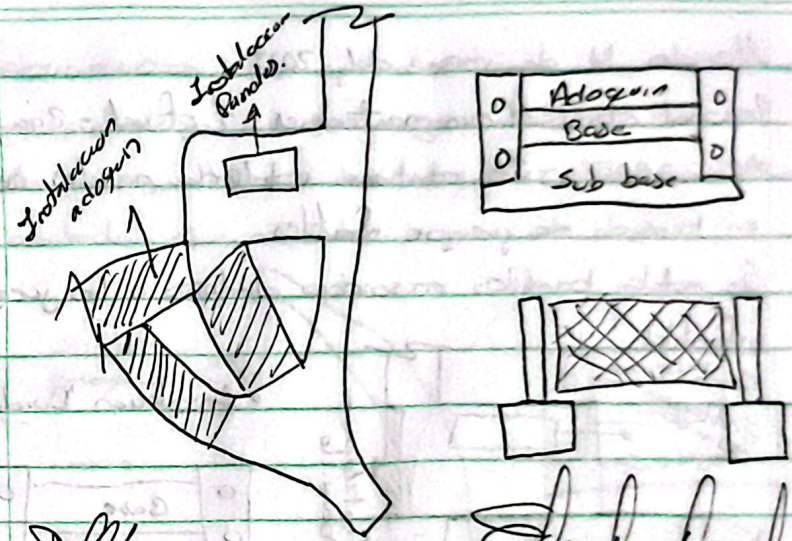

[Signature]

[Signature]
Néstor Ch. Int.

Ma. 13 de mayo del 2025

Personal obra: 2 oficiales - 2 ayudantes - 4 ornamentadores

ACTIVIDADES: Se continúa instalando adoguin en sendero del costado sur.

Se continúa instalando arceles metálicos en baranda de juegos infantiles

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 12:00 Pm

[Signature]


[Signature]
Néstor Ch. Int.

Miércoles 14 de mayo del 2025

Personal obra: 4 ornamentadores - 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continúe instalando paneles metálicos en baranda de juegos infantiles

Se instalan bordillos en sendero alrededor a los juegos infantiles

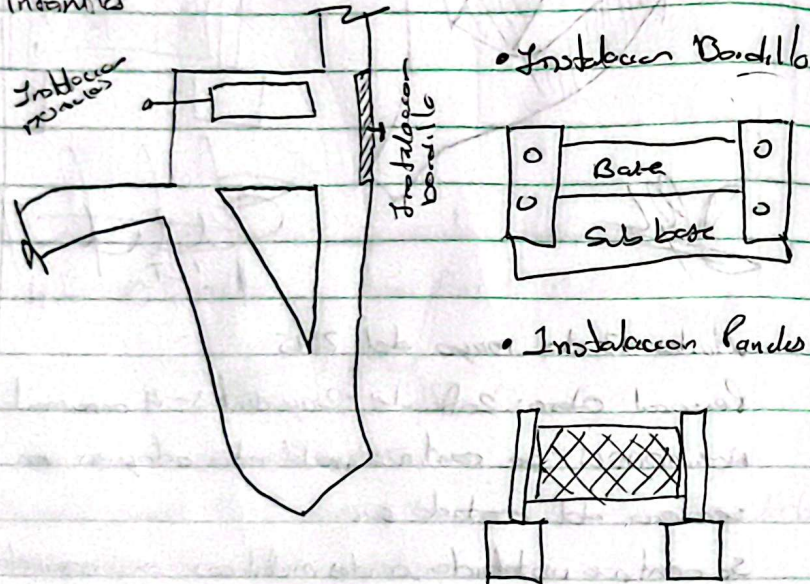

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 1:30 pm Hora fin: 4:00 pm


Elaborado por: Nicolás Chavarría P. - Int

Jueves 15 de mayo del 2025.

Personal obra: 4 ornamentadores 1 oficial 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se aplica anticorrosivo en baranda perimetral en zona de juegos infantiles

Se inicia instalación de cobogran en sendero del costado sur oriente.

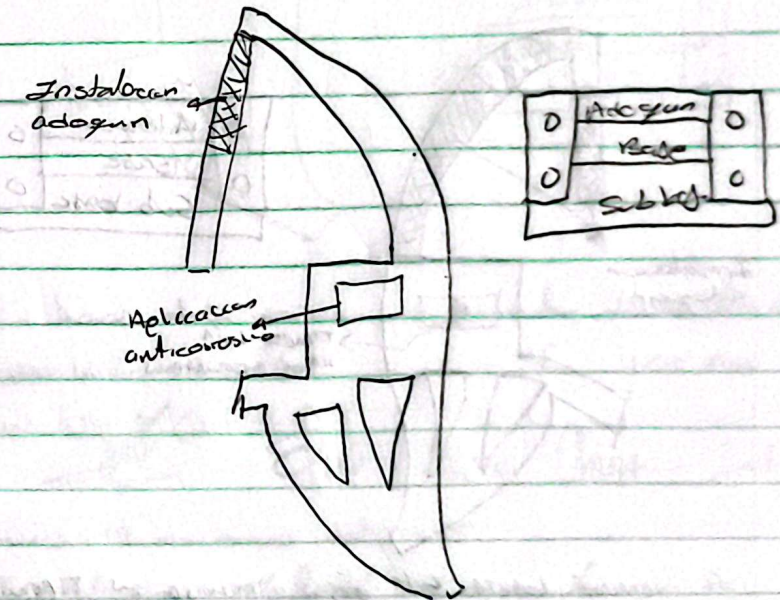

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 Am Hora fin: 12:00 pm

Hora inicio 3:00 pm Hora fin: 5:00 pm


Elaborado por: Nicolás Chavarría P. - Int

Viernes 16 de mayo del 2025

Personal obra: 3 ornamentadores - 2 oficiales 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticoncepcion en baranda de juegos infantiles.

- Se continua instalando adoquin en sendero del costado sur y sur oriente

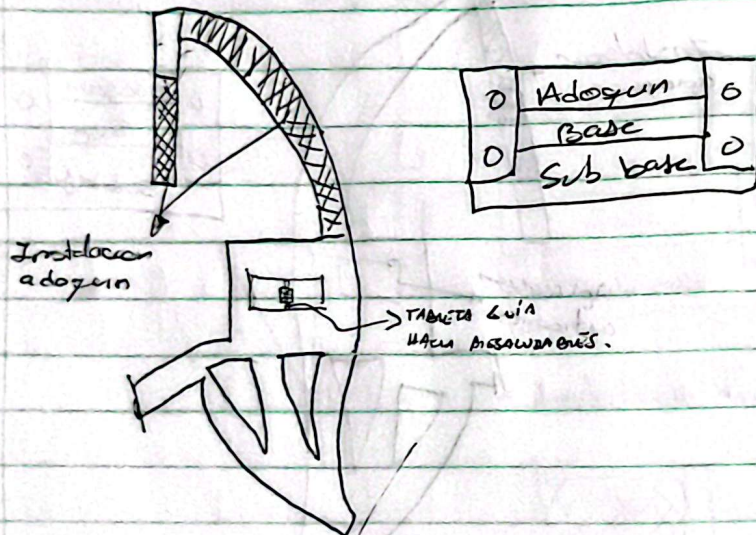

Se instalara loseta guía desde el inicio en la Pasadizos.

En horas de la mañana se presentaran lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 Am Hora fin 12:00pm


Norma Chart - Int

El Int. [Signature]

Sabado 17 de mayo del 2025

Personal obra: 1 Oficial 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en senderos del costado norte

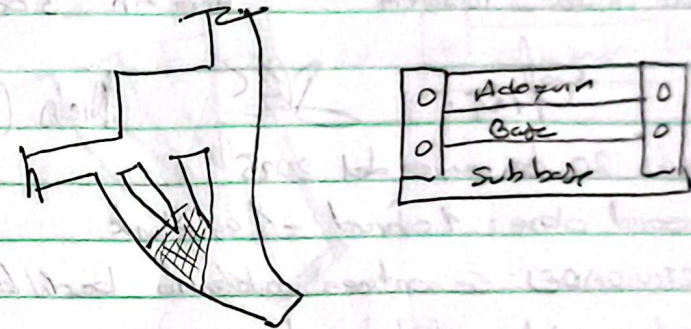

En horas de la mañana se presentaran lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 Am


Hora fin 11:00 Am

[Signature] El Int. Norma Chart - Int

Lunes 19 de mayo del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en senderos del costado norte

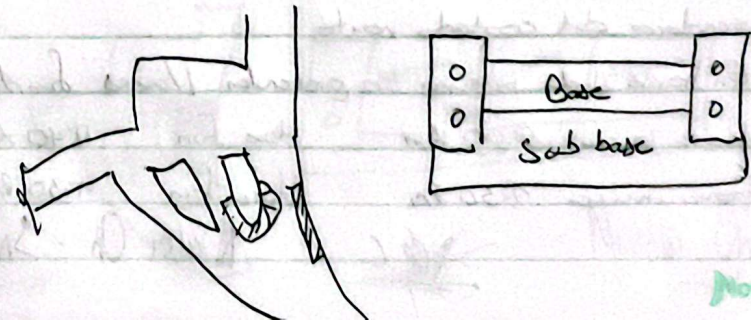

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
 Hora inicio : 7:30 AM Hora fin 11:00 AM
 Hora inicio 12:30 PM Hora fin 3:00 PM

El INT.  Nicolas Ch - Int

Martes 20 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordil 6 en senderos del costado norte

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 7:00 AM Hora fin 9:30 AM

Hora inicio 10:20 AM Hora fin 11:00 AM

El INT.  Nicolas Ch - Int

Miércoles 21 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante


ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en senderos del costado norte

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 8:00 AM Hora fin 11:40 AM

Hora inicio 1:30 PM Hora fin 4:30 PM

 Nicolas Ch - Int

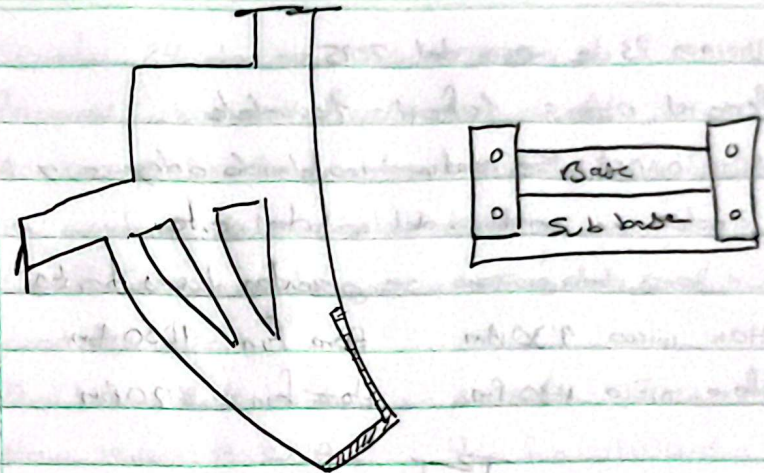

El INT.  Nicolas Ch - Int

Jueves 22 de mayo del 2025


Personal obra 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instala adoquin en senderos del costado norte, y se instala locotoquin en sendero.

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 AM Hora fin 12:00 PM

Hora inicio 2:00 PM Hora fin 4:30 PM



El INT.  Nicolas Ch - Int

Viernes 23 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continuo instalando adoguyn y locos en senderos del costado norte

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:30 AM Hora fin 11:30 AM

Hora inicio 1:30 PM Hora fin 11:20 PM

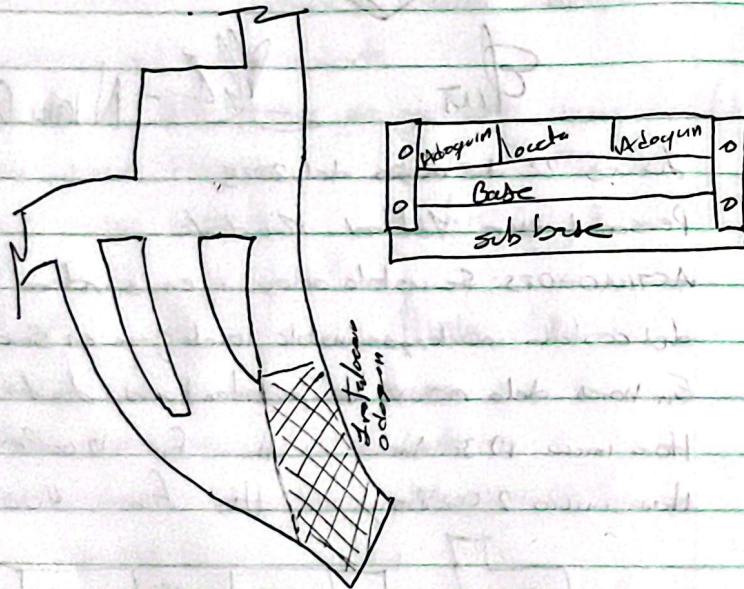

Melo Ch - Int

JLC

Fin.

Sabado 24 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continuo instalando adoguyn en senderos del costado norte

Se finde rampa de acceso en sendero del costado sur.

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 8:30 AM Hora fin 11:00 AM

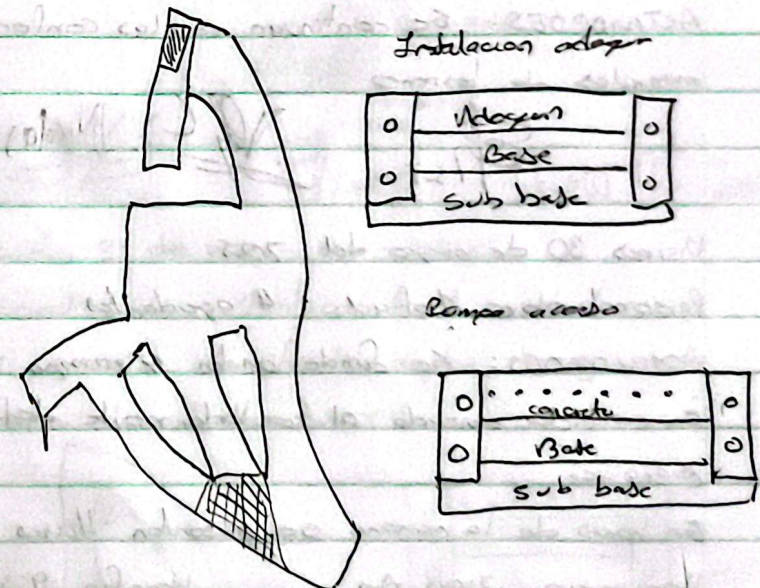

JLC

Fin.

Work Area - Int

Lunes 26 de mayo del 2025

Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante


ACTIVIDADES: Se inicia conformación de terreno manual, en perimetros de cerco.

Elm.  Nicolas Ch - Int

Martes 27 al Jueves 29 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúan con los conformamientos manuales de terreno

Elm.  Nicolas Ch - Int

Viernes 30 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 4 ayudantes

ACTIVIDADES: Se funde anden y rampa en concreto ubicado al costado norte del pasaje

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 7:00 Am

Hora fin 9:30 Am


Hora inicio 11:00 Am


Hora fin 12:00 Pm

Hora inicio 2:00 Pm

Hora fin 3:30 Pm

Norma

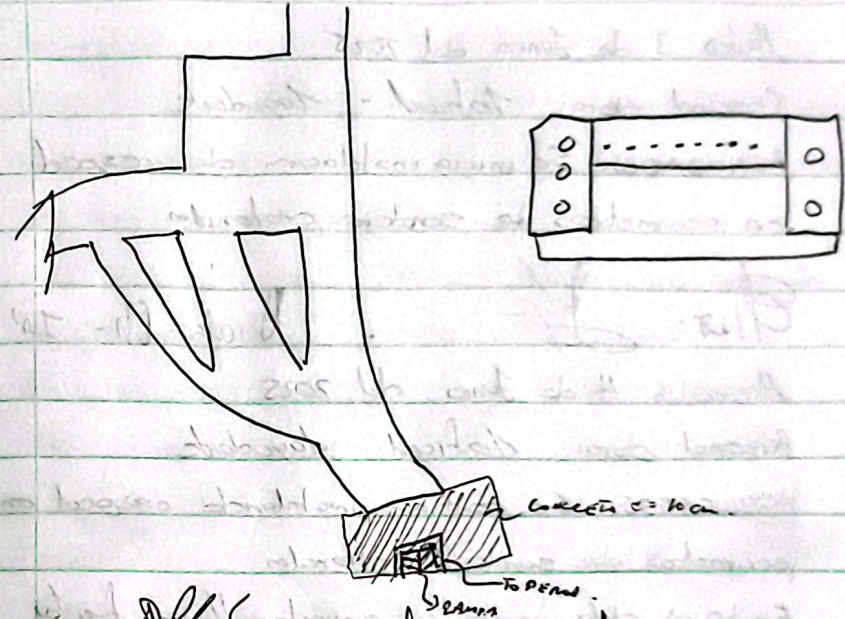



 Elm. Nicolas Ch - Int

Sábado 31 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se funde anden de quete ubicado al costado sur.



 Elm. Nicolas Ch - Int

Norma

Marzo 3 de Junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de cesped en perimetros de senderos peatonales

Dir. JLC - Nicolas Ch - Int

Miercoles 4 de Junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando cespced en perimetros de senderos peatonales

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 pm Hora fin 4:30 pm

Dir. JLC - Nicolas Ch - Int

Jueves 5 de Junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando cespced en perimetros de senderos peatonales

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 Am Hora fin 12:00 pm

Dir. JLC - Nicolas Ch - Int

Norma

Viernes 6 de Junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante - 4 instaladores granos cauchos

ACTIVIDADES: Se continua instalando cespced en perimetros de senderos peatonales

- Se inicia instalacion de grano caucha en zona de juegos infantiles (grano caucha donde negro)

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 pm Hora fin 5:00 pm

JLC - Nicolas Ch - Int Dir.

Sabado 7 de Junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante - 4 instaladores granos cauchos

ACTIVIDADES: Se continua instalando cespced en perimetro de sendero peatonal

- Se continua instalando grano caucha en zona de juegos infantiles (grano caucha donde negro)

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 Am Hora fin 12:00 pm

JLC - Nicolas Ch - Int Dir.

Norma

Lunes 9/6/2025

Personal: 10 personas + 3 instructores de cancha.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: Se hace repaso de cancha a color

en zona de juego infantil.

Se continúa con inspección.

JLC

Elm.

Martes 10/6/2025.

Personal: 10 + 3 instructores de cancha.

Actividades: Se hace repaso en zona de juego infantil.

Inicio de inspección de cancha a color según

de ser.

JLC

Elm.

Miércoles 11/6/2025.

Personal: 3 instructores de cancha + 2 pintores.

Clima: Lluvia en la mañana.

Actividades: Se pintan y pinta el

pintura en pavimento para la parte de las

Norma

Dispositivos:

- Pinta con instrucciones de cancha en zona de juego infantil.

JLC

Elm.

Jueves 12/6/2025

Personal: 3 instructores de cancha + 2 pintores.

Clima: Lluvia en la mañana.

Actividades: - Terminación del cancha a color en juego infantil.

- Se repasa mano y detalles de pintura sobre zona de dispositivos.

JLC

Elm.

Jueves 19/06/2025

Personal: 2 instructores de cancha.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: - Inspección de estructuras de vallas

8x120 y 8x100. Inspección de banco M-31.

JLC

Elm.

Norma

VIERNES 20/06/2025.

PERSONAS: 2 INSTRUCTORES DE ASESINATO.

ACTIVIDADES: INSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA SEÑALES DE CENSAJO Y OBSERVACIÓN (80x120) E IDE-S.

- INSTRUCCIÓN DE CENSAJO EN ÁREAS INOCUAS

JLL

Elmi.

SÁBADO 21/06/2025.

PERSONAS: 1 M.

ACTIVIDADES: ASO.

JLL

Elmi.

JULIO 19/2025

LA NOCHE ANTERIOR (17/07/2025), SE PRODUCE ACTO DE VANDALISMO E INTENTO DE ROBO DE 2 MÓVILES BROS MÓVILES.

CONTAR LA OSE DEL MÓVIL "EMPTICA" Y LA INTERVENCIÓN PARA DEJAR LA CIRCUNSTANCIA LO PERMITA. EVITAR EL ROBO. EL CAMINANTE AUNQUE LO EMPREZARON A CORRER, PERO NO PUDIERON ALCANZARLO.

Norma

SE PRODUCE A REUNIÓN AMBOS MÓVILES, LLEVANDO A TENER Y HACER LA RESERVIA PERMANENTE. SE RECONSTRUYERON LA SIGUIENTE SEMANA.

JLL

Elmi.

CIERRE
BITÁCULA.

Elmi.

JLL

Norma
