
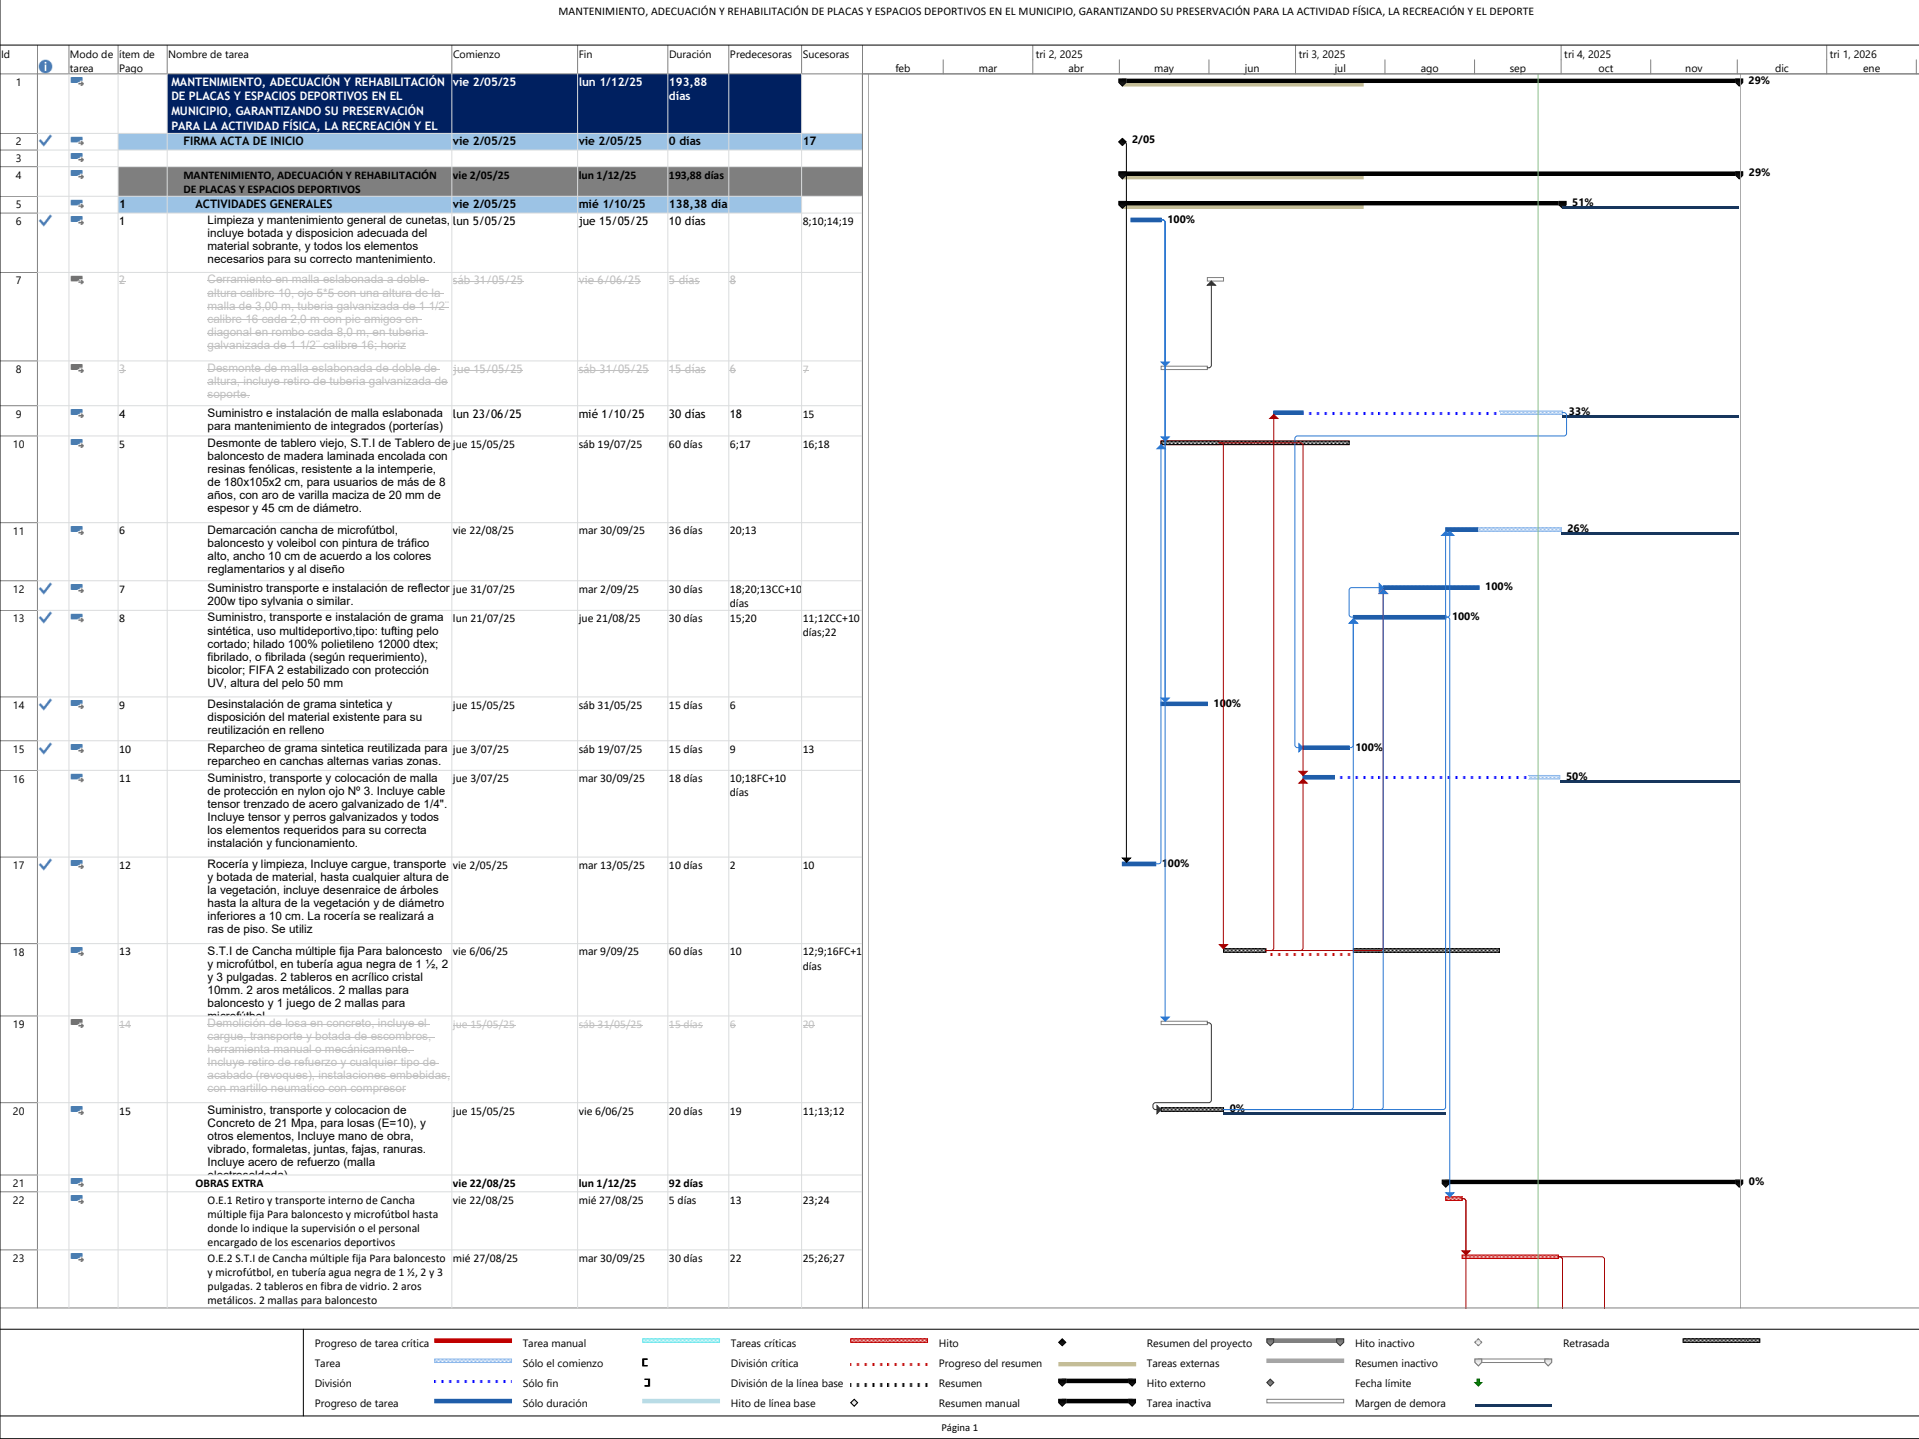


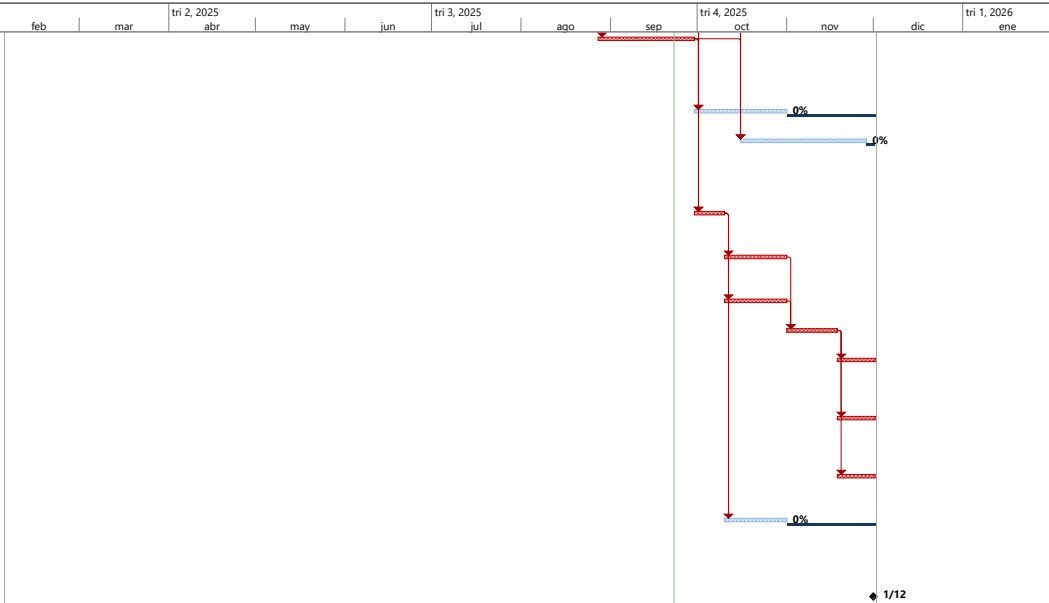

Mantenimiento, Adecuación y Rehabilitación de Placas y Espacios Deportivos en el Municipio, Garantizando su Preservación para la Actividad Física, la Recreación y el Deporte									
Id	Modo de tarea	Item de Pago	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras	Sucesoras	
24			O.E.3. Mantenimiento de portería integrada, incluye: Retiro de malla metálica, varilla y soldadura con pulidora, suministro e instalación de malla en nylon, retiro de pintura y preparación de la superficie, una mano de base wash primer,	mié 27/08/25	mar 30/09/25	30 días	22	25;26FC+15 días;27	
25			O.E.4 Suministro, transporte e instalación de caucho para cancha de grama sintética	mar 30/09/25	sáb 1/11/25	30 días	23;24		
26			O.E.5 Mantenimiento general de cerramiento deportivo (incluye reconstrucción donde sea necesario del piso mallas, cambio de malla que se encuentre en mal estado, cocido de malla donde se requiera, malla y mantenimiento porterías)	jue 16/10/25	vie 28/11/25	40 días	23;24FC+15 días		
27			O.E.6 Desmonte de aparatos sanitarios (unidad sanitaria, orinales y lavamanos), Incluye disposicion final y/o entrega donde lo indique la	mar 30/09/25	vie 10/10/25	10 días	23;24	28;29;34	
28			O.E.7 Suministro, transporte e instalación de accesorios sanitarios completos, incluye válvulas de vaciado y llenado.	vie 10/10/25	sáb 1/11/25	20 días	27	30	
29			O.E.8 Suministro e instalación de orinales mediano para unidad sanitaria. Incluye grifería y desagües.	vie 10/10/25	sáb 1/11/25	20 días	27	30	
30			O.E.9 Suministro, Transporte e Instalación de puerta sencilla 1200mm	sáb 1/11/25	mar 18/11/25	15 días	28;29	31;32;33	
31			O.E.10 Suministro y colocación de pintura para graderías existentes, incluye preparación de la superficie a intervenir. Colores a definir según aprobación de la supervisión.	mar 18/11/25	lun 1/12/25	12 días	30		
32			O.E.11 Mantenimiento y pintura de pasamanos en tubería metálica, Incluye retiro de pintura existente y aplicación de anticorrosivo y esmalte apto para intemperie, color según indicaciones de	mar 18/11/25	lun 1/12/25	12 días	30		
33			O.E.12 Suministro, transporte, pintura e instalación de lámina calibre 18 con medidas de 3 m * 0,70 en torres de cubierta	mar 18/11/25	lun 1/12/25	12 días	30		
34			O.E.13 Suministro, transporte y colocación de duchas. Incluye Grifería, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	vie 10/10/25	sáb 1/11/25	20 días	27		
35									
36			ENTREGA DE OBRA	lun 1/12/25	lun 1/12/25	0 días			
									
<div>Progreso de tarea crítica  Tarea manual  Tareas críticas  Hito  Resumen del proyecto  Hito inactivo  Retrasada  Tarea  Sólo el comienzo  División crítica  Progreso del resumen  Tareas externas  Resumen inactivo  División  Sólo fin  División de la línea base  Resumen  Hito externo  Fecha límite  Progreso de tarea  Sólo duración  Hito de línea base  Resumen manual  Tarea inactiva  Margen de demora </div>									
Página 2									
