



CONTRATO: COP-003-2025-CD

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO
SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA,
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.**

BITÁCORA DE EJECUCIÓN DE OBRA

EL CARMEN DE VIBORAL





BITÁCORA DE OBRA

Contrato de obra pública COP-003-2025-CD cuyo objeto es realizar el “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE”, se contrató a la empresa CONSTRUCTORA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO:	COP-003-2025-CD
CONTRATANTE:	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de El Carmen de Viboral – EDUR.
NIT:	901.521.260-2
GERENTE:	MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
IDENTIFICACIÓN:	CC No. 71.113.392
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S
NIT:	901467557-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ELKIN ALONSO GOMEZ ALZATE
IDENTIFICACIÓN:	CC No. 71.115.533
OBJETO:	“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE”.”



VALOR:

CUATROCIENTOS DIECISEIS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS M/L (\$ 416.645.135).

ADICIÓN N°1:

\$138.870.775,67 INCLUIDO AU

VALOR TOTAL:

\$555.515.910 INCLUIDO AU

PLAZO:

CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO:

02 DE MAYO DE 2025

AMPLIACIÓN N°1:

UN (1) MES

AMPLIACIÓN N°2:

DOS (2) MESES

FECHA DE FINALIZACIÓN

01 DE DICIEMBRE DE 2025

BITÁCORA DE OBRA

El viernes 02 de mayo de 2025 se realiza la firma del acta de inicio del contrato de obra COP-003-2025-CD cuyo objeto es realizar el “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE”, se contrató a la empresa CONSTRUCTORA, por ende, se realiza apertura de la presente bitácora con la finalidad de realizar seguimiento a las actividades diarias de la ejecución contractual:

1. Viernes 02 de mayo de 2025

Estado del clima: Seco, soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes


Materiales: Arena, caucho, parche sintético.


Herramienta y equipo: Bisturí, pala, pisón, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

Se inician las obras en la cancha sur del municipio, donde se realizan las adecuaciones correspondientes en áreas severamente deterioradas. Como resultado, se eliminan un total de seis zonas afectadas. Dado que la condición climática es soleada, se procedió a la intervención y preparación del área para facilitar las labores de reparación el día siguiente.




Directora de obra


Residente de obra



2. Sábado 03 de mayo de 2025

Estado del clima: Seco, soleado

Personal del contratista:
Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, pisón, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

El clima óptimo para la correcta adecuación y parcheo de las zonas anteriormente dispuestas por lo que se puede dar por concluida la actividad necesaria para dar por terminada la adecuación de la grama sintética en la zona sur.



Paulette Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra



3. Domingo 04 de mayo de 2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, herramienta menor.

Actividades:

Se inicia trabajo en la cancha auxiliar 1 donde se procede al retiro total de la grama sintética el día es parcialmente nublado por lo que se avanza en porcentaje de un 50 %.

Nota: bajo responsabilidad de la Empresa Master, se trabaja los sábados y Domingos en horarios extendidos, sin que se responsabilice a la EDUR ni a la Administración Municipal.



Directora de obra

Residente de obra



4. Lunes 05 de mayo de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 Maestro de obra 8 ayudantes
Materiales:	Arena, caucho.
Herramienta y equipo:	Bisturí, pala, herramienta menor.
Actividades:	

Se finaliza con el retiro total de la grama sintética para el día lunes se deja toda la grama en un lugar donde no interrumpa el siguiente proceso el día es nublado, pero no hay precipitaciones por lo que se puede avanzar, que se deja para el día martes, para la correcta adecuación y nivelación del terreno.



Directora de obra

Residente de obra



5. Martes 06 de mayo de 2025

Estado del clima: Lluvioso

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, herramienta menor.

Actividades:

Se adecua y se nivela el terreno que sirve como base para la grama sintética para una correcta funcionalidad de desagües con sus respectivos niveles de desagüe para evitar encharcamientos, el día es lluvioso por lo que se dificulta la actividad y no nos permite terminar la misma por lo que se espera el día siguiente.



Directora de obra

Residente de obra



6. Miércoles 07 de mayo de 2025

Estado del clima: Lluvioso

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, herramienta menor.

Actividades:

Se finaliza con la nivelación no se procede con la actividad de ubicar la grama sintética ya que en el día se presenta gran afluencia de lluvia por lo que se dificulta la correcta instalación se deja para el día siguiente esperando un mejor clima.



Directora de obra

Residente de obra



7. Jueves 08 de mayo de 2025

Estado del clima: Lluvioso

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes


Materiales: Arena, caucho, sintético.


Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, herramienta menor.

Actividades:

Se inicia la actividad de ubicar y extender la grama sintética en el terreno previamente preparado, el día es lluvioso por lo que en intervalos en el transcurso del día se pueden realizar labores lo que conlleva a tener un rendimiento no muy alto por lo que no se es posible terminar con la actividad.




Directora de obra


Residente de obra



8. Viernes 09 de mayo de 2025

Estado del clima: Lluvioso

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho, sintético.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, herramienta menor.

Actividades:

Se logra finalizar con la actividad de instalación de la grama sintética, también se recibe materiales faltantes que son arena y caucho los que son muy importantes para la preservación y buen uso de la grama se dejan tapados con plástico ya que el día es muy lluvioso para evitar que se moje.



Directora de obra

Residente de obra



9. Sábado 10 de mayo de 2025

Estado del clima: Lluvioso

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho, sintético.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

Se procede a esparcir la arena en primer lugar para que esta haga de ancla para que la grama sintética no se mueva aproximadamente un centímetro de espesor, luego se empieza a esparcir el caucho el cual debe de ser en aproximadamente 3 centímetros especificados para una correcta instalación para que no haya un desgaste excesivo de las fibras, no se logra terminar con la actividad del caucho por el clima ya que es lluvioso.



Directora de obra

Residente de obra



10. Domingo 11 de mayo de 2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho, sintético.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

Se finaliza la con la actividad de esparcir el caucho y se reciben dos porterías nuevas a lo que se da por finalizada la auxiliar 1, consiguiente a la terminación se empiezan obras en auxiliar 2 la cual tiene muchos puntos focales de desgaste y se retiran zonas afectadas un total de 29 zonas el día es óptimo por lo que se logra avanzar rápidamente.

Nota: bajo responsabilidad de la Empresa Master, se trabaja los sábados y Domingos en horarios extendidos, sin que se responsabilice a la EDUR ni a la Administración Municipal.



Directora de obra

Residente de obra



11. Lunes 12 de mayo de 2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho, parche sintético.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

Se finalizan con las actividades de parcheo de la auxiliar 2 en su totalidad pudiendo así culminar con las actividades y poder proseguir con la cancha norte principal.



Directora de obra

Residente de obra



12. Martes 13 de mayo de 2025

Estado del clima: Nublado

Personal del contratista:
Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
8 ayudantes

Materiales: Arena, caucho, parche sintético.

Herramienta y equipo: Bisturí, pala, apisonador, nivel, cinta métrica, rastrillo, herramienta menor.

Actividades:

Se interviene la cancha sintética norte principal donde se identifican puntos a intervenir y se ase su correcta instalación así culminando labores.



Directora de obra

Residente de obra



13. Miércoles 14 de mayo de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 Maestro de obra 8 ayudantes
Materiales:	Arena, caucho, parche sintético.
Herramienta y equipo:	Escoba, recogedor, herramienta menor.
Actividades:	
Limpieza y aseo de las canchas intervenidas para su correcta entrega.	



Paulette Hernández Facimilla

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

14. Jueves 15 de mayo de 2025

Estado del clima: Nublado


Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No aplica.


Herramienta y equipo: Escoba, recogedor, herramienta menor.

Actividades:

Se realizó reunión de revisión de avances y seguimiento con la participación de los funcionarios de la EDUR y el contratista de obra; se revisó las actividades en ejecución, se expusieron las dudas sobre las intervenciones a realizar y se solicitó definir la prioridad de intervenciones con los recursos contractuales de la obra, además se solicitó el recibo parcial de las intervenciones realizadas a la fecha dado que los escenarios deportivos se encuentran en uso.



Directora de obra



Residente de obra



15. Viernes 16 de mayo de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------

Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
-----------------------	--------------------

Actividades:

Se realizó actividad de recorrido de campo y reconocimiento de campo en escenario deportivo denominado cancha norte.



Directora de obra

Residente de obra



16. Lunes 19 de mayo de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------

Herramienta y equipo:	Herramienta menor
-----------------------	-------------------

Actividades:

Se realizó actividad de recorrido de campo y reconocimiento de campo en escenario deportivo denominado cancha Sur.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra



17. Martes 20 de mayo de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 Maestro de obra
2 ayudantes

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: Taladro, herramienta menor

Actividades:

Se realiza el suministro, transporte e instalación de porterías múltiples de microfútbol y baloncesto.



Directora de obra

Residente de obra

18. Miércoles 21 de mayo de 2025

Estado del clima: Soleado


Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.


Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se realizó recorrido de campo con el equipo profesional de la entidad contratante y el contratista de obra para revisar las intervenciones realizadas en los escenarios deportivos, además de realizar la toma de medidas con entidad contratante.



Directora de obra



Residente de obra



19. Jueves 22 de mayo de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------

Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
-----------------------	--------------------

Actividades:

Se realiza visita en el sitio de intervención de obra con el representante legal del contratista de obra para revisar las intervenciones realizadas y proceder con la entrega a la entidad contratante.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra



20. Jueves 23 de mayo de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra


Materiales:	No Aplica.
-------------	------------


Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
-----------------------	--------------------

Actividades:

Se realiza recorrido de campo y revisión de las intervenciones realizadas en los escenarios deportivos, donde se observa material regado en cancha auxiliar norte.




Directora de obra


Residente de obra



21. Lunes 26 de mayo de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: Escoba, recogedor, herramienta menor.

Actividades:

Se realiza limpieza y se ejecuta el aseo de nuevo en la cancha auxiliar norte conforme los requerimientos de la entidad contratante para su entrega.



Directora de obra

Residente de obra



22. Martes mayo 27 de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------

Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
-----------------------	--------------------

Actividades:

Se realiza visita a la escuela ubicada en la vereda de Betania con la finalidad de identificar la placa deportiva que se requiere intervenir.



Directora de obra

Residente de obra



23. Miércoles mayo 28 de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica
-------------	-----------

Herramienta y equipo:	Herramienta menor
-----------------------	-------------------

Actividades:

Se realizan algunos ajustes y visita a los escenarios para corroborar estado de los sitios de intervención conforme mantenimientos realizados previamente.



Paulette Hernández Acuña

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra



24. Jueves mayo 29 de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza informes técnicos y proyección de acta de cobro de obra N°1 para su respectiva entrega a la entidad contratante

 Anexo_1_Doc_Contract

 Anexo_2_Corresp_Enviada

 Anexo_3_APU

 Anexo_4_Cronograma

 Anexo_5_Seg_Cronograma

 INFORME_TECNICO_01_20250530

 INFORME_TECNICO_01_20250530

Directora de obra

Residente de obra



25. Viernes, 30 de mayo de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se realiza informes técnicos y de seguridad y salud en el trabajo, se realiza mesa de trabajo para revisar cantidades de obra con el personal de campo y elaborar las memorias de cantidades que se requieren entregar a la entidad contratante, conforme las condiciones de contratación y de presentación de actas de cobro de obra.

Directora de obra

Residente de obra



26. Sábado, 31 de mayo de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se termina de elaborar los informes mensuales de obra para el componente técnico y de seguridad y salud en el trabajo para proceder a entregar a la entidad contratante conforme las condiciones establecidas por la entidad

Directora de obra

Residente de obra



27. Lunes, 02 de junio de 2025

Día festivo, no se realizan actividades.

Directora de obra

Residente de obra

28. Martes, 03 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza atención a observaciones del paquete entregado a la entidad contratante para la revisión del informe de avance técnico y de seguridad y salud en el trabajo, además se revisan las observaciones de los anexos suministrados para el acta de cobro de avance de obra N°1 a la entidad contratante.

Directora de obra

Residente de obra



29. Miércoles, 04 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continua con la actividad de atención a observaciones del paquete entregado a la entidad contratante para la revisión del informe de avance técnico y de seguridad y salud en el trabajo, además se atienden las observaciones de los anexos suministrados para el acta de cobro de avance de obra N°1 a la entidad contratante con la finalidad de realizar el cobro de las actividades ejecutadas a la fecha.

Directora de obra

Residente de obra

30. Jueves, 05 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra



Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza el acta de cambio de obra conforme las actividades mayores y menores que se evidenciaron en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las cantidades realmente ejecutadas en campo según los requerimientos de la entidad contratante, por ende, se realiza respectiva documentación para la revisión y entrega a la entidad contratante.

Directora de obra

Residente de obra

31. Viernes, 06 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza radicación del acta de cobro de obra N°1 en la página oficial del Secop II definido por la entidad contratante para la gestión y cobro de las actas de avance de obra, además de incluir los respectivos anexos requeridos para el trámite contractual.

Directora de obra

Residente de obra



32. Lunes, 09 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza revisión de las obras extra que se han generado o se requieren en el desarrollo del contrato para realizar las actividades que hacen parte del alcance contractual, con la finalidad de realizar la respectiva solicitud de revisión y aceptación ante la entidad competente.

Directora de obra

Residente de obra

33. Martes, 10 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza revisión de los alcances contractuales con la finalidad de solicitar a la entidad contratante la definición de las instituciones a intervenir conforme los ítems



contractuales, cantidades y requerimientos de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los plazos contractuales y los recursos pendientes por ejecutar.

Directora de obra

Residente de obra

34. Miércoles, 11 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	No Aplica
Actividades:	

Se continúa con la revisión de los alcances contractuales, se realiza reunión interna entre el equipo profesional con la finalidad de solicitar a la entidad contratante la definición de las instituciones a intervenir conforme los ítems contractuales, cantidades y requerimientos de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta los plazos contractuales y los recursos pendientes por ejecutar.

Directora de obra

Residente de obra

35. Jueves, 12 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra



Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza cotizaciones con diferentes empresas que realizan la elaboración, suministro y transporte de elementos contractuales por ejecutar como lo son:

- Malla en nylon
- Tableros de baloncesto
- Porterías integradas de microfútbol y baloncesto

Directora de obra

Residente de obra

36. Viernes, 13 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa con la consulta de empresas y cotizaciones para la fabricación y suministro de actividades contractuales del proyecto, correspondientes a las porterías integradas, tableros de baloncesto, malla en nylon para cerramiento, pintura tipo tráfico para demarcación de los escenarios deportivos.

Directora de obra

Residente de obra



37. Lunes, 16 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa con la consulta de empresas y cotizaciones para la fabricación y suministro de actividades contractuales del proyecto, correspondientes a las porterías integradas, tableros de baloncesto, malla en nailon para cerramiento, pintura tipo tráfico para demarcación de los escenarios deportivos.

Directora de obra

Residente de obra

38. Martes, 17 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa con la consulta de empresas y cotizaciones para la fabricación y suministro de actividades contractuales del proyecto, correspondientes a las



porterías integradas, tableros de baloncesto, malla en nailon para cerramiento, pintura tipo tráfico para demarcación de los escenarios deportivos.

Directora de obra

Residente de obra

39. Miércoles, 18 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------

Herramienta y equipo:	No Aplica
-----------------------	-----------

Actividades:

Se solicita visita técnica a los sitios de fabricación de elementos correspondientes a escenarios deportivos requeridos en los ítems contractuales para revisar condiciones de ejecución, plazos de entrega y revisar cierre económico y contratar la fabricación de elementos.

Directora de obra

Residente de obra

40. Jueves, 19 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra

Materiales:	No Aplica.
-------------	------------



Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa solicitando visita técnica a los sitios de fabricación de elementos correspondientes a escenarios deportivos requeridos en los ítems contractuales para revisar condiciones de ejecución, plazos de entrega y revisar cierre económico y contratar la fabricación de elementos.

Directora de obra

Residente de obra

41. Viernes, 20 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa solicitando visita técnica a los sitios de fabricación de elementos correspondientes a escenarios deportivos requeridos en los ítems contractuales para revisar condiciones de ejecución, plazos de entrega y revisar cierre económico y contratar la fabricación de elementos.

Directora de obra

Residente de obra



42. Lunes, 23 de junio de 2025

No se realizan actividades por ser día festivo.

Directora de obra

Residente de obra

43. Martes, 24 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	No Aplica

Actividades:

Se solicita reunión con la supervisión de la entidad contratante con la finalidad de revisar el balance del contrato, las cantidades contractuales y los sitios de intervención para dar trámite a las actividades pendientes por ejecutar en el plazo restante de la obra.

Directora de obra

Residente de obra

44. Miércoles, 25 de junio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	No Aplica
Actividades:	

Se realiza capacitación con el personal de campo para realizar reinducciones y revisar condiciones seguras de trabajo, implementación adecuada de los elementos de protección personal y planes de emergencia en obra.



Paulette Fernanda Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



45. Jueves, 26 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se continúa solicitando reunión con la supervisión del contrato de obra, con la finalidad de definir las actividades de intervención, los sitios de trabajo, las sedes establecidas para realizar la instalación de los elementos pertenecientes a las porterías integradas por suministrar.

Directora de obra

Residente de obra

46. Viernes, 27 de junio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza balance de obra teniendo en cuenta las cantidades contractuales ejecutadas en los ítems iniciales de intervención correspondientes a las gramas sintéticas y reparcheo de los escenarios deportivos, donde se identificó que algunas



cantidades superaron los costos inicialmente contemplados por la entidad contratante, por ende, es necesario replantear algunas actividades pendientes por ejecutar para ser aclarados los sitios de intervención, su necesidad y aclarar las cantidades finales a intervenir.

Directora de obra

Residente de obra

47. Lunes, 30 de junio de 2025

No se realizan actividades dado que es un día festivo.

Directora de obra

Residente de obra

48. Martes, 01 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	No Aplica
Actividades:	

Se realiza revisión de las cantidades de ejecución pendientes por realizar y se propone a la entidad contratante la ejecución de las demarcaciones, instalación de tableros y suministro de porterías integradas, con la finalidad de avanzar en las actividades contractuales, dado que se alerta el plazo restante de obra correspondiente a 2 meses para la terminación y entrega de las actividades ejecutadas.

Directora de obra

Residente de obra



49. Miércoles, 02 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza visita a las empresas donde se realiza la fabricación de las porterías integradas y tableros de baloncesto conforme lo establecido por la entidad contratante.

Directora de obra

Residente de obra

50. Jueves, 03 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza cotización de las lámparas a instalar en las canchas principales del municipio para realizar instalación de las luminarias establecidas en los ítems contractuales.

Directora de obra

Residente de obra



51. Viernes, 04 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza comunicación con la entidad contratante para solicitar definir los intervenciones en los escenarios deportivos y así mismo proceder con las actividades en campo dentro de los plazos contractuales.

Directora de obra

Residente de obra

52. Lunes, 07 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se realiza reunión con la entidad contratante para realizar revisión del balance de obra y definir las actividades a ejecutar en cada escenario deportivo, además se realizó recorrido de campo para socializar las intervenciones en las sedes propuestas y definidas por el contratante.


Directora de obra

Residente de obra

53. Martes, 08 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra
Materiales:	No Aplica.
Herramienta y equipo:	No Aplica
Actividades:	

Se realiza visita en sitio de fabricación de porterías integradas para revisar estado de avance de fabricación, materiales y plazos de intervención.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra



54. Miércoles, 09 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra

Materiales: No Aplica.

Herramienta y equipo: No Aplica

Actividades:

Se recibió los materiales e insumos necesarios para realizar la instalación de luminarias en los escenarios deportivos principales de la cancha municipal (Norte), por ende, se realiza la gestión necesaria para proceder con la instalación de dichos elementos en campo.

Directora de obra

Residente de obra

55. Jueves, 10 de julio de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
2 ayudantes

Materiales: Luminarias

Herramienta y equipo: Herramienta menor, señalización, líneas de vida, equipo de trabajo seguro en alturas.

Actividades:

Se realizó retiro de luminaria existente en la cancha municipal principal (Norte) con la finalidad de realizar la instalación de las luminarias suministradas en el objeto y



alcance del presente contrato con la finalidad de atender las deficiencias existentes de iluminación en la sede por el no funcionamiento de las luminarias existentes.



Directora de obra

Residente de obra

56. Viernes, 11 de julio de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 oficial 2 ayudantes
Materiales:	Luminarias
Herramienta y equipo:	Herramienta menor, señalización, líneas de vida, equipo de trabajo seguro en alturas.

Actividades:

Se continuó con la actividad de retiro de luminaria existente en la cancha municipal principal (Norte) con la finalidad de realizar la instalación de las luminarias suministradas en el objeto y alcance del presente contrato con la finalidad de atender las deficiencias existentes de iluminación en la sede por el no funcionamiento de las luminarias existentes.



Paulette Heredia Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra

57. Lunes, 14 de julio de 2025

Estado del clima:

Nublado

Personal del contratista:

Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial



2 ayudantes

Materiales:

Luminarias

Herramienta y equipo:

Herramienta menor.

Actividades:

Se realizó visita al taller donde se encuentra en fabricación las porterías integradas para ser instaladas en los escenarios deportivos definidos por la entidad contratante.



Paulette Heredia Facimilla

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra




58. Martes, 15 de julio de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 oficial 2 ayudantes
Materiales:	Luminarias
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Actividades:

Se realizó revisión del funcionamiento de las luminarias instaladas en la cancha municipal conforme los requerimientos de la entidad contratante

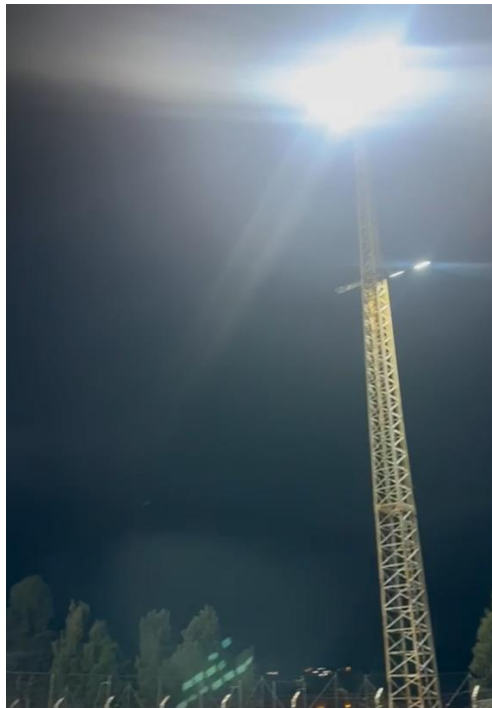

Paulette Heronza Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra



59. Miércoles, 16 de julio de 2025

Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 oficial 2 ayudantes
Materiales:	Luminarias
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Actividades:

Se realizó compra y suministro de pintura para realizar demarcación de los escenarios deportivos, conforme lo definido por la entidad contratante de las sedes a intervenir, además de cumplir con los colores establecidos por la entidad contratante.

Directora de obra

Residente de obra

60. Jueves, 17 de julio de 2025


Estado del clima:	Nublado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 1 oficial 2 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.



Actividades:

Se realizó compra y suministro de pintura para realizar demarcación de los escenarios deportivos, conforme lo definido por la entidad contratante de las sedes a intervenir, además de cumplir con los colores establecidos por la entidad contratante.


Directora de obra


Residente de obra

61. Viernes, 18 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza limpieza de cunetas en el sitio de intervención, dando inicio en el escenario deportivo de las Garzonas. Posteriormente se continua con la instalación de cinta de enmascarar para delimitar las líneas, los colores, los espesores.

Se realiza el inicio de aplicación de pintura tipo tráfico en la demarcación de los escenarios deportivos en la sede las Garzonas.

Se realiza comité de seguimiento de obra conforme lo solicitado por la supervisión del contrato para socializar los avances de obra y definir las sedes de intervención según cantidades y actividades pendientes por ejecutar.



Paulette Heredia Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

62. Lunes, 21 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se continua con la actividad de rocería y limpieza de cunetas perimetrales de los escenarios deportivos en intervención.

Se realiza la continuidad en la instalación de cinta de enmascarar para realizar delimitación de espesores de las líneas, demarcación y guía de trabajo.

Se continúa realizando la aplicación de pintura tipo tráfico en los escenarios deportivos de intervención definidos por la entidad contratante.



Paulette Heredia Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

63. Martes, 22 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se continua con la actividad de rocería y limpieza de cunetas perimetrales de los escenarios deportivos en intervención.



Se realiza la continuidad en la instalación de cinta de enmascarar para realizar delimitación de espesores de las líneas, demarcación y guía de trabajo.

Se continúa realizando la aplicación de pintura tipo tráfico en los escenarios deportivos de intervención definidos por la entidad contratante.



Paulette Fernanda Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra


64. Miércoles, 23 de julio de 2025

Estado del clima:	Soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Actividades:

Se continua con la actividad de rocería y limpieza de cunetas perimetrales de los escenarios deportivos en intervención. Se realiza la continuidad en la instalación de cinta de enmascarar para realizar delimitación de espesores de las líneas, demarcación y guía de trabajo. Se continúa realizando la aplicación de pintura tipo tráfico en los escenarios deportivos de intervención definidos por la entidad contratante.




Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

65. Jueves, 24 de julio de 2025

Estado del clima:

Soleado



Personal del contratista:

- Directora de obra
- Residente de obra
- Profesional SST de obra
- 2 oficial
- 3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Se continuó con la actividad de rocería y limpieza de cunetas perimetrales de los escenarios deportivos en intervención. Se realiza la continuidad en la instalación de cinta de enmascarar para realizar delimitación de espesores de las líneas, demarcación y guía de trabajo. Se continúa realizando la aplicación de pintura tipo tráfico en los escenarios deportivos de intervención definidos por la entidad contratante.



Paulette Hernández Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



66. Viernes, 25 de julio de 2025

Estado del clima:	Seco - soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Se realiza la gestión para las intervenciones de los escenarios deportivos la siguiente semana según las condiciones de las canchas, disponibilidad de los encargados de cada sede y horarios disponibles.

Directora de obra

Santiago Ossa E.

Residente de obra

67. Lunes, 28 de julio de 2025

Estado del clima:	Seco - soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Se continúa con la gestión para las intervenciones de los escenarios deportivos la siguiente semana según las condiciones de las canchas, disponibilidad de los encargados de cada sede y horarios disponibles.

Directora de obra

Santiago Ossa E.

Residente de obra



68. Martes, 29 de julio de 2025

Estado del clima:	Seco - soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Se realiza revisión de los esquemas de medidas de intervención realizados por el personal de la obra conforme las demarcaciones que se han ejecutado en campo, además de tener en cuenta la normatividad en el tema.



Paulette Heredia Acosta
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



69. Miércoles, 30 de julio de 2025

Estado del clima:	Seco - soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza revisión de los escenarios deportivos por intervenir, donde se identifico que varios de los sitios definidos, no cuentan con las condiciones mínimas de intervención; se encontró placas en completo deterioro de la losa de concreto lo cual inviabiliza la aplicación de la pintura en la demarcación, por ejemplo el escenario deportivo de Aguas Claras.



Paulette Fernanda Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



70. Jueves, 31 de julio de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la revisión de los escenarios deportivos por intervenir, donde se identificó que varios de los sitios definidos, no cuentan con las condiciones mínimas de intervención; se encontró placas en completo deterioro de la losa de concreto lo cual inviabiliza la aplicación de la pintura en la demarcación.



Paulette Fernanda Pacimilla
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra

71. Viernes, 01 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la revisión de los escenarios deportivos por intervenir, donde se identificó que varios de los sitios definidos, no cuentan con las condiciones mínimas de intervención; se encontró placas en completo deterioro de la losa de concreto lo cual inviabiliza la aplicación de la pintura en la demarcación.

Además, se continua con la actividad de aplicación de pintura en las placas de intervención para actividades de demarcación en el escenario deportivo de La Florida.



Paulette Heredia Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

72. Lunes, 04 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Camargo, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa. Además, se realiza inducciones y capacitaciones con el personal de obra que participa en los sitios de intervención.



Paulette Hernández Arcinilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

73. Martes, 05 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Camargo, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa



Paulette Heredia Paemilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

74. Miércoles, 06 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza visita al taller de fabricación de las porterías integradas para revisar avances, plazos y fechas de entregas en obra.



Paulette Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra



75. Jueves, 07 de agosto de 2025

No se realiza actividades, día festivo.

Paulette Hernández Acuña

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

76. Viernes, 08 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista:
Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza transporte de porterías integradas a los sitios de instalación definidos por la entidad contratante. Además, se realiza la demarcación de la placa deportiva en el escenario denominado como Marco Tulio.



Paulette Hernández Acuña

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

77. Lunes, 11 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Guamito, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa



Francette Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra



78. Martes, 12 de agosto de 2025

Estado del clima:	Seco - soleado
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se realiza la instalación de porterías integradas en el escenario deportivo denominado Las Garzonas.



Paulette Hernández Acuña
Directora de obra



Santiago Ossa E.
Residente de obra

79. Miércoles, 13 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se realiza comité de seguimiento de obra en las instalaciones de la entidad contratante, donde se revisan los avances de la obra, se revisan las cantidades ejecutadas en obra, se solicita la presentación del acta de cobro de obra N°2 con los respectivos anexos, además de incluir el acta de cambio de obra N°2.



Paulette Hernández Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



80. Jueves, 14 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continua con la preparación de la superficie, limpieza de cunetas, instalación de cinta de enmascarar y finalmente la aplicación de pintura tipo tráfico para escenarios deportivos.



Paulette Hernández Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra



81. Viernes, 15 de agosto de 2025

Estado del clima: Seco - soleado

Personal del contratista:

- Directora de obra
- Residente de obra
- Profesional SST de obra
- 2 oficial
- 3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Cristo Rey, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa




 Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

82. Lunes, 18 de agosto de 2025

Estado del clima:	Lluvioso- frio
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Marco Tulio, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa



Paulette Heredia Facimilla
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

83. Martes, 19 de agosto de 2025

Estado del clima: Lluvioso- frio

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico

Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo de Marco Tulio, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa. Se realizó ingreso de porterías integradas para ser ubicadas en los escenarios deportivos de las sedes de intervención. Se realizó preparación de la superficie, excavación, limpieza, instalación de refuerzo para vaciado de placa deportiva en portería integrada, según necesidad de la entidad contratante y el escenario deportivo.



Paulette Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra

84. Miércoles, 20 de agosto de 2025

Estado del clima:	Lluvioso- frio
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se realizó el retiro y desinstalación de tablero existente en el escenario deportivo de Villa María los cuales fueron acopiados al costado de la placa para ser dispuestos por la secretaria de deportes o quien se designe para su disposición final.



Raquel Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa G.
Residente de obra

85. Jueves, 21 de agosto de 2025

Estado del clima: Lluvioso- frio

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
2 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura tipo tráfico


Herramienta y equipo: Herramienta menor.

Actividades:

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa. Se realizó ingreso de porterías integradas para ser ubicadas en los escenarios deportivos de las sedes de intervención. Se realizó preparación de la superficie, excavación, limpieza, instalación de refuerzo para vaciado de placa deportiva en portería integrada, según necesidad de la entidad contratante y el escenario deportivo.



Paulette Heronza Acuña
Directora de obra

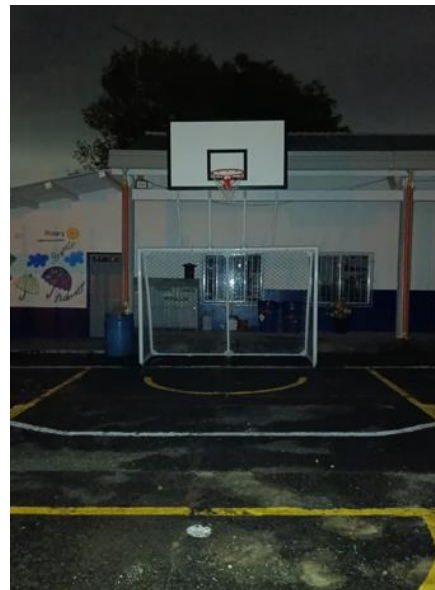

Santiago Ossa G.
Residente de obra



86. Viernes, 22 de agosto de 2025

Estado del clima:	Lluvioso- frio
Personal del contratista:	Directora de obra Residente de obra Profesional SST de obra 2 oficial 3 ayudantes
Materiales:	Pintura tipo tráfico
Herramienta y equipo:	Herramienta menor.
Actividades:	

Se continuó realizando la actividad de preparación de la superficie y aplicación de pintura para la intervención en la demarcación del escenario deportivo, además de realizar la limpieza de cunetas perimetrales de la placa. Se realizó ingreso de porterías integradas para ser ubicadas en los escenarios deportivos de las sedes de intervención. Se realizó preparación de la superficie, excavación, limpieza, instalación de refuerzo para vaciado de placa deportiva en portería integrada, según necesidad de la entidad contratante y el escenario deportivo.



Paulette Hernández Acuña
Directora de obra

Santiago Ossa E.
Residente de obra

Lunes, 25 de agosto de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
2 ayudantes


Materiales: Tubos redondo de pulgada y media de 3 mm

Herramienta y equipos: Herramienta menor

Actividades:

Se procedió al des anclaje de las porterías del escenario deportivo El Progreso, realizando el retiro de manera cuidadosa para evitar daños en la estructura. Posteriormente, las porterías fueron cargadas y transportadas al taller de trabajo, donde se llevará a cabo la fabricación e instalación de las arañas que no tenían, con el objetivo de que mejore su seguridad a la hora de instalación de los tableros.




Directora de obra



Santiago Ossa G.
Residente de obra

Mates, 26 de agosto de 2025

Estado del clima: Sol y nubes

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Malla – Guaya


Herramienta y equipos: Malacate, taladro percutor, sisalla, escalera, arnés, llave boca fija y herramienta menor.

Actividades:

Se procede a la instalación de malla de nylon en la parte trasera de las porterías, utilizando guaya para darle la tensión adecuada y asegurar su correcta sujeción. Esta instalación tiene como objetivo crear una barrera física que evite que los balones salgan del área de juego, protegiendo a los espectadores, transeúntes y propiedades circundantes, y garantizando mayor seguridad en el escenario deportivo.



Paulette Hernández Facimilla
Directora de obra

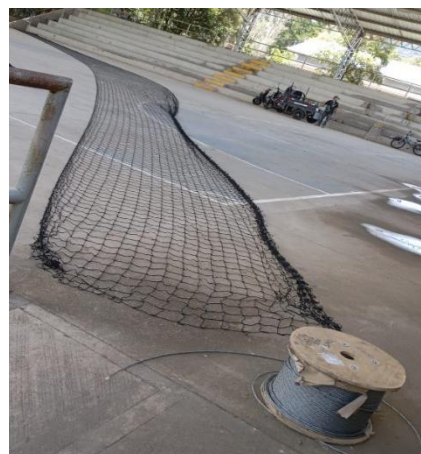

Santiago Ossa G.
Residente de obra

Martes, 27 de agosto de 2025

Estado del clima: Soleado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes


Materiales: 2 tableros en fibra de vidrio

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se realizó intervención en la cancha de la Escuela de Dos Quebradas, se trabajó en la instalación de dos tableros de baloncesto en fibra de vidrio. Debido a la ubicación del lugar y las dificultades de acceso, los tableros fueron transportados en mulas para garantizar su llegada en buen estado. Esta situación generó un leve retraso en la ejecución de la actividad, sin embargo, la instalación se llevó a cabo de manera correcta, quedando los tableros en condiciones óptimas para su uso por parte de la comunidad.




Directora de obra



Santiago Ossa G.
Residente de obra

Viernes, 29 de agosto de 2025

Estado del clima: Soleado


Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: 2 tableros en fibra de vidrio

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Con las arañas ya fabricadas e instaladas, se procedió al traslado de las porterías hacia el escenario deportivo El Progreso. En el lugar, se realizó el montaje de los tableros en fibra de vidrio y se efectuó el anclaje de las estructuras para garantizar mayor seguridad y estabilidad durante su uso. Esta actividad permitió dejar las porterías completamente funcionales y listas para el desarrollo de las prácticas deportivas.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Estado del clima: Nublado



Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: 16 ruedas de naylon con tenedor y freno


Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se procedió al desmontaje de las ruedas de las estructuras de baloncesto que se encontraban en mal estado en el polideportivo. Posteriormente, se instalaron ruedas nuevas, dejando las estructuras en perfectas condiciones de rodamiento y eliminando el problema de atascamiento. Con esta intervención se facilita su movilidad y se asegura un uso más seguro y eficiente en el escenario deportivo.

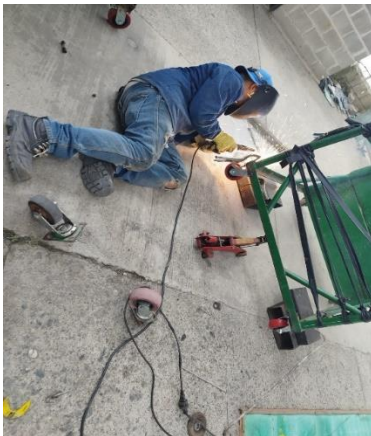

Directora de obra



Residente de obra

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Estado del clima: Sol y nubes

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: 2 tableros en fibra de vidrio

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se realizó el montaje e instalación de dos tableros de baloncesto en fibra de vidrio, junto con sus respectivos aros y mallas. Una vez finalizada la instalación, los tableros quedaron completamente funcionales y listos para su uso, garantizando condiciones adecuadas para la práctica deportiva.



Paulette Heredia Acuña

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

Martes, 9 de septiembre de 2025

Estado del clima: Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes


Materiales: Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto),
pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Llaves de impacto, taladro percutor, cinta métrica,
equipo de soldadura.


Actividad:

Se inició con la verificación del punto de instalación en la vereda BETANIA según la ubicación establecida, posteriormente, se realizó la limpieza del terreno. Los integrados (estructura metálica que combina portería y tablero de baloncesto) fueron ensamblados en sitio, realizando la unión de sus componentes mediante pernos y soldaduras puntuales de refuerzo.

Una vez ensamblados, se ejecutó la fijación al concreto mediante pernos de anclaje mecánicos y se verificó la alineación de cada estructura, finalmente, se aplicó pintura de acabado anticorrosivo para proteger la estructura metálica.



Directora de obra



Residente de obra

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Estado del clima: Parcialmente Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes


Materiales: Pintura acrílica para exteriores (colores: blanco, amarillo), disolvente, cinta de enmascarar.

Herramienta y equipos: Brochas, escobas, cinta métrica, cuerda de nylon

Actividad:

Se realiza la actividad en la vereda CAMARGO, se inicia con la limpieza de la superficie de la placa, retirando el polvo, residuos y material suelto mediante escobas, posteriormente se procedió al trazo y nivelación de las líneas de juego con el apoyo de la cinta métrica.

Una vez se verificó el trazo, se aplicó la pintura acrílica para exteriores de alto tráfico en los colores correspondientes a cada disciplina deportiva, se realizaron dos capas de pintura para mejorar la durabilidad y visibilidad de las líneas.



Directora de obra

Santiago Ossa E.

Residente de obra

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Estado del clima: Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes



Materiales: Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto),
pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Llaves de impacto, taladro percutor, cinta métrica,
equipo de soldadura.

Actividad:

Se inició con la verificación del punto de instalación en la vereda CRISTO REY según la ubicación establecida, posteriormente, se realizó la limpieza del terreno. Los integrados (estructura metálica que combina portería y tablero de baloncesto) fueron ensamblados en sitio, realizando la unión de sus componentes mediante pernos y soldaduras puntuales de refuerzo.

Una vez ensamblados, se ejecutó la fijación al concreto mediante pernos de anclaje mecánicos y se verificó la alineación de cada estructura, finalmente, se aplicó pintura de acabado anticorrosivo para proteger la estructura metálica.

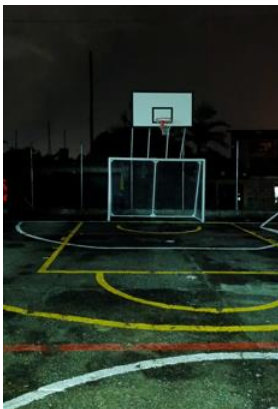

Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

Lunes, 15 de septiembre de 2025

Estado del clima: Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Tableros de fibra de vidrio, aros, pernos de anclaje, tuercas y arandelas.


Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)


Actividad:

Se realiza la instalación en la vereda DOS QUEBRADAS, se realiza la limpieza y preparación de la superficie para la instalación de los nuevos tableros, verificando su verticalidad.

Los nuevos tableros fueron colocados y fijados mediante pernos de anclaje y tuercas de seguridad, asegurando una correcta rigidez y alineación con respecto al aro reglamentario finalmente, se efectuó la inspección visual del conjunto.




Directora de obra


Residente de obra



Martes, 16 de septiembre de 2025

Estado del clima: Parcialmente Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Tableros de fibra de vidrio, aros, pernos de anclaje, tuercas y arandelas.

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se realiza la instalación en la placa deportiva de EL PROGRESO, se realiza la limpieza y preparación de la superficie para la instalación de los nuevos tableros, verificando su verticalidad.

Los nuevos tableros fueron colocados y fijados mediante pernos de anclaje y tuercas de seguridad, asegurando una correcta rigidez y alineación con respecto al aro reglamentario finalmente, se efectuó la inspección visual del conjunto.



Directora de obra

Santiago Ossa E.

Residente de obra

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Estado del clima: Despejado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura acrílica para exteriores (colores: blanco, amarillo), disolvente, cinta de enmascarar, Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto), pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Brochas, cinta, taladro percutor, martillo, equipo de soldadura.

Actividad:

Se inicia con la limpieza general de la superficie en la vereda LAS GARZONAS, posteriormente se efectuó la verificación de las áreas para la demarcación, marcando las líneas reglamentarias, una vez definido el trazo se procedió a la aplicación de la pintura.

En paralelo, se adelantó la instalación de los integrados deportivos (portería + tablero de baloncesto). Se verificó la ubicación de los puntos de anclaje y se realiza el ensamble en sitio ajustando cada componente. Con la finalización de ambas actividades, las placas quedaron debidamente demarcadas, funcionales y equipadas, cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la práctica deportiva.



Paulette Heredia Acuña

Directora de obra



Santiago Ossa G.

Residente de obra



Jueves, 18 de septiembre de 2025

Estado del clima: Despejado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura acrílica para exteriores (colores: blanco, amarillo), disolvente, cinta de enmascarar.

Herramienta y equipos: Brochas, escobas, cinta métrica, cuerda de nylon

Actividad:

Se realiza la actividad en la vereda GUAMITO, se inicia con la limpieza de la superficie de la placa, retirando el polvo, residuos y material suelto mediante escobas, posteriormente se procedió al trazo y nivelación de las líneas de juego con el apoyo de la cinta métrica.

Una vez se verificó el trazo, se aplicó la pintura acrílica para exteriores de alto tráfico en los colores correspondientes a cada disciplina deportiva, se realizaron dos capas de pintura para mejorar la durabilidad y visibilidad de las líneas.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Estado del clima: Despejado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes


Materiales: Pintura acrílica para exteriores (colores: blanco, amarillo), disolvente, cinta de enmascarar, Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto), pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Brochas, cinta, taladro percutor, martillo, equipo de soldadura.

Actividad:

Se inicia con la limpieza general de la superficie en la vereda LA FLORIDA, posteriormente se efectuó la verificación de las áreas para la demarcación, marcando las líneas reglamentarias, una vez definido el trazo se procedió a la aplicación de la pintura.

En paralelo, se adelantó la instalación de los integrados deportivos (portería + tablero de baloncesto). Se verifico la ubicación de los puntos de anclaje y se realiza el ensamble en sitio ajustando cada componente. Con la finalización de ambas actividades, las placas quedaron debidamente demarcadas, funcionales y equipadas, cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la práctica deportiva.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra



Martes, 23 de septiembre de 2025

Estado del clima: Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto),
pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Llaves de impacto, taladro percutor, cinta métrica,
equipo de soldadura.

Actividad:

Para la vereda LA MADERA, se procede de las estructuras metálicas correspondientes a los integrados deportivos fueron cargadas y transportadas hasta el taller de trabajo, donde se programó la fabricación e instalación de las arañas de soporte que no estaban incorporadas originalmente,

Esta adecuación tiene como finalidad reforzar la estructura y mejorar la estabilidad y seguridad para la posterior instalación de los integrados en campo.

Directora de obra

Residente de obra

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Estado del clima: Despejado

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Pintura acrílica para exteriores (colores: blanco, amarillo), disolvente, cinta de enmascarar, Integrado metálico (portería + tablero de baloncesto), pernos de anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva.

Herramienta y equipos: Brochas, cinta, taladro percutor, martillo, equipo de soldadura.

Actividad:

Se inicia con la limpieza general de la superficie en la placa deportiva de la institución educativa MRCO TULIO, posteriormente se efectuó la verificación de las áreas para la demarcación, marcando las líneas reglamentarias, una vez definido el trazo se procedió a la aplicación de la pintura.

En paralelo, se adelantó la instalación de los integrados deportivos (portería + tablero de baloncesto). Se verifico la ubicación de los puntos de anclaje y se realiza el ensamble en sitio ajustando cada componente. Con la finalización de ambas actividades, las placas quedaron debidamente demarcadas, funcionales y equipadas, cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la práctica deportiva.



Paulette Hernández Acuña

Directora de obra



Santiago Ossa E.

Residente de obra



Lunes, 29 de septiembre de 2025

Estado del clima: Parcialmente Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes

Materiales: Tableros de fibra de vidrio, aros, pernos de anclaje, tuercas y arandelas.

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se realiza la instalación en la placa deportiva de POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, se realiza la limpieza y preparación de la superficie para la instalación de los nuevos tableros, verificando su verticalidad.

Los nuevos tableros fueron colocados y fijados mediante pernos de anclaje y tuercas de seguridad, asegurando una correcta rigidez y alineación con respecto al aro reglamentario finalmente, se efectuó la inspección visual del conjunto.



Directora de obra

Santiago Ossa G.

Residente de obra

Martes, 30 de septiembre de 2025

Estado del clima: Parcialmente Nublado, sin afectaciones a la ejecución de la actividad.

Personal del contratista: Directora de obra
Residente de obra
Profesional SST de obra
1 oficial
3 ayudantes



Materiales: Tableros de fibra de vidrio, aros, pernos de anclaje, tuercas y arandelas.

Herramienta y equipos: Equipo de soldadura, caretas, andamios, arnés, equipo de seguridad, herramienta menor (taladro, pulidora, llaves, etc.)

Actividad:

Se realiza la instalación en la placa deportiva de VILLA MARIA, se realiza la limpieza y preparación de la superficie para la instalación de los nuevos tableros, verificando su verticalidad.

Los nuevos tableros fueron colocados y fijados mediante pernos de anclaje y tuercas de seguridad, asegurando una correcta rigidez y alineación con respecto al aro reglamentario finalmente, se efectuó la inspección visual del conjunto.

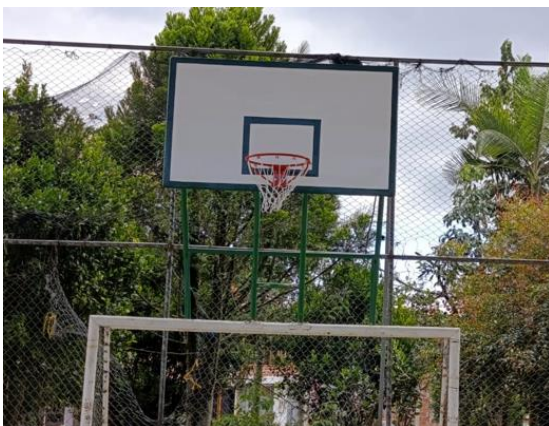

Directora de obra

Santiago Ossa E.

Residente de obra
