


02 de febrero de 2022 (Miércoles)

Actividad: Se realiza visita y recorrido del proyecto por parte de la interventoría, funcionarios de la territorial de INVIAS, Contratistas y personal de secretaría de planeación e infraestructura del municipio de cerete, Previa a la entrega de la documentación del contrato, pólizas, aprobación de pólizas registro presupuestal y acta de inicio por parte del municipio, Posteriormente se realiza reunión técnica inicial para fijar los compromisos del contratista e interventoría para poder dar comienzo con los trabajos.

Nota: El día 31 de enero de 2022 se firma acta de inicio del Proyecto que tiene como objeto: Construcción de pavimento rígido de la vía que comunica la Vereda San Antonio - El cedro Corregimiento de Tabolargo municipio de cerete departamento de Córdoba.

DAVID LOO CASTRO -

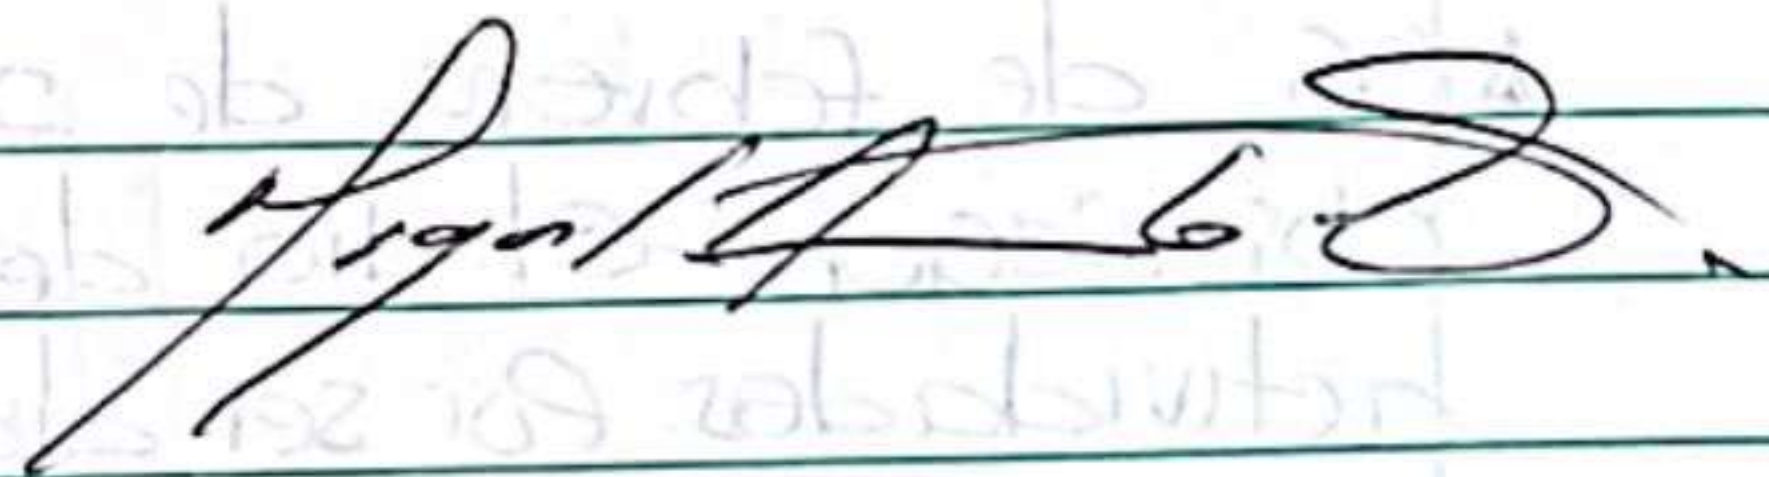

03 de febrero de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco


Personal en obra: Trabajador Social

Equipos: Ninguno

Actividad: El contratista inicia con la realización de las actas de Vecindad

- El contratista se encuentra en la revisión y/o ajustes a estudios y diseños.

DAVID LOO CASTRO -

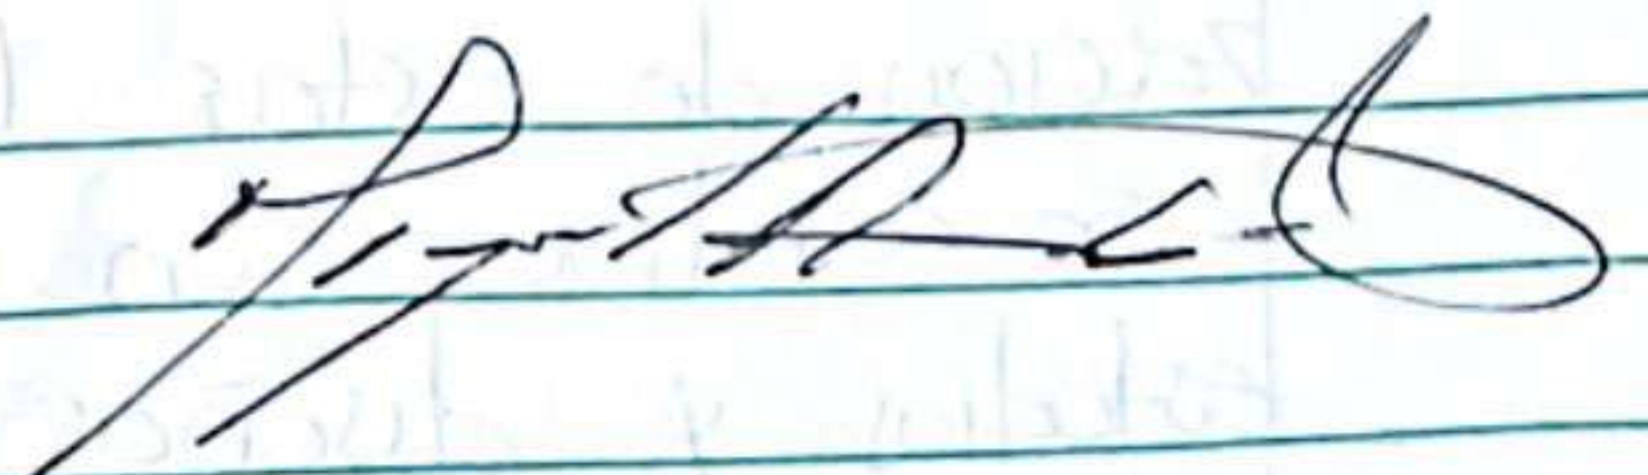

04 de febrero de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco


Personal en obra: Trabajador Social

▲ Equipo en obra: Ninguno

Actividad en obra: El contratista continua con la realizacion de las actas de Vecindad.

- Se continua con la revision y/o ajustes a estudios y diseños.

DAVID FOO CASTRO-

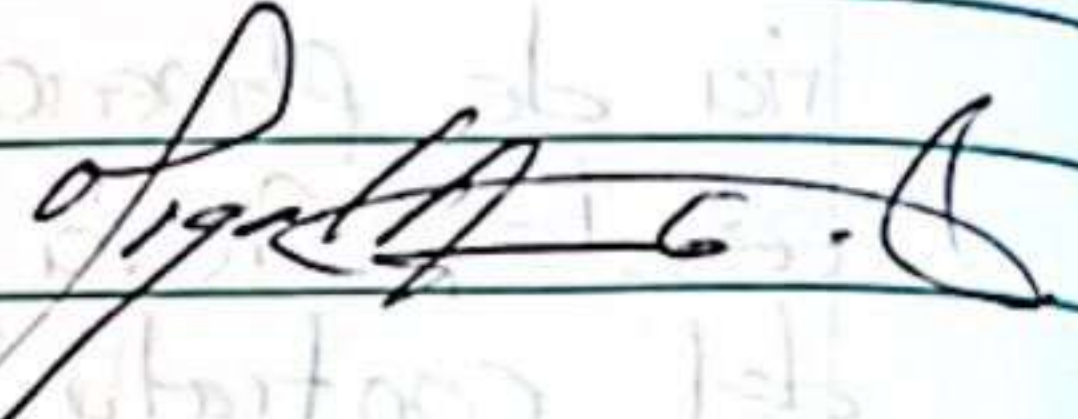

▲ 05 de febrero de 2022 (Sabado)

▲ Estado del tiempo: seco


▲ Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: Se continua con la realizacion de las actas de Vecindad.

- Se continua con la revision y/o ajustes a estudios y diseños.

▲ Equipo en obra: Ninguno.


DAVID FOO CASTRO-



▲ 06 de febrero de 2022 (Domingo)

Observación: El día de hoy no se realizaron actividades. Por ser domingo

DAVID FOO CASTRO-

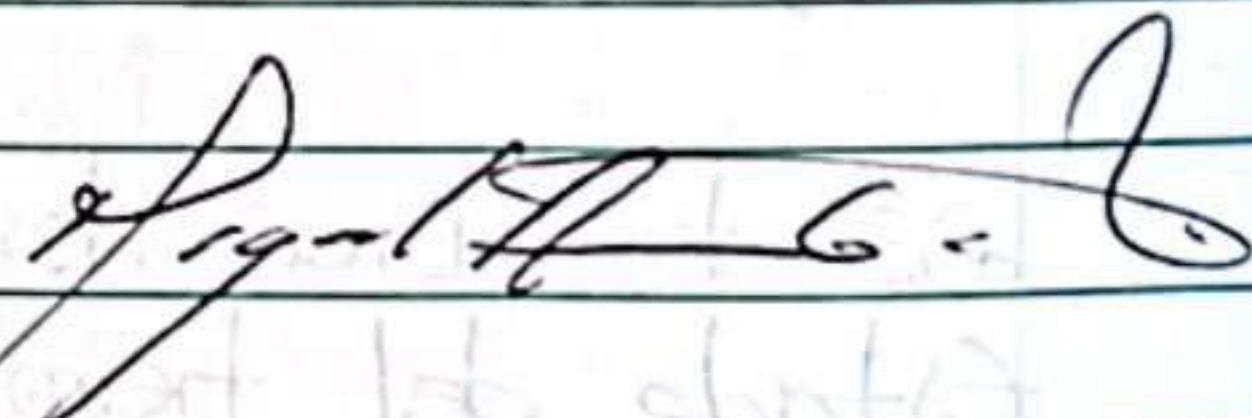

▲ 07 de febrero de 2022 (Lunes)

▲ Estado del tiempo: seco.

▲ Equipo en obra: Herramientas menores.

▲ Personal en obra: Trabajador social.

Comision Topografica (3).

▲ Actividad en obra: Se continua con la realizacion de actas de Vecindad.

- Se continua con la revision y/o ajustes a estudios y diseños.

- Se inicia con el abscusado de larva

DAVID FOO CASTRO-



- ▲ 08 de febrero de 2022 (Martes)
- ▲ Estado del tiempo: Seco
- ▲ Equipos en obra: Estación topográfica
- ▲ Personal en obra: Comisión de topografía (3)
Trabajador social
- ▲ Actividad: Se realizan actas de vecindad.
 - Se continúa con el abscusado en la vía
 - Se continúa con la revisión y/o ajustes a estudios y diseños.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

- ▲ 09 de febrero de 2022 (Miércoles)
- ▲ Estado del tiempo: Seco
- ▲ Equipos en obra: Estación
- ▲ Personal en obra: Comisión topográfica (3)
trabajador (Social)
- ▲ Actividades: Se continúa con la revisión y/o ajustes a estudios y diseños.
 - Se continúa con la realización de los actas de vecindad
 - Se continúa con el abscusado en la vía

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

- ▲ 10 de febrero de 2022 (Jueves)
- ▲ Estado del tiempo: seco
- ▲ Equipos en obra: Estación
- ▲ Personal en obra: Comisión topográfica (3)
Trabajador Social
- ▲ Actividades: Se realizan actas de vecindad
 - Se continúa con el abscusado en la vía
 - Se continúa con la revisión y/o ajustes a estudios y diseños.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

11 de febrero de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Equipo en obra:


Personal en obra: Trabajador social

Comision topografica (3)

Actividad en obra: Se realizan actas de Vecindad.

SE ENTREGO LA DOCUMENTACION
INICIAL SOLICITADA POR EL IDUSIAS

DAVID FOO CASTRO

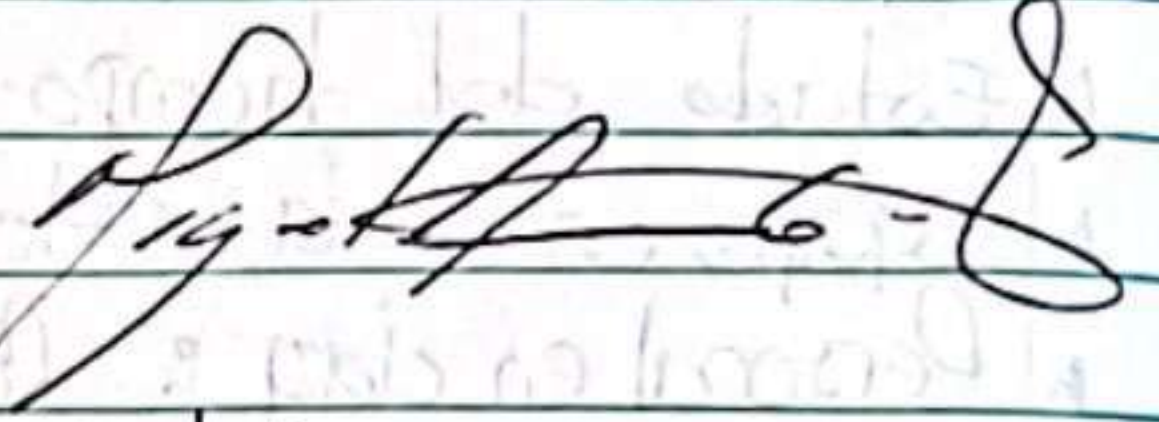

12 de febrero de 2022 (Sabado)


Estado del tiempo: Seco

Equipo en obra: Ninguno

Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: Se continuan con la realiza-
cion de los actas de Vecindad.


DAVID FOO CASTRO

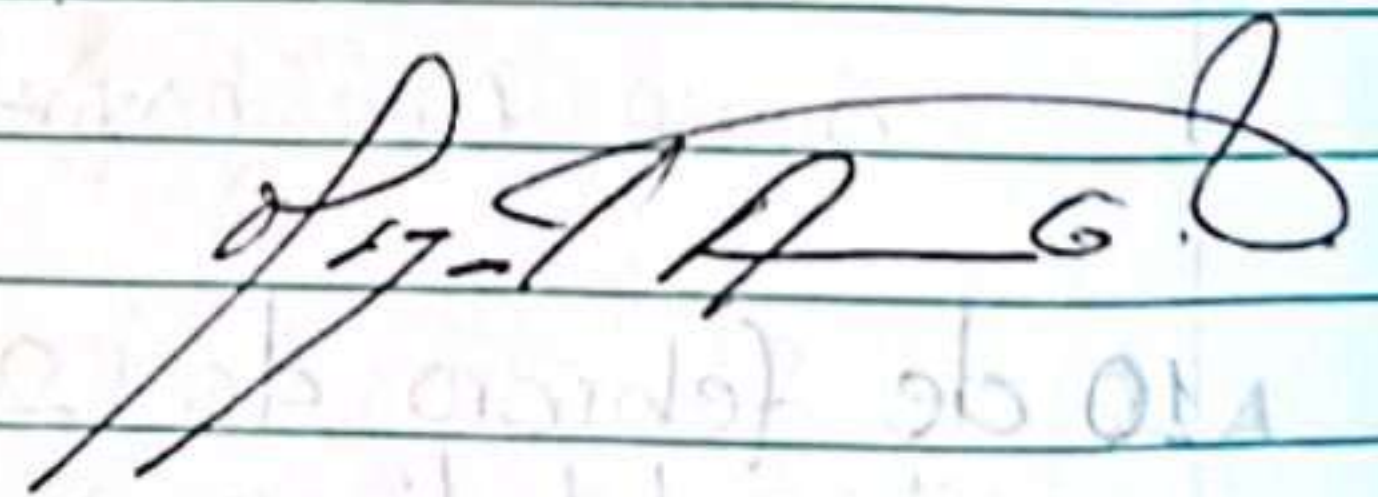

13 de febrero de 2022 (Domingo)

No se realizan ninguna actividad en obra.

DAVID FOO CASTRO

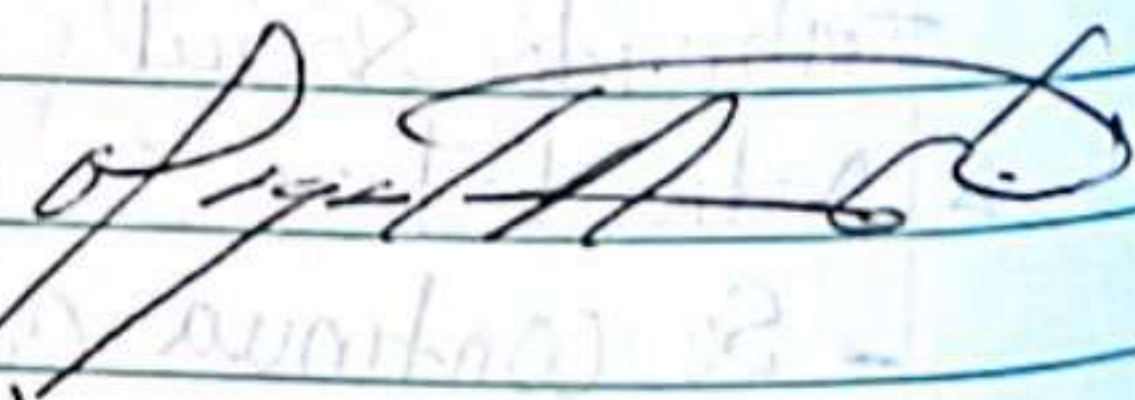


14 de febrero de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: Seco

Equipo en obra: Ninguno

- ▶ Personal en obra: Trabajador Social
- ▶ Actividad en obra: se continua con la realizacion de las actas de Vecindad.

DAVID FPO CASTRO-

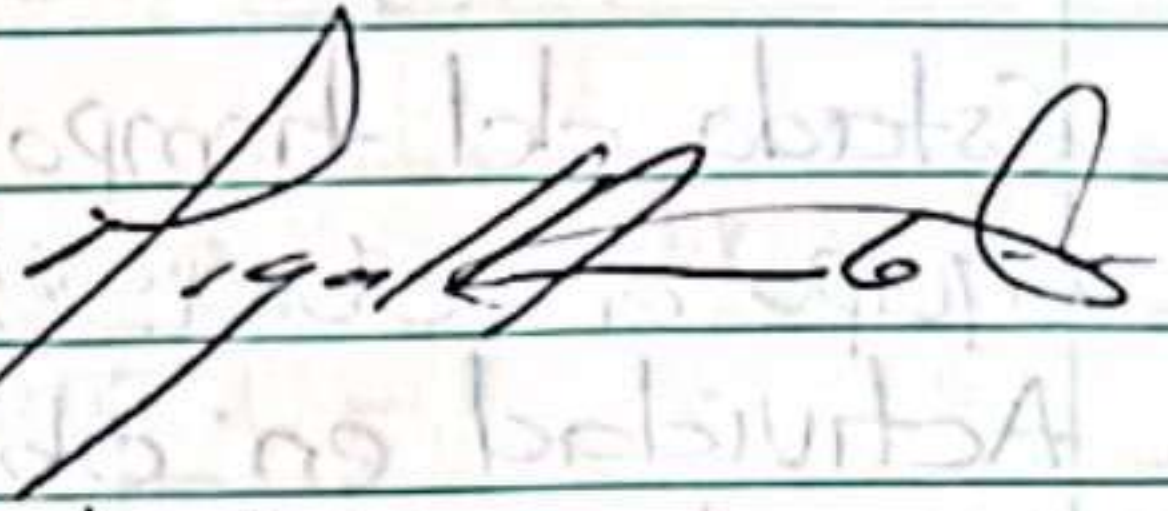

15 de febrero de 2022 (Martes)


Estado del tiempo: Seco.

Equipo en obra:

Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: se continua con la realizacion de actas de Vecindad.

DAVID FPO CASTRO-

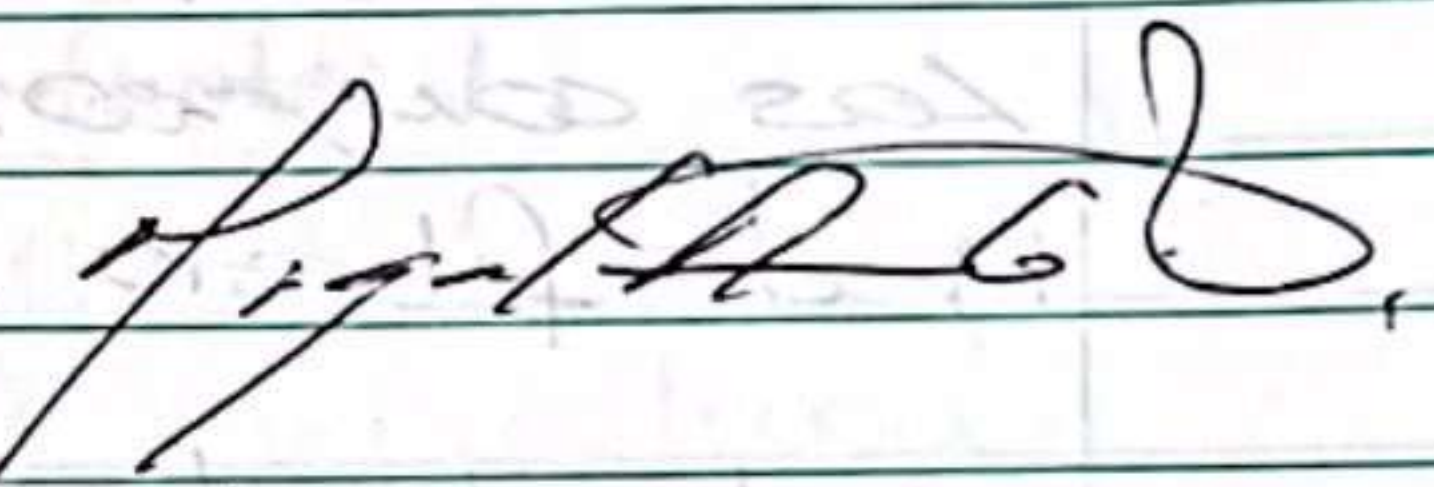

16 de febrero de 2022 (Miercoles)


Estado del tiempo: seco.

Equipo en obra: Ninguno

Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: se realizan actas de vecindad en el tramo a intervenir

DAVID FPO CASTRO-

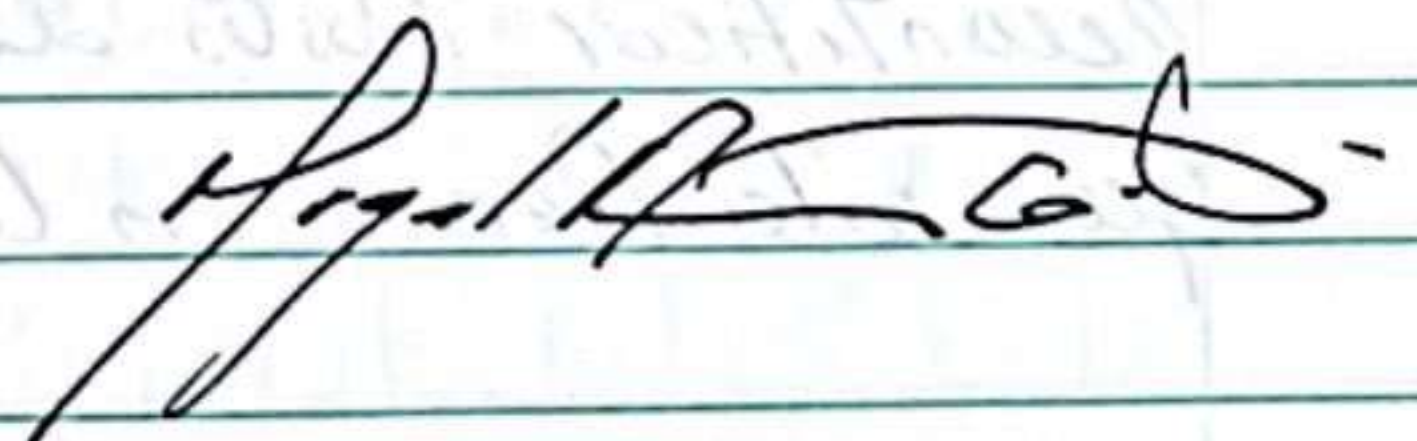

17 de febrero de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: Ninguno

Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: se realizan actas de vecindad

DAVID FPO CASTRO-



18 de febrero de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Equipo en obra: Ninguno

Actividad en obra: El contratista continua con la realización de actas de Vecindad

- Se realiza levantamiento topografico y hacen conteo de postes electricos que se encuentren por dentro del tramo a intervenir

Personal en obra: trabajador Social

Comision topografica

SE REQUERIRÁ CONTINUA OBRA PARA RECONSTRUIR LAS CARRETERAS.

19 de febrero de 2022 (Sabado).

Δ Estado del tiempo = Seco

Δ Equipo en obra:

Δ Personal en obra: trabajador Social

Comision topografica

Δ Actividad en obra: El contratista continua con la realización de actas de Vecindad.

- Se realiza levantamiento topografico para cuantificar Postes de luz y arboles en la via que interfieran en la ejecucion del proyecto.

DAVID EPO CASTRO

[Signature]

20 de febrero de 2022 (Domingo).

El día de hoy no se realizan actividades

DAVID EPO CASTRO

[Signature]

21 de Febrero (de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: Nivel

Personal en obra: Comision topografica (3)

Trabajador Social (1)


Actividad en obra: El Contratista instala valla informativa al inicio de la obra.

- Se realizan actas de vecindad.

- Se realiza levantamiento topografico para verificar los arboles o postes electricos que se encuentren dentro del margen de ejecucion de la obra

SE ENTREGO EL PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA

DAVID FDU CASTRO



22 de febrero de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: Nivel

Personal en obra: Comision topografica (3)


Trabajador Social

Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad

- Se realiza levantamiento topografico en la via

SE ENTREGARON LOS AJUSTES Y DISEÑOS DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORIA.

DAVID FDU CASTRO



23 de febrero de 2022 (Miercoles)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: Nivel

Personal en obra: Comision topografica (3)


Trabajador Social (1)

Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad

- Se realiza levantamiento topografico a la via.

SE REALIZO RECORRIDO DE VERIFICACION DE DISTANCIAS AL GOTADERO Y A LA PLANTA.

DAVID FDU CASTRO



24 de febrero de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: Nivel

Personal en obra: Trabajador Social (1)


Comision topografica (3)

Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad

- Se realiza levantamiento topografico en la Via

- SE REALIZO REUNION CON LOS ESPECIALISTAS PARA DAR CLARIDAD A LAS OBSERVACIONES.

DAVID FLO CASTRO



25 de febrero de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: seco


Equipo en obra: Ninguno

Personal en obra: Trabajador Social

Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad.

- Se realiza comite de seguimiento Virtual por parte del Instituto Nacional de Vias en los que estuvieron presentes Interventoria, contratista funcionaria de Invia.

DAVID FLO CASTRO



26 de febrero de 2022 (Sabado)


Estado del tiempo: seco.

Equipo en obra: Ninguno

Personal en obra: Trabajador Social (1)

Actividad en obra: Se realizan actas de vecindad.

DAVID FLO CASTRO

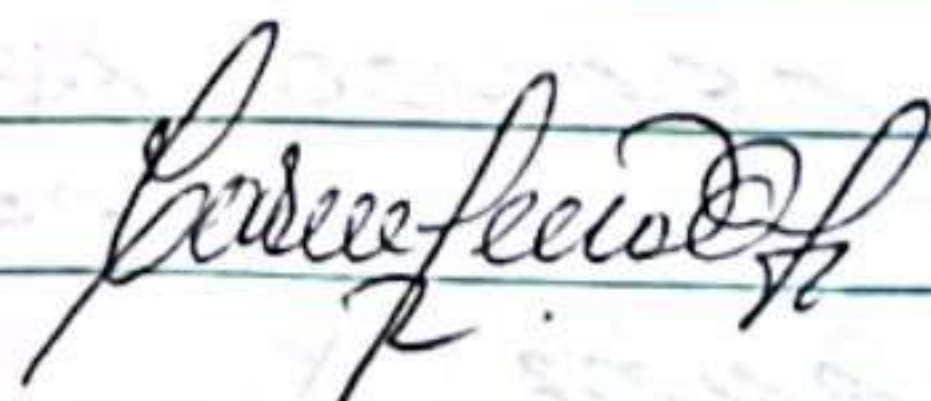

27 de febrero de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades.

28 de febrero de 2022 (Lunes)


Estado del tiempo: Seco

Personal en obra: Trabajador Social

Equipo en obra: Ninguno

Actividad en obra: Se realizan actas de Verdad

DAVID FRO CASTRO



01 de marzo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Seco

Maquinaria y Equipo en obra: Motoniveladora (1)


Retro tipo payarita (1) - Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra

Auxiliar HSE (1) - Palateros (2) - Oficios Varios (2)

Actividad en obra: Se realizan actividades de perfilar en la Vía San Antonio - Cedro para el ingreso de maquinaria y volquetas.

DAVID FRO CASTRO



02 de marzo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Herramientas menores Motoniveladora (1) - Retro payarita (1)

Personal en obra: Residente de obra

Auxiliar HSE - Palateros (2) - Oficios Varios (2)

Comisión topográfica (2)

Actividades en obra: Se inicia corte para el mejoramiento de la calzada del P+040 al P+080. Llegando a la SR.

- Se retira material proveniente de la excavación

DAVID FRO CASTRO

Barrios

03 de marzo de 2022 (Jueves)

- Estado del tiempo: Seco
- Equipos y maquinaria en obra: Retroexcavadora(1) - Herramientas menores
- Personal en obra: ~~Paletero~~ Auxiliar Hse(1) Residente(1) operador motoniveladora(1) Herramientas menores Nivel.
- Actividad en obra: Se continua con corte para mejoramiento de la calzada de la Abs Koto80 al K+120
- Se retira material proveniente de la excavación

DAVID FRO CASTRO

Barrios

04 de marzo de 2022 (Viernes)

- Estado del tiempo: Seco
- Equipos y maquinaria: Motoniveladora(1)
- Retroexcavadora(1) Minicargador(1) Nivel(1)
- Herramientas menores
- Personal en obra: Residente de obra(1)
- Residente interventoria(1) operadores(3)
- Auxiliar Hse Comision de topografia(2)
- Paleteros(2) Oficiales Varios(2)
- Actividad en obra: Se continua con el corte para mejoramiento de la calzada. estas actividades se realizaron en horas de la tarde debido a que en horas de la mañana se realizo socialización del Proyecto con la Comunidad.

DAVID FRO CASTRO

Barrios

05 de marzo de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador (1) Vibrocompactador (1)

Retro-pajeta - motoniveladora (1) Herramientas menores

Personal en obra: Ing Residente de obra (1) Presid. Interventoría


Auxiliar HSE, Trabajador social (1) operador (3) Oficio

Varios (2) Comisión topográfica (2)

- Actividad en obra: Se continúa con el corte para el mejoramiento de la calzada existente de abs K0+120 a abs K0+160

- Se continúa con el Carga y transporte del material proveniente de la excavación

DAVID FRO CASTRO -



06 de marzo de 2022 (Domingo)

Estado del tiempo: seco

Equipo y maquinaria en obra: Herramienta

menores - Motoniveladora (1) Minicargador (1)

Retro Pajeta (1) Vibrocompactador (1) Nivel (1)


Personal en obra: Residente de obra (1) Residente Interventoría (1)

operadores (3) comisión topográfica (2) paleteros (2) Auxiliar

HSE (1) Trabajador social (1) Oficio Varios (2)

Actividad en obra: Excavación de material común de Abs K0+160 a Abs K0+180.

DAVID FRO CASTRO -



07 de marzo de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: Se presentan fuertes lluvias de 3:30 pm a 5:30 pm

Maquinaria y equipos: Minicargador(1) Nivel
Retro-pajita - Vibrocompactador moto, H. menores - Moto

Personal en obra: Ing. Residente de obra.


Residente de interventoría - Auxiliar HSE(1)

Trabajador social(1) - operador(3) paletero(2)

Oficios Varios(2)

Actividad en obra: Excavación de material
común de la Abs K0+180 a K0+200

DAVID FOO CASTRO-



08 de marzo de 2022 (mañetas)

Estado del tiempo: seco

Maquinaria y equipos: Minicargador - motoniveladora

Retro-pajita Vibro Compactador nivel H. menores

Personal en obra: Residente de obra - Residente

de interventoría(1) Auxiliar HSE(1) - Inspector SST

Interventoría Trabajador social paletero(2) operador(3)

Oficios Varios(2) Comisión topográfica(2)

Actividad en obra: En horas de la mañana no
se realizan actividades ya que la sobrasante
se encuentra saturada debido a las lluvias que
se presentaron el día de ayer.


En horas de la tarde se hace limpieza

y compactación de la calzada.

- Se realiza llenado con afirmado del Prota
al Pro + 200

OBSERVACION: El contratista realiza actividades hasta las 11:30pm

DAVID FOO CASTRO-




09 de marzo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: seco

- * Equipo y maquinaria: Motoniveladora (1) - Mini. Cargador (1) - Vibrocompactador (1) - Camión tanque (1) Nivel (1) - Herramientas menores.
 - * Personal en obra: Auxiliar Residente de obra. Comisión topográfica (2) - Auxiliar HSE (1) - Auxiliar Social (1) Paletero (2) - Operadores (3) - Ayudantes (2)
 - * Actividad en obra: Se realiza nivelación de capa de afirmado del Pto + 200 al Pto + 240.
 - * Se humecta y compacta material de afirmado
 - * Se realizan Excavaciones del Pto + 200 al Pto + 240
- OBSERVACIÓN: El contratista realiza actividades hasta las 7:30 am.

DAVID FDO CASTRO



10 de marzo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Equipo en obra: Motoniveladora (1) - Minicargador (1) Vibrocompactador (1) - Camión tanque (1) - Herramientas menores.

Personal en obra: Auxiliar Residente de obra Comisión de topografía (2) Auxiliar HSE (1) - Social (1) Paletero (2) - Operadores (3) Ayudantes (2).


Actividad en obra: Se realiza Excavación de material Común del Pto + 240 al Pto + 260

Se instala afirmado con una capa de 25cm del Pto + 200 al Pto + 260

Se humedece y compacta material de afirmado

OBSERVACIÓN: El contratista realiza actividades hasta las 11:30 pm.

DAVID FDO CASTRO

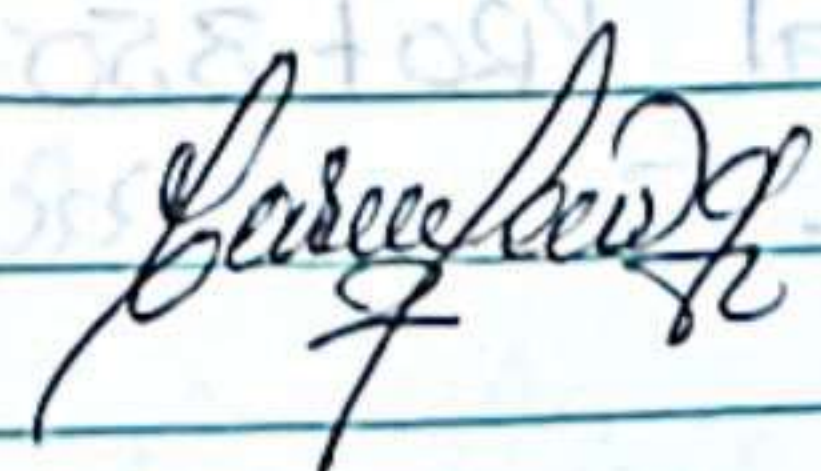

11 de marzo de 2022 (Viernes)


Estado del tiempo: Seco.

- Equipo y Maquinaria en obra: Minicargador (1) Vibrocompactador (1) Nivel
- Personal en obra: Residente de obra - Auxiliar HSE social (1) - Operador (2) -

Actividad en obra: El Contratista no realiza actividades debido a fallas mecánicas presentadas en motoniveladora.

OBSERVACION: Se le solicita al contratista informar por escrito y anticipada a esta Interventoría cuando vaya a realizar actividades en horario extendido. Actividades a realizar, Equipos y Personal que utilizara.

DAVID FDO CASTRO



12 de Marzo de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Seco


- Equipo y Maquinaria: Herramientas menores motoniveladora (1) Vibro Compactador (1) - Minicargador (1) Nivel (1)
- Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE Comisión topográfica (2) Paletero (2) Oficiales Varios (2)

- Actividad en obra: Se realiza excavación en obra del PRO+260 al PRO+350

- Se instala material de afirmado del PRO+260 al PRO+350

- Se compacta material de afirmado

DAVID FDO CASTRO-



13 de Marzo de 2022 (Domingo)

No Se realizan actividades en obra.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

14 de Marzo de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Herramientas menores.

Minicargador - Vibrocompactador.

Personal en obra: Residente Auxiliar, Auxiliar HSE operador (2)

Comision de topografia (2) oficios varios (2) paleta (2)

Actividad en obra: El contratista no realiza actividades en obra debido a fallas mecanicas presentadas en la motoniveladora, argumenta que las actividades programadas para el dia de hoy dependian de dicha maquina.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

* 15 de Marzo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Seco

- Equipo y maquinaria: Herramientas menores Motoniveladora (1) Vibrocompactador (1) Minicargador Volqueta (2)

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE

Comision topografica (2) Oficios Varios (2) paleta (2)

operador (3) Conductor de Volquetas (2)

Actividad on obra: Se realiza excavacion de material Comen del PRO+350 al PRO+430.

Se instala afirmado del PRO+350 al PRO+430.

Se compacta material de afirmado

- Se realiza retiro de material proveniente de la excavacion

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

* 16 de marzo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Seco

Maquinaria y equipo: Herramientas menores

Motoniveladora (1) Vibrocompactador (1)

Minicargador (1) Volquetas (2) Nivel (1)

Actividad en obra: Se realiza excavación de material común del PRO + 430 al PRO + 490

Se realiza lleno y compactación de material seleccionado, se retira material de excavación

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE

Comisión topográfica (2) Ayudantes (2) paleteros (2)

operadores (3) conductores (2)

Observación: El contratista realiza actividades en obra hasta las 11:30 pm.

DAVID FOO CASTRO

[Signature]

* 17 de Marzo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria en obra: Herramientas menores

Motoniveladora Minicargador Vibrocompactador

Nivel Volquetas (2)

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar

HSE (1) Comisión topográfica (1) operador (3)

conductor (3) Ayudantes (2) paleteros (2)

Actividad en obra: Se realiza excavación de material común del PRO + 490 al PRO + 566

- Se instala y compacta material de afirmado del PRO + 490 al PRO + 566

- Se retira material de excavación

DAVID FOO CASTRO

[Signature]

18 de marzo de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: seco

Equipo y Maquinaria: Herramientas menores.

Motoniveladora (1) Vibrocompactador Minicargador

Nivel volquetas (2)

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE

Comision topografica (2) paleteros operador (3) Conductor (2)

Actividad en obra: Se realiza excavación de material

Comun del Pto+560 al Pto+620

Se retira material proveniente de la excavación

DAVID FOO CASTRO



19 de marzo de 2022 (Sabado)

Estado del tiempo: soleado

Equipo y maquinaria: Herramientas menores volqueta

motoniveladora Vibrocompactador minicargador Nivel

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE

Comision topografica (2) paleteros (2) Ayudantes (2)

operador (3) conductor (2)

Actividad en obra: se realiza excavación de material


de afirmado del Pto+620 a Pto+660.

- se instala y compacta material seleccionado

del Pto+620 a Pto+660 de 0.10 cm

- se retira material de excavación


DAVID FOO CASTRO



20 de marzo de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

DAVID FOO CASTRO



- 21 de marzo de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: seco

Equipo y maquinaria en obra: Herramientas

menores motoniveladora vibrocompactador

minicargador Nivel

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE


Comision topografica (2) Oficios Varios (2)

Ayudantes (2) operador (1)

Actividad en obra: Se realiza serec del.

material de afirmado

DAVID FDO CASTRO



22 de marzo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: seco

Equipo y maquinaria: Herramientas menores

Motoniveladora - Vibrocompactador - minicarga-

dor Nivel Volquetas (2)

- Personal en obra: Residente de obra Auxiliar

HSE comision topografica (2) paleteros (2) Oficio

Varios (2) operador (3) conductor (2)


Actividad en obra: Se realiza excavacion de

material comun del Prot 660 al Prot 860

Se realiza Retiro de material proveniente de la

excavacion

DAVID FDO CASTRO

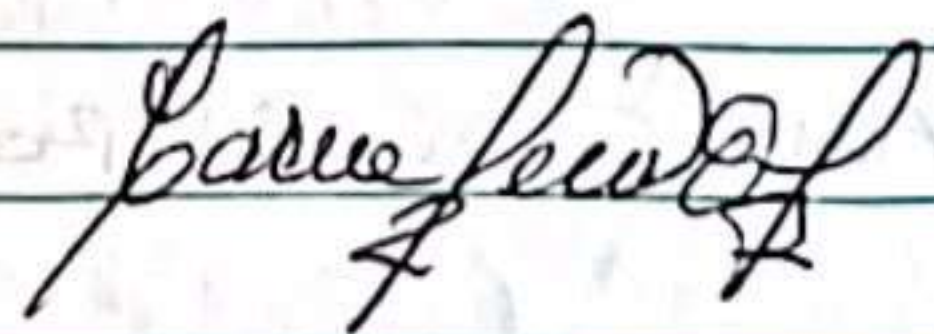

23 de marzo de 2022 (Miercoles)

Estado de tiempo: seco

Equipo y Maquinaria: Herramientas menores
 Motoniveladora Minicargador Vibrocompactador
 Nivel Volqueta

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE
 Comision topografica (2) Ayudantes (2) Paletas (2)
 Operador (3) Conductor (2)

Actividad en obra: se continua con las excavaciones
 de material comun del $\text{Prot} + 660$ al $\text{Prot} + 860$.

- se retira material proveniente de la excavacion

DAVID FOO CASTRO

[Signature]

24 de marzo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y Personal: Herramientas menores Motonivela-
 dora - minicargador - Vibrocompactador

Personal: Residente de obra Auxiliar HSE Comision de
 topografia (2) paletas (2) Oficios varios (2) Operador (3)
 Conductor (2)

Actividad en obra: Se continua con excavaciones
 de material comun del $\text{Prot} + 860$ al $\text{Prot} + 960$.

Se instala y compacta material seleccionado
 del $\text{Prot} + 660$ al $\text{Prot} + 860$

- se retira material de excavacion

DAVID FOO CASTRO

[Signature]

25 de Marzo de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Herramientas menores
 Moto niveladora minicargador Vibrocompactador
 Nivel volquetas (2)

Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar HSE
Comisión de topografía (2) paletas (2) Oficiales Varios (2)
Conductor (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se continúa con la excavación
de material común del Pto + 860 al Pto + 960
Se retira material proveniente de excavación

DAVID FDO CASTRO

Barryfury

26 de Marzo de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias en
horas de la tarde de 4:30 a 5:30 pm.

Equipo y Maquinaria en obra: Minicargador
Motor niveladora Vibro compactador Recicladora

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE
Topografía (2) Oficiales Varios (2) paletas (2)

Actividad en obra: Se realizan excavaciones
de material común del Pto + 960 al Pto + 1060
Se instala y compacta material de afirmado
del Pto + 860 al Pto + 960.

DAVID FDO CASTRO

Barryfury

27 de Marzo de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

DAVID FDO CASTRO

Barryfury

28 de Marzo de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: Se presentaron lluvias
de 1:00 a 3:00 pm.

Equipo y Maquinaria: Herramientas menores. Recicladora
Motor niveladora Minicargador Vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE
Comisión Topográfica (2) Operador (3) Oficios Varios (2)
paletón (2)

Actividad en obra: Se continúa con excavación de material común primera capa del PR1+600 al PR1+800. Se instala y compacta material de afinado del PR0+960 al PR1+000.

DAVID FDO CASTRO

David Fdo Castro

29 de marzo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria en obra: Recardadora Pajonta. Vibro compactador. Nivel Volquetes.

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE. Topografía (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se continúa con excavación de material común del PR1+800 al PR2+650 -Se retira material proveniente de la excavación

DAVID FDO CASTRO

David Fdo Castro

30 de marzo de 2022 (Miércoles)

estado del tiempo: Se presentan lloviznas en horas de la tarde de 5:30 pm a. 8:30

Equipo y maquinaria: Recardadora Pajonta nivel Volquete.

Personal en obra: Residente de obra. Auxiliar HSE Comisión de topografía, paletón (2) Oficios Varios (2) Operador (2)

Actividad en obra: Se continúa con excavaciones de material común del PR2+650 al PR3+488

Se retira material de excavación

DAVID FCO CASTRO

Barufka

31 de marzo de 2022 (Jueves.)

✓ Estado del tiempo: Se presentan fuertes lluvias de 9:30am a 12:30m.

Equipo y maquinaria: Vibro compactador Recicladora, Pajanta Nivel.

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE Comision topografica (2) paletero (2) Oficiao Vano (2) Operador (3).

Actividad en obra: En el día de hoy no se realizaron actividades en obra debido a las fuertes lluvias que se presentaron en horas de la mañana.

DAVID FCO CASTRO

Barufka

01 de Abril de 2022 (Viernes)

✓ Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias en horas de la mañana. desde las 7:00 am a 11:00 am.

Personal en obra: Residente de obra topografica (2) Operadores (4) Auxiliar HSE (1) Social (1) paletero (2) Ayudantes (2)

Equipo en obra: Minicargador - Vibrocompactador motor niveladora - Pajanta - Herramientas menores nivel.

Actividad en obra: No se realizan actividades en obra debido a las fuertes lluvias.

DAVID FCO CASTRO

Barufka

02 de Abril de 2022 (Sábado)

✓ Estado del tiempo: se presentaron lluvias moderadas en horas de la mañana desde las 7:30 am hasta 11:30 am.

Equipos en obra: Minicargador - Motoniveladora Pajanta - Vibro compactador - Nivel - Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra Auxiliar HSE Socios operador (4) Comisión de topografía Ayudantes (2) Paletera (2)

Actividad en obra: No se realizan actividades en obra por las fuertes lluvias presentadas.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

03 de Abril de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

04 de Abril de 2022 (Lunes)

✓ Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 8:00 am a 9:00 am

- Equipos en obra: minicargador, vibro compactador, Volqueta, motoniveladora Comisión de topografía (Nivel) Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra, Auxiliar HSE Conductores (2), socios operador (4), paletera (2) Ayudantes (2)

Actividad en obra: se realizan excavaciones de material común del P+960 al P+120

- se retira material proveniente de excavación

- se instala material de afirmado de P+860 al P+120

Y DAVID FDO CASTRO

[Signature]

05 de Abril de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: seco

Equipo en obra: palaneta, minicargador, volqueta, motoniveladora, vibrador compactador nivel

Personal en obra: Jefe de obra Topografía (2) conductores (2) Auxiliar HSE, Social, Paletero (2) Operador (4) Ayudantes (2)

Actividad en obra: se continúan con las excavaciones del K+120 al K+220

- se continúa con el retiro de material de excavación

- se instala y compacta material de afirmado del K+120 al K+220 -

se libera este tramo solo por excavación, mas no por alineamiento

X DAVID SDO CASTRO

06 de Abril de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: seco

Equipo y maquinaria en obra: palaneta minicargador - motoniveladora Vibrador Compactador Nivel

Personal en obra: Jefe de obra, Auxiliar HSE, Social Paletero (2) Ayudantes (2) Operador (4) Comisión topográfica (2)

Actividad en obra: se continúan con las excavaciones del K+220 al K+320

se instala y compacta material de afirmado del K+220 al K+320, la topografía libera pista solo por nivel mas no por alineamiento

X DAVID SDO CASTRO

07 de Abril de 2022


✓ Estado de tiempo: seco en horas de la mañana. Lluvias moderadas en horas de la tarde de 01:30 pm a 3:30 pm.

Equipo y maquinaria en obra: Pajarita - minicargador
 Moto nivelador Vibro Compactador Nivel

Personal en obra: Residente de obra (1) social (1)
 Auxiliar HSE (1) Palotera (2) Oficiales varios (2) Topografía (2)
 Operador (4)

Actividad en obra: se continua con las actividades
 de excavación del K+320 al K+440
 se instala y compacta material de afirmado.
 del K+320 al K+440 se solicita retirar material de
 excavación el cual cayó en el carril Bague

DAVID FRO CASTRO



08 de Abril de 2022

estado del tiempo: Seco


equipo y maquinaria: Pajarita minicargador Moto nivelador
 Vibro Compactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
 operador (4) - Oficiales varios (2) Auxiliar HSE - social.

Actividad en obra: se instala material de afirmado.
 se saca fallo ubicado en el K+360 al K+364.

El día de ayer el contratista tomó muestra para laboratorio de Afirmado

DAVID FRO CASTRO



09 de Abril de 2022

Tiempo: Seco

- Equipo y maquinaria: Pajarita - minicargador - Vibro
 Compactador - motoniveladora vapelos (2)

- Personal en obra: Residente de obra - Comision de
 topografía (2) Auxiliar HSE (1) social (1) Ayudantes (2)
 Palotera (2) Conductores (2)

Actividad en obra: se continúan con las excavaciones y retiro de material proveniente de estas del K_1+32 al K_1+440 .
Se retira material de excavación el cual cayó en caño Bugre.
La topografía libera trazo por nivel más no por alineamiento.
DAVID FDO CASTRO

[Signature]

10 de Abril de 2022

Estado del tiempo: seco
Equipo y Maquinaria: Minicargador, faja, motonivelador, Vibro compactador, Nivel volqueta (2)
Personal en obra: Residente de obra, topografía, operadores (4), palotera (2), Ayudantes (2), Auxiliar HSE (1), Social (1), conductora (2)

Actividad en obra: se realizan excavaciones del K_1+440 al K_1+540 .
-se hace retiro de material de excavación

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

11 de Abril de 2022

✓ Estado del tiempo: se presentan lluvias en horas de la mañana de 7:00 am a 9:00 am
Equipo y Maquinaria: faja, minicargador, motoniveladora, Vibro compactador, Nivel.
Personal en obra: Residente de obra (1), topografía, Ayudantes (2), palotera (2), operadores (4).
Actividad en obra: se instala y compacta material de afirmado del K_1+440 al K_1+540 .
topografía libera trazo por nivel más no por alineamiento

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

12 de Abril de 2022

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Pajanta, minicargador - motonivelador
Vibro compactador Nivel - Volquetes


Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) operadores (4)

Auxiliar HSE Social paletera (2) Ayudantes (2) conductores (2)

Actividad en obra: Se continúan con excavaciones del K+540 al K+740.

- Se retira material proveniente de la excavación

DAVID FDO CASTRO



13 de Abril de 2022

Tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Pajanta - minicargador - Motoniveladora
Vibro compactador Nivel.


Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2) operador (4)

Ayudantes (2) paletero (2)

Actividad en obra: Se instala y compacta material de afirmado K+540 al K+740

La topografía libera pista por nivel más no por alineamiento


DAVID FDO CASTRO



14 de Abril de 2022 (Jueves)

No se realizan actividades por motivo de la Semana mayor (Semana Santa)


DAVID FDO CASTRO



15 de Abril de 2022 (Viernes)

No se realizan actividades por motivo de la Semana mayor

DAVID FDO CASTRO



16 de Abril de 2022

No se realizan actividades en obra, debido al tránsito vehicular (Retorno) de Semana Santa.

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

17 de Abril de 2022

No se realizan actividades por ser Domingo

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

18 de Abril de 2022

Temp: Seco

Equipo y maquinaria: Pajanta minicargador, Motoniveladora - Vibrocompactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) Oficiales (2) paleteros (2) operador (4)

Actividad en obra: se continúa con la excavación y retiro de material proveniente de esta del K+740 al K+960

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

19 de Abril de 2022

Temp: Se presentan lluvias de 7am a 10:00 am y de 12:00 m a 3:00 pm.

Equipo y maquinaria: Pajanta minicargador, motoniveladora Vibrocompactador Nivel

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) operador (4) Ayudantes (2)

Actividad en obra: No se realizan actividad debido a las lluvias presentadas en el transcurso del día

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

20 de Abril de 2022

✓ Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 12:30 pm a 3:30 pm.

- Equipo y maquinaria: Pajanta Motoniveladora Vibrocompactador Minicargador Nivel

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Operador (4) Ayudantes (2) Paletera (2) Auxiliar HSE Social

Actividad en obra: Por motivo a las lluvias presentadas en horas de la tarde se vieron afectados las actividades programadas por el contratista

- Se hacen excavaciones del K1+960 al K2+100.

- Se extiende y compacta material de afirmado del K1+740 al K1+960.

- Se topografía libremente por nivel más no por alineamiento.

OBSERVACION: Se produjo un derrame de aceite hidráulico por una de las volquetas que transportaba

afirmado. El especialista ambiental por parte de la interventoría da recomendaciones al contratista

de como recoger el residuo peligroso, el contratista sigue las recomendaciones, recoge el aceite en

galones y lo envía a un lugar donde este será recogido por una empresa encargada

Esta interventoría solicita un certificado por parte de la empresa encargada de recoger el residuo peligroso

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

21 de Abril de 2022


✓ Estado del tiempo: se presentan lluvias en horas de la tarde de 12:00 m a 3:00 pm.

Equipo y maquinaria: Pajanta - Motoniveladora, Minicargador, Vibrocompactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra, operador (4), Topografía (2), Ayudantes (2), paletera (2)

Actividad en obra: No se realizan actividades en obra debido a que en horas de la mañana se les hizo mantenimiento a las máquinas y en horas de la tarde por las fuertes lluvias que se registraron no se pudo realizar las actividades programadas.

DAVID FIDIO CASTRO



22 de Abril de 2022

✓ Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de 6:00 a 8:00.


Equipo y Maquinaria: Minicargador - Pajanta, Motoniveladora, Vibrocompactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2), operador (4), paletera (2), Ayudantes (2)

Actividad en obra: en horas de la tarde se extiende y compacta material de afirmado K1+960 al K2+100.

OBSERVACIÓN: el contratista extiende material con grado alto de humedad. Por tal motivo este Tramo correspondiente entre K1+980 al K2+03 queda en observación hasta tanto no sea realizado el ensayo de Compactación en campo.

DAVID FIDIO CASTRO



23 de Abril de 2022

estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Pajanta minicargador, Vibro-compactador - motoniveladora - Nivel

personal en obra: Ing. Residente de obra, Topografía (2) Auxiliar Hse Social paletera (2) Ayudantes (2) Operador (4)

Actividad en obra: Se continua con excavaciones del K2+100 al K2+140.

DAVID FIDIO CASTRO

Barufecio

24 de Abril de 2022

estado del tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Motoniveladora

personal en obra: Ingeniero Residente de obra

Actividad: El constructivo adecua el botadero autorizado donde debe ir el material proveniente de excavación

DAVID FIDIO CASTRO

Barufecio

25 de Abril de 2022

Tiempo: se presentan lluvias en horas de la tarde desde la 01:00pm a 3:00pm.

- Maquinaria y Equipo: Pajanta minicargador, motoniveladora

- Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)

Ayudantes (2) paletera (2) Operador (4) Operador (4)

Actividad en obra: Se extiende material de afirmado ciego se continua con excavaciones del K2+140 al K2+180

26 de Abril de 2022

Tiempo: Seco.

Equipo y Maquinaria: Pajanta - Minicargador
Motor niveladora - Vibrocompactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)
operadores (4) Paletero (2) Ayudantes (2) HSE

Actividad en obra: Se continúan con las
excavaciones del K2+180 a K2+200

- Se extiende y compacta material de
afirmado de la K2+03a hasta K2+180

DAVID FDO CASTRO

[Signature]

27 de Abril de 2022

- Tiempo: Se presentan lluvias en horas
de la tarde de 3:00pm a 5:00pm.

- Equipo y maquinaria: Pajanta - mini-
cargador - motor niveladora - Vibrocompactador.
Nivel.

Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)
Paletero (2) Ayudantes (2) Auxiliar
HSE, Socios operadores (4)

Actividad en obra: Se continúa con
las excavaciones del K2+200 a K2+290.
topografía libre para por nivelación mas no por alineamiento

DAVID FDO CASTRO


[Signature]

28 de Abril de 2022.

Tiempo: Se presentaron lluvias en horas de
la mañana de 8:00 am a 10:00 am.

Equipos y maquinaria: Pajonita minicargador
 Vibro compactador - motoniveladora (1) Nivel.
 Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)
 Auxiliar HSE Social, paletina (2) - operadora (4)
 Actividad en obra: No se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias que se presentaron en horas de la mañana.

P DAVID FDO CASTRO



29 de Abril de 2022

Estado del tiempo: Seco.

Equipos y maquinaria: Minicargador, Pajonita Motoniveladora, Vibrocompactador.


Personal en obra: Residente de obra, comisión de topografía (2) Paletina (2) Ayudantes (2) Auxiliar HSE Social Operador (4)

Actividad en obra: Se continuó con las Excavaciones del K2+270 al K2+400.

Se extiende y compacta material de afirmado del K2+180 al K2+400.

Topografía recibe puntos por nivelación mas no por alineamientos

x DAVID FDO CASTRO



30 de Abril de 2022


Estado del tiempo: Seco

Equipos y Maquinaria: Pajonita, minicargador, vibrocompactador, motoniveladora, Nivel

Personal en obra: Res. de obra, Topografía (2) paletina (2) Ayudantes (2) HSE Social Operador (4)

Actividad: Se realizan Excavaciones del K2+400 al K2+500

x DAVID FDO CASTRO



01 de Mayo de 2022

no se realizan actividades en obra por
Ser Domingo

BA

Barufend

02 de Mayo de 2022

estado del tiempo: se presentan lluvias
en horas de la mañana de 8 am a 11:00 am
equipo y maquinaria: Minicargador Moto
Vibro Compactador

Personal en obra: Residente

Actividad en obra: por motivo de los
fuertes lluvias solo se retira agua estan-
cada. Las demás actividades programadas
no se pudieron realizar

BA

Barufend

03 de mayo de 2022

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria:

Personal en obra:



Actividad en obra: Se realizan actividades
de excavación del K2+400 al K2+480

- Se libera por topografía solo nivel ya que no hay aline

OBSERVACIÓN: El día de hoy en horas de la
mañana cuando se realizaban actividades


de excavación se evidencio que el tubo de
carga potable de 8 pulgadas que suministra
el servicio al corregimiento de rubo largo.
se encuentra superficial y expuesto ante
las actividades de excavación por tal motivo
se le informa al contratista por medio de
oficio comunicante de caracter urgente con
la empresa prestadora del Servicio de agua
potable AQUALIA para que se coloque al tanto
del Servicio, tambien se le informo al contra-
tista por medio de este oficio lo siguiente
con el fin de evitar atrasos en la ejecu-
cion de las actividades y en caso dado que la
empresa AQUALIA no de una respuesta. se
solicito que el contratista presente una
medida de seguridad que proteja la tuberia
esto con el fin de buscar una solucion a
tiempo sin causar danos que puedan afectar
ala comunidad.

por otro lado se le recomienda al contratista
hacer apiques para poder tener certeza que
tan profundo esta la tuberia del K2+480 en
adelante, Tramo que no fue recibido por la topografia
de la intervencion

04 de Mayo de 2022

El dia de hoy se presentaron inconvenientes
de orden publico lo cual impidio la reali-
zacion de las actividades programadas.
Ya que salieron comunicados por diferentes medios
que habia un paro armado por motivos de seguri-
dad el personal en obra se tuvo que retirar

05 de Mayo de 2022

No se realizan actividades en obra por motivos de seguridad debido al paro armado

[Signature]

[Signature]

06 de Mayo de 2022

No se realizan actividades en obra por motivo de Seguridad debido al paro armado

[Signature]

[Signature]

07 de Mayo de 2022

No se realizan actividades en obra debido a que continua el paro armado

[Signature]

[Signature]

08 de Mayo de 2022

No se realizan actividades en obra debido a que continua el paro armado

[Signature]

[Signature]

09 de Mayo de 2022

Estado del tiempo: seco

Equipos y Maquinaria: Mini cargador, Motorveladora
Nivel, Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)
Auxiliar SST, Social, Jefe de obra (2) Ayudante (2)
operador (3)

Actividad en obra: En horas de la mañana,
el contratista no realiza actividades en obra
no se encontro personal en obra ni movimiento
de maquinaria, solo se evidencio presencia de la
Topografía la cual se ausento tambien.

Inician actividades en horas de la tarde.
a partir de la 1:00 pm.
realizan actividades de excavacion al K2+660
al K2+800.

- Instalan material de afirmado de K2+480
al K2+560.

OBSERVACION: El contratista instala material
de afirmado del K2+480 al K2+560, Tramo
que estaba sin recibir por la topografía de
la interventoria, este tramo no se habia recibido
debido a que estaba en observacion a la espera
que llegara la empresa AQUALIA ya que el fono
que abastece a Sabalero de agua potable se
encontraba muy superficial ademas de esto
se estaba a la espera de una propuesta por
parte del contratista para proteger dicha
tuberia esto con el fin de evitar daños a la
tuberia al momento de realizar actividades
de compactacion y asi evitar dejar a la comunidad
sin el servicio, valga aclarar que el día
03 de mayo de 2022 se le informo al contratista
por medio de oficio de la situacion presentada
y aun asi este extendio el material de
afirmado, por tal motivo esta interventoria
no recibe este tramo.

10 de Mayo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y Maquinaria: Minicargador Motori-
Veladora, Vibro Compactador

Personal en obra: Ing Residente Topografía (2)

Auxiliar HSE (1) Social (1) Palilera (2) Oficios
Varios (2) Operador (3)

- Actividad en obra:

Se realizan actividad de excavación del
K2+800 al K2+860.

- Se instala afirmado del K2+560 al K2+610

[Signature]

[Signature]

11 de Mayo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Lluvioso en horas de la
mañana de 6:00 am a 8:00 am.

Equipo y Maquinaria: Minicargador Motori-
veladora Vibro compactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra, comisión
de topografía (2) Palilera (2) Oficios Varios (2)

Auxiliar SST, Social Operador (3)

Actividad en obra: Se realizan Excavaciones
del K2+860 al K2+980.



Se instala afirmado del K2+610 al K2+800

[Signature]

[Signature]

12 de Mayo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

1. Equipo y Maquinaria: Minicargador. Motor niveladora
 Vibro compactador. Nivel. Volqueta
 Personal en obra: Residente de obra, Topografía (2)
 Paleteros (2) Oficios Varios (2) Auxiliar HSE (1).
 Social (1). Conductor (2)
 Actividad en obra: Se retira material
 proveniente (de las) excavaciones.
 - Se instala material de afirmado del
 K2+800 al K2+960.
 La topografía libre por debajo de la cota solo por niveles.
 

13 de Mayo de 2022 (Viernes).

estado del tiempo: seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador. Motor niveladora.

Vibro compactador. Nivel.

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)


Operador (3) Oficios Varios (2) Paletero (2).

Auxiliar HSE. Social

Actividad en obra: Se continúan con la excavaciones

del K2+980 al K3+080.

- Se realiza retiro de material proveniente de
 excavación

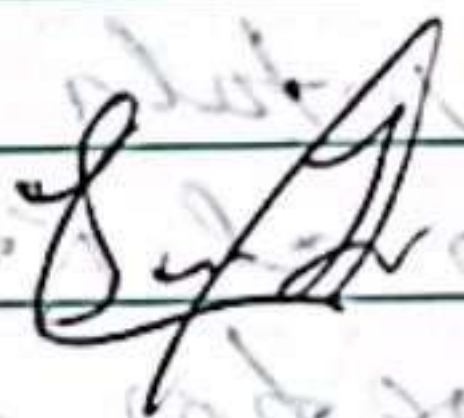


14 de Mayo de 2022 (Sábado)

estado del tiempo: seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador. Motor niveladora
 Vibro Compactador Nivel.

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)

Operador (3) Ayudantes (2) Paletero (2)

Auxiliar HSE (1) Social (1).

Actividad en obra: se continúa con actividades de excavación del K3+080 al K3+180.

Se continua con el retiro de material
proveniente de las excavaciones.

LA

Parafuente

15 de Mayo de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

LA

Parafuente

16 de Mayo de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Se presentaron lluvias
en horas de la tarde de 1:30 a 3:30 pm.

Equipo y maquinaria: Minicargador -
moto niveladora - Vibrocompactador
nivel. Volqueta

Personal en obra: Fendante de obra (1)

Topografico (3) Aguadantos (2) paleteros (2)

Operador (3) Conductor

Actividad en obra: Se intula material de
afirmado del K2+960 al K3+000

- Se continua con el retiro de material
proveniente de la excavación

LA

Parafuente

17 de Mayo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Se presentaron lluvias en
horas de la tarde de 2:00 a 4:00 pm.

Equipo y maquinaria: Minicargador motoniveladora
Vibro Compactador - Volqueta

Personal en obra: Residente de obra Topografía (3)
operadores (3) Paletas (2) Oficiales varios (2)

Actividad en obra: Se continúan con las excavaciones del K3+180 al K3+210.

Se retira material proveniente de excavación

[Signature]

[Signature]

18 de Mayo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador
motoniveladora - Vibro compactador Nivel Volqueta

Personal en obra: Residente de obra Topografía (3)
Ayudantes (2) Paletas (2) Auxiliar HSE (1) Social (1).

Conductor

Actividad en obra: Se realiza liberación de
sobrasante por parte de la Comisión Topográfica
de Interventoría del K2+990 al K3+250.

- Se instala material de afirmado del
K3+000 al K3+160.

[Signature]

[Signature]

19 de Mayo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y Maquinaria: Minicargador Moto-
niveladora - Vibro compactador Volqueta

Personal en obra: Residente de obra Topografía (3)

Ayudantes (2) Paletas (2) Auxiliar HSE (1) Social (1)

Conductor

Actividad en obra: Se instala material de afirmado
del K3+160 al K3+210.

se realizan excavaciones del K3+250 al K3+300.
se retira material proveniente de la excavación
se libera sub rasante por topografía.

[Signature]

[Signature]

20 de Mayo de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: minicargador motor nivelador
vibro compactador - nivel -

Personal en obra: Residente de obra, comisión
topográfica (3) Auxiliar HSE (1) Social (1)

Palatera (2) operador (3)

Actividad en obra: Se realizan excavaciones
del K3+370 al K3+470.

se libera sub rasantes por parte de la comisión
topográfica del K3+370 al K3+470.

[Signature]

[Signature]

21 de Mayo de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador motor
nivelador nivel Volqueta

Personal en obra: Residente de obra

Topografía (3) Operador (3) Palatera (2)

Apujantes (2) Auxiliar HSE (1) Social (1) conductor (2)

Actividad en obra: Se instala material de
afirmado del K3+370 al K3+470

- Se continúa con el retiro de material proveni-
ente de la excavación

[Signature]

[Signature]

22 de Mayo de 2022 (Domingo)

NO Se realizan actividades en obra

LA *Carretero*

23 de Mayo de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: motoniveladora - minicargador
vibrocompactador Nivel volquete pajanta Nivel (2)

personal en obra: Residente de obra Topografía (3)

paleta (2) Oficiales Varas (2) Auxiliar HSE

Social Conductor (2)

Actividad en obra: Se realizan excavaciones del K3+200 al K3+370.

Se continúa con el retiro de malenel proveniente de las excavaciones.

- Se libera rasante por topografía del K3+200 al K3+370

LA *Carretero*

24 de Mayo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
vibrocompactador Nivel (2)

Personal en obra: Residente de obra Comisión de
topografía (3) operador (3) Ayudantes (2) paleta (2)

Actividad en obra: Se instala y compacta malenel de afirmado del K3+200 al K3+370.

Se hacen excavaciones del K3+470 al K3+488

LA *Carretero*

25 de mayo de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias moderadas de 12:30 a 4:30 pm

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora Nivel (2) Vibrocompactador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (3) Operadores (3) Ayudantes (2) Paletera (2) Auxiliar HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se instala malenal de afirmado de K3+370 al K3+488

Se realiza Cerec al afirmado y se colocan niveles con alineamientos.

[Signature]

[Signature]

26 de Mayo de 2022 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador motoniveladora - Vibrocompactador Nivel (2)

Personal en obra: Residente de obra Comisión de topografía (3) Ayudantes (2) Paletera (2) Operadores (3) Auxiliar HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se recibe por parte de la topografía de intervención lista en afirmado del K3+280 al K3+488

Se toman densidades al afirmado del K3+280 al K3+488

Se instala sub base del K3+488 al K3+380

[Signature]

[Signature]

27 de Mayo de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 2:00 a 4:00pm.

- Equipo y maquinaria:

Personal en obra: Presidente de obra Comisión de topografía (2) Operadores (3) Paletero (2) Oficiales Varios (2) Auxiliar HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se realiza corrección a sub-base, nivelación y alineamientos del K3+380 al K3+488.

- Se hace liberación de sub-base por parte de la Comisión Topográfica de la Interventoría
- Se toman distancias a la sub-base.

[Signature]

[Signature]

28 de Mayo de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias de:

Equipo y maquinaria: Minicargador, Motor nivelador, Vibrocompactador, Nivel, Herramientas menores, Vibrador de concreto.

Personal en obra: Presidente de obra topografía (3), Paletero (2), Ayudantes (10), maestro (1), Auxiliar HSE (1), Social (1), operador (3)

Actividad en obra: Se instalan rieles para colocar concreto.

- Se hace liberación de rieles por parte de la Comisión de Topografía de la Interventoría

- Se instalan 18ml de concreto del K3+488 al K3+473

[Signature]

[Signature]

29 de mayo de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

30 de mayo de 2022 (Lunes)

No se realizan actividades en obra

Por ser festivo

[Signature]

[Signature]

31 de Mayo de 2022 (Martes)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 6:00 am a 8:00 am

- Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - Vibro Compactador - Vibrador de concreto - Herramientas menores

- Personal en obra: Presidente de obra, Comisión de topografía (3) Operador (3) Oficiales Varas (2) Palcitera (2) Auxiliar HSE (1) Social (1) maestro (1) Ayudantes (9)

Actividad en obra: Se toman densidades a la sub base

- Se instalan rieles para concreto

- Se liberan rieles por nivel. K3+473 hasta K3+44

- Se instala concreto del K3+473 al K3+435

[Signature]

[Signature]

01 de Junio de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Motoniveladora - minicargador - Vibrocompactador Nivel (Topografía)
Estación topográfica

Personal en obra: Presidente de obra, comisión topográfica Auxiliar HSE (1) Social (1) - paletero
Ayudantes: operador (3)

Actividad en obra: se realiza Cereso de subbase K3+380 - K3+400

Se instala subbase del K3+380 al K3+400
- No se hacen liberaciones de interventoría por aposte en curva

x S/A

02 de Junio de 2022 (Jueves).

Tiempo:

Equipo y maquinaria en obra: Minicargador Moto niveladora - Vibro compactador
Vibrador de concreto.

Personal en obra: Ingeniero Rondante
Comisión de topografía (2) operadores (3)
Auxiliar HSE, Auxiliares Social, paleteros (2).
Ayudantes (10) maestro (1)

Actividad en obra: se funda concreto del K3+435 al K3+385.

- Se realiza Cereso de subbase de K3+340 - K3+380.

- Se libera por topografía subbase - Piebs K3+435 al K3+385

S/A

03 de junio de 2022 (viernes)

estado del tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Mini Cargador
Vibro Compactador Motoniveladora
Nivel - Estación - Vibrador de concreto.

Personal en obra: Residente de obra
Operador (3) Auxiliar HSE - Social - Ayudantes
Paletera (2) Comisión topográfica (2) maestro (1)

- Actividad en obra: Se reabe sub base y nivelación de rieles del K3+340 al K3+380 por parte de la interventoría
- Se cerea sub base del K3+300 - K3+380
- Se realiza cereo afirmado K3+300 - K3+380
- Se realiza fundida K3+385 al K3+339

[Signature]

[Signature]

04 de junio de 2022 (sábado)

Estado del tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Mini Cargador
motoniveladora - Vibro compactador
Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra
Operador (3) Auxiliar HSE, social Ayudantes
Comisión de topografía (2) Paletera (2)

Actividad en obra: Se continúa con Cereos afirmados del K3+300 al K3+200

- - Se libera sub base y Nivel de rieles de K3+300 al K3+340 y afirmado del K3+080 al K3+280

Por la intervencion - se toman densidades

x *[Signature]*

05 de junio de 2022 (Domingo)

[Signature]

No se realizan actividades en obra.

[Signature]

[Signature]

06 de Junio de 2022 (Lunes)

Estado del tiempo: se presentan lluvias de 7 a 12.
8:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto
niveladora - Vibro compactador Nivel - Estacion
Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra operadores (3)
Auxiliar HSE, Social filetera (2) Ayudantes topografia (2)

Actividad en obra: Se realiza cerco de tierra
plen del K3+080 al K3+280.

Se fonde del K3+339 al K3+302.

Se recibe por intervencion del K3+080 al K2+280

Se instala sub base del K3+080 al K2+280

[Signature]

[Signature]

07 de junio de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Se presentan fuertes lluvias
de 09:00 am a 12:00 m.

Equipo y Maquinaria: Minicargador - moto
niveladora - Vibro compactador Nivel estacion
Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra, Comision de topografia (2)

Operadores (3) Ayudantes (2) paletero (2) Hse social

Actividad en obra: debido a las fuertes lluvias que se presentaron el contratista solo evacuó aquí las demás actividades programadas no se pudieron realizar

[Signature]

08 de Junio de 2022 (Miércoles)

[Signature]

Tiempo: seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador
moto niveladora - vibro compactador
Nivel - estación -

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) paleteros (2) Ayudantes (2)
Auxiliar Hse social Topografía (2)

Actividad en obra: se realiza cerco de isle
sobre base del K3+180 al K3+300
- cerco de afirmado de K2+700 al K3+000

[Signature]

09 de Junio de 2022 (Jueves)

[Signature]

Tempo: se presentan lluvias de 3:00 a 5:00 pm

Equipo y maquinaria: Minicargador
Moto niveladora - vibro compactador
Nivel - Estación - Vibrador de concreto

Personal en obra: Ingeniero Residente de obra - Auxiliar HSE - Auxiliar social operadores (3) paletas (2) comisión de topografía (2) maestro (1) Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se funde 35 m³ de pavimento del K3+302 al K3+266 - Se instala subbase K3+300-K3+180 se realiza core de subbase K3+300 al K3+180.

• Se libera subbase y Nivel de rieles del K3+250 al K3+300

x *[Signature]*

10 de Junio de 2022 (Viernes).

[Signature]

• Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:30 a 5:30 pm

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Moto-niveladora - Nivel - Estación Vibro Compactador - Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) social (1) HSE (1) paletas (2) Ayudantes (10) maestro (1)

Actividad en obra: Se continúa con la fundida que fue suspendida por las lluvias del día de ayer del K3+266 al K3+245

• Se libera riel y subbase del K3+180 al K3+240

x *[Signature]*

11 de Junio de 2022 (Sábado)

[Signature]

Tiempo: Se presentan lluvias de 07:30 a 08:30 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora Vibro Compactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) - Auxiliar HSE - Auxiliar
social Topografía (2)

Actividad en obra: Se continúa con los
fundidos de concreto del K+245 al K+182
- se utiliza soplador de espalda para secar la
Vía

• se realiza seguimiento a los actos de
Vecindad.

- se toma muestra de concreto para calidad

12 de junio de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

13 de Junio de 2022 (Lunes)

► Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la
mañana de 07:00 am a 11:00 am.

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Moto
nivelador - Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) Auxiliar HSE Auxiliar Social
patoteras (2) Ayudantes (2) topografía (2)

Actividad en obra: No se realizan actividades
en obra debido a los fuertes lluvias
solo se evacua agua

• - se reprograma liberación de afirmado por lluvias

14 de Junio de 2022 (Martes)

Tempo: Se presentan llovios de 07:00 a 11:00am las cuales impiden cumplir con las actividades programadas.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) Paletara (2) Ayudantes (2)
Hse (1) Social (1) Topografía (2)

Actividad en obra: Se realizan actos de Vecindad (Seguimiento).

- Evacuación de aguas estancadas por lluvias

x *[Signature]*

15 de Junio de 2022

(Miércoles).

[Signature]

Tempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Minicargador - moto niveladora - Nivel - Estación - Vibro Compactador
Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra (1)
Ayudantes (2) operadores (3) paletaras (2)
Auxiliar Hse, Social.

Actividad en obra: Se realiza Cerco de sub base del K3+100 al K3+180.

- Se instala sub base del K3+100 al K3+180

- Se instalan rieles del K3+100 al K3+180

• Se reprograma revisión de sub base y densidad. El tramo no se encontraba listo

[Signature]

[Signature]

16 de Junio de 2022

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Motoniveladora
mini cargador - Vibro compactador - Nivel
Estación - Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra
Operadores (3) - Ayudantes (10) Paleteru (2)
HSE (1) Social (1) maestro (1)

- Actividad en obra: se recibe sub base y nivel de rieles por parte de la interventoria del K3+100 al K3+182 - se toman densidades

- Se instala pavimento del K3+182 al K3+100
- se toman Viguetas al concreto para efecto de calidad

[Signature]

[Signature]

17 de Junio de 2022 (Viernes)

Tiempo: se presentan fluvios de 10:30 a 12:30 pm. las cuales afectan las actividades programadas por el contratista

Equipo y maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - mini cargador - Nivel.

Personal en obra: Residente de obra operadores (3)
Ayudantes (2) paletera (2) HSE (1) Social Topografía (2)

Actividad en obra: se colon estacos latrulo en la vía y alineamientos.

debido a los fluvios se suspenden actividades

* El contratista no entrega diseño de sub base Compromiso adquirido para el día de hoy

18 de Junio de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador
moto niveladora - Vibro Compactador nivel
estacion.

Personal en obra: Residente de obra. Hse
operadores (3) Ayudantes (2) Topografía (2) Social
paleleros (2)

• Actividad en obra: Se recibe por parte de
Interventora liberación de afirmado de K3+010 al
K3+100

- Se recompacta afirmado del K3+010 al K3+100
se toman densidades en subbase afirmado K3+010 al K3+100
- se envía diseño de subbase a INTERVENTORA

19 de Junio de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

20 de Junio de 2022 (Lunes)

No se realizan actividades por ser festivo.

21 de Junio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan lluvias de 07:00am a 12:00pm

Equipo y maquinaria: Mini Cargador
Vibro Compactador - Moto nivelador
Nivel - Estación

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) Ayudantes (2) paleteros (2)
Hse (1) Social (1) Topografía (2)

Actividad en obra: Se chequean anchos y alineamientos.

Se evacua agua estancada por los llovios presentados las cuales impidieron realizar las actividades programadas.

[Signature]

[Signature]

22 de junio de 2022 (Miércoles)

Tempo: Seco

Equipo y maquinaria: Mini cargador - Vibro Compactador - Moto niveladora Nivel - Estación Volquetas (2)

Personal en obra: Residente de obra
operadores (3) Ayudantes (1) Topografía (2)
Hse (1) Social (1) paleta (2)

Actividad en obra: Se instala sub base del K3+030 al K3+100

- se realiza Cero de sub base del K3+030 al K3+100

[Signature]

[Signature]

23 de Junio de 2022 (Jueves).

Tiempo: Se presentan lloviznas en horas de la tarde de: 07:00 pm a 08:00 pm.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - Vibro compactador - Vibrador de concreto - Nivel - Estación.

Personal en obra: Residente de obra. Topografía (2) Operadores (3) Ayudantes (10) Auxiliar Social HSE paletera (2)

Actividad en obra: Se libera afirmado por parte de la topografía de interventoría del K3+010 al K2+880.

- Se libera nivel de rieles y subbase por parte de la topografía de interventoría del K3+040 al K3+102.

- Se toman densidades en afirmado por parte de interventoría y contratista del K3+010 al K2+880.

- Se toman densidades a subbase por parte de la interventoría y Contratista del K3+040 al K3+102.

- Se instala concreto del K3+102 al K3+048.

- Se realiza visita a obra por parte del especialista estructural de la interventoría el cual hace las siguientes recomendaciones para que los tengan en cuenta al momento de fundir:

- mejorar el acabado del pavimento cuando este lloviendo.

- Humedecer la subbase antes de fundir. (esto lo hace el contratista).

- Terminar corte de Juntas y sello de los mismos.




24 de Junio de 2022 (Viernes)

Tiempo: se presentan lluvias de 07:00 a 10:00 am

Equipos y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro compactador - Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra - topografía (2) paleteros (2) Ayudante (2) Operador (3)
Social (1) HSE (1)

Actividad en obra: No se realizan las actividades programadas para el día de hoy por las lluvias presentadas - solo se evacua agua estancada

[Signature]

[Signature]

25 de Junio de 2022 (Sábado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am

Equipos y maquinaria: Motoniveladora
Vibro compactador minicargador Nivel Estación

Personal en obra: Residente de obra (1) topografía (2)
Operador (3) Ayudante (1) paletero (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: No se realizan las actividades programadas para el día de hoy por las lluvias presentadas

[Signature]

[Signature]

26 de junio de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature] *[Signature]*

27 de junio de 2022 (Lunes)

No se realizan actividades en obra.
Por ser festivo

[Signature] *[Signature]*

28 de junio de 2022 (Martes).

Tiempo: se presentan lluvias de 04:30 a 5:30 pm

Equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador Nivel - estación - volquete (2)

Personal en obra: Residente d. obra - Topografía (2)
Paletera (2) Operador (3) Ayudantes (2) Auxiliar Social
HSE conductores (2)

Actividad en obra: Se instala sub base del K3+040
al K2+970

- Se compacta y cerea sub base del K3+040 al K2+970

- Se instalan y nivelan rieles del K3+040 al K2+970

[Signature] *[Signature]*



29 de junio de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 06 a 07:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
- Vibro Compactador - Vibrador de concreto Nivel Estación

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudante (10) paletero (2) operador (3) Hse
social

- Actividad en obra: Se recibe por topografía liberación de subbase nivelación de rieles del K₃₊₀₄₀ al K₂₊₉₇₀
- Se instala pavimento del K₃₊₀₄₈ al K₃₊₀₁₅.
- Se le recomienda al contratista adecuar los tramos que se encuentran en mal estado debido a las fuertes lluvias en la vía San Antonio - Zapal - Cedro

30 de Junio de 2022 (Jueves)


Tiempo: seco.

(1) Equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora - Vibro compactador - Vibrador de concreto Nivel - Estación

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudante (10) operador (3) paletero (2) Hse - Social

Actividad en obra: Se instala Subbase del K₂₊₉₈₀ al K₂₊₈₈₀

- Se instala Concreto del K₃₊₀₁₅ al K₂₊₉₄₈
- Se adecuan tramos malos en la vía





01 de Julio de 2022 (Viernes)


Estado del tiempo: Seco

equipos y maquinaria: Minicargador - Motoni-
veladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Paletera (2) Social (1) HSE (1) Operador (3)

Actividad en obra: Se ~~carate~~ sub base del
K2+880 al K2+980.

x 




02 de Julio de 2022 (Sábado)

Estado del tiempo: Seco

equipos y maquinaria: Minicargador - Motoni-
veladora - Vibrador de concreto - Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) Operadores (3) Paletera (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se recibe liberación por top-
grafía sub base y nivelación de rieles K2+978 al K2+918
- Se instalan rieles para fundidos de concreto
- Se instala pavimento del K2+978 al K2+918
- Se toman viguetas - se toman dos lados en sub base
Se hace muestra de Slump.

x 



03 de Julio de 2022 (Domingo)

NO se realizan actividades en obra

x *[Signature]*

[Signature]

04 de Julio de 2022 (Jueves)

No se realizan actividades en obra por ser festivo

x *[Signature]*

[Signature]

05 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: minicargador - Moto niveladora - Vibro compactador

Personal en obra: Pondera de obra Topografía (2)
Ayudantes (1) operador (2) paletero (2) Hsec (1)
Soceol (1)

Actividad en obra: Se realiza cerco en a firmado

Observación: Debido a las lluvias presentadas en la mañana el contratista no pudo cumplir con todas las actividades programadas el día de hoy.

[Signature]

[Signature]

06 de Julio de 2022 (Viernes)


Tiempo: Seco


Equipo y Maquinaria: Vibrador de concreto - mini Cargador - Vibro compactador - Moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Topografía
Ayudantes (10) Palotera (2) HSE (1) Social (1)
operador (3)

Actividad en obra: Se recibe por parte de la Comisión de topografía de intervención liberación de Sobobos y nivel de Riebs. K2+918 al K2+885.

- se fonde concreto del K2+918 al K2+885
- se toma muestra de slump para verificar asentamiento del concreto.

x 



07 de Julio de 2022 (Jueves)


Estado del tiempo: Se presentan llovios en horas de la tarde de: 04:00 pm a 05:00 pm

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Palotera (2) operador (3) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se realiza Cero de afirmado
Se coloca alineamiento y anchos por parte de topografía del K2+780 al K2+880.

- Se inicia con el sellado de juntas de K3+488 al K3+368.

x 



08 de Julio de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora
Vibro compactador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
 Ayudantes (2) Operador (3) Hse (1) Social (1)
 Pilotera (2)

Actividad en obra: Se continua con el
 coreo en afirmado del K2+880 al K2+780

- - se recibe por topografía liberación en afirmado del K2+880 al K2+780
- se toman densidades en afirmado por parte de la intervención en la Abs K2+825 izquierdo y en la K2+860 derecho

x *[Signature]*

09 de Julio de 2022 (Sábado) *[Signature]*

Tempo: Seco.

Equipos y Maquinaria: Motor niveladora - Mini-
 cargador - Vibro Compactador.

Personal en obra: Residente de obra
 Topografía (1) Pilotera (2) Ayudantes (2)
 Operador (3) Social (1) Hse (1)

Actividad en obra: Se realiza coreo en
 afirmado del K2+780 al K2+680.
 Se continua con el sello de juntas
 del K3+368 al K3+300.

x *[Signature]*

10 de Julio de 2022 (Domingo)

no se realizan actividades en obra

x *[Signature]*

[Signature]



11 de julio de 2022 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 10:00 am.

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - minicargador (Equipos Inactivos)

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Ayudantes (2) Operador (3) Palotera (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Por motivo de las fuertes lluvias presentadas en horas de la mañana se vio afectada la programación del día solo se evacuó agua estancada.


12 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Se presentan fuertes lluvias de 12:30 pm - 3:30 pm.

Equipos y maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - Minicargador

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Ayudantes (2) Paloteros (2) HSE (1) Social (1) Operador (3)

Actividad en obra: Se continúa con el Cerezo en afirmado del K2+780 al K2+680. Por motivo de las lluvias presentadas en horas de la tarde el Contratista tuvo que parar las actividades que estaba realizando.




13 de julio de 2022 (Miércoles)

Estado del tiempo: Se presentan lluvias de 06:00 a 07:00.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - Vibro Compactador - Estación - Nivel.

Personal en obra: Residente de obra operadores (3) Topografía (2) Ayudantes (2) paletas (2) social Hse.

Actividad en obra: en horas de la mañana se vaciaron aguas estancadas, por las lluvias presentadas.

- En horas de la tarde se extiende y compacta sub base.

[Signature]

14 de julio de 2022 (Jueves)

[Signature]

- Tiempo: seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - Vibro compactador - Vibrador de concreto - Nivel - Estación - Herramientas menores - Nivel - C

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2) Paletas (2) - Hse (1) social (1) - Operador (3) Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se recibe por topografía sub base y nivelación de rieles del K + al K2+830.

- Se toman coteos en sub base - K2+885 Izquierdo y K2+830 derecho.

- Se corea afirmado del K2+770 al K2+570.

- Se instala concreto del K2+885 al K2+830

Se toman viguetas y muestra de Slump.
para efecto de calidad del concreto.

~~S-A~~ 15 de Julio de 2022 (Viernes) ~~Paruefex~~

Tempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoni-
veladora - Vibrocompactador

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
operador (3) Ayudantes (2) Paletera (2) HSE (1)
Social (1)

Actividad en obra: Se continua con el
Cerezo de afirmado del K2+780 al K2+580.
- Se libera por parte de la topografía de
interventoria afirmado del K2+780 al K2+600.

~~S-A~~ ~~Paruefex~~

16 de Julio de 2022 (Sabado).

Tempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador motoniveladora
Vibro Compactador - Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
Ayudantes (10) Paletera (2) operador (3) HSE (1)
Social (1)

Actividad en obra: Se instala sub base del
K2+780 al K2+820.

- Se recibe sub base y nivelacion de rieles (K2+830-K2+795) por parte de la topografia. El contratista e interventoria toman consideraciones.
- Se instala concreto del K2+830 al K2+795.
- Se toma slump para verificar asentamiento de concreto.

S-A

Barufendi

17 de Julio (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

S-A

Barufendi

18 de Julio de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
vibrador compactador - Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra topografia (2)
Ayudantes (2) operador (3)

Actividad en obra: se instala y compacta
sub base del K2+790 al K2+710.
Se correa sub base del K2+790 al K2+710.

S-A

Barufendi

19 de Julio de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo y Maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
vibrador compactador - Vibrador de concreto Nivel estación

Personal en obra: Presidente de obra - Topografía(2) Hse social operador(3) Ayudantes(10) pintora(2)

Actividad en obra: Se instalan rieles.

- Se recorre por topografía del K2+795 al K2+712 (Sob base)
- Se toman densidades en sob base K2+740 Izq.
- Se instala Concreto del K2+795 al K2+712.
- Se toma slump para verificar asentamiento del Concreto.

[Signature]

[Signature]

20 de Julio de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:00 pm a 05:00 pm

- Equipo y maquinaria: Motoniveladora - Vibro - Compactador - Minicargador

- Personal en obra: Presidente de obra - Topografía(2) Hse(1) Social(1) - operador(3) Ayudantes(2) pintora(2)

Actividad en obra: Se realiza cerco de Sob base del K2+712 al.

- Se instala Sob base del K2+712 al K2+630

[Signature]

[Signature]

21 de Julio de 2022 (Jueves)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Motoniveladora - Minicargador

Vibro Compactador Nivel - estación

Personal en obra: Residente de obra operador(3)
Ayudantes(2) Topografía(2) Hse Social Paletera(2)

Actividad en obra: en horas de la mañana
se evacua agua y se retira material húmedo
de la vía

En horas de la tarde se cerea afirmado
del K2+600 al K2+500.

J-D

22 de julio de 2022 (Viernes).

Barra/Barra

Tiempo: lluvioso en horas de la mañana de 6:00 am a
07:00 am.

Equipos y maquinaria: Vibro Compactador - Mini-
cargador - Motoniveladora - Vibrador de
concreto Herramientas menores - Nivel

Personal en obra: Residente de obra topografía(2)
Auxiliar Social Auxiliares Hse(2) Paletera(2) Ayudantes(10)
operadores(3)

Actividad en obra: Se libera sub base y nivel de
rieles del K2+712 al K2+630
se instala concreto del K2+712 al K2+630.

J-D

23 de julio de 2022 (Sábado).

Barra/Barra

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la
mañana de 07:00 am a 09:00 am.

equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador Nivel

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Auxiliar Social Auxiliar Hse Operadores (3)
Ayudantes (2) Paletera (2)

Actividad en obra: Por motivo de los lluvias
presentadas el contratista no pudo realizar las
actividades programadas. Solo se evacua aguas
estancadas.

J/A

Paruef

24 de Julio de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

J/A

Paruef

25 de (Julio de) 2022 (Lunes)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 01:30 a 04:30 pm

equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra; Topografía (2)
Operador (3) Ayudantes (2) Hse (1) Social (1) Paletera (2)

Actividad en obra: Se realiza cerco en afirmado
K2+500 al K2+150.

- Se evacua agua estancada de budo
a los fierto Lluvias presentados en horas
de la tarde

J/A

J.A.
26 de Julio de 2022 (Martes) *Baruford*

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 09:00 am

Equipo y maquinaria: minicargador
motorizadora - VibroCompactador

Personal en obra: Residente de obra
topografía (2) Ayudantes (2) Operador (3)
palitera (2) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se extiende y
compacta sub base del K2+630 al K2+430
- se funden losas laterales en carcamo para
proteger tubería de agua potable (8 pte).
del K2+470 hasta K2+485 ml.

J.A.
27 de Julio de 2022 (Miércoles) *Baruford*

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motorizadora
Vibro Compactador - Vibrador de concreto Herramientas
menores

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
operadores (3) Ayudantes (10) HSE (1) Social (1)
palitera (2)

Actividad en obra: Se continúa con el Cero a
Sub base del K2+630 al K2+430.
- Se recibe mixtura de Rieles y Sub base por
topografía del K2+630 al K2+760.

Se toman densidades en Sub base K2+590 A-Derecho
 Se fondea del K2+485 al K2+470 Caricoma
 Se toman muestra de Slump para verificar asentamiento
 Se toman Viguetas para efecto de calidad del Concreto.

J-A

Forrest

28 de Julio de 2022 (Jueves).

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
 Vibro Compactador; Viguetas (2)

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
 Ayudantes (2) operador (3) HSE (1) Social (1) Conductores (2)

Actividad en obra: En horas de la mañana no se pueden ejecutar actividades debido a que al suelo se encuentra saturado.
 - En horas de la tarde se extiende Sub base al K2+430 al K2+300

J-A

Forrest

29 de Julio de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco.

Equipo y Maquinaria: Minicargador Motoniveladora
 Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
 Ayudantes (10) operador (3) HSE (1) Social (1)

Actividad en obra: Se instalan Estructos al K2+630 al K2+560

- Se toman mastros de slump para verificar asentamiento

- Se toman viguetas para efecto de calidad del Concreto

[Signature]

[Signature]

30 de Julio de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: Minicargador motorizado
Vibro Compactador

Personal en obra: Peón de obra Topografía (2)
Ayudante (1) Paletino (2) HSE Social

Actividad en obra: Se realiza cese de Sub base del K2+560 al K2+300.
Se realiza corte de Junta

[Signature]

[Signature]

31 de Julio de 2022

- Tiempo: seco

- Equipos en obra: Minicargador - Motorizado - Nivel
Vibro Compactador

- Personal en obra: Peón de obra - Topografía (2) HSE Social

Actividad en obra: Se instalan rieles del K2+560 al K2+440

[Signature]

[Signature]

01 de agosto de 2022 (Lunes)


Tiempo: Se presentan lluvias en horas en horas del día de 02:00 a 04:00 pm


equipos en obra: Minicargador - Vibro Compactador - moto niveladora - Nivel - Estación

Personal en obra: Res. de obra - Topografía (2) operador (3) - paletera (2) Hse (1) Social (1)

Actividad en obra: Se reabe por topografía nivel de sub base y rieles del K2+440 al K2+550.

las actividades programadas para el día de hoy se venían afectadas por las lluvias presentadas

x 



02 de agosto de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco


equipos y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora - vibro Compactador - vibrador de concreto Herramientas: nivel - estación


Actividad en obra: Se instala concreto del K2+440 al K2+550.

- Se toman vigetas del concreto

- Se toma slump para verificar asentamiento del Concreto

Personal en obra: Res. de obra - Topografía (2) operadores (3) paletera (2) Ayudante (10) Hse (1) Social (1)

x 



03 de agosto de 2022 (Miércoles)

Tiempo: seco

Equipos y maquinaria: Motoniveladora - Vibro compactador - minicargador Nivel - Estación

Personal en obra: Res. de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Operadores (3) paletara (2)
Hse (1) Social (1)

Actividad en obra: Se instala, compacta y cerea sub base del K2+330 al K2+440
- se instalan rieles del K2+330 al K2+440
- se toman densidades en sub base por parte del Contratista en presencia de la interventoría las cuales completaron 96%.

x *[Signature]*

[Signature]

04 de agosto de 2022 (Jueves)

Tiempo: seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora - Vibro compactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Res. de obra Topografía (2)
Hse (1) Social (1) Operador (3) Ayudantes (2)
paletara (2)

Actividad en obra: Se recibe por topografía nivel de sub base y rieles.
- Se realiza sello de Juntas.

x

[Signature]

05 de agosto de 2022 (Viernes)

Tiempo: Se presentan lluvias de 4:00 pm a 06:00 pm.

Equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora
vibro Compactador - Vibrador de Concreto Herramientas
menores

Personal en obra: Pes. de obra Topografía (2)
Ayudante (10) Social (1) Hsec (1) paletero (2) operador (3)

Actividad en obra: Se realiza fundida de pavimento
del K2+440 al K2+390.

Se realiza Slump.
Por motivo de las lluvias se para la fundida.

SA

Parafirma

06 de agosto de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
vibro Compactador - vibrador de concreto

Personal en obra: Pes. de Obra - Topografía (2) Hsec (1)
Social (1) paletero (2) Operador (3) Ayudante (10)

Actividad en obra se continua con la fundida
de pavimento del K2+390 al K2+330.


Se continua con el Sello de Juntas en pavimento

SA

Parafirma

07 de agosto de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

x 

08 de agosto de 2022 (Lunes)


Tiempo: Seco


Equipos y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador - nivel - Estación Volqueta (2)

Personal en obra: Res. de obra Topografía (2)
Ayudantes (2) Operadores (3) palatera (2) social (1) Hx (1)

Actividad en obra: Se instala y corea sub base del K2+330 al K2+220

Se recibe por topografía nivelación de sub base y rieles del K2+330 al K2+220.

x 




09 de agosto de 2022 (Martes)


✓ Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 04:30 a 06:30

Equipos y Maquinaria: Minicargador - Motoniveladora - Vibro Compactador Vibrador de Concreto

Personal en obra: Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (10) Palatera (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se instala concreto del K2+330 al K2+270

x 



10 de agosto de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador - Vibro Compactador - Vibrador de Concreto - motoniveladora Nivel - Estación - Herramientas menores

Personal en obra: Res. de obra operadores (3) Topografía (2) Ayudantes (10) Pilotera (2) Hse - Social.

Actividad en obra: Se instala concreto del K2+270 al K2+220.

Se sella juntas en pavimento.

11 de agosto de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora Vibro Compactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Res. de obra. operadores (3) Ayudantes (2) Pilotera (2) Hse - Social Topografía (2)

Actividad en obra: Se instala y Cereca Sub base del K2+220 al K2+150.

- Se instalan rieles del K2+220 al K2+150.

12 de agosto de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: seco

Personal en obra: Res. de obra topografía (2)
Ayudantes (10) palotera (2) Social Hse

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibro-
Compactador - Vibrador de concreto - Moto
niveladora - Herramientas menores - Nivel

Actividad en obra: Se reabe por topografía
nivel de rieles y sub base del K2+220 - K2+150
Se instala concreto del K2+220 al K2+150
Se toman Viguetas y se hace slump al
concreto para efecto de calidad.

x *[Signature]*

[Signature]

13 de Agosto de 2022 (Sábado)

↓ Tiempo: se presortan llovios en horas de la
mañana de 9:30 a 10:30 am

Equipo y maquinaria: Minicargador
moto niveladora - Vibro compactador - Nivel. estación

Personal en obra: Res. de obra topografía (2)
Ayudantes (2) Hse social palotera (2)

Actividad en obra: Se realiza Cerezo en
afirmado del K1+900 al K2+150
Se continúa con el Sello de Juntas en pavimento

x *[Signature]*

[Signature]

14 de agosto de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

15 de agosto de 2022 (Lunes)

No se realizan actividades en obra por ser festivo.

[Signature]

16 de agosto de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibrocompactador
moto niveladora Nivel Estación

Personal en obra: Res de obra Topografía (2) pilotes (2)
Ayudantes (2) Operadores (3) Hse (1) Social (1)

Actividad en obra: Se recibe por topografía nivel y
alineamientos de afirmado del K1+900 al K2+150.

- Se cerea afirmado del K1+900 al K1+850.

x *[Signature]*

[Signature]

17 de agosto de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco


Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora
Vibro Compactador - Nivel - Estación


Personal en obra: Rendite de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) Hse (1) Social (1) - pilotes (2)
operadores (3)

Actividad en obra: Se recibe por topografía nivel y alineamiento de afirmado del K1+900 a K1+850

Se instala subbase del K2+150 al K2+080

— se correa subbase del K2+150 al K2+080

x 



18 de agosto de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador — vibro compactador
motor niveladora nivel estación — vibrador de concreto


Personal en obra: Res de obra Topografía (2)
operador (3) Ayudantes (10) palatera (2) Hse — Social


Actividad en obra: Se instalan rieles del K2+150 al K2+080

— se recibe por parte de la topografía de intervención nivel de subbase y rieles del K2+150 al K2+080

— se instala Concreto del K2+150 al K2+080
se toman Vigas y Slom del concreto para efecto de calidad

— se toma densidades a la subbase por parte del Contratista en compañía de la interventora la cual dio

x 



19 de agosto de 2022 (Viernes)

✓ Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde 3:00-4:00pm


Equipos y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro compactador - Nivel - Estación


Personal en obra: Res. de obra Topógrafo (2) Ayudantes (2)
Operadores (3) Hse social palatera (2)

Actividad en obra: Se cerea afirmado del K1+950 al K1+700

- Se recibe por topografía (Interventoria) nivel y alineamiento de afirmado del K1+950 al K1+700

- Se continua con el Sello de juntas al pavimento





20 de agosto de 2022 (Sábado).

✓ Tiempo: Se presentan lluvias. Lleva en horas de la mañana de 06:00 am a 07:00 am


Equipos y maquinaria: minicargador motoniveladora
Vibro compactador Nivel Estación


Personal en obra: Res de obra Topógrafo (2) Ayudantes (2)
Operadores (3) Hse social palatera (2)

Actividad en obra: Se recibe por parte de topografía nivel de sub base y neles del K2+080 al K1+960.

- Se instalan neles del K2+080 al K1+960

- Se extiende sub base del K1+960 al K1+800





21 de agosto de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

22 de agosto de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador - Moto niveladora - Estación - Nivel
Herramientas menores - Vibro concreto.

Personal en obra: Residente de obra topografía (2)
Ayudantes (10) - Hse - Social - Operadores (3)
Palotero (2)

Actividad en obra: Se instala concreto del K2+060 al K2+010

- Se continúa con el sello de juntas.
- Se toman Vigetas y muestra de slump

[Signature]

23 de agosto de 2022 (Martes)

1. Tiempo: Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana de 07:00 - 10:00 am

Equipos y maquinaria: minicargador
moto niveladora Estación - Nivel.
Vibro Compactador

Personal en obra: Residente de obra
Comisario de topografía ayudantes (2)

Palatera (2) Hse - Social Operador (3)

Actividad en obra: Se cancela obra debido a las lluvias presentadas en la mañana las cuales afectaron las actividades programadas para el día de hoy.

[Signature]

[Signature]

24 de agosto de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - mini: Cargador - Nivel - Estación - motor niveladora - Vibro concreto

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) Ayudantes (2)

Actividad en obra: Se instala concreto del K2+00 al K2+980.
- Se continúa con el sello de juntas.

[Signature]

[Signature]

25 de agosto de 2022 (Jueves)

✓ Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 08:00 am a 10:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibro Compactador - motor niveladora - Nivel - Estación

Personal en obra: Res de obra operadores (4)
Hse Social palatera (2) Ayudantes (2)
Topografía (2)

Actividad en obra: se continúan con sello de juntas luego se suspenden las actividades debido a las lluvias presentadas en la mañana

J.D.

x Caruefend

26 de agosto de 2022 (viernes)

Tiempo: fuertes lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora - Vibro Compactador - Nivel estación

Personal en obra: Residente de obra - Topografía (2) Ayudante (2) Operador (3) HSE - Social - Piloto (2)

Actividad en obra: Debido a las lluvias que se presentaron el día de ayer y hoy. Solo se ha evaluado aquí las actividades programadas para el día de hoy no se pudieron realizar ya que el suelo se encuentra muy saturado

J.D.

Caruefend

27 de agosto de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora - Vibro Compactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Residente de obra - Topografía Social, HSE Operador (2) - Piloto (2)

Actividad en obra: Se continua con el sello de Juntos

- Se inicia Cerezo en sub base.

[Signature]

[Signature]

28 de agosto de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

[Signature]

29 de Agosto de 2022 (Lunes)

✓ Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 08:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Vibro Compactador - Estacion - nivel.

Personal en obra: Residente de obra - Operador (3)
Ayudantes (2) Peletero (2)

Actividad en obra: Se continua con el Cerezo en sub base del K+800 al K+970

Se extiende sub base del K+800 al K+970

[Signature]

[Signature]

30 de agosto de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - mini
Cargador - Estacion nivel - motoniveladora

Personal en obra: Pes de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) palatera (2) - Hsc - social - operador (4)

Actividad en obra: No se recibe por topografía
Nivel de subbase y rieles debido a que
no se encontraba listo el terreno

- Se instalan Rieles del K+860 al K+970
- Se toman densidades en sub base K+860-K+970

x LA

Cornejo

31 de agosto de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora - Vibrocompactador - Estación - Nivel

Personal en obra: Pes. de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) operador (4) - palatera (2) Hsc - social.

Actividad en obra: Se recibe por topografía
nivel de subbase y rieles del K+860 al
K+970

- Se corea afirmado del K+200 al K+80
- Se instala subbase del K+700 al K+860

x LA

Cornejo

01 de Septiembre de 2022 (Jueves)



Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador - Vibro Compactador - Estación - Nivel - Vibrador de Concreto motoniveladora

Personal en obra: Residente de obra. Topografía (2)
 Social-Hse - palatera (2) operador (3) Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se instala concreto del
 K1+860 al K1+940

- Se toman Viguetas para medir la verificación del concreto
- Se toma muestra de slump para verificar asentamiento del concreto.

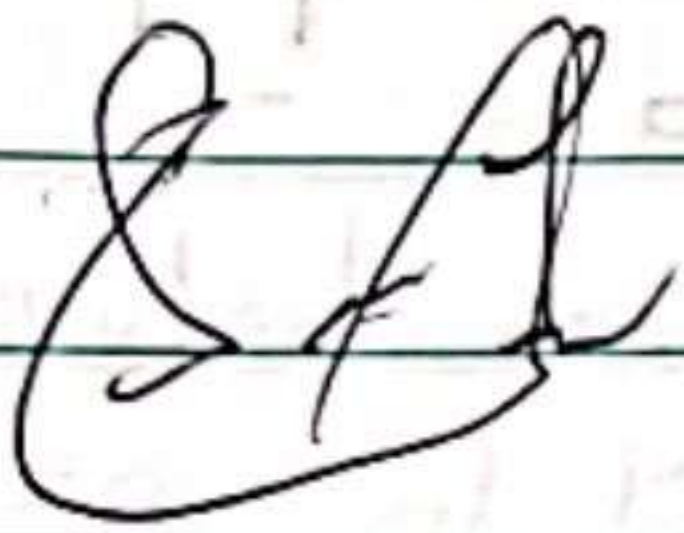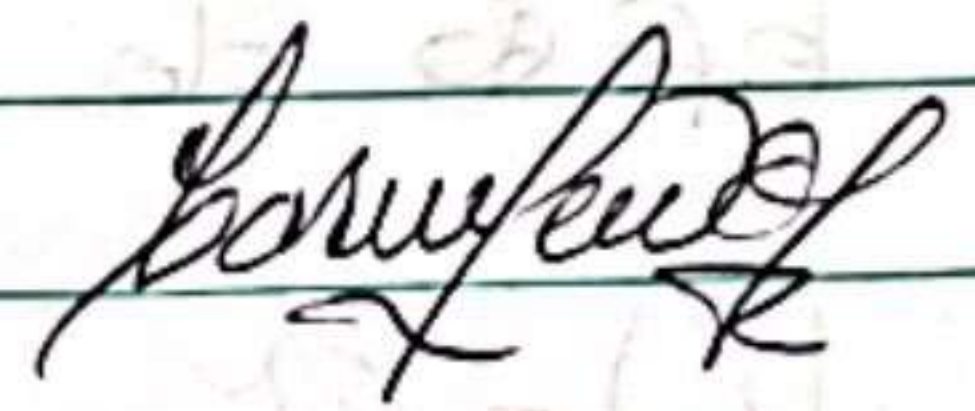02 de Septiembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: seco

Equipo y maquinaria: Minicargador Motoniveladora
 Vibro Compactador - Estación - Nivel

Personal en obra: Res. de obra - Topografía (2)
 Social (1) Hse Palatera (2) Ayudantes operadores

Actividad en obra: Se cerea afirmado al K+700
 al K1+

- Se se prende y compacta sub base al K1+860 al K1+760
- Se sigue afirmado por topografía (inventaria) K1+700 - K1+200

03 de Septiembre de 2022 (Sabado)

Tiempo: seco

Equipos y maquinaria: Mini cargador Vibro Compactador
 Moto niveladora - Vibrador de concreto Nivel
 Estacion

Personal en obra: Res. de obra - Topografía (2)
Ayudantes (10) palatera (2) operador (3) Hse social

Actividad en obra: Se instalan rieles del $K1+860$ al $K1+760$.

- - se libera sub base y rieles por parte de la topografía de intervención del $K1+860$ al $K1+760$
- se instala concreto del $K1+860$ al $K1+760$
- se toman vigetas y muestra de slump para efecto de calidad del Concreto

[Signature]

04 de septiembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

05 de septiembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: se presentan lluvias de 08:00 a 09:00 am

Equipos y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro compactador - Nivel - estación

Personal en obra: Res. de obra - Topografía (2) Hse social - palatera (2) operador (3) Ayudantes (2)

Actividad en obra: se instala sub base del $K1+780$ al $K1+700$ -

- se toman densidades en sub base del $K1+780$ al $K1+700$ por parte del Constructora

[Signature]

[Signature]

06 de Septiembre de 2022 (martes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - Motoniveladora
Vibro Compactador - Muel. estación

Personal en obra: Residente de obra topografía (2) - Operador (3)
Ayudantes (2) paletaria (2)

Actividad en obra: Se instalan Rieles del
K1+780 al K1+700

- Se toman densidades por parte de la intervención
ala sub base del K1+700 al K1+780

- Se libera por topografía fra del K1+780 al K1+750
debido a inconvenientes con alineamiento, no se
libera hasta el K1+700 abscisa solicitada. (sub base)
- Se instala concreto del K1+780 al K1+750
- Se toma muestra de slump para efecto de calidad
del concreto.

Parafuef

07 de Septiembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador nivel estación - Vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra - Topografía (2) Ayudante (1)
Ases. social operador (3) paletaria (2) operadores (3)

- Actividad en obra: Se libera por topografía
sub base y rieles del K1+750 al K1+700

se funde pavimento del K+750 al K+700
se toma Vigas y se hace muestra de
Slom. para Efecto de Calidad

[Signature]

08 de Septiembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: se presentan lluvias de 03:00pm a 04:00pm

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - Minicargador - motoniveladora.

Personal en obra: Res-de obra - Topografía (2)
Ayudantes (2) palitera (2) Hse - Social. operadores (3)

- Actividad en obra: se libera afirmado por parte de la topografía de la interventoría de K+100 al K+400
- Se toman densidades en afirmado del K+100 al K+400
- Se extiende sub base del K+600 al K+700

[Signature]

[Signature]

09 de Septiembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: minicargador - Vibro compactador motoniveladora - Nivel - estación - Vibrador de concreto


Personal en obra Res-de obra (omision de topografía (2) Ayudantes (10) social (1) Hse (1) palitera (2) Operadores (3)

Actividad en obra: Se instalan rieles del K1+700 al K1+600

- Se libera por parte de la Comisión topográfica de interventoría Rieles y subbase del K1+600 al K1+700

- Se instala Concreto del K1+600 al K1+700

- Se toman viguetas y muestra de Slump para efecto de Calidad

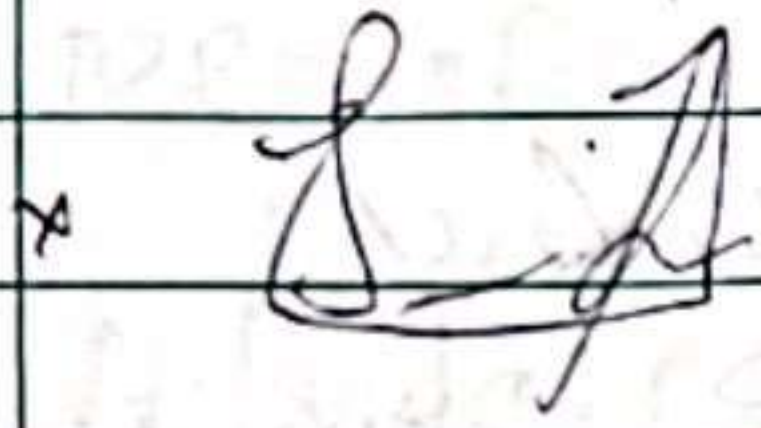



10 de Septiembre de 2022 (Sábado).


Tiempo: Seco


Equipos y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador
moto niveladora - nivel - estación

Personal en obra: Res de obra topografía (2) Ayudantes (2)
operadores (3) paletara (2) HSE - Social

Actividad en obra: Se instala. Sub base. del K1+600 al K1+500


- Se toman densidades a la sub base por parte del contratista del K1+600 al K1+500

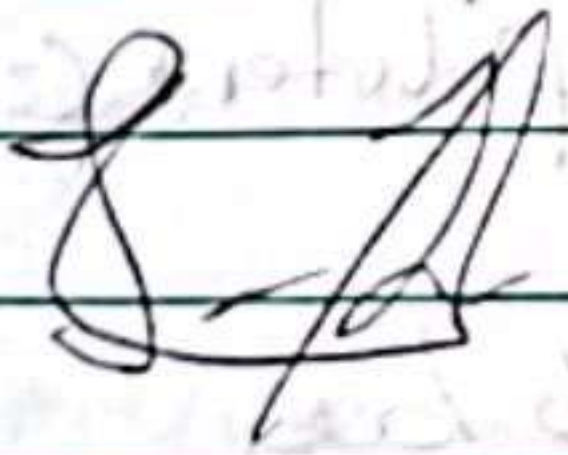




11 de Septiembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

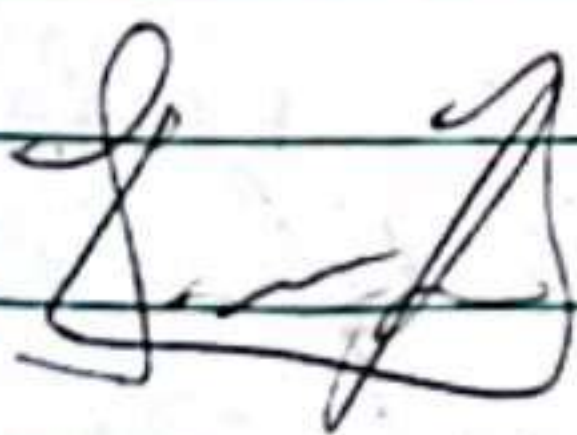



12 de Septiembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador - motoniveladora - Nivel - estación - Vibrador concreto

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) Hse Apudantes (10) Social - Operador (3) Paletera (2)

Actividad en obra: Se instalan rieles para concreto del K_1+600 al K_1+500

- Se libera por parte de la topografía Rieles y Sub base del K_1+600 al K_1+500
- Se instala pavimento del K_1+600 al K_1+500
- Se toman viguetas y muestra de slump para efecto de calibrar el concreto

[Signature]

[Signature]

13 de Septiembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Llovizna en horas de la mañana de 07:30 a 08:30 am

Equipos y maquinaria: minicargador - Vibro compactador - motoniveladora - Nivel - estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) Apudantes (2) Social Hse operador (3) Paletera (2)

Actividad en obra: Se instala sub base K_1+500 al K_1+430

Se Cerece sub base del K_1+500 al K_1+430

Se Cerece afirmado del K_1+100 al K_1+000

[Signature]

[Signature]

14 de Septiembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 08:00 am.

Equipos y maquinaria: minicargador - Vibro compactador
motoniveladora - Nivel - estación - Vibrador de concreto

Personal en obra: Res. de obra - social (1) HSE (1)
topografía (2) Ayudantes (10) - paletero (2) operadores (3)

Actividad en obra: Se instalan rieles en subbase del K_1+500 al K_1+430 .

- Se libera por topografía nivel de rieles y subbase del K_1+500 al K_1+430
- Se instala Concreto del K_1+500 al K_1+430
- Se toman viguetas y se hace Slom del K_1+500 al K_1+430 para efecto de calidad.

[Signature]

[Signature]

15 de Septiembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador - Nivel - Motoniveladora - estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) Social (1)
HSE - Operadores (3) paletero (2) Ayudantes (1)

Actividad en obra: Se continúa con el Cerezo a órdenes del K_1+000 al K_1+800

- Se instala sub base del K_1+430 al K_1+330
- Se instalan rieles en sub base del K_1+430 al K_1+330

[Signature]

[Signature]

16 de Septiembre de 2022 (viernes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 07:00 am a 09:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibro compactador
Motoniveladora - Nivel - estación - Vib. de Concreto

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) HSE (1)
Social (1) - operadores (3) - paletara (2) Ayudantes (10)

- Actividad en obra: Se liberan neles y sub base por parte de la intervención del K+430 al K+330

- Se instala concreto del K+430 al K+390.
Se suspende fundido de concreto por fallos mecánicos en la planta de concreto

[Signature]

[Signature]

17 de Septiembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Vibro compactador - minicargador
Motoniveladora Nivel - Estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) HSE
social operadores (3) Ayudantes (2) paletara (2)

Actividad en obra: Se continúa con la fundido de pavimento del K+390 al K+430
Se instala y cura subbase del K+330 al K+230

[Signature]

[Signature]

18 de Septiembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

19 de Septiembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 08 a 09:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - motorvelador - Nivel
Vibro compactador - estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2) Ayudantes (2)
Hse social - paletina (2) operadores (3)

Actividad en obra: Se Continúa con el Ceres
de afirmado del K+1000 al K+800

Se instalan rieles en sub base del K+335 al
K+230

- NO se realiza liberación de niveles de rieles y
sub base por ajustes de alineamiento debido a que
hay un poste que según alineamiento queda dentro
de la vía K+310.

• - se libera afirmado por topografía del K+1000 al K+800

[Signature]

[Signature]

20 de Septiembre de 2022 (Martes)

Tempo: seco

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - Mini
cargador - nivel - estación - motorveladora

Personal en obra: Res de obra, operadores (3) Hse
social Ayudantes (10) paletina (2) Topografía (2)

Actividad en obra: Se libera Nivel de rieles y
 Sub base por topografía K1+330 al K1+230
 - Se instala concreto del K1+330 al K1+230
 - Se toma muestra de Slump para efecto de
 calidad del concreto.

[Signature]

[Signature]

21 de Septiembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Se presentan llovios de 08:00 am
 a 10:00 am.

Equipo y maquinaria: Minicargador - Moto niveladora
 - vibrocompactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2)
 Ayudantes (2) social HSE paletero (2) operadores (3)

Actividad en obra: Las actividades programadas
 para el día de hoy se ven afectadas por
 los fuertes llovios. Solo se evacua agua
 estancada.

[Signature]

[Signature]

22 de Septiembre de 2022 (Jueves)


Tiempo: Seco


Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
 Vibrocompactador - Nivel - Estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2)
 Ayudante (2) social HSE paletero (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se Cerea Subbase al K1+270 al K1+190

Se instala Subbase al K1+470 al K1+50

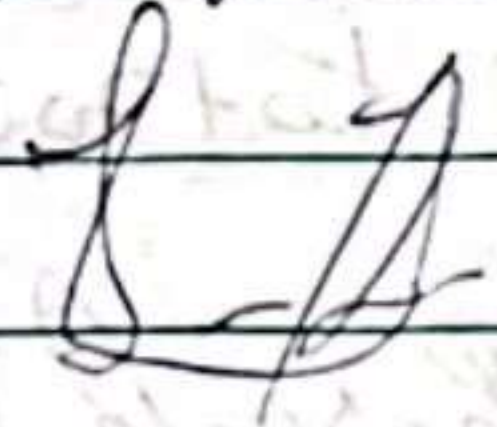x 



23 de Septiembre de 2022 (Viernes)


Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 02:30 a 04:30 pm


Equipo y maquinaria: minicargador - motoniveladora
Vibro Compactador - Nivel - Estación.

Personal en obra: Res. de obra - Topografía - Ayudantes (2)
Peletero (2) Social - HSE - Peletero (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se instalan nels en un solo Camil lateral Izquierdo del K1+270 al K1+190
Se libera nels y Sub base camil Izquierdo del K1+270 al K1+190

- Se Suspenden actividades debido a las fuertes lluvias presentados en horas de la tarde

x 



24 de Septiembre de 2022 (Sabado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 08:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - Vibrocompactador
Motoniveladora - Nivel - Estación - Vibrador de concreto

Personal en obra: Res. de obra Topografía (2) Social HSE
Ayudantes (12) Operador (3) Peletero (2)

Actividad en obra: Se funda Comil trayendo
del K+270 al K+190

Se cerra afirmando al K+800 al K+700

[Signature]

[Signature]

25 de Septiembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades

[Signature]

[Signature]

26 de Septiembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Vibro Compactador - moto
niveladora - mini cargador - Vibradora con creta

Personal en obra: Bos. de obra - Topografía (2) Social.
Ayudantes (10) palitru (2) operador (3)

Actividad en obra: Se libera nivel deriel
y sub base por topografía del K+270 al K+190
Comil derecho

- Se funda Comil derecho del K+270 al K+190

- Se realiza Slump para efecto de calidad
del concreto

[Signature]

[Signature]

27 de Septiembre de 2022 (Martes)

Tiempo: lluvias en horas de la tarde de 02:00 a 04:00 pm

Equipo y maquinaria: minicargador - vibro compactador
motor niveladora - Nivel - Estación -

Personal en obra: Res de obra Topografía (2) Hse
Social operadoras (3) palatera (2) Ayudantes (2)

Actividad en obra: Se instala Sdbas de
K1+170 al K1+070
debido a los fuertes lluvias se suspenden
actividades

[Signature]

[Signature]

28 de Septiembre de 2022 (Miércoles)

Tempo: Lluvias en horas de la tarde de 02:30
a 04:30 pm

Equipo y maquinaria: Vibro Compactador - moto
niveladora - Minicargador

Personal en obra: Res de obra, Topografía (2) social
Ayudantes (2) - palatera (2) - operador (3)

Actividad en obra: se realiza Cerec on Sdb
base del K1+170 al K1+070

Se suspenden actividades por las fuertes lluvias
que se presentan en horas de la tarde

[Signature]

[Signature]

29 de Septiembre de 2022 (Jueves)

Tempo: Se presentan lluvias en horas
de la mañana de 07:00 a 08:00 am

Equipo y maquinaria: Minicargador - motoniveladora
Vibro compactador

Personal en obra: Res de obra Topografía (2) Hse
Social palotero (2) Operadores (3) Ayudantes

Actividad en obra: Se instalan rieles del
K1+170 al K1+070

- Se libera Nivel de Subbase y rieles
por parte de la Comisión topográfica de
la intervención del K1+170 al K1+070
El Contratista inicia finde en horas
de la tarde cuando la vía se encuentra
seca y firme apta para finde del
K1+170 al K1+070.

OBSERVACIÓN: El Contratista saca el terreno
con ayuda de un Soplador de espaldas y opera
que la vía se quede en su totalidad para iniciar
los finde.

[Signature]

[Signature]

30 de Septiembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 03:30 - 5:30 pm

Equipo y maquinaria: Minicargador - moto
niveladora - Vibro compactador - Nivel-
estación

Personal en obra: Res de obra - Topografía (2)
Operador (3) palotero (2) Ayudantes (1)
Social Hse

Actividad en obra: Se realiza ccreo en

Sob base del K1+070 al K1+010

- Se instalan rieles del K1+070 al K1+010
Debido a las lluvias presentadas en la tarde
Se suspenden las actividades que se ejecutaban

[Signature]

[Signature]

01 de octubre de 2022 (Sábado).

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: mini cargador Motoniveladora
Vibro Compactador Nivel Estación Herra-
mientos menores. Vibrador de Concreto.

Personal en obra: Ing Residente de obra Topografía (2)
Ayudantes (10) Hsec (1) Social (1) Operadores (3)
Albañiles (2)

Actividad en obra: Se libera por topografía Rieles y
Sob base K1+070 al K1+010.

- Se funda del K1+070 al K1+010
- se toman muestra de slump al concreto para efecto de
calidad.

[Signature]

[Signature]

02 de octubre de 2022 (Domingo)

No se realiza actividad en obra.

[Signature]

[Signature]

03 de octubre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

equipos y maquinaria: mini cargador - vibró
compactador moto niveladora nivel
estación - vibrador de concreto

personal en obra: Res de obra Topografía (2)
Ayudantes (10) Social Hse operadores (3)
Palateros (2)

Actividad en obra: se instalan rieles del
K+700 al K+950.

se libera por topografía Nivel de rieles y sub base
del K+700 al K+950.

- Se instala pavimento del K+700 al K+950

- Se toma Slm y Vigetas para efecto de calidad

[Signature]

[Signature]

04 de octubre de 2022 (Martes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 07:00 a 08:00 am

equipos y maquinaria: Mini cargador - moto
niveladora - vibró compactador - Nivel
Estación Volquetes

personal en obra: Res. de obra topografía (2)
Ayudantes (2) Social Hse operadores (3)
Palateros (2)

Actividad en obra: se extiende y compacta
sub base K+880 al K+950

- Se cerca sub base del K+880 al K+950

[Signature]

[Signature]

05 de octubre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: moto niveladora - Vibro compactador - mini cargador - Nivel Estación Vibrador de Concreto

Personal en obra: Res. de obra Comisión de topografía Operador (3) Ayudantes (10) Social Hse palétna

Actividad en obra: se instalaron niveles del K+880 al K+950

- Se liberó por topografía niveles de rieles y subbase del K+880 al K+950

- se instala pavimento del K+880 al K+950

- se hacen muestra de slump para efecto de calidad del concreto

- Se liberó afirmado por topografía (TPI) K+700 al K+800

[Signature]

[Signature]

06 de octubre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana de 07:30 a 08:30 am

Equipo y maquinaria: Moto niveladora - mini cargador - Vibro compactador - Nivel Estación

Personal en obra: Residente de obra - Hse (1) Social (1) Operador (3) Ayudantes (2) palétnas. Conductor (2)

Actividad en obra: se extiende subbase del K+880 al K+820

se realiza cerco en ab base del Kotsoal
Kt+820

x *[Signature]*

[Signature]

07 de octubre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Mini Cargador Vibro
Compactador moto niveladora
Nivel Estacion

Personal en obra: Ros. de Obra (1) comisión
de topografía (2) Ayudantes (10) Paletero (2)
Hse Social

Actividad en obra: se libera por topografía (Gr)
Nivel y alineamiento de nobos y subbase del
Kt+880 al Kt+820

- Se instala pavimento del Kt+880 al Kt+820
- Se toman vigetas y glom al concreto para
efecto de calidad.

[Signature]

[Signature]


08 de octubre de 2022 (Sabado)

(1) Tiempo: Lluvias en la tarde de 08:00 a 05:00pm

Equipos y maquinaria: Mini Cargador - moto
niveladora - Vibro Compactador - Nivel
Herramientas menores - Estacion
topografica

Personal en obra: Pendiente de obra - Comisión
de topografía (2) Ayudantes (2) operadores (3)
Hse. Social paleteros (2)



Actividad en obra: Se instala sub base del. K0+820
al K0+750.
se suspenden actividades por lluvias.

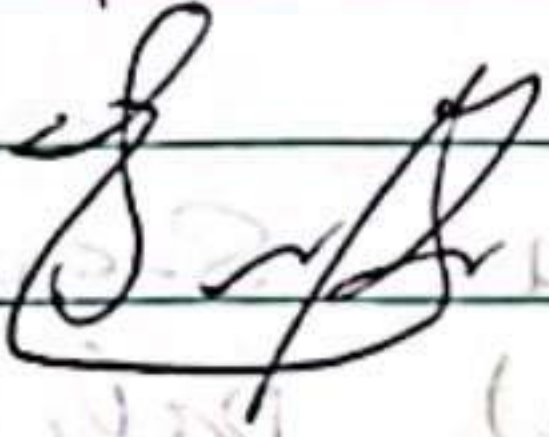


09 de octubre de 2022 (Domingo)

Tiempo: seco

no se realizan actividades en obra.
por ser domingo

10 de octubre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco



Equipos y maquinaria: Minicargador - motor
nucleadora Vibro Compactador - Nivel
estación

Personal en obra: Pendiente de obra, Social
Hse operadores (3) Ayudantes (10)
paleteros (2)

Actividad en obra: Se instalan riles del K0+820 al
K0+750

se recibe por topografía (INT) Nivel de nebl y sub
base del K0+820 al K0+750

- Se instala pavimento del K0+820 al K0+750

11 de octubre de 2022 (Martes)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 01:00 a 02:00 PM

Equipos y maquinaria: mini cargador moto
niveladora nivel - estacion - Vibro
Compactador

Personal en obra: Ren. de Obra Social
Topografa (2) Ayudantes (2) palifera (2)
Operador (3)

Actividad en obra: Se libera por parte de la topografia de la interventoria a firmados del K+600 al K+700

- Se realiza Cerco a Subbase del K+670 al K+750.

- Se instala Subbase del K+750 al K+670.

S-A

Parafirma

12 de octubre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvia

Equipos y maquinaria: mini cargador
moto niveladora - Vibro Compactador
Nivel Estacion

Personal en obra: Rendiente de obra Social
Asc. Operador (3) Ayudantes (2)
Palifera (2) Topografa

Actividad en obra: Se libera por parte de la topografia de la interventoria nivel de subbase y relleno del K+670 al K+750

se instala concreto del K0+750 al K0+716.
 se toma muestra de slump para efecto de calidad del concreto

[Signature]

[Signature]

13 de octubre de 2022 (jueves)

Tiempo: Seco

equipos y maquinaria: Mini cargadora - vibró
 Compactador - Nivel - Estación
 motoniveladora

Personal en obra: Residente de obra ASE
 Social operador(3) Ayudantes (10) Topografos (2)
 paleteiro (2)

Actividad en obra: Se funde del K0+716 al
 K0+686

-se toman vigas y muestra de slump al concreto
 para efecto de calidad.

[Signature]

[Signature]

14 de octubre de 2022 (viernes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: mini cargador - moto
 niveladora - Nivel estación - vibró
 Compactador

Personal en obra: Res. de obra - Social
 HSE operador(3) Ayudantes (2) paleteiro (2)

Actividad en obra: Se extiende y compacta sub base del K+670 al K+590

[Signature]

[Signature]

15 de octubre de 2022 (sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Mini cargador - Vibro Compactador Vibrador de concreto moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra comisión de topografía (2) Ayudantes (10) Paletera (2) HSE Social Operadores (3)

Actividad en obra: Se instaló concreto del K+686 al K+670.

Se toma muestra de Slump al concreto para Verificación de asentamiento.

[Signature]

[Signature]

16 de Octubre de 2022 (Domingo)

Tiempo: Seco

El día de hoy no se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

17 de Octubre de 2022 (Lunes Festivo)

No se realizan actividades en obra

SA

Parafuente

18 de Octubre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Mini Cargador moto
niveladora - Vibro Compactador - Nivel
Estación

Personal en obra: Responsable de obra
Topografías (2) Ayudantes (2) Operadores (3).
Paleteros (2)

Actividad en obra: Se realiza Cereos en sub
base del K0+670 al K0+590

- Se instalan rieles del K0+670 al K0+590

- Se toman densidades de K0+670 al K0+590

SA

Parafuente

19 de Octubre de 2022 (Miércoles)


Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: Minicargador moto
niveladora - Vibro Compactador - Nivel
Estación

Personal en obra: Responsable de obra, Comisión
de topografía (2) Ayudantes (2) ASE Social
Paleteros (2) Operador (3)

Actividad en obra: Se libera por topo
grafía de Interventoría del K0+670 al K0+590

- Se instala concreto del $Ko + 670$ al $Ko + 590$
- Se toman muestras de slump al concreto.

x 

García

20 de Octubre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Mini cargador moto
Niveladora Vibro compactador estacas
Nivel.

Personal en obra: Responsable de obra HSE
Social operadores (3) Ayudantes (2)
paleteros (2)

Actividad en obra: Se instala, compacta sub
base del $Ko + 590$ al $Ko + 520$

- Se arma subbase del $Ko + 590$ al $Ko + 520$
- Se toman muestras en sub base del $Ko + 590$
al $Ko + 520$

x 

García

21 de Octubre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria Mini cargador Vibro
Compactador, moto niveladora, Nivel
Estación

Personal en obra: Responsable de obra top.
gru fioc (2) Ayudantes (10) paleteros (2) Social
HSE

Actividad en obra: Se instalan rieles del $K_0 + 590$ al $K_0 + 520$

- Se libera por topografía (Int) nivel de rieles y sub base del $K_0 + 590$ al $K_0 + 520$
- Se instala concreto del $K_0 + 590$ al $K_0 + 520$

[Signature]

[Signature]

22 de Octubre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 07:30 a 10:30 am.

Equipos y maquinaria: Mini cargador vibrador
Compactador moto niveladora Nivel
Estacion

Personal en obra: Residente de obra
Topografía (2) Ayudantes (2) Social Hse
Paletero

Actividad en obra: No se realizan actividades en obra debido a las lluvias que se presentaron

[Signature]

[Signature]

23 de Octubre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

[Signature]

[Signature]

24 de Octubre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Se presentan lluvias en horas de mañana de 07 a 08 am


Equipo y maquinaria: Mini cargador moto
niveledora Vibro compactador Nivel
Estación


Personal en obra: Peo de obra Cominon
de topografía Socceul Hs e paletine (2)
Ayudantes (2) Operadores.

Actividad en obra: Se extiende y compacta
Subbase del K0+520 al K0+440

- Se toman dondado en sub base del K0+520
al K0+440

- Se instalan rieles del K0+520 al K0+440

x 



25 de Octubre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: Mini cargador moto
niveledora Vibro compactador Nivel
Estación


Actividad en obra: Se libera por topografía de
la intervención Nivel de rieles y sub base
del K0+520 al K0+440

- Se instalan Concretos del K0+520 al K0+440

- Se toman muestras de slump al concreto
para efecto de cohesión del mismo.

Personal en obra: Pondero de obra
Topografía (2) Ayudantes (2)

Auxiliar Social Auxiliar Hse paleteros.
operadores (3)

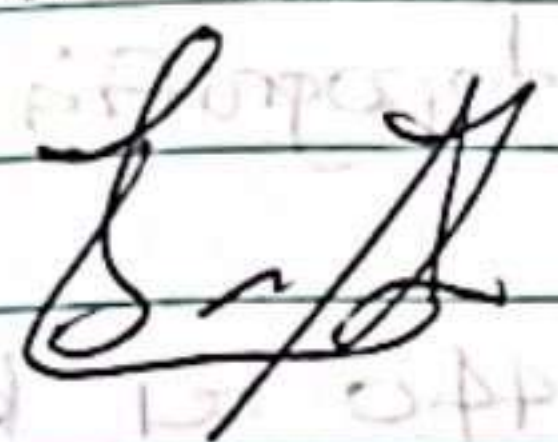x  



26 de Octubre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvioso en horas de la tarde de 04:00 a 05:00 pm

Equipo y maquinaria: Moto niveladora
Vibro Compactador - minicargador
Nivel Estación

Personal en obra: Pendiente de obra
Topografía (2) Ayudantes (2) Social
Ases Operadores

Actividad en obra: Se extiende y compacta
Sub base del K+440 al K+370.
Se realiza coreo a sub base del K+440 al K+370
Se toman densidades a sub base del K+440 al K+370

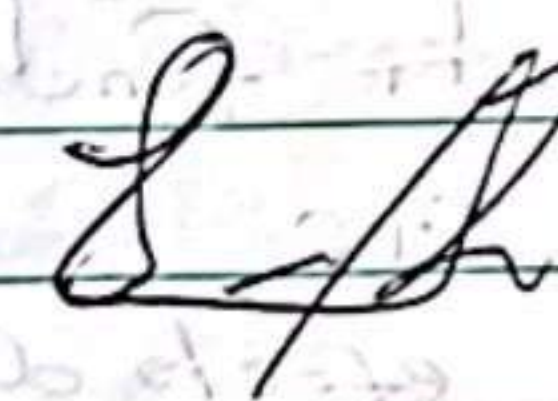x  

27 de octubre de 2022 (Jueves)


Tiempo: Seco


Equipo y maquinaria: moto niveladora
Vibro compactador Nivel Estación
minicargador

Personal en obra: Pendiente de obra
Social Hse Topografía (2) Ayudantes (2)
operador (3) paletera (2)

Actividad en obra: Se recibe por topografía del Kot 440 al Kot 370.

- se instala concreto del Kot 440 al Kot 425
- se toma slump para efecto de calidad del concreto

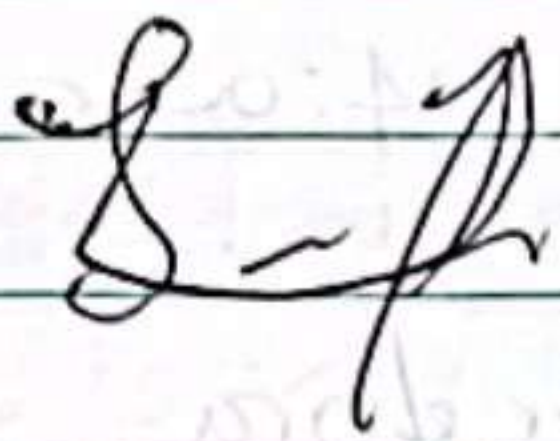x 



28 de octubre de 2022 (Viernes)


Tiempo: Seco


Equipos y maquinaria: Minicargador - Nivel Estacion - Moto niveladora - Vibro Compactador

Personal en obra: Pcs de obra - Social - Hse Topografía (2) Ayudantes (10) - Operador (3) Paleteros (2)

Actividad en obra: Se continúa con la fundición de concreto del Kot 425 al Kot 370.

- Se toman Slump y muestra de slump para efecto de calidad al concreto.

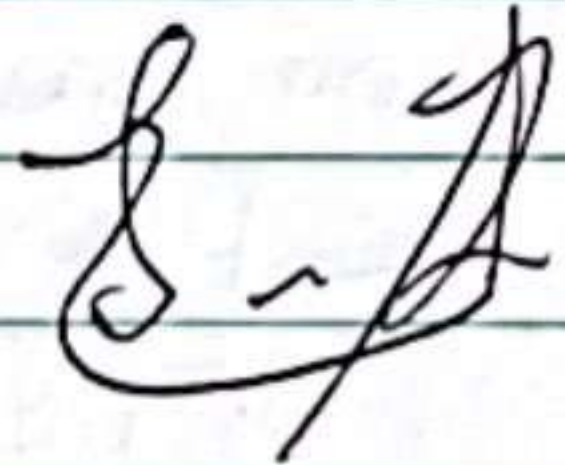x 



29 de Octubre de 2022 (Sábado)


Tiempo: Hazy en horas de la mañana de 07:30 a 08:30 am

Equipos y maquinaria en obra: minicargador moto niveladora - Vibro Compactador

personal en obra: Per obra - Ayudante operadores paleta Hse


Actividad en obra: Debido a los lluvias presentados en la mañana el contratista no pudo cumplir con las actividades programadas para hoy.


x 



30 de octubre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

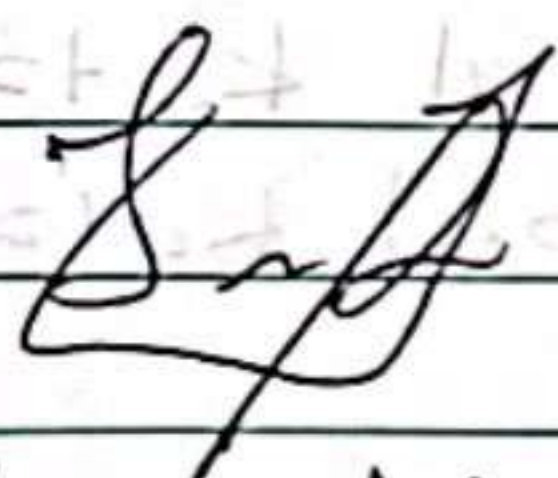x 



31 de octubre de 2022 (Lunes)


Tiempo: Seco


equipo y maquinaria: Mini Cargador - moto niveladora - Nivel - estación - vibrador compactador

personal en obra: Rendón de obra
operador - Ayudante social Hse
paleta

Actividad en obra: Se instala y compacta Sub
base del K0+370 al K0+300

- Se Carga Subbase del K0+370 al K0+300

x 



01 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco.

Equipo y maquinaria: mini cargador - Nivel
Vibro Compactador - Estación
motoniveladora.

Personal en obra: Residente de obra
Peritista(2) Comision de topografía
Ayudantes (12)

Actividad en obra: Se libera camil derecho
sobre base y rieles por parte de la topografía
de intervención

- Se instala rieles del K+370 al K+300
- Se instala pavimento del K+370 al K+300
camil derecho

LA

Barraza

02 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 02:00 a 04:00 Pm

Equipo y maquinaria: Mini cargador - motonivela
dora - Vibro Compactador - Estación
nivel

Personal en obra: Residente de obra - Hse
Social - Operador - Ayudantes -
Peritista.

Actividad en obra: se instalan rieles camil
Izquierdo

- se presentan lluvias los cuales impiden continuar
con la actividad.

LA

Barraza

03 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Lluvias en la tarde de 02:00 a 04:00 PM

Equipos y maquinarias: minicargador - motor niveladora
vibro compactador - Estacion topografica
Nivel Ayudantes (10)

Personal en obra: Rendones de obra - Operador
Hse - Social palileros - Comision
de topografia

Actividad en obra: Se realiza cerco en
subbases del K+300 al K+380
- se instalan rieles del K+300 al K+380

[Signature]

[Signature]

04 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipos: minicargador - Motor niveladora
vibro compactador

Personal en obra: Res de obra operador 3 Ayudante
palileros Hse - social - comision
Topografica (2)

Actividad en obra: Se libera portopografia (sub-bases y
Rieles) del K+300 al K+380 - CI.

Se instala pavimento del K+380 al K+300 CI.
Se toma muestra de 81cm para efecto de
calidad del concreto

[Signature]

[Signature]

05 de Noviembre (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipos: minicargador - motor niveladora - estación - Nivel Vibro compactador

Personal en obra: Responsable de obra
HSE - Social - piloto (2) Operador (3)
Ayudantes (10)

Actividad en obra: Se instalan rieles camil derecho

Se libere por topografía Rieles y Sobres del K+300 al K+350

-se instala Concreto CD. K+300 al K+250

-se firma maestro de slan al concreto

J/A

Cornejo

06 de Noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

J/A

Cornejo

07 de Noviembre de 2022 (Lunes) Festivo.

No se realizan actividades por ser festivo

J/A

Cornejo

08 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Nublado de 01:00 a 03:00 pm

Equipos en obra: minicargador - moto niveladora - Vibro Compactador - Estacion nivel

Personal en obra: Residente de obra - Social operadores (3) - Ayudantes (10) HSE topografia (2)

Actividad en obra: se instalan rieles obl Kot+250 al Kot+160

Se liberan rieles y Se libera por topografía - Se instala concreto de Kot+260 al Kot+310 @ ±

J-A

Paraflex

09 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvias de 2:00 a 03:00 pm

Equipos en obra: minicargador - moto niveladora - Vibro Compactador - Nivel Estacion

Personal en obra: Residente de obra HSE Social Ayudantes (10) operadores (3) Paleteros (2)

Actividad en obra: se instalan rieles canal Kot+260 Kot+190.

Debido a las lluvias se aplazan las actividades programadas para el día de hoy

J-A

Paraflex

10 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipos y maquinaria: mini cargador - Topografía estación - Nivel - motonivelador - Vibro Compactador. Vibrador de Concreto

Personal en obra: Residente de obra
HSC - Social - Ayudantes (1)
Operador (3)

Actividad en obra: Se liberan Rieles y Nivel de Sub base por topografía Kot+260 al Kot+190
- Se instalan concreto del Kot+260 al Kot+190
- Se toman muestras de Slump al concreto

[Signature]

[Signature]

11 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: mini cargador - moto niveladora - Vibro Compactador
Nivel Estación

Personal en obra: Residente de obra
HSC - Social - patetores comisión de topografía (2)

Actividad en obra: Se instalan Rieles del Kot+260 al Kot+190
- Se reciben Rieles y nivelación de Sub base por topografía del Kot+260 al Kot+270

Se funda del K+260 al K+240 CI
Se toman muestras de Slbm al Concreto

S-A

Barrafeuf

12 de Noviembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo y maquinaria: mini cargador - moto
niveladora - estacion - nivel - vibró
Compactador - moto niveladora

Personal en obra: Residente de obra Hse
Social - Ayudantes (10) pintor (2)
Operador (3) Topografía (2)

Actividad en obra: Se instala pavimento
del K+240 al K+190

- Se toman muestras de Slbm al concreto
para Verificar asentamiento

S-A

Barrafeuf

13 de Noviembre de 2022 (Domingo)

NO Se realizan actividades en obra

S-A

Barrafeuf

14 de Noviembre de 2022 (Jornada festiva)

NO Se realizan actividades en obra

S-A

Barrafeuf

15 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Lluvias en horas de la mañana
de 08:00 a 10:00 am

Equipos en obra: minicargador - Monto
Nivelador - Nivel - Estacion vlv
Compactador

Personal en obra: Res de obra - social
Auxiliar Hse - Ayudantes - operador
topografía

Actividad en obra: Se evacuó agua producto
de los lloviznos presentados en la mañana
los cuales impidieron realizar actividades el día
de hoy

[Signature]

[Signature]

16 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: Minicargador - motonivelador
Vlv Compactador - motoniveladora - Nivel

Personal en obra: Residente de obra - Hse
social - Paletera (2) Operador (3) Ayudantes (12)

Actividad en obra: Se instalan notes del
Kot 190 al Kot 140. C.D.

- Se liberan notes y sobbase por topografía
del Kot 190 al Kot 140 C.D.

- Se fondo del Kot 190 al Kot 140

[Signature]

[Signature]



17 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias del 09:00 a 11:00 am

Equipo en obra: Minicargador - motor niveladora
Vibro compactador - estación

Personal en obra: Residente de obra - Topógrafo (2)
Ayudante (2) Hsc - social pública (2) Operario (2)

Actividad en obra: Solo se evacuó a aguas
estancadas debido a las lluvias de la mañana
los cuales afectaron las actividades programadas
para el día de hoy


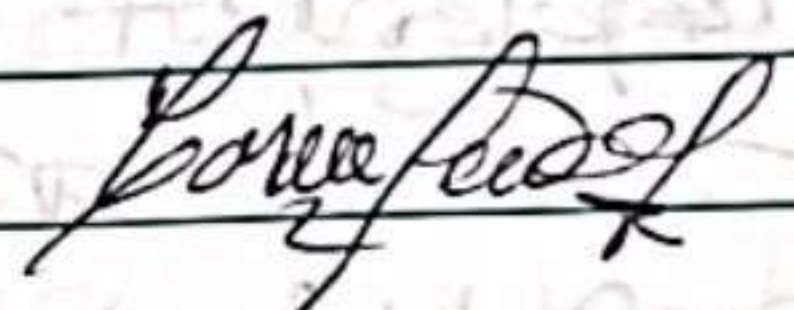
18 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Lluvias en la mañana de 08:00 a 09:00 am

Equipos: Minicargador - Motor niveladora
Vibro compactador - Nivel estación

Personal en obra: Residente de obra Operario (3)
Ayudante (10) Piloto (2)

Actividad en obra: Se retiró material sobrante
y reemplazado por material seco
- Se instalan rieles del K+140 al K+170
canil Fierro

19 de Noviembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: Minicargador - Vibro compactador - moto niveladora - Nivel vibrador de concreto

Personal en obra: Residente de obra
Ayudantes (10) Operadores (3) piloto (2)
Social HSE

Actividad en obra: Se libera sub base y rieles del K+140 al K+190 por topografía
- Se funda del K+140 al K+190 canal Izquierdo
- Se toman muestra de slump al concreto

[Signature]

[Signature]

20 de noviembre de 2022 (domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

21 de noviembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Lluvias en horas de la tarde de 01:00 a 02:00 pm

Equipos en obra: Minicargador - Moto niveladora - Vibro Compactador

- Personal en obra: Residente de obra
Topografía (2) Ayudantes (10) piloto (2)
Social Operador (3)

Actividad en obra: Se instala y compacta sub base del $Ko+140$ al $Ko+80$
 - Se toman densidades por parte del contratista

J-A

Barcelon

22 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador motorizado - Vibro Compactador - Estación

Personal en obra: Res. de obra - Operador (3)
 Ayudantes (10) - Palotero (2) topografía (2)

Actividad en obra: Instalación y compactación de sub base del $Ko+80$ al $Ko+000$
 - Cero de sub base del $Ko+140$ al $Ko+000$

J-A

Barcelon

23 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - motorizado - Vibro Compactador - Nivel - Estación

Actividad en obra: Se instalan rieles del $Ko+140$ al $Ko+000$
 - Se toman densidades del $Ko+140$ al $Ko+000$ a sub base

J-A

Barcelon

24 de Noviembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Eqps en obra: minicargador - motoniveladora - Vibro Compactador - Vibrador de concreto

Personal en obra: Jefe de obra operadores (3)
Ayudantes (10) palotera (2) Social (1)
HSE (1)

- Actividad en obra: Se libere por topografía sub base y notes del K+140 al K+200

- Se instala pavimento (concreto) del K+140 al K+200

- Se toman muestra de Slump al concreto para verificar asentamiento

[Signature]

[Signature]

25 de Noviembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Eqps en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Ing Residente Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se realiza corte de places del K+140 al K+200

[Signature]

[Signature]

26 de noviembre de 2022 (Sábado)

Tiempo: Lluvias de 02:00 a 04:00 pm

Equipos en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra: Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se continúa con sello de juntas del K+540 al K+480

[Signature]

[Signature]

27 de Noviembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

28 de Noviembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipos en obra: Herramientas menores.

Personal en obra: Residente de obra: Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se continúa con el sello de juntas del K+480 al K+400

[Signature]

[Signature]

29 de Noviembre de 2022 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Ayudante (4) Residente de obra

Actividad en obra: Se Continúa con el sello de junta K₀+420 al K₀+300

[Signature]

[Signature]

30 de Noviembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Lluvioso de 08:00 a 09:00 am

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Residente de obra
Ayudante (4)

Actividad en obra: El Contratorista continúa el sello de junta del K₀+300 al K₀+200

[Signature]

[Signature]

01 de diciembre de 2022 Jueves

Tiempo: Seco

Eqps: Herramientas menores

Personal en obra: Res. de obra y Ayudante

Actividad: Se continúa con el sello de junta

[Signature]

[Signature]

02 de Diciembre de 2022 (Viernes)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Pes. de obra Ayudantes (4)

Actividad en obra: Se continua con el Sello de Juntos.

[Signature]

[Signature]

03 de diciembre de 2022 (Sabado)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Pes. de obra Ayudantes 4 SST.

Actividad en obra: se sellan juntos.

[Signature]

[Signature]

04 de diciembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

[Signature]

[Signature]

05 de diciembre de 2022 (Lunes)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

personal en obra: Res. de obra Ayudante (4) SST.

Actividad en obra: Sello de juntas

[Signature]

[Signature]

06 de diciembre de 2022 (Martes)

- Tiempo: Seco
- Equipos en obra: Herramientas menores
- Personal en obra: Res. de obra Ayudante (4) SST
- Actividad en obra: Se continua con el Sello de juntas

[Signature]

[Signature]

07 de diciembre de 2022 (Miércoles)

Tiempo: Seco

- Equipos: Herramientas menores

Actividad en obra: Se continua con el Sello de juntas

- Personal en obra: Res de obra SST. Ayudante (4)

[Signature]

[Signature]

08 de diciembre de 2022 (Jueves)

No se realizan actividades en obra. por ser festivo

[Signature]

[Signature]

09 de diciembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal en obra: Res de obra SST Ayudantes (8)

Actividad en obra: Se inicia con la excavación para instalar bordillos

JF

Paraflex

10 de diciembre de 2022 (Sábado)

Tempo: Seco

Equipos en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Res de obra SST Ayudantes (8)

Actividad en obra: Excavaciones para instalación de bordillos

JF

Paraflex

11 de diciembre de 2022 (Domingo)

NO se realizan actividades en obra

JF

Paraflex

12 de diciembre de 2022 (Lunes)

Tempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal en obra: Res de obra SST Ayudantes

Actividad: Excavaciones para instalación de bordillos

JF

Paraflex

13 de diciembre de 2022 (Martes)

Tempo: Seco

Equipos en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Res-de obra SST Ayudantes (8)
 Actividad: Excavacion de bordillos (instalacion)

[Signature]

[Signature]

14 de diciembre de 2022 (Miércoles)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res-de obra, Ayudantes (8) SST.

Actividad: Excavacion para instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

15 de diciembre de 2022 (Jueves)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores.

Personal: Res-de obra SST Ayudantes (8)

Actividad: Excavacion para instalacion de bordillos.

[Signature]

[Signature]

16 de diciembre de 2022 (Viernes)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

Personal en obra: Res-de obra SST Ayudantes (8)

Actividad en obra: Excavacion para instalacion de bordillo,

[Signature]

[Signature]

17 de diciembre de 2022 (Sábado)

Tempo: Seco

Equipo en obra: Herramientas menores

personal en obra: SST Res. de obra Ayudantes (8)
 Actividad: Se instalan bordillos

[Signature]

[Signature]

18 de diciembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

19 de diciembre de 2022 (Lunes)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

personal en obra: Ayudantes (8) SST Res de obra

Actividad en obra: Instalacion de bordillos.

[Signature]

[Signature]

20 de diciembre de 2022 (Martes)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

personal en obra: Res de obra SST Ayudantes (8)

Actividad: Se continua con la instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

21 de diciembre de 2022 (Miércoles)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

personal en obra: Residente de obra SST Ayudante (8)

Actividad: Instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

(8) 22 de diciembre de 2022 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Pes de obra SST Ayudantes (8)

Actividad: Instalación de bordillos

J. A.

Barufkeof

23 de diciembre de 2022 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Pes de obra SST Ayudantes (8)

Actividad: Instalación de bordillos

J. A.

Barufkeof

24 de diciembre de 2022 (Sábado)

No se realizan actividades en obra
por motivo afistus Nondona

J. A.

Barufkeof

25 de diciembre de 2022 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

J. A.

Barufkeof

26 de diciembre de 2022 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Pes de obra. SST Ayudantes (8)

Actividad: Excavacion e instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

27 de diciembre de 2022 (Martes)

Tempo: Seco

Personal: Res de obra SST Ayudantes (8)

Equipo: Herramientas menores

Actividad: Excavacion e instalacion de bordillos -

[Signature]

[Signature]

28 de diciembre de 2022 (Miercoles)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (8)

Actividad: Excavacion e instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

29 de diciembre de 2022 (Jueves)

Tempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal en obra: Res de obra - SST - Ayudante (8)

Actividad: Excavacion e instalacion de bordillos

[Signature]

[Signature]

30 de diciembre de 2022 (Viernes)

Tempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal: Res de obra SST Ayudantes (8)

Actividad en obra: Se excava e instalan bordillos

L-2

Carretero

31 de diciembre de 2022 (Sábado)

No se realizan actividades por fiestas de fin de año

L-2

Carretero

01 de enero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

L-2

Carretero

02 de enero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores.

Personal: Ing. Res - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Se realiza excavación e instalación de bordillos

L-2

Carretero

03 de enero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (12)

Actividad: Instalación de bordillo

L-2

Carretero

04 de enero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Instalación de bordillo

[Signature]

[Signature]

05 de enero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Excavación para instalación de bordillo

- Instalación de bordillo

[Signature]

[Signature]

06 de enero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Excavación para bordillos e instalación de bordillos

[Signature]

[Signature]

07 de enero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipos: Herramientas menores

Personal: Rendiente de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Instalación de bordillo

[Signature]

[Signature]

08 de Enero de 2023 (Domingo)

Tiempo: Seco

Personal: SST(0) - Res de obra - Ayudantes (0)

No se realiza actividad en obra

Por ser domingo

[Signature]

[Signature]

09 de Enero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

10 de Enero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Instalacion de bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

11 de Enero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes

Actividad: Instalacion de bordillo pre fabricados

[Signature]

[Signature]

12 de enero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Personal: Per de obra - SST - Ayudantes (10)

Equipo: Herramientas menores

Actividad: Instalación de bordillo prefabricado

[Signature]

[Signature]

13 de enero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Personal: Per de obra - SST - Ayudantes (10)

Equipo: Herramientas menores

Actividad: Instalación de bordillo prefabricado

[Signature]

[Signature]

14 de enero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Personal: Per de obra - SST - Ayudantes (10)

Equipo: Herramientas menores

Actividad: Instalación de bordillo prefabricado

[Signature]

[Signature]

15 de enero de 2023 (Domingo)

Tiempo: Seco

Personal: (0). Ninguno

Equipo: Ninguno

Actividad: No se realiza actividad por ser

Domingo

[Signature]

[Signature]

16 de enero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudante (10) - Operador

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

J.A.

Barrefeud

17 de enero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores - minicargador

Personal: Res de obra - Operador - SST - Ayudantes (10)

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados.

J.A.

Barrefeud

18 de enero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - Operador - SST - Ayudante (10)

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

J.A.

Barrefeud

19 de enero de 2023 (Domingo)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - Operador - SST - Ayudante

Actividad en obra: Se extiende material de afirmado en el palda de bordillo

- Se hacen excavaciones para instalar bordillos
- Se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

20 de enero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
 Equipo: Minicargador - Herramientas menores
 Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10) operador
 Actividad: Se instalan bordillos prefabricados
 Se instalan material para espaldar de bordillos

[Signature]

[Signature]

21 de enero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco
 Equipo: Operador - Herramientas menores
 Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10) operador
 Actividad: Se instalan bordillos

[Signature]

[Signature]

22 de enero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

23 de enero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco
 Equipo: Minicargador - Herramientas
 menores

Personal: Res de obra - SST - operador - Ayudantes
 Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

24 de enero de 2023 (martes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10) operador

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

25 de enero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10) operador

Actividad: Se demuestran placas fijadas K+320

K+560 con el equipo

- se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

26 de enero de 2023 (jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (10) operador

Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

27 de Enero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Operador - Ayudantes (10)

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados.

[Signature]

[Signature]

28 de Enero de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores.

Personal: Res de obra - SST - Operador - Ayudantes (10)

Actividad: Se funden placas fisuradas.

Se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]

29 de Enero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

30 de Enero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores.

Personal: Res de obra - SST - Operador - Ayudantes (10)

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

[Signature]

[Signature]


31 de enero de 2023 (Martes)


Tiempo: Seco

Equipo en obra: minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: SST - Res de obra - Ayudante (2) Operarios (1)

Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados

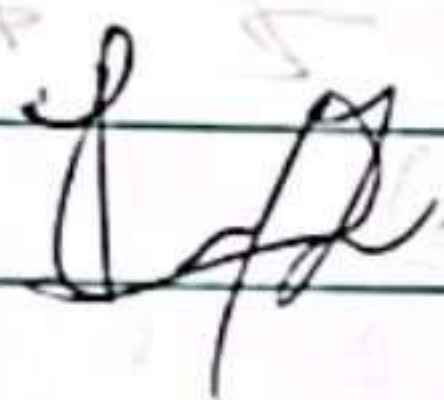x 



01 de febrero de 2023 (Miércoles)


Tiempo: Seco


Equipo: minicargadora - Herramientas menores

Personal: SST - Res de obra - Ayudantes operarios

Actividad en obra: Se instalan bordillos prefabricados

Cierre actos de Verdad.





02 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco


Equipo: minicargador - Herramientas menores


Personal: Res de obra - SST - Ayudante (8) operarios

Actividad: Se hacen excavaciones para instalar bordillos.

- Se instalan bordillos prefabricados

- Se funden bordillos in situ





03 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Dos de obra - SST - Ayudantes(operador)
 Actividad: Se instala bordillos prefabricados
 Cierre actus de Verindad.

Luff

Barney

04 de febrero de 2023 (Sábado)

Tempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Dos de obra - SST - Ayudantes(operador)

Actividad: Se continúa con la instalación de
 bordillos - Cierre actus de Verindad

Luff

Barney

05 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

Luff

Barney

06 de febrero de 2023 (Lunes)

Tempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Dos de obra - SST - social.

Actividad: Cierre actus de Verindad

- Instalación de bordillos prefabricados

Luff

Barney

07 de febrero de 2023 (Martes)

Tempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

08 de febrero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores - minicargador

Personal: Res de obra - SST - operador - Ayudantes

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

- se funden placas que estaban fibradas

- se funden bordillos in situ.

LA

Corrección

09 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - operador

Ayudantes

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

LA

Corrección

10 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudante - operador

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados.

LA

Corrección

11 de febrero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (2) Operador (1)
 Actividad: Se instalan bordillos prefabricados.
 - se realiza limpieza en larva para realizar la demarcación vial

[Signature]

[Signature]

12 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra

[Signature]

[Signature]

13 de febrero de 2023 (Lunes)

Tiempo: seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Operador - Ayudantes (2)

Actividad: Continúan con la instalación de bordillos prefabricados y bordillos fundidos in situ
 - se inicia con la demarcación lineal.

Linea Central.

OBSERVACIÓN: Se le recomienda al contratista corregir los plases lavados del K+540 al K+600 antes de realizar la demarcación a lo que el contratista responde que lo hará posteriormente y en caso de realizar demarcación nuevamente en ese tramo lo hará.

[Signature]

[Signature]

14 de febrero de 2023 (Martes)

Tiempo: seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - Operador - Ayudante

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

Se Continúa con la demarcación lineal lateral

x *J.A.*

15 de febrero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores minicargador

Actividad: Se continúa con la instalación de bordillos prefabricados

- se instalan sonitos verticales

J.A.

16 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: Herramientas menores - Minicargador

Actividad: Se continúa con la instalación de bordillos prefabricados

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (8)

J.A.

17 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Res de obra - operador - Ayudante

Actividad: Instalación de bordillos prefabricados

- se instalan sonitos verticales

J.A.

18 de febrero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Personal: Bos de obra - SST - Ayudante (s) operador

Actividad: Se instalan Señales Verticales

- Se instalan bordillos prefabricados

Equipo: minicargador - Herramientas menores

[Signature]

[Signature]

19 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realizan actividades en obra.

[Signature]

[Signature]

20 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco.

Personal en obra: Bos de obra - SST - Ayudantes - Operador

Equipo: Herramientas menores minicargador

OBSERVACIÓN: Se aproba prorroga N-3 por parte de la administración municipal con fecha de 15 de feb/23.

Actividad: Se toman juntas entre bordillos

se instala bordillos prefabricados.

OBSERVACIÓN: Se le informa al contratista que hay bordillos desalineados lo cual deben ser corregidos

[Signature]

[Signature]

21 de febrero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador Herramientas menores.

Personal: Bos de obra - Ayudantes (s) SST operador

Actividad: se continúan con el sello de juntas

entre bordillos

[Signature]

[Signature]

22 de febrero de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Per de obra - SST - Ayudantes operador

Actividad: Se organizan bordillos volcados por los vehículos

- Se toman juntas de bordillos

OBSERVACIÓN: Se le solicita al contratista arreglar las juntas entre bordillo y la losa y colocar mezcla en su totalidad

- Se le solicita al contratista arreglar el empalme de bordillos entre los proyectos Centro y Cepillo

[Signature]

[Signature]

23 de febrero de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Per de obra - SST - Ayudantes operador

Actividad: Se toman juntas entre bordillos

- Se arreglan bordillos volcados

[Signature]

[Signature]

24 de febrero de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Per de obra - operador

Ayudantes Contr - SST

Actividad: Se instalan bordillos prefabricados

- Se arreglan bordillos desalineados

[Signature]

[Signature]

25 de febrero de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes (4) operador

Actividad: se realiza confinamiento de espaldas de bordillos con material seleccionado.

[Signature]

[Signature]

26 de febrero de 2023 (Domingo)

No se realiza actividad en obra

[Signature]

[Signature]

27 de febrero de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Herramientas menores.

Personal en obra: Res. de obra - SST - Ayudantes (4).

operador (1)

Actividad en obra: Se continua con el confinamiento de espaldas de bordillos con material seleccionado

OBSERVACIÓN: Se le recuerda al contratista que el confinamiento de espaldas de bordillos con material seleccionado debe ser compactado como figura en el ítem

[Signature]

28 de febrero de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Vibro Compactador
 Personal en obra: Res. de Obra - SST

Ayudantes (4) operador (1)

Actividad en obra: Se continua con la conformación de espaldar de bordillos con material seleccionado

OBSERVACIÓN: se le solicita al contratista arreglar juntas entre bordillos y placas y hacerlas según las especificaciones técnicas

x *[Signature]*

[Signature]

01 de marzo de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res. de obra - SST - Ayudantes (8)

Operador

Actividad: Se continua con la conformación de espaldar de bordillos

[Signature]

[Signature]

02 de marzo de 2023 (Jueves)

Temp: Se presentan lluvias moderadas en horas de la tarde del 03:00 a 04:00 pm

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res. de Obra - SST - Ayudantes

Operador

Actividad: Se Continúa con la conformación de espaldar de bordillos

[Signature]

[Signature]

03 de marzo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo: Minicargador - Herramientas menores

Personal: Res de obra. operador SST Ayudantes operador

Actividad: Se construyen descotes

- Se continua con la confirmación de espaldar de bordillos

[Signature]

[Signature]

04 de marzo de 2023 (Sábado)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Inspector de obra - SST Ayudantes operador

Actividad: se construyen descotes

- Se continua con la confirmación de espaldares de bordillos.

[Signature]

[Signature]

05 de Marzo de 2023 (Domingo)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores

Personal: SST - Inspector de obra - Ayudante

Actividad: Se compacta material de espaldar de bordillos

[Signature]

[Signature]

06 de marzo de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador Herramientas menores

Personal en obra: Inspector de obra - SST Ayudantes (8) Operador (1)

Actividad en obra: Se Continúa con el llenado de espaldas de bordillos
- Se continúa con la construcción de discotes

[Signature]

[Signature]

07 de marzo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Se presentan lluvias de 02:00 a 03:00 pm.

Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Inspector de obra SST

Ayudantes (8)

Actividad: Se Construyen discotes en la vía

- Se instala material de Lleno para espaldas de bordillo.

OBSERVACIÓN: Se solicita Peridante de obra en obra.

[Signature]

[Signature]

08 de marzo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Peridante de obra - SST Operador Cepudente

Actividad en obra: se constuyen descales
- Se continuan con la conformacion de
espaldars de bordillos

JL

García

09 de marzo de 2023 (Jueves)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador Herramientas menores
personal en obra: Res de obra - SST - Ayudantes (8)
operador

Actividad en obra: Construcción de descales
Compactación y llenado de espaldar de bordillos

JL

García

10 de marzo de 2023 (Viernes)

Tiempo: Seco
Equipo: minicargador - Zanca
personal en obra: Res de obra - SST - Ayudantes
operador

Actividad: Lleno y Compactación de
espaldar de bordillos
- Construcción de descales

JL

García

11 de marzo de 2023 (Sabado)

Tiempo: Seco
Equipo: Minicargador Zanca
Personal: Res de obra SST Ayudantes (8) operador (1)
Actividad: Compactación y llenado de espaldar

JL

García

12 de marzo de 2023 (Domingo)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Rana

Personal: Res de obra - SST - Ayudante (x)
Operador

Actividad: Se compacta lleno espaldas de
bordillo.

NOTA: 2 propietarios se oponen a la construcción de 2 descolos

J-A

Barra Pz

13 de marzo de 2023 (Lunes)

Tiempo: Seco

Equipo: minicargador - Rana

Personal: Res de obra - SST - Ayudantes operador

Actividad: Se compacta lleno de espaldas
Construcción de descolos

OBSERVACIÓN: Se solicita al Contratista
aplicar las actividades que se están realizando
y las pendientes ya que el contrato de
obra finaliza el día 15 de marzo de
2023 Actividades que se nombran a continuación

- Terminar lleno de espaldas de bordillos
con su respectiva compactación

- entrega de caracterización vial

- arreglar bordillos desalineados

- Arreglar placas lavados en el K0520
compromiso adquirido para el 10 de
marzo (bordo)

- Arreglar empalme de bordillos entre
los proyectos San Antonio Cepillo y San
Antonio - Cedro

- Arreglar juntas entre bordillos y losa de
pavimento

- Terrear con la actividad protección

de talud ya que se cuenta con el
permiso del propietario

[Signature]

[Signature]

14 de marzo de 2023 (Martes)

Tiempo: Seco

Equipo: Rana Minicargador - Herramientas menores

Personal en obra: Pe. de obra. 357 - Ayudante(s) - Operador(s)

Actividad en obra: Se continúa con la compactación
de las espaldas de bordillos

- Después de obtener el permiso del propietario del
predio donde se va a construir la protección de
talud se inicia con el descapote para continuar
con la construcción de esta obra, la cual se
debe realizar teniendo en cuenta el diseño
presentado por el Contratista y cumpliendo de
calidad con las especificaciones técnicas del
Trabajo teniendo en cuenta que esta actividad se
trata de una protección de talud con piedra
pegada, de no cumplir con las especificaciones
técnicas esta no será recibida a satisfacción
por esta interventoría

[Signature]

[Signature]

15 de marzo de 2023 (Miércoles)

Tiempo: Seco

Equipo en obra: Pajunta - minicargador Herramientas
Menores

Personal en obra: Pe. de obra. 357 Ayudante(s) operador(s)
operador(s)

Actividad en obra: El Contrator Continúa con la Compactación de espaldar de bordillos. Se Continúa con el diseño de la capa vegetal donde se construya la protección de talud con piedra pegada.

- Se perfilan los puntos para iniciar con construcciones de vigas de confinamiento e instalación del concreto ciclope.

OBSERVACIÓN: El día de hoy 15 de marzo de 2023 finaliza el Contrato de obra N° 172 de 2021. Quedando pendiente como:

1. Terminar de recompactar espaldar de bordillos
2. Instalación de concreto ciclope para la protección de talud.

3. Arreglo de placas lavados en el K+540

Actividades que deben ser entregadas en un plazo no mayor a diez días si no se atienden serán descontados del acta final el valor correspondiente a cada actividad.

