

Mayo 08 del 2023 (Lunes)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topográfica (1), Almacenista (1), Profesional social (1), operador (9), oficios varios (4), Paletero (1), Laboratorista (1).

Personal de interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topográfica (1)


Actividades Ejecutadas Obra:

- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de sobbase en el tramo (K2+298 - K4+720)


Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (2), Carrotanque (1)

Se reporta motoniveladora cat en reparación

Se realizará reubicación de cuatro postes de energía el día de Mayo 14



D.E. obra.


Residente interventoría

Mayo 09 del 2023 (Martes)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1),
Almacenista(1), Operador(9), oficios varios(4),
Paletero(4), laboratorista(1)


Personal de interventoria: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), Comisión topografica(1)


Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de subbase en el tramo (K0+669 - K1+040)

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora(1), Pajarita(1),
Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2)
Carrotanque(1)

Motoniveladora cat en reparación


Residente interventoria


D.O. - Obra

Mayo 10 del 2023 (Miércoles)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde la madrugada hasta aproximadamente las 9:30 am y estuvo nublado el resto del día


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), Comisión topográfica (1), Almacenista (1), Operador (5), Oficiales varios (4), Paletero (4), Laboratorista (1)


Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topográfica (1)

Maquinarios y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (1), Carrotanque (1)

* No se realizaron actividades que conlleven al avance del proyecto debido a las lluvias

Motoniveladora cat continúa en reparación


Residente interventoría


C.M. Obra.

Mayo 11 del 2023 (Jueves)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), operador(9), Oficios varios(4), Paletero(4), Laboratorista(1).


Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1).

Actividades Ejecutadas Obra:

- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(1), Volquetas(1) Carrotanque(1).


Residente interventoría


Dir. obra

Mayo 12 del 2023 (Viernes)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)


Actividades Ejecutadas Obra:


- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de afirmado en el tramo (K1+648 - K2+208)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pagarita(1), Motoniveladora(2), Vibracompactor(2), Volquetas(2), Carro tanques(1)

La motoniveladora ha sido reparada

Se reporta que hay árboles antes de llegar a la zona de la reserva que se encuentran cerca a la via y que comprometen su estabilidad a partir del K3+390 hacia mayores


Residente interventoría


Obra

Mayo 13 del 2023 (Sábado)

Horario Laboral: 7-12pm y 1-5pm

Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Siso (1), comisión topografica (1), Almacenista (1), operador (9), oficinas varias (4), Paletero (4), Laboratorista (1).


Personal de interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetar (2), Carro tanque (1)


Residente interventoría



D.O. Obra

Mayo 14 del 2023 (Domingo)

Horario laboral: 7 - 12pm

Estado del tiempo: seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Operador(1), Paletero(2), Electricista(4)

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1).


Actividades Ejecutadas Obra:

- Rehabilitación de postes de energía que se encontraban dentro de la vía según el diseño

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1)



Residente Interventoría



Director Obra

Mayo 15 del 2023 (Lunes)

Horario laboral: 7-12pm y 1-5pm


Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 3:30am hasta las 9:30am y el resto del día estuvo nublado


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Sico(1), Almacenista(1), Comisión topografica(1), Oficios varios(2), Palettero(3).

Personal de Interventoría: Director(1), Inspector(1), Residente(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: El personal de las maquinas no se presentó en la obra, debido a las lluvias

* No se realizaron actividades que conlleven al avance del proyecto, debido a las lluvias


Residente interventoría


Dir. obra.

Mayo 16 del 2023 (Martes)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), comisión topografica(1), Operadores(8), Oficios varios(4), Paletero(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).


Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarrilla(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de afirmado en el tramo (K2+295 - K4+320)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+295 - K4+320)

Se presentaron lluvias de intensidad leve en horas de la noche (2 horas)


Residente Interventoría


D.O. Obra.

Mayo 17 del 2023 (Miércoles)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1),
SISO (1), Profesional social (1), Almacenista (1),
Comisión topográfica (1), Oficios Varios (3), Paletero (4),
Laboratorista (1), operadores (9)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1),
Inspector (1), Comisión topográfica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:


- Excavación y explanación de la vía en el
tramo (K2+298 - K3+435)


Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora (1), Pajarita (1),
Motorizadora (2), Vibrocompactador (2), Volquetes (2),
Carrotanque (1)

Se reporta pajarita en reparación

Se toma densidad en tramo de afirmado K2+630 al K2+800
con resultados de K2+690 con 99.8% y K2+790 con
95.9% y se aprueba el tramo

Tramo del 2+560 al 2+630 con resultado de 2+590 con
99.8% también es aprobado


Residente interventoría


Dir. obra.

Mayo 18 del 2023 (Jueves)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1)


Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de geotextil en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Inspección del programa de orden y limpieza, parte A frentes de obra

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Carrotaque(1).

En reunión de obra realizada el día de hoy se establece que el tramo de la reserva comprendida ente K3+435 al K4+335 pasa a ser competencia del municipio, el cual se encargara de instalar un mepramiento en este tramo, esto debido a que no se llega a un acuerdo con el propietario de los arboles


Residente interventoria



D.R. obra.

Mayo 19 del 2023 (Viernes)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1),
Siso(1), Profesional Social(1), Comisión topográfica(1),
Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3),
Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), Comisión topográfica(1)


Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de subbase tramo (K2+298 - K3+435)
- Levantamiento topografico del nuevo tramo a intervenir

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1),
Motoriveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2),
Carrotanque(1)

Se inicia levantamiento topografico de la zona después de la
reserva (K4+335 hacia mayores) con el fin de identificar el
nuevo alcance que tendrá el proyecto
llega a obra un minicargador


Residente interventoría


D.R. Obra.

Mayo 20 del 2023 (Sábado)

Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1),
Siso(1), Paleteros(4), Comisión topográfica(1), Almacenista(1),
Operadores(9), Oficios Varios(3), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), Comisión topográfica(1).


Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de geotextil en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1),
Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2),
Carrotanque(1)

Se reporta minicargador dañado


Residente Interventoría


D.O. Obra.

Mayo 22 del 2023 (Lunes)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm


Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias durante la madrugada del lunes y durante el día estuvo nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Oficios varios(3), Paletero(2), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajanta(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

* Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada del lunes el terreno de la vía estaba bastante saturado y no permite realizar ningún tipo de actividades



Residente interventoría



Dir. obra.

Mayo 23 del 2023 (Martes)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm


Estado del tiempo: Mañana nublada y tarde soleada


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1),
SISO(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1),
Operadores(9), Oficios varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1),
Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1),
Volquetas(1), Carrotanque(1)

* Debido a las fuertes lluvias presentadas el día anterior el terreno aun se encuentra bastante saturado lo que impide el desarrollo de las actividades en la jornada de hoy.


Residente interventoría


Dir. Obra.

Mayo 24 del 2023 (Miércoles)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm


Estado del tiempo: Se presentaron lluvias fuertes durante la mañana y siguió la tarde con una lluvia leve


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios varios(3) Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1)

* Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motorizadora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Minicargador(1), Carrotanque(1)

* No se realizan actividades debido a las lluvias todo el día


Residente, Interventoría



Dir. obra.

Mayo 25 del 2023 (Jueves)

Horario laboral: 7-12pm y 1-5pm

Estado del tiempo: Soleado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenera(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).


Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetes(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)

*En la jornada de la mañana no fue posible realizar ningún tipo de actividades debido a que el ferreno se encontraba bastante saturado por las lluvias del día anterior


Residente, Interventoría


Dir. Obra.

Mayo 26 del 2023 (Viernes)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: durante la mañana soleado y a partir de la 1:00pm se presentaron fuertes lluvias.

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Palettero(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetas(1), Carrotanque(1).

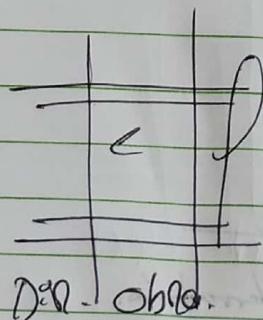
Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Replanteo de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

* En la jornada de la tarde no se pudo realizar ningún tipo de actividades debido a las fuertes lluvias



Residente Interventoría



Dir. Obra

Mayo 27 del 2023 (Sábado)

Horario laboral: 7 - 12 pm


Estado del tiempo: Nublado


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1),
SISO(1), Profesional social(1), Comisión topográfica(1),
Almacenista(1), operadores(9), Oficios Varios (3).
Paletero(4), laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1)
Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarina(1),
Motonivelador(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1),
Volquetos(1), Carrotanque(1)

* No se realiza ningún tipo de actividades debido
a que el terreno se encuentra bastante saturado
por las lluvias del día anterior.


Residente interventoría


D.º. Obra.

Mayo 29 del 2023 (Lunes)

Horario Laboral: 7-12pm y 1-5pm

Estado del tiempo: mañana soleada y en la tarde se presentan fuertes lluvias desde la 1:00pm

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Operadores(5), Oficios varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volqueta(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)

* En la jornada de la tarde no se realizó ningún tipo de actividades debido a las fuertes lluvias que se presentaron


Residente Interventoría


Res. obra.

Mayo 30 del 2023 (Martes)

Horario Laboral: 7-12pm y 1-5pm

Estado del tiempo: mañana soleada, tarde nublada y a partir de las 3:30pm se presentan lluvias

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)


Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoriveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volqueta(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Replanteo de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

* Debido a las lluvias presentadas el día anterior las actividades se suspendieron a las 10:00am y se suspendieron nuevamente a las 3:30pm debido a las lluvias presentadas en esa hora.


Residente Interventoria


Dir. Obra.

Mayo 31 del 2023 (Miércoles)

Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm

Estado del tiempo: mañana nublado y tarde soleada

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1),
Siso(1), Profesional social(1), Almacenista(1),
Comisión topografica(1), Operadores(9), Paletero(4)
Oficios varios(3), Laboratorista(1)


Personal de interventoría: Director(1), Residente(1),
Inspector(1), Comisión topografica(1)


Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1),
Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1),
Minicargador(1), camotangue(1).

Actividades Ejecutadas Obra:

- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)

* Debido a las lluvias presentadas el día anterior
Las actividades se iniciaron a partir de las
11:00am porque el terreno estaba muy saturado



Residente interventoría




Dir. Obra

BITACORA DE OBRA TIERRALTA

Se suspenden las actividades por motivos de lluvia



Residente de obra


 Residente Interventor

Sábado, Abril 29 de 2023

Estado Tiempo: Nublado

Equipos en obra: Retro Orya, Pagarita, Autohormiguera, Motobomba, Herrerach
 Motos (palas, palín, Carretas, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventor, oficial, Sir,
 Obremos, Almacenista, operadores.


Actividades en obra.

Fundición de Solado para limpieza, para el estribo nº2.

Recorrido interno de material pulmo, cemento

Retiro de material producto de la excavación.

Se termina de fundir el solado de limpieza, en el estribo nº2.



Residente de obra.



 Residente Interventor

Domingo, Abril 30 de 2023

No se realizan actividades en obra, por ser el día de descanso
 laboral obligatorio




Residente de obra



 Residente Interventor

Lunes, Mayo 01 de 2023

" No se ejecutaron actividades debido a que es un día festivo,
 por ser el día del trabajo.



Residente de obra


 Residente Interventor

Marques, Mayo 02 de 2023


Estado Tiempo: Soleado.

Equipos en obra: Retro-Oruga, paqueta, tubohormigón, Herramientas Menores (Bichingues, barras, palas, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Siso, Almacenista, oficial, obreros, operadores.

Actividades en obra.

Se adelanta el armado del acero de refuerzo, en el estribo n°2, Margen derecha, Vereda Severinera, Municipio Tiramulata.

 demolición o descubierta de los pilotes puidos,
Residente de obra,


Residente Interventoria.

Miercoles, Mayo 03 de 2023.


Estado Tiempo: soleado

Equipos en obra: Herramientas Menores (barras, bichingues, palidos), Martillo.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Siso, Almacenista, Maestros, Oficiales, obreros, Operadores,

Actividades en obra.

Se continúa el descubierta o demolición de los pilotes a nivel del solado de limpieza, en el estribo n°2


Residente de obra


Residente Interventoria.

Jueves, Mayo 04 de 2023

Estado Tiempo: soleado

Equipos en obra: Hidrolavadora, Martillo, Motobomba, Herramientas Menores (barras, palidos, palas, etc), paqueta.


Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestros, Siso, Almacenista, oficiales, obreros, operadores.

Actividades en obra.


Se termina el descubierta de los 24 pilotes a nivel del solado, en el estribo n°2

Se realiza limpieza y axo en el acero de refuerzo del estribo n°3.

Transporte interno del acero hacia la margen derecha, del puente.



Residente de obra


Residente de interventoría

Viernes, Mayo 05 de 2023.

Estado Tiempo: Muy soleado


Equipos en obra: Motobomba, pajarita, Herramientas Menores (barra, pulidora, etc.)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, siso, Almacenero, operadores.


Actividades en obra:

Se inicia el armado e instalación del acero de refuerzo, para el estribo N°2, según diseño

Se inicia la dobléz o el gancho del acero de los pilotes, según diseño L0.45m, Se continúa con el lavado del acero de refuerzo, en el estribo N°1.



Residente de obra


Residente de interventoría

Sábado, Mayo 06 de 2023

Estado Tiempo: Muy soleado

Equipos en obra: Motobomba, pajarita, Herramientas Menores (barra, pulidora, etc.)


Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, siso, Almacenero, obreros, operadores

Actividades de obra:


Se continúa con la dobléz o la exandra del gancho, del acero de los pilotes, según diseño.

Avance en la Instalación del acero de refuerzo en el estribo N°2, según diseño.

Se continúa con el aseo y limpieza, en el dado N°3.




Residente de obra



Residente de interventoría

Domingo, Mayo 07 de 2023.

"No se realiza actividades, por ser el día de descanso obligatorio."



Residente de obra.


Residente de interventoría.

Lunes, Mayo 08 de 2023.

Estado Tiempo: Soleado.

Equipos en obra: Motobomba, Herramientas menores (barras, palas, etc)


Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, Siso, Almacenista, obreros, operadores.

Actividades en obra.


Avance en la instalación del acero de refuerzo en el estribo n°2, según diseño.

Se continúa con el doblaje del acero de refuerzo de los pilotes, según diseño.

lavado del duto n°2.



Residente de obra


Residente de interventoría.

Martes, Mayo 09 de 2023.

Estado Tiempo: Nublado.

Equipos en obra: Motobomba, Herramientas menores (barras, palas, pulidor, etc), Retro, ^{patente}


Personal en obra: Residente de obra, Residente interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, Siso, Almacenista, operadores.

Actividades de obra.


Avance en la instalación del acero de refuerzo para el estribo n°2, según diseño.

Se realiza lavado y asco en el estribo n°1

Se organiza el acceso para el estribo n°1




Residente de obra.


Residente de interventoría.


Miércoles, Mayo 10 de 2023.

No se trabajó porque se presentó una lluvia desde las 2:00 a.m hasta

Las 11:00 A.M, que aumentó el nivel de la quebrada Severina.



Residente de obra


Residente de Interventoría.

Jueves, Mayo 11 de 2023.

Estado Tiempo: Nublado

Equipos en obra: pajarita, Retro-Oruga, Motobomba, Herramientas Menores (pala, baras, polidoras).

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Siso, Almacanista, oficiales, obreros, operadores.


Actividades en obra.

Se continúa con la instalación del acero de refuerzo, según diseño, en el estribo N°2


Avance en el lavado y aso en el dado de la estructura, del estribo N°1.

Excavación mecánica y Adecuación Acceso, para el estribo N°1.

Se realiza comité de obra, conjuntamente entre Interventoría y contratista.



Residente de obra,


Residente de Interventoría.

Viernes, Mayo 12 de 2023.

Estado Tiempo: Soleado

Equipos en obra: Retro-Oruga, Motobomba, Herramientas Menores (pala, baras, polidoras, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Siso, Almacanista, oficiales, obreros, operadores, T. social.


Actividades en obra.


Avance en la instalación del acero de refuerzo para el dado, en el estribo N°2.

Lavado del dado N°1, en el estribo N°1

Se autoriza por parte de la interventoría, la fundación del estribo N°1, todo a la modelación realizada, de acuerdo a la ubicación de los pilotes.

Se realiza charla sobre seguridad y aseo, en el trabajo, a los obreros.




Residente de interventoría.

Residente de obra

Sábado, Mayo 13 de 2023.

Estado Tiempo: Soleado.

Equipos en obra: Retro-Oruga, Pájara, Molotompa, Herramientas Menores (pala, baras, pulidoras, etc).

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestros, SISO, oficiales, obreros, operadores, Conductores, Almacenista,

Actividades de obra.


Se continúa el armado e instalación del acero de refuerzo, según diseño, en el estribo no2.

Pellazo de material en talud quebrado. Severinera.

Aseo y lavado del acero instalado en el estribo no1.

Se refuerza la estructura de madera o formaletas, en el estribo no1.




Residente de interventoría.

Residente de obra.

"Domingo, mayo 14 de 2023."

No se realizan actividades en obra, por ser el día de descanso dominical obligatorio.

Lunes, Mayo 15 de 2023.

Estado tiempo: Se presenta una lluvia desde la madrugada a las 10:30 AM.

Equipos en obra: Herramientas Menores (baras, pulidoras, palas, etc), Molotompa.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, Almacenista.

Actividades de obra.

Se refuerzan las formaletas del escopado, en el estribo no2,

No se realizan mas actividades en la jornada de la mañana, por motivo de la fuerte lluvia, desde la madrugada.


Martes, Mayo 16 de 2023.

Estado tiempo: Se presenta una lluvia, por la tarde desde 5:00 p.m. - 3:00 a.m.
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría,
Maestro, Oficiales, Obreros, Siso, Almacenerista, Operadores, Vecinicos, Conductores.
Actividades en obra.


Se realiza aseo, lavado del acero de refuerzo, de la estructura del estribo w3.
Avance a la instalación del acero de refuerzo, del estribo w3.

Se realiza una logística para iniciar la fundición del estribo w2, para las 8:00 AM.

Haga los equipos y herramientas necesaria para la fundición del estribo w2.



Residente de obra


Residente de interventoría.

Miércoles, Mayo 17 de 2023.

Estado tiempo: Nublado

Equipos en obra: Retro-Oruga, Regadora, Autoborniguera, Motobombas, planta de agua.
Herramientas Menores (Cables, barras, Cabel, etc).

Personal en obra: Rep legal consorcio, Residente de obra, Residente Interventoría,
Inspector Interventoría, Maestro, Oficiales, Operadores, Siso, Almacenerista.

Actividades en obra.


Se realiza la fundición del estribo w2, a concreto de 3.500 psi, la actividad de fundición se extiende hasta las 9:00 p.m.

Se toman muestras del concreto fundido en obra.

Avance a el armado e instalación del acero en el estribo w3, margen derecho quebrada Severina.



Residente de obra.


Residente de interventoría.

Jueves, Mayo 18 de 2023.

Estado tiempo: Nublado

Equipos en obra: Motobomba, Herramientas Menores (barras pulas, palanetas, etc).

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Oficiales, Obreros, Siso, Almacenerista, Operadores


Actividades en obra.

Se realiza el curado del dado fundido, en el estribo no 2.
 Acarreo interno de los tableros, para armar el encofrado, del estribo no 1.

Avance en la instalación del acero de refuerzo, en el estribo no 1.
 Aseo y lavado en el estribo no 1.

Se inicia a instalar la formaleta o tablero, para el encofrado del estribo no 1.

Se sellan las microfisuras de la placa del dado, en el estribo no 2.




 Residente de interventoría.

Residente de obra,

Viernes, Mayo 19 de 2023.

Estado tiempo: Nublado

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, T. Social, Inspector Interventoría, Siso, Almacanista, Oficiales, Obreros, Alarifes,

Equipos en obra: Pajarita, Herramientas Menores (pulidora, baras), motobomba.

Actividades en obra.

Se realiza comité o acta vecindaria, con el fin de exponer el avance, compromisos, inconvenientes en la ejecución de la obra.


Se continúa con el curado del dado en el estribo no 2

Se continúa con el encofrado con tableros en madera, en el estribo no 1.

Se realiza adecuación en el acceso en la entrada principal, del corregimiento Severinera.

Se hace la logística para programar la fundida del estribo no 1, margen derecha quebrada Severinera

Se realiza comité técnico en obra, entre interventoría y contratista,




 Residente de interventoría.

Residente de obra

Sábado, Mayo 20 de 2023.

Estado tiempo: Soleado

Equipos en obra: Motobomba, Herramientas Menores (baras, muelles, pulidoras, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestros, Oficiales, Obreros, Gg. Almacén, Operadores.


Actividades en obra.


Se continúa con el encofrado o instalación de tableros, para el dado en el estribo nos.

Desmonte de formaleta en madera en el dado del estribo nos.

Acero y limpieza del acero en el dado del estribo nos.

Llega a la obra el resto del acero, para terminar de armar el dado en el estribo nos.




Residente Interventoría

Residente de obra

Domingo, Mayo 21 de 2023.

Estado Tiempo: Nublado.


Equipos en obra: Herramientas Menores (barras, pulidoras, martillos, etc.)


Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Oficiales, Obreros.

Actividades en obra.

Se retoma el armado e instalación del acero de refuerzo, para el dado en el estribo nos.

Avance a la instalación de tableros para el acero del estribo nos.
Se presenta una lluvia en horas de la tarde.




Residente Interventoría

Residente de obra

Lunes, Mayo 22 de 2023


Estado Tiempo: Nublado


Equipos en obra: Herramientas Menores (barras, morsa, martillos, etc.)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Oficiales, Obreros.

Se adelanta la instalación del acero de refuerzo, según diseño para el dado del estribo nos.

Avance en la instalación de tableros o guerdas, para el dado del estribo nos.

se trabara este día festivo, con el fin de avanzar o alistar el dado, del estribo nos. para proceder con la fundición del mismo..




Residente de interventoría.

Residente de obra.

Martes, Mayo 23 de 2023.

Estado Tiempo: se presenta una llovizna, desde las 4:00 A.M. - 6:00 P.M.


Equipos en obra: Herramientas menores (Mora, barros, etc.), Reto, Puyanta, Autohormiguera, motobomba.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de Interventoría, Maestro, Siso, Almacenista, Operadores, obreros, Oficiales


Actividades en obra.

Avance en la instalación del acero de refuerzo, según diseño, para el dado, del estribo nos

Se realiza Aseo, lavado, limpieza en el armado del acero, del dado en el estribo nos, dado a la fuerte lluvia, acasando en la mañana de hoy. llega a la obra el cemento para la fundición



Residente de obra


Residente de interventoría.

Miércoles, Mayo 24 de 2023.

Estado Tiempo: Positiva, Reto - Oroya, Herramientas Menores (Barros, Mora, Martillos, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, Siso, Almacenista, Operadores.

Actividades en obra:

Se realiza la logística para la fundición del dado del estribo nos.

Se termina de armar el acero y se refuerzan los tableros, en el dado del estribo nos

Avanzo Acceso para el dado del estribo nos.

Aseo y lavado del dado en el estribo nos.

Se realiza el transporte del cemento, para la margen derecha de la quebrada, para la fundición del estribo nos.
La actividad se terminó hasta las 2:00 P.M.

Ju G

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Jueves, Mayo 25 de 2023.

Estado Tiempo: Soleado.

Equipos a obra: Autobombas, Pajeta, Motobombas Vibradores, Placa Eléctrica, Herramientas Menores (Mangueras, Cables, tubos, etc.).

Personal a obra: Rep. legal Anzario, Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, CISO, Almacenero, Muestrero, Oficiales, Obreros, Operadores, Mecánico, Conductores.

Actividades a obra:

Se funda el dado a concreto de 3500 psi, en el estribo nos.
La actividad de fundición se vio interrumpida por motivos de lluvia.
El contratista tapó con plástico el concreto, que se lleva fundido.
Se termina la actividad de fundición a las 2:00 P.M.

Se toman muestras del concreto fundido.

Se funden 98 m³ de concreto, según diseño.

Ju G

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Viernes, Mayo 26 de 2023.

Estado Tiempo: soleado.

Equipos a obra: Motobomba, Pajeta, Volquete, Herramientas Menores (pala, Mangueras, etc.).


Personal a obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Muestrero, Oficiales, Obreros, Operadores, CISO, Conductores, Almacenero.

Se realiza el arado del dado a el estribo nos.


Acumulo interno del Material mixto, de la margen izquierda a

La margen derecha de la quebrada.

Arreglo de paso por la quebrada Severinera, entrada principal se realiza monitoreo del praguado del concreto del dado, estribo nos.



Residente de obra



Sábado, Mayo 27 de 2023

Estado tiempo: Soleado.

Equipos en obra: Equipos de Topografía, Tripoide, nivel, estación, Motoniveladora, Pajoneta, Herramientas Menores (pala, barra, mono)


Actividades en obra.

Se inicia la explanación de la vía al acceso del puente, margen izquierda quebrada Severinera.


Se continúa con el armado del acero, Muros, Aletas, estribo nos llega a la obra el vibro, para la explanación de los accesos del puente.

Se realiza orden y limpieza en la obra.

se realiza el adensado del puente, con equipos de precisión.



Residente de obra



"Domingo, Mayo 28 de 2023."

No se realiza actividades debido a que el día de descanso obligatorio.

Lunes, Mayo 29 de 2023.

Estado tiempo: Nublado, se presenta una lluvia por la madrugada

Equipos en obra: Motoniveladora, Herramientas Menores (pala, barra, cable)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventor, Inspector Interventor, oficiales, obreros, Siso, Almacenerista, operadores.


Actividades en obra.

Se continúa con la explanación de la vía, extendido del material para terraplén.


Se continúa con el armado del acero, para eletus y muros, según diseño.

Se inicia el retiro de tablero del dado fundido, en el estribo no 1.
Excavación manual para retiro de tablero.

Se realizan las charlas de seguridad al personal de la obra



Residente de obra


Residente de interventoria.

Martes, Mayo 30 de 2023.

Estado Tiempo: soleado.

Equipos en obra: Motoniveladora, vibro, Retro, paqueta, Autohormiguera, Herramientas Menores (barras, Carretas, palas, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector de Interventoria, Siso, Almacenista, oficial, obreros, operadores.


Actividades en obra.

Avance en el retiro de formaleta o tableros a los dados de los estribos no 1 y no 2

Se continúa con el extendido o conformación del material grande para la vía acceso del puente.



Residente de obra


Residente de interventoria

Miércoles, Mayo 31 de 2023

Estado Tiempo: nublado, se presentan lluvias desde las 2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Equipos en obra: Motoniveladora, vibro, Retro, Herramientas Menores (barras, palas, Martillos, etc)

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, oficial, obreros, Siso, Almacenista, Operadores.


Actividades en obra.

Avance en la conformación del material para terraplén, para los accesos del puente.


Se continúa con el retiro de tableros en madera, a el dado del estribo no 1.

Se presenta una lluvia desde las 2:30 p.m. - 4:30 p.m.

Se realiza orden y limpieza en la obra.



Residente de obra



Residente de interventoría
