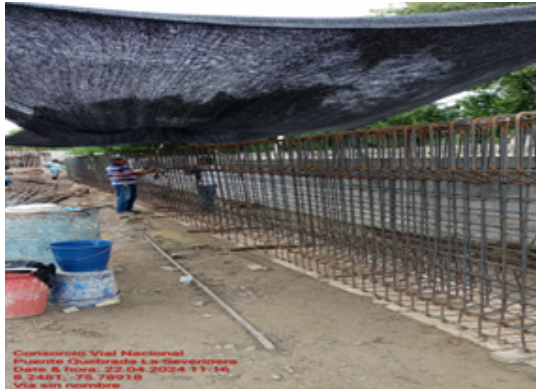


- **Municipio de Tierralta.**



- **Municipio de los Córdoba.**



- **Municipio de Montelibano**



BITACORA DE OBRA

**BITACORA DE OBRA
LP-MM-006-2022
MONTELIBANO**

01 APR 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLEMA: Seso

PERSONAL OBRERA: Director(1), Residente(1), R. Social(1), (1) SISO, paleteros(4), oficios
varios (2), topógrafo (1), (1) cadenero, (1) almacenista.

PERSONAL INTERVENCIONISTA: (1) Director, Residente(1), Aux(1), R. Ambiental
Topógrafo, cadenero, secretario y conductor.

ACT. REALIZADAS:


PINTADO: Jornada de limpieza.


AVANZAR: No se ejecutan actividades de obra.

MMA Y EQUIPOS: Inactivos

OBSERVACIONES: Los dos tramos del proyecto mantienen inactivo
sin recibir información oficial del contratista de los motivos
para no reactivar en obra.

ADV


R. Social


R. Intervent

02 ABR 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CIZMA: Seso

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), P. social (1), siso (1), Palafero (2), otros varios (4), topógrafo (1), cadenero (1), operadores (3) y laboratorista.

PERSONAL INTERVENIENTAS: Director (1), Residente (1), Aux (1), Inspector (1), P. Ambiental, Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria y conductor.

ACT. REALIZADAS:

PUNTO: No se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: Reproceso de nivelación y conformación de subbase a cota de diseño. Densidades de compacto para verificar compactación. (K1000, K1000, K2000, K2100 y K2200)

HERRAMIENTAS: Motor niveladora, vibracompactor, camotougeos y equipo de topografía.

OBSERVACIONES: Interventoría reitera preocupación por inactividad en obra para los dos tramos.

Por otro lado para la liberación por densidades es preciso contar con la liberación topográfica previamente. Adicionalmente se advierte que para poder comparar el factor de compactación se debe contar con los ensayos de proctor actualizados del material del sector donde se realiza la densidad.

RAV

Int

R. Interventoría

03 ABR 2024 (MIÉRCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), Paleteros (2), obreros varios (4), topógrafo (1), cadenero (1), operadores (3) laboratorista (1) y almacenista (1).

PERSONAL INTERVENTORIAL: Director (1), Residente (1), Aux (1), Inspector (1) R. Ambiental, topógrafo (1), cadenero (1), secretaria y conductor

AUT. REALIZADAS

PENDI: No se ejecutan actividades de obra (limpieza ambiental).

ANCLAR: Reproceso de nivelación y conformación de subbase a cota de diseño K2+750 - K2+800 y K2+960 - K3+020. Tarea de densidades K2+800, K2+400, K2+500, K2+600, K2+700, K2+800, K2+900, K3+000, K3+100, K3+200, K3+300 y K3+400.

MADRID Y EQUIPOS: Motor niveladora, vibracompactor, camión y equipo de topografía.

OBSERVACIONES: Interventoría reitera preocupación por los pocos avances de obra tendidos en las últimas jornadas, el 90% ejecutado no avanza. Interventoría por otro lado, recalca que los resultados de la tarea de densidades quedan sujetos a verificación hasta que se concuerden con los ensayos (proctor) actualizados.

También se menciona que los ensayos de caracterización realizados por Interventoría presentaron observación en el tamaño de $1\frac{1}{2}$ ", por lo tanto serán trasladados al especialista de pavimentos para su concepto, quedando pendiente de este en caso de ser necesario acciones correctivas.

RAV

Int.

Interventoría

04 ABR 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL CLIMA: lluvias moderadas 2:00-3:00 am.

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. Salud (1), SDO (?)
 Paleteros (2), oficios varios (1), topógrafo (1), cadenero (1)
 operadores (3), laboratorista (1) y almacenera (1)

PERSONAL INTERVENIENTE: Director (1), Residente (1), Aux (1),
 Inspector (1), R. Ambiental (1), topógrafo (1), cadenero (1),
 secretaria (1) y conductor (1)

ACT. REALIZADAS:

PISO: No se ejecuta actividades de obra

AVELAR: Repaseo de nivelación subbase a cota de diseño
 K4+550 - K5+350. Tama de densidades K4+000, K4+100, K4+200
 K3+200, K3+500, K3+600, K3+700, K3+800, K3+900.

MMA y EQUIPO: Motoniveladora, vibracompactor, camotangua
 y equipo de topografía

OBSERVACIONES: Los avances de obra para ambos tramos no
 se movieron, manteniendo el mismo % de ejecución de
 corte semanal anterior. En algunos sectores donde se termi-
 ron las densidades el factor de compactación arrojó mas
 del 100% por tanto estos puntos quedan bajo compactación
 hasta que se cuente con el proctor actualizado para
 cada sector.

ANV.

~~Residente~~
 R. Intervent

05 abril 2024 (viernes)

Estudio del clima: seco

Personal de obra: Director o (1), Residente o (1), Psocial (1), SISO (1), paleteros (2), Oficios varios (4), Topografo (1), cadenero (1), operarios (3), laboratorista (1) y almacenista (1).

Personal interventoria: Director (1), Res int (1), aux int (1), inspector (1), Res ambiental (1), Topografo (1), cadenero (1), Secretaria (1), conductor (1).

ACT REALIZADAS:

PANDD: No se ejecutaron actividades de obra.

PAVELAR: Repaseo de nivelación sub-base a cada de obra, toma de densidades en los dos K4+300, K4+400, K4+500, K4+600, K4+700, K4+800, K4+900, K5+000, K5+100, K5+200, K5+300.

MAQ Y ERUP: Motor niveladora (1), vibro compactador (1), carro tanque (1) y equip de topografía (1).

OPS: interventoria reitera preocupación por inactividad en obra para los 2 tramos.

se le solicita al contratista tomar medidas contingentes para dar celeridad a la obra y reducir el atraso mostrado en los últimos indicadores.

AAV

aux inter

R. Intervent.

06 abr. 2024 (sábado)

Estado del clima: seco

personal de obra: Director o (1), Res obra (1), R social (1), SISO (1), paleteros (2), Oficio varios (4), Topógrafo (1), cadenero operadores (3), laboratorista (1) y Almacenista (1)

personal de inventaria: Director int (1), Res int (1), aux int (1), Res amb int (1), Topógrafo (1), cadenero (1), ins int (1), conductor y secretaria (1)

ACT REALIZADAS


PRIVADO: no se realizó actividades de obra.


PUBLICAR: se realizan actividades de asen y señalización

MAG Y EDUAR: Motoniveladoras (1), vibró compactador (1), carrolanque (1), y equip de topografía (1).

OBJ: los dos tramos del proyecto mantienen inactivo sin recibir información oficial por parte del contratista de los motivos para retomar labores.

AAV


aux int.



R. Intervent.


07 abr. 2024 (domingo)

Estado del clima: seco

No se realiza ninguna actividad por ser un día dominical

AAV


aux int.


R. Intervent.

08 ABR 2024 (LUNES).

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRERO: Director (1), Residente (1), R. social (1), SDO (1), Topografo (1), codeneno (1), obreros varios (2), paleteros (2) y almacenista.

PERSONAL INTERVENTORIA: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), R. Ambiental (1), Inspector (1), Topografo (1), codeneno (1), secretario (1) y conductor (1).

ACT. REALIZADAS:


PENDO: Limpieza general y habilitación de un tramo de vía.

ANCLAR: Montreos inactivo.

MMA Y EQUIPO: Inactivo

OBSERVACIONES: Interventoria manifiesta preocupación por el parosismo de actividades evidenciado en obra, se piden reactivación inmediata.

AAV


R. Interventor

09 ABR 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRERO: Director (1), Residente (1), R. social (1), SDO (1), Topografo (1), codeneno (1), obreros varios (2), paleteros (2) y almacenista.

PERSONAL INTERVENTORIA: Director (1), Residente (1), Auxi (1), R. Ambiental (1), Inspector (1), topografo, codeneno (1), secretario (1) y conductor (1).

ACT. REALIZADAS:


PENDO: Instalación valla informativa, según última resolución.

ANCLAR: Inactivo.

MMA Y EQUIPO: Inactivo.

OBSERVACIONES: Suplementalmente inquietante parosismo de actividades del proyecto para ambos tramos de vía, donde interventoria se solicita reactivación inmediata.

AAV


R. Interventor

10 ABR 2024 (MIÉRCOLES)

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso moderado 8:30 - 9:00 pm

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), Topógrafo (1), cadenero (1), oficina varios (2), paleteros (2) y almacenista.

PERSONAL INTERVENIENTA: Director (1), Residente (1), Auxiliar (1), R. Ambiental (1), Inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y almacenista (1).

ACT. REALIZADAS:

PINDU: No se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra.

MMA Y EQUIPOS: Inactivos

OBSERVACIONES: Persiste inactividad total en obra para los dos tramos del proyecto, sin recibir manifestación formal del contratista que argumente la situación presentada.

AAV

[Firma]
R. Intervent

11 ABRIL 2024 (JUEVES)

Estado del clima: seco

Personal de obra: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), Topógrafo (1), cadenero (1), oficina varios (2), paleteros (2), y almacenista.

Personal de intervinencia: Director (1), Res. ind (1), aux ind (1), R. ambiental (1), inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y almacenista (1).

ACTIVIDAD REALIZADA

PINDU: No se ejecutan actividades


ANCLAR: No se ejecutan actividades.

MMA Y EQUIPOS: inactivos

OBSERVACIONES: persiste inactividad total en obra para los 2 tramos; sin recibir manifestación formal del contratista que argumente la situación presentada

en obra.

AAV


Aux Int

12 abril 2024 (viernes)

Estado del clima: seco

personal de obra: Director (1), presidente (1), E. social (1), SISO (1), Topógrafo (1), cadenero (1), oficios varios (2), puletero (2) y Almacenista.

personal de interventoría: Director (1), Res int (1), Aux int (1), Inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y Almacenista (1).

ACT REALIZADA.


PINDO: No se ejecutan actividades.

PNDIA: No se ejecutan actividades.

MAD y EQUIPO: inactivo.

OBS: persiste inactividad total en obra para los 2 tramos sin recibir manifestación formal del contratista que argumente la situación presentada en obra.

AAV


Aux Int

13 abril 2024 (sábado)

Estado del clima: seco

personal de obra: Director (1), Res o (1), E. social (1), SISO (1), Topógrafo (1), cadenero (1), oficios varios (2), puleteros (2) y Almacenista (1).

personal de interventoría: Director (1), Res int (1), Aux int (1), Inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y Almacenista (1).

39ml.

ACT REALIZADAS


PUNDO: NO SE ejecutaron actividades de obra.

ANCLAR: NO se ejecutaron actividades de obra.

MAD Y EQUIP: inactivo

OBJ: se le recomienda al contratista mantener la señalización que se requiera en la vía en intervención

AAV




14 abril (domingo)

Estado del clima: seco

No se realiza ninguna actividad por ser un día dominical

AAV



15 ABR 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. social (1), SPSO (1), topógrafo (1), Codenoro (1), Oficios varios (1), paleteros (2) y almacenista.

PERSONAL INTERVENCIÓN: Director (1), Residente (1), Aux (1), P. Auto (1), Inspector (1), topógrafo (1), codenoro (1), secretario (1), conductor (1).

ACT. REALIZADAS:


PUNDO: No se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra.

MAD Y EQUIPOS: Inactivos

OBSERVACIONES: Interventoria reitera preocupaciones por evidente inactividad en los dos brazos del proyecto.

AAV



16 ABR 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), Aux (1), P. Ambiental (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1), oficios varios (2) paleteros (2) y almacenista (1)

PERSONAL INTERVENTORA: Director (1), Residente (1), Aux (1), P. Amb. (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor

ACT. REALIZADAS:

PUNDO: No se ejecutaron actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutaron actividades de obra.

MMA Y EQUIPO: Inactivos

OBSERVACIONES: La interventoria realiza verificaciones de la instalación del sello de juntas en el plado, faltando por sellar 180ML en el almacenamiento N. 1, se preveer sellado para recibos y pago.

DAY

~~Hecho~~
P. Intervent.

17 ABR 2024 (MIÉRCOLES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), Aux (1), Ambiental (1), P. Social (1), SDO (1), topógrafo (1), cadenero (1), oficios varios (1), paleteros (1) y almacenista (1)

PERSONAL INTERVENTORA: Director (1), Residente (1), Aux (1), P. Amb (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1) y conductor (1)

ACT. REALIZADAS:

PUNDO: Sello de juntas K1200 - K1200

ANCLAR: No se ejecutaron actividades de obra.

MMA Y EQUIPO: Cortadora de concreto y hta menor.

OBSERVACIONES: Interventoria reitera preocupación por los malos avances de obra, advirtiéndole que la instalación del sello no representa avance de obra, por tanto el atraso seguirá en aumento.

DAY

~~Hecho~~
P. Intervent.

18 ABR 2024 (JUEVES)

ESTADO DEL TIEMPO: Nubios fuertes 1:00 - 2:00 AM.

PERSONAL OBRA: Director(1), Residente(1), R. social(1), SISO(1), Inspector(1), topógrafo(1), cadenero(1), oficios varios(2), paleros(2), almacenista.

PERSONAL INTERVENCIÓN: Director(1), Residente(1), Aux(1), R. Amb(1), inspector(1), topógrafo(1), cadenero(1), secretario(1) y conductor.

ACT. REALIZADAS:

PINDO: Solo de puntos Alm 1 K1420 - K1430.

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra.

MAD Y EQUIPO: Inactivos

OBSERVACIONES: Interventoría evidencia y expone mal comportamiento de la estructura de cuneta (losa), la cual se está despegando de la estructura de pavimento en el carril derecho Alin. 2 K2450 - K2452, se solicita corrección inmediata y tomar acciones preventivas de este comportamiento en los demás sectores.

AAV.

[Firma]
R. Intervent.

19 ABR 2024 (VIERNES).

Estado del tiempo: seco

Personal obra: Director(1), Res obra(1), R. social(1), SISO(1), inspector(1), Topógrafo(1), cadenero(1), oficios varios(2), paleros(2), almacenista(1).

Personal de intervención: Director int(1), Res int(1), aux int(1), R ambiental int(1), inspector(1), Topógrafo(1), cadenero(1), secretaria(1), y conductor(1).

ACT. REALIZADAS

PINDO: NO se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: NO se ejecutan actividades de obra.

MAD Y EQUIPO: Inactivos

OBS: Interventoría presenta preocupación por los malos avances de obra, advirtiendo que los sellos de junta no representan avances de obra.

AAV.

[Firma]
Aux int.

20 abril 2024 (sábado)

Estado del tiempo: 9:00 pm hasta 11:00 pm (llovizna moderada)
 Personal de obra: Director (1), Res obra (1), R social (1), SISO (1),
 inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), Oficiales Varios (2), palateros (2),
 almacenista (1).

Personal Interventoria: Director (1), Res int (1), aux int (1), R ambiental
 (1), inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1), y conductor
 (1).

ACT REALIZADAS


PANDO: No se ejecutan actividades de obra

ANULAR: No se ejecutan actividades de obra:

MAQ Y EQUIP: INACTIVOS

OBS: Interrogatoria reitera preocupación por los malos
 avances de obra.


AAV



21 abril 2024 (Domingo)

Estado del tiempo: Lluvia intensa 3:00 am y 5:00 am
 No se realiza ninguna actividad por ser un día
 dominical.

AAV-



22 abril 2024 (Lunes)

Estado del tiempo: Lluvia intensa 5:30 pm hasta 11:00 pm
 Personal de obra: Director (1), Res obra (1), R social (1),
 SISO (1), inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), Oficiales Varios (2),
 palateros (2), almacenista (1)

Personal de Interventoria: Director int (1), Res Interventoria (1),
 aux int (1), R ambiental int (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1),
 secretaria (1), conductor (1).

ACT REALIZADOS:


PUNDO: No se realizan actividades de obra

ANCLAR: No se realizan actividades de obra.

MAD Y EQUIP: INACTIVOS

OBS: Interventoría recibe preocupación por evidente inactividad en los 2 turnos del proyecto

AAV


AAV Int.

23 abril, 2024 (martes)

Estado del tiempo: seco

personal de obra: Director obra (1), Res obra (1) R social (1), SJO (1), inspector (1), Topógrafo (1), cadenero (1), Oficios varios (2), paleteros (2), almacenista (1).

personal de interventoría: Director int (1), Res int (1), aux int (1) R ambiental int (1), inspector int (1), Topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1), y conductor (1)

ACT REALIZADOS


PUNDO: No se ejecutan actividades de obra

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra

MAD Y EQUIP: inactivo

OBS: se le solicita al contratista, realizar un plan de contingencia para dar celeridad a las actividades de obra, para reducir el atraso presentado por la inactividad en obra.

AAV


AAV Int.

24 abril 2024 (miercoles)

Estado del tiempo: lluvias leves 3:00 - 4:30 AM.

personal de obra: Director obra (1), Res obra (1), P social (1), SISO (1), Inspector (1), Topografo (1), cadenero (1), Oficios varios (2), paletero (2), almacenista (1).

personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), aux int (1), Ambiental int (1), Inspector (1), Topografo (1), cadenero (1), Secretaria (1) y conductor (1).

ACT REALIZADAS


PUNTO: No se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra.

MAR Y EQUIP: INACTIVO

OBS: Interventoria realiza preparación por evidente inactividad en los 2 tramos del proyecto.

AAV.


aux int.

25 abril 2024 (jueves)

Estado del tiempo: Seco.

personal de obra: Director obra (1), Res obra (1), P social (1), SISO (1), Inspector (1), Topografo (1), cadenero (1), Oficios varios (2), paletero (2), almacenista (1).

personal de interventoria: Director int (1), Res int (1), aux int (1), Ambiental int (1), Inspector (1), Topografo (1), cadenero (1), Secretaria (1) y conductor (1).

ACT REALIZADAS

PUNTO: No se ejecutan actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutan actividades de obra.

MAR Y EQUIP: INACTIVO

OBS: se reanuda preapropiada por parte de inter-
veniente por la reactividad en obra ya que el
contratista no da respuesta oficial del porque de
esta.

AAV-

~~R. Intervent.~~
R. Intervent.

26 ABR 2024 (VIERNES)

ESTADO DEL TIEMPO: Nublos moderados 3:30 - 4:30 AM.

PERSONAL EN OBRA: Director (1), Residente (1), R. social (1), SISO (1), Insp
tor (1), topógrafo (1), cadenero (1), oficiales varios (2), paleteros (2)
almacenistas (1).

PERSONAL INTERVENIENTE: Director (1), Residente (1), Aux int (1)
Ambiente (1), Inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secreta-
ría (1), conductor (1).

ACT. REALIZADA:

PUNTO: Reconfirmación subbase Alia 1, frente al área con cam/D.
Excavación para cueros C.D Alineamiento 2, K27040 - K27050.

AVILAR: No se ejecutaron actividades de obra.

MMA Y EQUIPO: Pajarita (1A).

OBSERVACIONES: Se observó llegada a obra de (1) máquina paleta
a no obstante, para reactivación total de obra se precisa confor-
mar adecuadamente el frente de maquinaria requerido.

Por otro lado interventoría realiza observación respecto a garan-
tizar la calidad del material de subbase a reconfirmar en
el sector frente al alumbrado (por fender), ocasionando mejoras
de ser necesario al material instalado con anterioridad.

También se realiza observación por el comportamiento de los
cueros (lasas) en el alineamiento No. 6, el cual muestra desli-
zamiento o desprendimiento respecto al pavimento, precis-
do acciones correctivas para controlarlo y prevenir el deslizamien-
to de la estructura.

AAV

~~R. Intervent.~~
R. Intervent.

27 ABR 2024 (SÁBADO).

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. Social (1), siso (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), oficiales varros (2), paleros (2), educacionista.

PERSONAL INTERVENTORA: Director (1), Residente (1), Aux (1), Ambiental (1), inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria y conductor.

ACT. REALIZADAS:

PENDI: No se ejecutaron actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutaron actividades de obra.

MMA Y EQUIPOS: Inactivos.

OBSERVACIONES: Interventoría reitera preocupación por inactividad del personal en obra, para los dos tramos (Puerto y Anclon).

AAV

~~R. Intervent~~
R. Intervent

28 ABR 2024 (DOMINGO)

ESTADO DEL TIEMPO: Nubes moderadas 1:00 - 2:30 AM.

NO SE EJECUTAN LABORES POR SER DOMINICAL

AAV

~~R. Intervent~~
R. Intervent

29 ABR 2024 (LUNES)

ESTADO DEL CLIMA: Seco

PERSONAL OBRA: Director (1), Residente (1), R. social (1), siso (1), Inspector (1), topógrafo (1), Cadenero (1), oficiales varros (1), paleros (2), educacionista (1).

PERSONAL INTERVENTORA: Director (1), Residente (1), Aux (1), A. Amb. (1), Inspector (1), topógrafo (1), cadenero (1), secretaria (1), conductor (1).

ACT. REALIZADAS:

PENDI: No se ejecutaron actividades de obra.

ANCLAR: No se ejecutaron actividades de obra.

MMA Y EQUIPOS: Inactivos

OBSERVACIONES: Interventoría solicita garantizar calidad y estabilidad del material de subbase en el sector por Andar Kot 363 - Kot 384 C. Derecho. Así como también garantizar su densificación.

AAV

~~R. Intervent~~
R. Intervent

30 ABR 2024 (MARTES)

ESTADO DEL CLIMA: SECO

PERSONAL OBRA: Director(1), Residente(1), R. social(1), ssa(1), inspector topográfico(1), codinero(1), obreros(2), paleteros(2) y albañiles.
PERSONAL INTERVENFORZA: Director(1), Residente(1), Aux(1), Inspector R. Ambiental(1), topógrafo(1), codinero(1), secretario(1) y conductor.

ACT. REALIZADAS:

PINTO: Fudida pavimento MK40 Alin No 1 K0363 - K0384 (21m) C. Derecho.

AVELAR No se ejecutan actividades de obra.

MMA Y EQUIPOS: Mixer, rodillo vibratorio, equipo topográfico y hta menor.

OBSERVACIONES: Interventoria manifiesta No conformidad por Fudida de concreto MK40 sobre la subbase sin cumplir el % factor de compactación (95%), mostrando también en esa superficie segregación del material.

AAV

[Firma]
Interventor

BITACORA DE OBRA
LP-007-2022
LOS CORDOBAS

07-04-2024

Horario: 7-12 - 1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora,
Vibro, Pajarita, minicargador.


Actividades.


Subbase tramo 10

Excavaciones para curulas tramo 6

Cobertura grout tramo 10

Se reporta que la cuadrilla de tramo 4 (Placa huella) y tramo
8 (Cuentas) no se encuentran laborando


Residente Interventor


Director Obra.

02-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante, palettera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, Pajanta, minicargador.

Actividades.

Cunetas tramo 6

cerca de subbase tramo 10

Se libera tramo por densidad del K5+590 al 5+680 con los siguientes resultados (subbase): K5+620 con 96.7% y K5+650 con 98%.

Las cuadrillas de tramo 4 y 5 no se presentaron a laborar actividad suspendida


Residente Interventoria


Director Obra.

03-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: soleado.

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, Of varios, maestro, ayudante, paletara.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motor niveladora, Vibro, Pajarita, mini cargador.


Actividades.


Curules en tramo 6

Subbase tramo 10

Puestas para losas de concreto tramo 10

Continúa suspendida la actividad en tramo 4 y 6


Resident Interventoria


Director Obras

04-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo:

Personal en obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, of varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motonivelado, Vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades.


Exploración tramo 10

Excavación y retro material tramo 10

Concreto MR 40 del K5+590 al 5+670 Lasb Izquierdo las actividades en tramo 4 y 6 continúan suspendidos

Colocación geotextil/ tramo 16


Residente Interventoria


Director Obra

05-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal en obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, SISO, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, Of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro,
Pajarita, minicargador.


Actividades.

Explanacion tramo 10

Excavacion y retiro de material 10

mejoramiento en puente tramo 10

Concreto MR para losas de concreto del K+590 al K+620
lado izquierdo, este concreto queda en observacion hasta que
se presente los ensayos de calidad realizados a la subbase
Suspendida actividad en tramo 4 y 6


Residente Interventoria


Director Obras.

06-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, SISO, Topografo,
almacenista, laboratorista, Operadores, Of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro,
Pajara, minicargador.

Actividades.


Bordillos tramo 6

Subbase tramo 10

Las actividades en tramo 4 y 6 continuan suspendidas por la no
presencia de personal

Colocacion geotextil tramo 10


Residente interventoria



Director Obra.

08-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab social, SISO, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, Of Varios, maestro, ayudante, paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades.

Bordillos tramo 6

Subbase tramo 10

Cobertura geotextil tramo 10

Se le notifica al contratista que hasta no presentar los ensayos del material de subbase, no se autoriza la instalacion de concreto para losas de pavimento

Ausencia de personal en tramo 4

Residente Interventoria

Director Obra.

04-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, of varios,
maestro, ayudante, paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.


Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro,
Pajanta, minicargador.

Actividades.

Bordillos tramo 6

Rectificacion niveles para cerros subbase tramo 10

Ausencia de personal en tramo 4


Residente Interv.


Director Obra.

10-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo
almacenista, laboratorista, Operadores, Of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro,
Pajanta, minicargador.


Actividades


Subbase tramo 10

toma de densidades subbase entre 5+930 y 6+040 con los
siges resultados 5+960 con 104.28 %, 5+990 con 101.80 %
y 6+010 con 103.2 %, tramo liberado por densidad y
topografía

Tramo liberado por topografía entre K 5+820 al 5+880
y por densidad con los siges resultados K 5+830 con 100.7 %
y 5+860 con 106.7 %.

aun está pendiente la entrega de ensayos a subbase instalada
Se instala nueva valla informativa


Resident Interventor


Director Obra

11-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, Laboratorista, Operadores, Of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro,
Pajarita, minicargador.

Actividades.

Concreto MR 40 entre K5+820 al 5+880 Lado 139

Retiro de material tramo 10


Mejoramiento en piedra tramo 10


Bordillos tramo 6

Confirma inactividad en tramo 4

Concreto MR 40 del K5+930 al K5+970 lado 139

Colocacion geotextil tramo 10


Resid. Interventor


Director Obra

12-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.


Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadoras, of Varios,
maestro, ayudante, paletara.


Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo,

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro,
Pajanta, minicargador.

Actividades.

Colocacion de muck para cercos subbase tramo 10
Caretas tramo 7


Residente Interventoria


Director Obra

13-04-2024

Horario: 7-12 - 1-5

Estado de Tiempo: Soleado

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, Laboratorista, operadores, of varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro,
Pajarita, minicargador.


Actividades.

Losas de concreto MR 40 del K5+970 al K6+030


Explanacion y retiro de material de excavacion tramo 10

Mezclamiento en piedra tramo 10

Colocación geotextil tramo 10



Residente Interventoria



Director Obra

15-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de tiempo: Soleado.

Personal en obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante, paletara.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro, Pagarita, minicargador.

Actividades.


Revisos de actividades en placa huella tramo 4 con excavacion para riego nostras

Densidad en tramo de subbase recibida por topografia de K5150 al 5+760

Densidades en tramo de subbase recibida por topografia K6+150 al K6+250

Se reciben ambas tramos por densidades el tramo del 5+680 al 5+760 con densidades de 98.7% (K5+700.29) y 96.9% (K5+750)

El tramo del 6+150 al 6+250 con densidades de 99.9% (6+180 Densidad) y 95% (6+220 139)


Residente Interventoria



Director Obra

16-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trabajo Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, of vario, maestro, ayudante, paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.


Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades:


Concreto MR 40 del 5+680 al 5+722 carril 139

Concreto MR 40 del 6+150 al 6+190 139

Subbase tramo 10



Residente Interventoria



Director Obra

17-04-2024

Horario: 7-12-7-5

Estado de Tiempo: soleado.

Personal en obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, of varios. maestro, ayudante, paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora, Vibro, Pajarita, minicargador.


Actividades,

Excavaciones para vigas costillas placa hulla

Excavacion para curvas tramo 6

Excavacion para curvas tramo 7


Residente Interventoria


Director Obra.

18-04-2024

Horario: 7-12-7-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, Operadores, of varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro, pajarita, minicargador.

Actividades.

Concreto MR 40 del 6+190 al 6+232 139

Concreto MR 40 del 5+722 al 5+761 139


Hydramiculo con piedra tramo 10

Explanacion y retiro materiales tramo 10

Colocacion geotextil tramo 10

Instalacion subbase tramo 10


Residente Interventoria


Director Obra

19-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Lluvias desde las 2 am hasta 6 am
Lluvias 9 PM a 11 PM.

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, Operadores, Of Varios,
maestro, ayudante, palettera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.


Maquinaria y Equipos: Motoniveladora,
vibro, pajarita, minicargador.


Actividades.

Se recibe tramo por densidades y topografia del K5+880 al
5+930 con 103.78 V. en K5+895 (DER)

Extendida subbase tramo 10

Colocacion acero vigas rostras placa huella tramo 4


Residente Interventoria


Director Obra

20-04-2024

Horario: 7-12-7-5

Estado de Tiempo:


Personal En Obra: Director, Residente,
Inspector, Trab social, siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, Operadores, of varios,
maestro, ayudante, Paletera.


Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora,
vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades

No hay reporte por mal tiempo el dia de hoy


Residente Interventoria


Director Obra.

22-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Lluvias toda mañana de 6:am hasta las 8:am. tarde y noche.


Personal En obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of Varios, maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topografo.


Maquinaria y Equipos: motoniveladora, vibro, pajarita, minicargador.

Actividades.

No hay reporte de actividades por lluvias en la mañana y la tarde de hoy



Residente Interventoria



Director Obra.

23-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Lluvias Medio día. 12:PM A 2:PM.

Personal En obra: Director, Residente, inspector, Trab social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of varios, maestro, ayudante, palettera.

Personal Interventoria: Director, Residente, inspector, topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades.

Bordillos placa huella tramo 4


Extendida subbase tramo 10


Excavaciones y retiro material tramo 10

Mejoramiento en piedra tramo 10

Colocación geotextil tramo 10

Se realiza subbase por topografía y densidad al $K+250$ al $K+310$ con 108.35% en $K+270$ 139. y 104.4% en $K+290$ der


Residente Interventoría


Director Obra.

24-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de tiempo: fuertes lluvia desde las 12:00 PM hasta la 1:00 PM lluvia torrencial.

Personal en obra: Director, Residente, Inspector, Trab Social, Siso, Topógrafo, Almacenista, laboratorista, Operadores, Of Vano, maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente, Inspector, Topógrafo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora, vibro, Pajanta, minicargador,

Actividades.


Concreto ME 40 carril izq entre K6+230 al G+272

Curetas tamaño 6

Se presentan lluvias en horas de la tarde



Residente Interventoria



Director Obra.

25-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Lluvias desde las 3:AM hasta las 5:AM.


Personal en Obra: Director, Residente, inspector, Trab Social, Siso, Topografo, almacenista, laboratorista, operadores, of Varios, maestro, ayudante, palettera.

Personal Interventoria: Director, Residente, inspector, Topografo.


Maquinaria y Equipos: motoniveladora, Vibro, Pajarita, minicargador.

Actividades.

Concreto M2 40 del 5+880 al 5+290 izquierda
Acero para losa transición en placa hueca tramo 4



Residente interventoria



Director Obra.

26-04-2024

Horario: 7-12 - 1-5

Estado de Tiempo: Lluvias desde las 2:AM hasta 5:AM.
Continua Cereno de la noche desde las 5:AM hasta 6:AM.


Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, of Varios,
maestro, ayudante, Paleta.


Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo,

Maquinaria y Equipos: motoniveladora,
Vibro, Pajareta, minicargador.

Actividades.

Se recorren tramos en subbase tramo 10


Residente Interventoria



Director Obra

27-04-2024

Horario: 7-12

Estado de tiempo: Soleado.


Personal en obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, Siso Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo,


Maquinaria y Equipos: motonivelador,
Vibro, Pajanta, minicargador,

Actividades.

Se recibe subbase por densidades entre K 6+320 a K 6+350
con 105.2% en K 6+320 136 y 107.23% en K 6+340 de
Concreto MR 40



Residente Interventoria



Director Obra.

29-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de Tiempo: Soleado.

Personal en obra: Director, Residente,
Inspector, Trab social, Siso, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, OP varios,
maestro, ayudante, paletara.

Personal interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora,
vibro, payarita, minicargador.

Actividades

Excavaciones para cunetas tramo 7


Cerco subbase tramo 10

Excavaciones y retiro material tramo 10


Mejoramiento en piedra tramo 10

Instalación geotextil tramo 10

Colocación subbase tramo 10



Residente Interventoría



Director Obra

30-04-2024

Horario: 7-12-1-5

Estado de: Tiempo: Soleado.

Personal En obra: Director, Residente,
Inspector, Trab Social, SISO, Topografo,
almacenista, laboratorista, operadores, of Varios,
maestro, ayudante, Paletera.

Personal Interventoria: Director, Residente,
Inspector, Topografo.

Maquinaria y Equipos: motoniveladora,
Vibro, Paganita, minicargador,

Actividades.


Se libera tramo por densidad y topografia al K 6+350 al
6+400 con 104.11 % en 6+370 (Per) y 111.32 % en 6+385

Retiro materiales excavacion tramo 10

Plasmaneo en piedra tramo 10

Extensida geotextil

Subbase tramo 10



Residente Interventoria



Director Obra.

BITACORA DE OBRA
LP-013-2022
TIERRALTA


Lunes, febrero 26 de 2024.


Estado tiempo: Soleado.

No se ejecutan actividades en obra, ya que se suspende el contrato, con tres (3) días hábiles antes de vencer, dado a que este vence el 29 de febrero de 2024. Igualmente el contratista manifiesta, que de aquí en adelante las actividades faltantes, se encuentra dentro la ruta crítica, de la viga postensa. La cual en estos momentos se encuentra en observación, por parte de la Interventoría.

Solo se realiza actividades del estado actual, como queda la obra, ante de la suspensión.

La interventoría esta presente hasta el día de hoy, hasta el reinicio de obra, se hace un registro fotográfico de todas las actividades ejecutadas y como se encuentran la obra.


Residente de obra


Residente intervent.

Martes, 02 de abril de 2024.


Estado del tiempo: Soleado.


Personal en obra: Residente e inspector de interventoría.

Actividad en obra.

En el día de hoy se celebra el acta de reinicio de obra, pero en la obra no se encuentran personal.

Por parte del contratista para el reinicio de actividades.


Residente obra


Residente intervent.

Miércoles, 03 de abril de 2024


Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Ing. Residente e inspector de interventoría.

Actividades en obra. No se ejecutaron actividades.

el día de hoy, debido a que no hay personal del contratista en obra.


Residente obra


Residente de intervent.

Jueves, 04 abril de 2024.


Estado del tiempo: Soleado.


Herramienta menor: Pica, pala, Baras etc.

Personal en obra: Ing Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Ayudantes y oficial.

Actividad en obra.

En el día hoy el personal trazo y excavo y niveló el terreno donde se va a construir la viga que reemplazará a la viga #1, la cual nosotros la interventoria le hiciera la revisión no pasara las pruebas realizadas, por lo cual se requiere el cambio


Residente obra


Residente Intervent.

Viernes, 05 abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado.


Herramienta menor: Pica, palas, Baras etc.

Maquinarias y equipos: Minicargadora, compactador "Ranu"

Personal en obra: Ing. Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, Ayudantes, oficial, operador.

Actividad en obra

En el día de hoy el personal continuo con la actividad de excavacion y nivelacion, la paqueta empezó con la ampliacion en el area donde se va a realizar la viga a reemplazar.


Residente obra


Residente Intervent.

Sábado, 06 Abril 2024

Estado del tiempo: Soleado.


Herramienta menor: Pica, pala, barra etc

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Ayudantes, Oficial.

Actividades en obra.


En el día de hoy se inició con el vaciado del mortero en concreto nivelado para el vaciado y construcción de la viga que se va a reemplazar.


También se inició con la llegada de las volquetes dobles y sencilla con el material granular que servirá de afirmado, viene de la cantera autorizada.

 Residente obra  Residente Intervent.

Domingo, 07 de Abril 2024

Descanso dominical por ley.

 Residente obra

 Residente Intervent.

Lunes, 08 de Abril 2024

Estado del tiempo: Parcialmente nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Ayudantes, Oficial.


Herramienta menor: Pica, pala, Barra etc.


Maquinaria y equipos: concretadora 1 1/2 bulto, "Boma".

Actividad en obra.

En el día de hoy se terminó de vaciar el mortero en concreto que servirá de base para la construcción de la viga que reemplazará la viga #1.

Se continuó con la traida del material granular y el día de ayer se trajo material también.

 Residente obra

 Residente Intervent.

Martes, 09 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Ayudante, oficial.

Herramienta menor: Pica, Pala, Barra etc.

Actividad en obra.

En el día de hoy se descargó el acero de refuerzo de la viga a reemplazar, también siguió llegando material granular, este material está acopiado, lo cual no genera avance de obra y no se ve reflejado en actividades ejecutadas por lo cual la interventoría manifiesta mucha preocupación por que desde que se reinició la obra no se están ejecutando actividades que reflejen avance de obra.

[Firma]

Residente obra

[Firma]
Residente intervent.

Miércoles, 10 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Ayudante, oficial, herrero

Herramienta menor: Pala, biquinqui, barra etc.

Maquinario y equipos: Pulidora, tronzadora, volquetes.

Actividades en obra

En el día de hoy se realizó, corte y figura de Acero de refuerzo de la viga a reemplazar también se continuó con la traida y acopio de material granular.

[Firma]

Residente obra

[Firma]
Residente intervent.


Jueves, 11 de abril 2024.


Tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de interventoría, Ayudante, oficial, herrero.

Herramienta Menor: Pala, Pica, Barro Etc.
 Equipos y Maquinaria: Tronzadora, Pulidora, Volquetes.
 En el día de hoy se continuo con la
 Figuración del Acero de refuerzo de la
 Viga a reemplazar.

También se continuo con el acopio del
 material granular.


 Residente obra.


 Residente interventor.

Viernes, 12 de abril 2024.

Estado del tiempo: soleado.


Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector
 de interventoría, OfICIAL, Ayudantes, Herrero.


Herramienta Menor: Pala, Barro, tubo metálicos.

Maquinaria y equipos: Tronzadora, Pulidora, Volquetes.

Se continuo con el figurado del acero de
 refuerzo de la viga a reemplazar.

También en el acopio de material granular


 Residente obra.


 Residente interventor.

Sábado, 13 abril 2024

Estado del tiempo: soleado.


Personal en obra: Residente de obra, Residente e
 inspector de interventoría, Ayudantes, Oficiales, Herrero.

Herramienta menor: Barro, Martillo, Barro.

Maquinaria y Equipos: Tronzadora, Pulidora.

Actividad en obra.

Se continuo con el corte y figuración del
 Acero de refuerzo de la viga a reemplazar
 también se continua en la actividad de
 acopio de material granular.


 Residente obra


 Residente interventor.

Domingo, 14 de abril 2024
Día de descanso por ley.

[Signature]
Presidente obra.

[Signature]
Residente interventor.

Lunes, 15 de abril 2024.

Estado del tiempo: soleado.

Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de intertorrentía, Ayudante oficial, Herrero, Almucenista
Maquinaria y equipos: frontadora, pulidora, volquete y
herramienta menor.

Actividad en obra.

Se continuo con el acopio de material granular
el personal que esta figurando no se encuentran en
obra el día de hoy.

[Signature]
Presidente obra.

[Signature]
Residente interventor.

Martes, 16 de abril 2024.

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de intertorrentía, Ayudantes, Oficial, Herrero, Almucenista.

Maquinaria y equipos: frontadora, pulidora, Volquetes y
herramienta menores

Actividad en obra.

Se continuo con la figuración del acero de refuerzo
de la viga a reemplazar y tambien en el acopio
del material granular.

[Signature]
Presidente obra

[Signature]
Residente interventor.

Miércoles, 17 de abril 2024.

Estado del tiempo: soleado - Parcialmente nublado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de intertorrentía, Ayudante, oficial, Herrero, Almucenista.

Maquinaria y equipos: frontadora, pulidora, Volquete y
herramienta menor.

Actividad en obra:

En el día de hoy se continua con la figuración

del acero de refuerzo de la viga a reemplazar
y con el acopio de material granular.

[Signature]

Presidente obra.

[Signature]

Residente interventor.

Jueves, 18 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado, lluvias en hora de ayer en la pm.

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector
de interventoría, Ayudante, Oficial, Maestro, Almacenista
Maquinaria y equipo: Tronzadora, Pulidora, Volquetes
Herramienta menor.

Actividad en obra.

En el día de hoy llegó el maestro y empezó
a organizar el acero y armar la viga.

Se continuó con el acopio del material
granular.

[Signature]

Presidente obra.

[Signature]

Residente interventor.

Viernes, 19 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector
de interventoría, Ayudantes, Oficial, Maestro, Almacenista
Maquinaria y equipos: Tronzadora, Pulidora, Volquetes.
Herramienta menor.

Actividad en obra.

En el día de hoy se inicia con el armado del
acero de refuerzo de la viga que se va a reemplazar
se continúa con el acopio de material granu-
lar.

[Signature]

Presidente obra.

[Signature]

Residente interventor.

Sábado, 20 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado.

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector
de interventoría, Ayudantes, Oficial, Maestro, Almacenista.

Maquinaria y equipos: Volquetes, tronadora y herramienta menor.

Actividad en obra.

Se continua con el armado del Acero de refuerzo de la viga que se va a reemplazar y se continua con el acopio de material granular.

[Signature]

Residente obra.

[Signature]
Residente interventor.

Domingo, 21 de abril 2024.

Descanso por festivo.

[Signature]

Residente obra.

[Signature]
Residente interventor.

Lunes, 22 de abril 2024.

Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal en obra: Residente obra, Residente e inspector de interventoría, Maestro, Ayudantes, oficial, Almacenero.

Maquinaria y equipo: tronadora, pulidora, volquete y herramienta menor.

Actividad en obra.

Se continua con el armado de la viga a reemplazar x con el acopio de material granular.

[Signature]

Residente obra.

[Signature]
Residente interventor.

Martes, 23 de abril 2024.

Estado del tiempo: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoría, Maestro, Ayudante, oficial, Almacenero.

Maquinaria y equipo: tronadora, Pulidora y herramienta menor.

Actividad en obra.

Se continua solamente en el armado de la viga a reemplazar.

[Signature]

Residente obra.

[Signature]
Residente interventor.
