

<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01																								
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32																								
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL																											
Semana No	51	DEL : 1-jun-25	FECHA: 9-jun-25																								
Plazo Total	25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)	786 días	AL: 7-jun-25																								
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		366 días																									
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		46,56%																									
Nombre del Supervisor : Angela Constanza Castellanos																											
OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA																											
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).																											
CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN																											
AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META																											
<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Programado:</td><td>1,03%</td><td>54,19%</td></tr><tr><td>(\$) Valor programado:</td><td>\$ 20.146.263,91</td><td>\$ 1.055.361.286,63</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Programado:	1,03%	54,19%	(\$) Valor programado:	\$ 20.146.263,91	\$ 1.055.361.286,63	<table><tr><td></td><td>Semanal</td><td>Acumulado</td></tr><tr><td>(%) Ejecutado:</td><td>0,27%</td><td>60,33%</td></tr><tr><td>(\$) Valor ejecutado:</td><td>\$ 5.225.713,00</td><td>\$ 1.174.882.235,23</td></tr><tr><td>Evaluación:</td><td>Porcentaje Adelanto:</td><td>6,14%</td></tr><tr><td></td><td>Valor Adelanto:</td><td>\$ 119.520.948,60</td></tr></table>			Semanal	Acumulado	(%) Ejecutado:	0,27%	60,33%	(\$) Valor ejecutado:	\$ 5.225.713,00	\$ 1.174.882.235,23	Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	6,14%		Valor Adelanto:	\$ 119.520.948,60
	Semanal	Acumulado																									
(%) Programado:	1,03%	54,19%																									
(\$) Valor programado:	\$ 20.146.263,91	\$ 1.055.361.286,63																									
	Semanal	Acumulado																									
(%) Ejecutado:	0,27%	60,33%																									
(\$) Valor ejecutado:	\$ 5.225.713,00	\$ 1.174.882.235,23																									
Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	6,14%																									
	Valor Adelanto:	\$ 119.520.948,60																									
DATOS CONTRACTUALES																											
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA																									
Contratista:	GRUPO FAO SAS	Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ																								
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	Contrato No:	23001280 H3 de 2023																								
Valor Inicial:	\$ 1.947.574.911	Valor Inicial:	\$ 838.169.861																								
Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 1.947.574.911	Valor Actualizado al modificatorio :	\$ 838.169.861																								
Plazo inicial:	30 MESES	Plazo inicial:	30 MESES																								
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DIAS	Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DIAS																								
Fecha de iniciación:	6-jun-24	Fecha de iniciación:	6-jun-24																								
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	Fecha de vencimiento:	31-jul-26																								
Valor total actual del contrato:	\$ 1.947.574.911	Valor total actual del contrato:	\$ 838.169.861																								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																											
OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA																											
EL DÍA JUEVES 05-06-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 51																											
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025)																											
N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES																								
1	Se realizó ajuste de la puerta en entrada a oficinas administrativas.	Bien realizado	NO																								
2	Se realizó arreglo de filtración de agua en dos aires acondicionados de la sala de abordaje No. 2, segundo piso.	Bien realizado	NO																								
3	Se realizó mantenimiento al aire acondicionado ubicado en las oficinas de seguridad.	Bien realizado	NO																								
4	Se continúan trabajos de instalación de puntos de anclaje.	En ejecución	NO																								
5	Se realizó traslado y acopio de la estructura metálica en la bodega.	Bien realizado	NO																								
6	Se terminó la actividad de soldadura en piso de la estructura metálica en la base SEI bomberos.	Bien realizado	NO																								
7	Se realiza verificación de filtración de agua en baño de hombres del primer piso del salón principal.	En ejecución	NO																								
8	Se realizó la instalación de los dispensadores de papel en baños públicos del aeropuerto.	Bien realizado	NO																								
SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO																											
04-06-2025 - SKVV/TERMINAL AEREO/BANDA TRANSPORTADORA																											
SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN																											
Mantenimiento de tanque ACPM de los grupos electrógenos. Mantenimiento de la trampa de grasas de los grupos electrógenos. Instalación de URNAS en acrílico de las salas de espera. Cambio de correas de la planta No. 2 del grupo de electrógenos. Transferencia de los grupos electrógenos. Izaje con diferenciales de la estructura metálica en base SEI Bomberos. Mantenimiento de la banda transportadora. Entrega de bodega por parte del contratista a la Administración del aeropuerto.																											

<div></div> <div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE			
<p>*Martes 03 de junio 2025. Verificamos la realización de charla SST y realización de ejercicios de calistenia, verificamos en campo actividad en el edificio principal en la cubierta, la continuación de la instalación de anclajes en el cual evidenciamos áreas señalizadas, escalera de extensión doble asegurada y apta para la actividad, la supervisión de la profesional e inspector SST y los equipos de protección contra caídas actos y acordes para la actividad. En la jornada de la tarde evidenciamos la continuidad del armado de la estructura metálica de la base sei de bomberos-gimnasio donde constatamos la socialización con el oficial de servicio de la tarea a realizar y el personal que ejecutará. La residente de obra supervisa la tarea como responsable quien autoriza, teniendo en cuenta medidas y controles preventivos para el desarrollo de esta actividad crítica en apoyo con la profesional SST.</p>			
<p>*Miércoles 04 de junio 2025. Verificamos realización de charlas SST y calistenia, firmas de permisos de trabajo, pre operacionales y reportes de salud. Organización en el campamento, en cuanto al almacenamiento de productos químicos, materiales y herramientas. Continuamos inspección en campo en el área de gimnasio base si de bomberos donde se socializa la actividad a realizar en el área con el oficial de servicio de bomberos, contratista obra e interventoría. Verificamos elementos de protección personal acordes a la actividad, el trabajador de actividad en caliente utilizando equipo de soldadura y pulidora cumpliendo con la seguridad. Continúan con el armado de andamios por parte del andamiere certificado del contratista de obra. Se realiza revisión del reporte semanal ambiental en donde se prueban dichos reportes, se emite comunicado solicitando al contratista de obra la entrega del certificado de paz y salvo por concepto de pagos de salarios y seguridad social integral del mes de mayo del personal que ejecutó actividades durante este periodo, plazo de la fecha de entrega el día de mañana 5 de junio antes del mediodía por cumplimiento legal y contractual.</p>			
<p>*Jueves 05 de junio 2025. Verificamos que el personal operativo procede a firmar documentación de SST, sin embargo, manifiestan no realizar actividades laborales por motivo de incumplimiento de no recibir el pago de la quincena correspondiente del 15 al 30 de mayo. En horas de la tarde se lleva a cabo el comité de seguimiento de obra número 51 de manera presencial realizado en la dirección de la región al Oriente, en donde abordamos los siguientes puntos: se encuentra pendiente la documentación del especialista eléctrico y el ayudante para la actividad de mantenimiento del cambio de transferencia en cuanto a la validez SST por parte de la región al Oriente y de la interventoría; continúa pendiente el compromiso de la entrega de los chalecos identificables de acuerdo al manual de entidad visual de la aeronáutica civil; se reitera la entrega del certificado de pagos de salario y seguridad social integral del periodo de mayo, certificado que corresponde al informe mensual de SSTA de la interventoría; así mismo pendiente la entrega de los informes de SST y ambiental del contratista de obra.</p>			
<p>*Viernes 06 de junio 2025. Evidenciamos que el personal operativo continúa con cese de actividades por el no pago de salario. Se llevó a cabo recorrido en campo con la supervisión en las áreas que han sido intervenidas, en el cual evidenciamos que el andamio que se encuentra armado en el área de gimnasio base de bomberos cuenta con un freno en mal estado, se solicita al contratista de obra reposición del freno y que se incluyan plataformas. Continuamos en el área de la fachada del edificio principal, exactamente en la entrada Alfa 8, nido de Avispas. Se solicita al contratista atender esa solicitud ya que esta área será intervenida para la actividad de mantenimiento realizada por el grupo por temas de seguridad y accidentes de trabajo.</p>			
<p>*Sábado 07 de junio 2025. Evidenciamos que el personal operativo continúa con cese de actividades, cumpliéndose hoy tercer día. Se continúa con la revisión de reporte semanal de SST de la fecha del 26 al 31 de mayo, constatamos la aprobación de dichos reportes.</p>			
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA			
FAO-CTO-23001163-0568-2025	Envío cotización para suministro de cubierta para adecuación en tanque de ACPM grupo electrógenos, incluye estructura metálica en ángulo 1 ½" 1/8, materiales y herramienta necesaria para su debida instalación y funcionamiento		
FAO-CTO-23001163-0569-2025	Envío programación semanal No 52.		
FAO-CTO-23001163-0570-2024	Memorias eléctricas planos eléctricos definitivos, para cambio de transferencia Aeropuerto Vanguardia..		
FAO-CTO-23001163-0571-2025	Comunicado FAO-CTO-23001163-0571-2025 envió de cotizaciones referentes a: • 11.1.107 SUMINISTRO MATERIALES PARA EL LAVADO DE TRAMPA DE GRASAS. • 11.1.108 SUMINISTRO MATERIALES PARA EL LAVADO Y ADECUACIÓN DE TANQUE ACPM GRUPO ELECTROGENOS.		
FAO-CTO-23001163-0572-2025	Envío informe semanal No 50 del Aeropuerto Vanguardia.		
FAO-CTO-23001163-0573-2025	ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL No.12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		
FAO-CTO-23001163-0578-2025	COMUNICADO-FAO-CTO-23001163-0578-2025 REPORTE SEMANAL 26 AL 31 DE MAYO 2025		
FAO-CTO-23001163-0579-2025	INFORME MENSUAL No 11 MAYO		
FAO-CTO-23001163-0580-2025	COMUNICADO-FAO-CTO-23001163-0580-2025 ENTREGA INFORME MENSUAL SST MAYO 2025		
CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA			
03-06-2025 - CO-FJ-1280-349-2025	VILLAVICENCIO – SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS ((Mantenimiento de aire acondicionado, sala de abordaje por donde ingresa Avianca)		
03-06-2025 - CO-FJ-1280-350-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de puerta entrada administrativa)		
03-06-2025 - CO-FJ-1280-351-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No51		
03-06-2025 - CO-FJ-1280-352-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO 2025262020021776 ID 2055044 EVALUACION INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE		
04-06-2025 - CO-FJ-1280-353-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0568-2025 – (Suministro cubierta en tanque ACPM grupo electrógenos)		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-354-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0558-2025 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-355-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0567-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 26 AL 31 MAYO 2025		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-356-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0571-2025 – (Mantenimiento trampa de grasas grupo electrógenos)		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-357-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0571-2025 – (Mantenimiento tanque ACPM grupo electrógenos)		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-358-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENVÍO DE SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
05-06-2025 - CO-FJ-1280-359-2025	VILLAVICENCIO - INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO PAGO DE SALARIO PERSONAL.		
07-06-2025 - CO-FJ-1280-360-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN OFICIO CO-FJ-1280-359-2025. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO PAGO DE SALARIO PERSONAL		



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

PROCESO

VERSION. 01

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

EJECUCION

CÓDIGO: FR-AV-
32

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA



PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA		1	2	3	4	5	6	7
NOMBRE	CARGO	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA							
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA			1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARIN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZUA	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUENO	COORDINADOR TÉCNICO							
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRIGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO			1	1	1	1	1
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO			1				
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCON	AYUDANTE ELÉCTRICO			1	1	1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZALEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA			1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARI REYES	OFICIAL DE OBRA			1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA			1	1	1	1	1
EDGAR JUVER BARBOSA DELGADO	OFICIAL DE OBRA			1	1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA			1	1	1	1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA			1	1	1	1	1
RUBÉN DARIO PEDRAZA DURAN	AYUDANTE DE OBRA			1				
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		0	0	14	12	13	12	11

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA		1	2	3	4	5	6	7
NOMBRE	DOCUMENTO	D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726			1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001			1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118			1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA		0	0	3	3	3	3	3

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	0	0	0
MARTES	3	14	17
MIÉRCOLES	3	12	15
JUEVES	3	13	16
VIERNES	3	12	15
SABADO	3	11	14

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

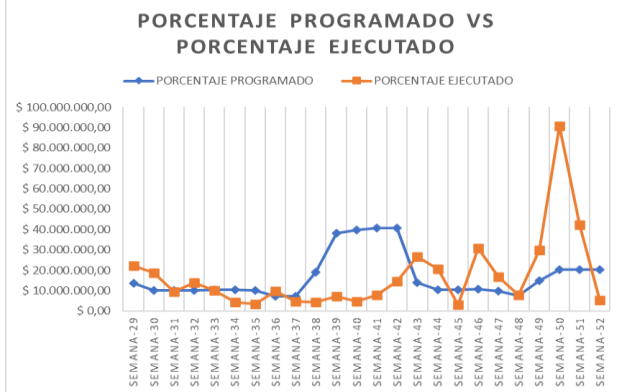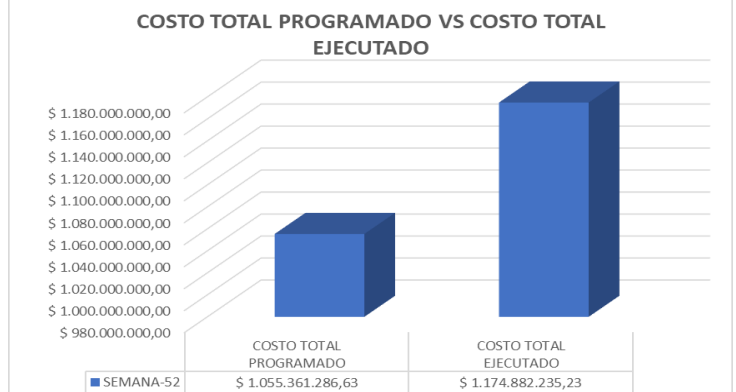

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	\$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	\$ 187.656.630,00	\$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	\$ 155.033.486,00	\$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	\$ 78.800.698,00	\$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	\$ 70.812.436,00	\$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	\$ 83.585.060,00	\$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	\$ 144.103.712,00	\$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	\$ 53.551.056,00	\$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	\$ 20.657.485,00	\$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	\$ 32.301.368,00	\$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	\$ 66.594.074,00	\$ 13.318.815,00	20,00%
TOTAL ACUMULADO		\$ 893.096.005,00	\$ 239.435.279,00	

Valor Total Contrato Obra
\$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
\$ 893.096.005,00
% Avance facturado Acumulado
45,86%

NOTA:

Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 42,44%. Equivalente a \$ 826,501,931,00 millones de pesos.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32


AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	\$ 27.938.995,00
2	jul-24	\$ 56.131.974,00
3	ago-24	\$ 46.738.612,55
4	sep-24	\$ 27.203.529,71
5	oct-24	\$ 25.632.258,47
6	nov-24	\$ 28.408.636,76
7	dic-24	\$ 43.785.303,84
8	ene-25	\$ 20.782.905,00
9	feb-25	\$ 12.450.479,00
10	mar-25	\$ 15.407.556,00
11	abr-25	\$ 24.113.540,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 328.593.790,00

Valor Total Contrato Interventoría
\$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
\$ 328.593.790,00
% Avance facturado Acumulado
39,20%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a \$ 304,480,250,00 con un porcentaje de 36,33%.
-------	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

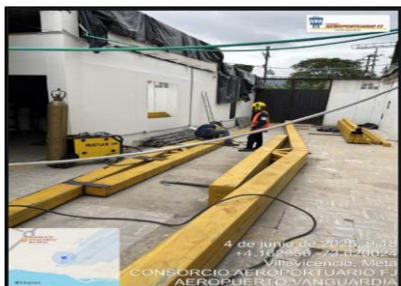					
No. FOTO 1	Se realizó ajuste de la puerta en entrada a oficinas administrativas.	No. FOTO 2	Se realizó arreglo de filtración de agua en dos aires acondicionados de la sala de abordaje No. 2, segundo piso.	No. FOTO 3	Se realizó mantenimiento al aire acondicionado ubicado en las oficinas de seguridad.
					
No. FOTO 4	Se continúan trabajos de instalación de puntos de anclaje.	No. FOTO 5	Se realizó traslado y acopio de la estructura metálica en la bodega.	No. FOTO 6	Se terminó la actividad de soldadura en piso de la estructura metálica en la base SEI bomberos.

FORMULARIO 1

PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERA L	PARTICULA R						(+)	(-)		
1MAMPOSTERIA												
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	\$ 38.916,00	\$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	\$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	\$ 30.706,00	\$ 1.842.360,00	50,00		110,00	\$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	\$ 26.258,00	\$ 3.938.700,00			150,00	\$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	\$ 38.490,00	\$ 76.306.425,00			1982,50	\$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	\$ 29.591,00	\$ 29.324.681,00			991,00	\$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	\$ 15.640,00	\$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	\$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	\$ 66.017,00	\$ 3.895.003,00	44,50		103,50	\$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	\$ 33.550,00	\$ 1.342.000,00			40,00	\$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	\$ 1.841,00	\$ 736.400,00	3700,00		4100,00	\$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	\$ 27.292,00	\$ 42.657.298,00			1563,00	\$ 42.657.298,00
Subtotal								\$ 199.913.827,00				\$ 199.472.264,00
2PISOS												
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	\$ 20.128,00	\$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	\$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	\$ 86.865,00	\$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	\$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	38,00	\$ 175.568,00	\$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	\$ 175.568,00
Subtotal								\$ 30.750.659,00				\$ 5.525.218,00
3CUBIERTA Y CIELORASO												
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO:NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	\$ 480.205,00	\$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	\$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	\$ 89.881,00	\$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	\$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	\$ 140.472,00	\$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	\$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM. INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	\$ 89.781,00	\$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	\$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	\$ 28.249,00	\$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	\$ 282.490,00
Subtotal								\$ 160.262.198,00				\$ 47.830.416,00
4CARPINTERIA METÁLICA												
19	4.1		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	\$ 451.209,00	\$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	\$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSONAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	\$ 17.857,00	\$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	\$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	\$ 22.736,00	\$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	\$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	\$ 83.129,00	\$ 6.816.578,00	40,58		122,58	\$ 10.189.953,00
Subtotal								\$ 18.976.923,00				\$ 80.995.211,00
5CARPINTERIA MADERA												
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	\$ 476.557,00	\$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	\$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	\$ 12.995,00	\$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	\$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	\$ 38.231,00	\$ 2.959.079,00			77,40	\$ 2.959.079,00
Subtotal								\$ 8.306.604,00				\$ 5.274.069,00
6CRISTERIA												
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	\$ 289.652,00	\$ 14.482.600,00		-50,00	-	\$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	\$ 84.356,00	\$ 4.217.800,00		-50,00	-	\$ 0,00
Subtotal								\$ 18.700.400,00				\$ 0,00
7CANALETAS Y PORTACABLES												
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	\$ 61.879,00	\$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	\$ 618.790,00
Subtotal								\$ 30.939.500,00				\$ 618.790,00

FORMULARIO 1

PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.


REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)												
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTAD A	VALOR TOTAL
		GENERA L	PARTICULA R						(+)	(-)		
8									LIMPIEZA PROFUNDA			
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	\$ 9.054,00	\$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	\$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	\$ 14.260,00	\$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	\$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	\$ 7.870,00	\$ 11.805.000,00			1500,00	\$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	\$ 627.943,00	\$ 100.470.880,00			160,00	\$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	\$ 30.741,00	\$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	\$ 249.228.771,00
Subtotal								\$ 575.375.447,00				\$ 502.718.551,00
9									EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS			
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 61.126.435,00	\$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	\$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	\$ 22.193.560,00	\$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	\$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	\$ 72.618.205,00	\$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	\$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	\$ 589.218,00	\$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal								\$ 170.079.432,00				\$ 129.413.992,00
10									MANO DE OBRA			
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	\$ 11.766.194,00	\$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	\$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	\$ 39.080,00	\$ 18.758.400,00	200,00		680,00	\$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	\$ 36.074,00	\$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	\$ 96.786.542,00
Subtotal								\$ 397.717.500,00				\$ 429.281.986,00
								SUBTOTAL OBRAS	\$ 1.611.022.490,00			\$ 1.401.130.497,00
							IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	\$ 11.956.808,00		0,19	\$ 10.399.015,00
								SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)	\$ 1.622.979.298,00			\$ 1.411.529.512,00


11 BOLSA DE MONTO AGOTABLE												
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	\$ 324.595.613,00	\$ 324.595.613,00				\$ 536.045.399,00
								TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	\$ 324.595.613,00			\$ 536.045.399,00


VALOR TOTAL	\$ 1.947.574.911,00	\$ 1.947.574.911,00
-------------	---------------------	---------------------

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				DESCRIPCIÓN						PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				ADMINISTRACIÓN	A=					20%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).				IMPREVISTO	I=					3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.				UTILIDAD	U=					5%
				TOTAL A.I.U.	A.I.U.=					28%


ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA
CC 79558358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS


SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 83359728
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

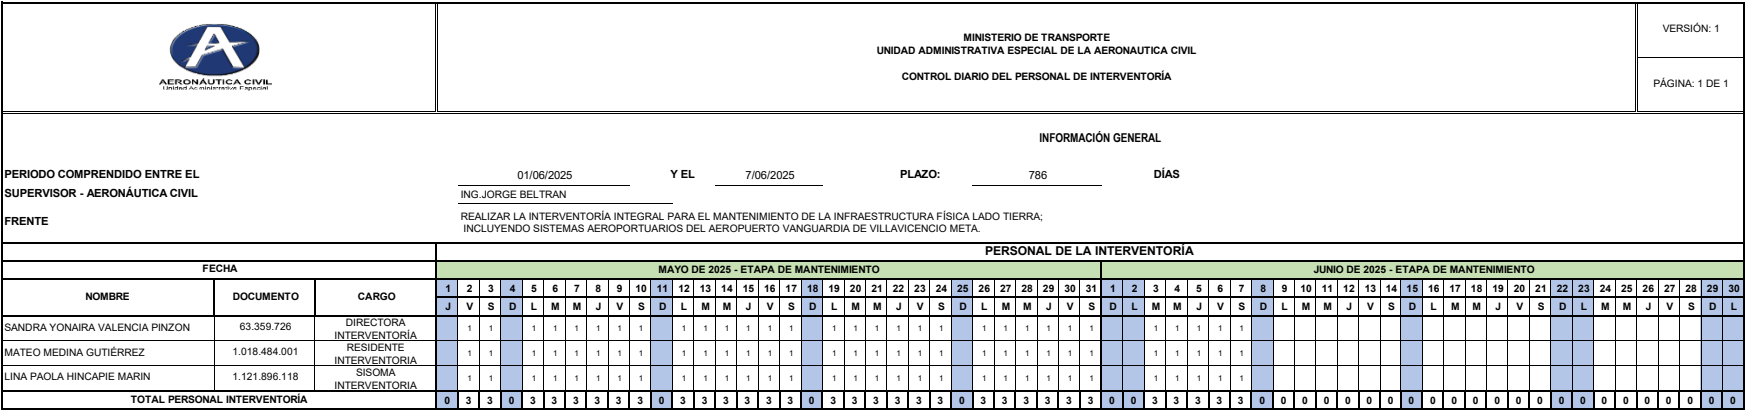



PÁGINA 1
DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

01/06/2025	Y EL	7/06/2025	PLAZO:	786	DÍAS
ING. JORGE BELTRAN					
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS DEBORDANTES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VII AVIACIONISTA					

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

[illegible]

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%	0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 1.600.000,00	0,08%	\$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 6.051.963,00	0,31%	\$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	\$ 0,00	0,00%	\$ -	0,00%		\$ 14.426.535,12	0,74%	\$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	\$ 45.812.826,61	2,35%	\$ 45.812.826,61	2,35%		\$ 32.938.784,08	1,69%	\$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	\$ 104.547.219,71	5,37%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 187.656.630,00	9,64%	\$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	\$ 163.281.612,81	8,38%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 228.308.146,00	11,72%	\$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	\$ 222.016.005,91	11,40%	\$ 58.734.393,10	3,02%		\$ 265.699.525,00	13,64%	\$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	\$ 267.981.357,99	13,76%	\$ 45.965.352,08	2,36%		\$ 287.156.607,00	14,74%	\$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	\$ 281.112.033,16	14,43%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 311.702.916,00	16,00%	\$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	\$ 294.242.708,33	15,11%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 360.592.928,00	18,51%	\$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	\$ 307.373.383,50	15,78%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 430.770.803,00	22,12%	\$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	\$ 320.504.058,67	16,46%	\$ 13.130.675,17	0,67%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	\$ 336.339.384,58	17,27%	\$ 15.835.325,91	0,81%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	\$ 352.937.560,70	18,12%	\$ 16.598.176,12	0,85%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	\$ 374.247.028,83	19,22%	\$ 21.309.468,13	1,09%		\$ 463.556.824,00	23,80%	\$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	\$ 401.170.505,98	20,60%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	\$ 428.093.983,13	21,98%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 474.761.492,00	24,38%	\$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	\$ 455.017.460,28	23,36%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 524.418.957,30	26,93%	\$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	\$ 481.940.937,43	24,75%	\$ 26.923.477,15	1,38%		\$ 528.524.348,30	27,14%	\$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	\$ 508.770.878,31	26,12%	\$ 26.829.940,88	1,38%		\$ 585.049.134,70	30,04%	\$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	\$ 535.533.086,04	27,50%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 606.186.245,82	31,13%	\$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	\$ 562.295.293,77	28,87%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 627.526.809,73	32,22%	\$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	\$ 589.057.501,50	30,25%	\$ 26.762.207,73	1,37%		\$ 649.728.616,29	33,36%	\$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	\$ 613.961.736,22	31,52%	\$ 24.904.234,72	1,28%		\$ 676.214.666,29	34,72%	\$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	\$ 634.212.216,92	32,56%	\$ 20.250.480,70	1,04%		\$ 718.014.760,61	36,87%	\$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	\$ 650.072.944,39	33,38%	\$ 15.860.727,47	0,81%		\$ 765.286.339,61	39,29%	\$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	\$ 663.682.314,47	34,08%	\$ 13.609.370,08	0,70%		\$ 787.369.049,00	40,43%	\$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	\$ 673.618.417,22	34,59%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 805.952.284,00	41,38%	\$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	\$ 683.554.519,97	35,10%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 815.249.829,00	41,86%	\$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	\$ 693.490.622,72	35,61%	\$ 9.936.102,75	0,51%		\$ 829.111.743,00	42,57%	\$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	\$ 703.766.316,78	36,14%	\$ 10.275.694,06	0,53%		\$ 839.295.695,00	43,09%	\$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	\$ 714.137.793,00	36,67%	\$ 10.371.476,22	0,53%		\$ 843.786.348,00	43,32%	\$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	\$ 724.265.806,04	37,19%	\$ 10.128.013,04	0,52%		\$ 847.270.374,00	43,50%	\$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	\$ 731.593.992,49	37,56%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 857.125.493,00	44,01%	\$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	\$ 738.922.178,94	37,94%	\$ 7.328.186,45	0,38%		\$ 861.773.136,00	44,25%	\$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	\$ 757.980.970,75	38,92%	\$ 19.058.791,81	0,98%		\$ 866.033.733,00	44,47%	\$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	\$ 796.179.171,30	40,88%	\$ 38.198.200,55	1,96%		\$ 873.215.813,00	44,84%	\$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	\$ 835.853.763,56	42,92%	\$ 39.674.592,26	2,04%		\$ 877.877.069,00	45,08%	\$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	\$ 876.597.467,07	45,01%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 885.784.982,00	45,48%	\$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	\$ 917.341.170,58	47,10%	\$ 40.743.703,51	2,09%		\$ 900.341.603,24	46,23%	\$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	\$ 931.369.380,59	47,82%	\$ 14.028.210,01	0,72%		\$ 927.131.725,24	47,60%	\$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	\$ 941.787.649,20	48,36%	\$ 10.418.268,61	0,53%		\$ 947.674.781,20	48,66%	\$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	\$ 952.206.592,93	48,89%	\$ 10.418.943,73	0,53%		\$ 950.790.829,20	48,82%	\$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	\$ 962.842.934,88	49,44%	\$ 10.636.341,95	0,55%		\$ 981.714.252,13	50,41%	\$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	\$ 972.624.266,23	49,94%	\$ 9.781.331,35	0,50%		\$ 998.652.395,13	51,28%	\$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	\$ 980.098.488,48	50,32%	\$ 7.474.222,25	0,38%		\$ 1.006.528.866,33	51,68%	\$ 7.876.471,20	0,40%
49	S-49	18/05/2025	\$ 994.922.494,90	51,09%	\$ 14.824.006,42	0,76%		\$ 1.036.518.797,33	53,22%	\$ 29.989.931,00	1,54%
50	S-50	25/05/2025	\$ 1.015.068.758,81	52,12%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.127.476.453,27	57,89%	\$ 90.957.655,94	4,67%
51	S-51	1/06/2025	\$ 1.035.215.022,72	53,15%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.169.656.522,23	60,06%	\$ 42.180.068,96	2,17%
52	S-52	8/06/2025	\$ 1.055.361.286,63	54,19%	\$ 20.146.263,91	1,03%		\$ 1.174.882.235,23	60,33%	\$ 5.225.713,00	0,27%
53	S-53	15/06/2025	\$ 1.075.507.550,54	55,22%	\$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	\$ 1.095.383.369,94	56,24%	\$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	\$ 1.114.027.164,38	57,20%	\$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	\$ 1.132.670.958,82	58,16%	\$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	\$ 1.151.314.753,26	59,12%	\$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	\$ 1.171.281.482,43	60,14%	\$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	\$ 1.192.206.198,82	61,21%	\$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	\$ 1.209.634.483,11	62,11%	\$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	\$ 1.226.076.594,25	62,95%	\$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	\$ 1.233.714.313,88	63,35%	\$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	\$ 1.241.172.352,05	63,73%	\$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	\$ 1.248.365.634,36	64,10%	\$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	\$ 1.254.878.115,87	64,43%	\$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	\$ 1.261.390.597,38	64,77%	\$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	\$ 1.267.733.439,63	65,09%	\$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	\$ 1.273.953.439,66	65,41%	\$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	\$ 1.280.173.439,69	65,73%	\$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	\$ 1.286.393.439,72	66,05%	\$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	\$ 1.325.893.877,29	68,08%	\$ 39.500.437,57	2,03%				
72	S-72	26/10/2025	\$ 1.366.073.507,47	70,14%	\$ 40.179.630,18	2,06%				
73	S-73	2/11/2025	\$ 1.406.253.137,65	72,21%	\$ 40.179.630,18	2,06%				
74	S-74	9/11/2025	\$ 1.446.432.767,83	74,27%	\$ 40.179.630,18	2,06%				
75	S-75	16/11/2025	\$ 1.473.252.146,74	75,65%	\$ 26.819.378,91	1,38%				
76	S-76	23/11/2025	\$ 1.485.874.113,84	76,29%	\$ 12.621.967,10	0,65%				
77	S-77	30/11/2025	\$ 1.498.696.083,31	76,95%	\$ 12.821.969,47	0,66%				
78	S-78	7/12/2025	\$ 1.511.518.052,78	77,61%	\$ 12.821.969,47	0,66%				
79	S-79	14/12/2025	\$ 1.524.340.022,25	78,27%	\$ 12.821.969,47	0,66%				
80	S-80	21/12/2025	\$ 1.533.088.604,89	78,72%	\$ 8.748.582,64	0,45%				
81	S-81	28/12/2025	\$ 1.541.349.091,56	79,14%	\$ 8.260.486,67	0,42%				
82	S-82	4/01/2026	\$ 1.547.764.734,78	79,47%	\$ 6.415.643,22	0,33%				
83	S-83	11/01/2026	\$ 1.554.180.378,00	79,80%	\$ 6.415.643,22	0,33%				
84	S-84	18/01/2026	\$ 1.561.147.319,89	80,16%	\$ 6.966.941,89	0,36%				
85	S-85	25/01/2026	\$ 1.569.039.773,60	80,56%	\$ 7.892.453,71	0,41%				
86	S-86	1/02/2026	\$ 1.577.169.941,22	80,98%	\$ 8.130.167,62	0,42%				
87	S-87	8/02/2026	\$ 1.585.066.137,73	81,39%	\$ 7.896.196,51	0,41%				
88	S-88	15/02/2026	\$ 1.592.896.342,39	81,79%	\$ 7.830.204,66	0,40%				
89	S-89	22/02/2026	\$ 1.600.740.077,38	82,19%	\$ 7.843.734,99	0,40%				
90	S-90	1/03/2026	\$ 1.608.739.411,11	82,60%	\$ 7.999.333,73	0,41%				
91	S-91	8/03/2026	\$ 1.616.532.746,82	83,00%	\$ 7.793.335,71	0,40%				
92	S-92	15/03/2026	\$ 1.625.499.763,32	83,46%	\$ 8.967.016,50	0,46%				
93	S-93	22/03/2026	\$ 1.637.498.649,21	84,08%	\$ 11.998.885,89	0,62%				
94	S-94	29/03/2026	\$ 1.649.771.243,75	84,71%	\$ 12.272.594,54	0,63%				
95	S-95	5/04/2026	\$ 1.664.573.433,63	85,47%	\$ 14.802.189,88	0,76%				
96	S-96	12/04/2026	\$ 1.680.566.021,32	86,29%	\$ 15.992.587,69	0,82%				
97	S-97	19/04/2026	\$ 1.696.558.609,01	87,11%	\$ 15.992.587,69	0,82%				
98	S-98	26/04/2026	\$ 1.704.432.501,33	87,52%	\$ 7.873.892,32	0,40%				
99	S-99	3/05/2026	\$ 1.712.140.705,99	87,91%	\$ 7.708.204,66	0,40%				
100	S-100	10/05/2026	\$ 1.721.817.914,73	88,41%	\$ 9.677.208,74	0,50%				
101	S-101	17/05/2026	\$ 1.736.558.276,80	89,17%	\$ 14.740.362,07	0,76%				
102	S-102	24/05/2026	\$ 1.751.298.638,87	89,92%	\$ 14.740.362,07	0,76%				
103	S-103	31/05/2026	\$ 1.766.039.000,94	90,68%	\$ 14.740.362,07	0,76%				
104	S-104	7/06/2026	\$ 1.774.935.235,23	91,14%	\$ 8.896.234,29	0,46%				
105	S-105	14/06/2026	\$ 1.781.081.291,74	91,45%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
106	S-106	21/06/2026	\$ 1.787.227.348,25	91,77%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
107	S-107	28/06/2026	\$ 1.793.373.404,76	92,08%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
108	S-108	5/07/2026	\$ 1.799.519.461,27	92,40%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
109	S-109	12/07/2026	\$ 1.805.665.517,78	92,71%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
110	S-110	19/07/2026	\$ 1.811.811.574,29	93,03%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
111	S-111	26/07/2026	\$ 1.817.957.630,80	93,34%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
112	S-112	2/08/2026	\$ 1.824.103.687,31	93,66%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
113	S-113	9/08/2026	\$ 1.830.249.743,82	93,98%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
114	S-114	16/08/2026	\$ 1.836.395.800,33	94,29%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
115	S-115	23/08/2026	\$ 1.842.541.856,84	94,61%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
116	S-116	30/08/2026	\$ 1.848.687.913,35	94,92%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
117	S-117	6/09/2026	\$ 1.854.833.969,86	95,24%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
118	S-118	13/09/2026	\$ 1.860.980.026,37	95,55%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
119	S-119	20/09/2026	\$ 1.867.126.082,88	95,87%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
120	S-120	27/09/2026	\$ 1.873.272.139,39	96,18%	\$ 6.146.056,51	0,32%				
121	S-121	4/10/2026	\$ 1.879.089.924,30	96,48%	\$ 5.817.784,91	0,30%				
122	S-122	11/10/2026	\$ 1.884.669.995,30	96,77%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
123	S-123	18/10/2026	\$ 1.890.250.066,30	97,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
124	S-124	25/10/2026	\$ 1.895.830.137,30	97,34%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
125	S-125	1/11/2026	\$ 1.901.410.208,30	97,63%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
126	S-126	8/11/2026	\$ 1.906.990.279,30	97,92%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
127	S-127	15/11/2026	\$ 1.912.570.350,30	98,20%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
128	S-128	22/11/2026	\$ 1.918.150.421,30	98,49%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
129	S-129	29/11/2026	\$ 1.923.730.492,30	98,78%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
130	S-130	6/12/2026	\$ 1.929.310.563,30	99,06%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
131	S-131	13/12/2026	\$ 1.934.890.634,30	99,35%	\$ 5.580.071,00	0,29%				
132	S-132	20/12/2026	\$ 1.947.574.910,60	100,00%	\$ 12.684.276,30	0,65%				

\$ 1.947.574.910,60 100%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ
