

Consecutivo:	4	Lugar:	Virtual				
Fecha:	27	11	2025	Hora Inicio:	9:00	Hora Fin:	10:30
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Comité Técnico de Seguimiento ANIM-MEN						
Elaboró:	Maria Mónica Montealegre – Contratista ANIM						
Asistentes:	ANIM: Natalia Valencia, Piedad Hoyos, Marcela Teresa Torres Harker, Juan Camilo González, María Mónica Montealegre MEN: Carlos Amaya, Sara Carolina Ricardo, Carlos Camargo, Carolina Sánchez Moya, Enrique Luis Monroy, Johnson Mario Cansario, Luis Alvaro Gallardo, Maurizio Toscano, Alejandra Prieto Munevar						
Agenda	- Verificación de Quorum - Proyectos y Grupos - Cronograma - Cronograma General - Cronograma Grupo - Estado Proyectos - Grupo 1 - Estado General Modulares - Estado de Convenios e Implantaciones - Temas por resolver						
TEMAS TRATADOS - Revisión del estado general de los proyectos, con énfasis en aquellos con riesgos documentales, prediales o de aprobación institucional. - Actualización sobre convenios: firmados, en revisión, pendientes o con documentación incompleta. - Revisión de predios y su viabilidad (casos críticos: Cali, Villeta). - Reporte del proceso de selección: adjudicaciones, publicaciones, fechas de cierre y cronograma. - Identificación de observaciones técnicas a los pliegos de suministro e interventoría y su gestión. - Análisis del Proyecto 4 del Grupo 1 (La Jagua) y alternativas si no es aprobado por Consejo Superior. - Revisión del avance de los proyectos en madera y necesidad de cierre de especificaciones. - Identificación de proyectos para Bolsa CAF (caso Becerril). - Revisión de riesgos de incumplimiento por falta de documentación, firmas o autorizaciones. - Planificación de mesa jurídica y técnica para la primera semana de diciembre. Estado general consolidado de los proyectos (27/11/2025) - Existen varios proyectos con un porcentaje de avance al 80%: Valmaría, Funza, Soacha. - Existen proyectos con alertas críticas prediales o institucionales: Cali, Villeta, La Jagua. - Algunos presentan falta de documentación obligatoria: certificación, documentos de fomento, actas de Consejo Superior (varias IES). - Los proyectos en madera (Valle del Guamuez y Buriticá) requieren cierre inmediato de especificaciones.							

- Varios proyectos están en estudio para incorporarse o sustituir otros (Monquirá, Palacio de San Francisco → no viable; reemplazo por Ladera).
- La definición del **proyecto 4 del Grupo 1** depende de decisiones institucionales urgentes.

Detalle por proyecto

1) Valmaría (Bogotá)

- Estado: Porcentaje de avance de 99.55% en fase de estructuración.
- Observaciones: Revisión de actas y verificación documental para cierre de convenio.

2) Funza

- Estado: Porcentaje de avance de 95.93% en fase de estructuración.
- Observaciones: Pendiente de definición normativa. No tiene aún factibilidad eléctrica por ser predio de la SAE.

3) Soacha

- Estado: Avanza, pero requiere consolidar documentos (certificación, acta de Consejo Superior).
- Observaciones: La IES solicitó tiempo adicional para entregar acta, no hay viabilidad eléctrica.

4) Cali

- Estado: **Proyecto crítico.**
- Hallazgos:
 - El predio **no es viable** (limitantes normativas y ambientales).
 - Requiere concertación ambiental y ruta jurídica de saneamiento.

5) Villeta

- Estado: En proceso, se busca que remplace a la Jagua en grupo 1.
- Hallazgos:
 - Ocupación del predio.
 - Falta de autorizaciones institucionales y documentación.

6) La Jagua (Proyecto 4 del Grupo 1)

- Estado: **Pendiente aprobación del Consejo Superior.**
- Riesgo: Si no se aprueba, se deberá activar plan alternativo.

7) Suba – Multicampus: estado crítico

- Estado: Se espera des priorización de proyecto por parte del MEN. Debe buscarse proyecto que lo supla.

8) Becerril

- Estado: En revisión normativa no ha iniciado implantación.
- Riesgo: Falta información por parte de la IES.

9) El Charco

- Estado: No se cuenta con toda la información.
- Observaciones: La IES manifestó dudas sobre construcción en madera; reunión técnica programada.

10) Arboletes

- Estado: Con implantación parcial, pero convenio sin documentación completa.

11) El Bagre

- Estado: En revisión documental.
- Pendientes: Certificación, fomento, documentos de soporte.

12) Santa Marta (dos sedes, incluyendo Minca)

- Estado: Avanzan de forma diferenciada.
- Minca: visita realizada, pero MEN debe priorizar formalmente.
- Urbanas: revisión en curso.

13) Minca (Adecuaciones)

- Estado: Pendiente decisión de priorización por MEN.

14) Buritacá (grupo 3)

- Estado: No priorizado para este ciclo inmediato.
- Parte del paquete de proyectos en madera; requiere cierre de especificaciones.
- ANIM prioriza Valle del Guamuez sobre Buritacá para publicación.

15) Valle del Guamuez (proyecto en madera)

- Estado: Avanzado; va a invitación pública.
- Observaciones: Debe cerrarse especificación técnica.

16) Palacio de San Francisco

- Estado: **No viable**.
- Motivo: Requiere trámites como Bien de Interés Cultural; MEN propone excluirlo.
- Sustitución: "Ladera".

18) Moniquirá

- Estado: Se propone **reincorporarlo** como alternativa para reemplazar proyectos con inviabilidad (Suba, La Jagua o Funza).

19) Proyectos del proceso de selección (Grupo 1)

- Incluye: Valmaría, Soacha, Funza y un cuarto proyecto (entre La Jagua, Villeta o alternativa).
- Estado:
 - Suministro e interventoría adjudicados.
 - Pólizas y acta de inicio en trámite.

Compromisos

Compromisos MEN

- Revisar y aprobar convenios con rezago documental (Santa Marta, Cali, Arboletes).
- Exigir entrega de documentos faltantes a IES.

- Definir priorización de Minca.
- Hacer seguimiento a ruta jurídica en el caso Cali.
- Villeta: Solucionar desalojo del predio por ocupación indebida
- OIE notificará a la ANIM la continuación o despriorización del proyecto de La Jagua de Ibirico
- El proyecto de palacio de San Francisco no es viable, por lo que será despriorizado y será reemplazado por el proyecto de Ladera – Cali. Sacar de la matriz de seguimiento y enviar toda la información de Ladera.
- Enviar actas de priorización Minca
- Cali: deben enviar toda la información pendiente para continuar con el proceso (esquema de saneamiento a la CVC, traspaso del predio a las IES y necesidades de las IES)
- MEN enviará certificación del Comité de Infraestructura sobre priorización para incluir el proyecto de Monquirá.

Compromisos ANIM

- Publicar procesos el 29 de noviembre.
- Cerrar observaciones: 35 en suministro, varias en interventoría.
- Coordinar mesa jurídica la primera semana de diciembre.
- Consolidar documentación para Grupo 1.
- Incluir a Monquirá en reemplazo de Funza o La Jagua o Multicampus Suba
- Incluir en el ppto general el pago de los profesionales que se contrataron
- ANIM solicita a MEN que firme acuerdo de cesión de derechos con SUMA, para tenerlo como anexo del acuerdo marco entre MEN – ANIM.

Compromisos IES

- Entregar actas de Consejo Superior.
- Aportar certificación CI y documentos fomento.
- Gestionar autorizaciones prediales (Cali, Villeta, El Bagre, El Charco).

Compromiso

Responsable

Firma y aprobación de convenios

MEN

Documentación faltante

IES - MEN

Publicación de procesos, adjudicación ANIM

Viabilidad predial

IES / Entes territoriales

Definición proyecto 4 DE GRUPO 1


MEN – ANIM

Fechas clave

- **29 de noviembre:** Publicación del proceso de selección.
- **15 de diciembre:** Cierre del proceso.
- **22 de diciembre:** Adjudicación.
- **Primera semana de diciembre:** Mesa jurídica y técnica ANIM–MEN.
- **Inmediato:** Cierre de convenios críticos y documentación pendiente.

NOTA: Resumen presentación se anexa a la presente acta

Firmas Participantes:



NOMBRE: LUIS ALVARO GALLARDO ERASO
ENTIDAD: MEN
CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO



NOMBRE: CARLOS ALIRIO AMAYA
ENTIDAD: MEN
CARGO: APOYO A SUPERVISIÓN OFICINA DE
INFRAES-TRUCTURA

NOMBRE: MARCELA TERESA TORRES HARKER
ENTIDAD: ANIM
CARGO: SECRETARIA GENERAL

NOMBRE:
ENTIDAD:
CARGO:

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del “Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria”



Educación



¡Somos
la
Revolución
del
Cambio!



Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco



| 27 noviembre de 2025

**COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
INTERINSTITUCIONAL - CONTRATO No.
CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA ANIM**

Comité Número 4

27 de Noviembre 2025

AGENDA

- 1. Verificación del Quorum**
- 2. Proyectos & Grupos.**
- 3. Cronograma**
 - **Cronograma General**
 - **Cronograma Grupo 1**
- 4. Estado proyectos**
 - **Grupo 1**
 - **Estado General Modulares**
- 5. Estado de Convenios e implantaciones**
- 6. Implantaciones**
- 7. Temas por resolver**



Verificación del Quorum

Verificación del Quorum

- Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto.
- Un (1) miembro designado por el (la) jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa.
- Un (1) miembro designado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.



Proyectos & Grupos

Grupos de Proyectos

GRUPO 1- MODULARES METÁLICO			
VALMARIA	FUNZA	SOACHA	VILLETA
GRUPO 2- MODULARES MADERA			
VALLE DEL GUAMUEZ			
GRUPO 3 - MODULARES MADERA			
BURITACA-MODULARES			
GRUPO 4 - MODULARES METÁLICO			
SANTA MARTA-ALUNA	MAGANGUE	TIERRA ALTA	
GRUPO 5			
BECERRIL	ARBOLETES		BAGRE
GRUPO 6			
LA JAGUA	BOGOTA MULTICAMPUS	CALI Modulares	EL CHARCO
GRUPO - ESTUDIOS Y DISEÑOS			
SOACHA	CALI		BOSA
GRUPO 8 ADECUACIONES			
MINCA		BURITACA	

Ubicación Ambientes Modulares



Grupos de Proyectos

Observaciones

GRUPO 1- MODULARES METÁLICO			
VALMARIA	FUNZA Consulta normativa	SOACHA	VILLETA
GRUPO 2- MODULARES MADERA			
VALLE DEL GUAMUEZ			
GRUPO 3 - MODULARES MADERA			
BURITACA-MODULARES			
GRUPO 4 - MODULARES METÁLICO			
SANTA MARTA-ALUNA	MAGANGUE	TIERRA ALTA	
GRUPO 5			
BECERRIL	ARBOLETES		BAGRE
GRUPO 6			
LA JAGUA Sin Aprobación CSU	BOGOTA MULTICAMPUS Sin Información	CALI Modulares En proceso Firma Convenio	EL CHARCO
GRUPO - ESTUDIOS Y DISEÑOS			
SOACHA	CALI En proceso Firma Convenio		BOSA En revisión de Convenio
GRUPO 8 ADECUACIONES			
MINCA Esperando priorización MEN		BURITACA	PALACIO DE SAN FRANCISCO Sin Viabilidad

Presupuesto


Actualizaciones

GRUPO	UBICACIÓN	INSTITUCIÓN	TIPO	PRESUPUESTO
1	Bogotá D.C- Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional	Obra Modulares	\$13.498.821.773,91
1	Funza	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	Obra Modulares	\$13.363.510.792,77
1	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	Obra Modulares	\$12.599.861.735,43
1	Villeta	Universidad Pedagógica Nacional Gobernación de Cundinamarca	Obra Modulares	\$11.415.069.922,79
2	Valle Guamuez	Institución Universitaria del Putumayo	Obra Modulares	\$14.760.898.074,07
3	Santa Marta - Buritaca	Institución Universitaria Santa Marta	Obra Modulares	\$7.402.171.600,00
4	Magangué	Universidad de Cartagena	Obra Modulares	\$17.860.686.669,63
4	Santa Marta- aluna	Universidad del Magdalena	Obra Modulares	\$14.977.091.377,00
4	Tierralta	Universidad de Córdoba	Obra Modulares	\$23.650.171.143,00
5	Arboletes CAF	Universidad de Antioquia	Obra Modulares	\$16.347.069.155,25
5	El Bagre CAF	Universidad de Antioquia	Obra Modulares	\$17.860.686.669,63
5	Becerril CAF	Universidad Militar de nueva Granada	Obra Modulares	\$13.523.509.926,00
6	Cesar	La Jagua de Ibirico	\$14.760.898.074,07	\$14.760.898.074,07
6	Bogotá D.C. - Suba	Multicampus Suba	Obra Modulares	\$13.509.974.508,47
6	Cali	RED ITTU	Obra Modulares	\$13.509.974.508,47
6	El charco	Universidad de Nariño	Obra Modulares	\$15.351.642.998,00
	Subtotal modulares			\$ 234.392.038.928,49
7	Santa Marta -Minca	Institución Universitaria Santa Marta	Adecuación	\$ 1.000.000.000,00
7	Buritaca	Institución Universitaria Santa Marta	Adecuación	\$ 1.000.000.000,00
7	Bogotá D.C-Palacio de San Francisco	ETITC	Adecuaciones	\$ 8.500.000.000,00
	Subtotal adecuaciones			\$ 10.500.000.000,00
8	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	Estudios y Diseños	\$ 2.434.571.951,00
8	Cali CAF	INTENALCO Alcaldía de Cali	Estudios y Diseños	\$ 4.000.000.000,00
8	Bogotá D.C- Bosa	Universidad Distrital-Francisco Jose de Caldas	Estudios y Diseños	\$ 4.234.571.952,00
	Subtotal estudios y diseños			\$ 10.669.143.903,00
	TOTAL			\$ 255.561.182.831,49



Cronograma

Cronograma General

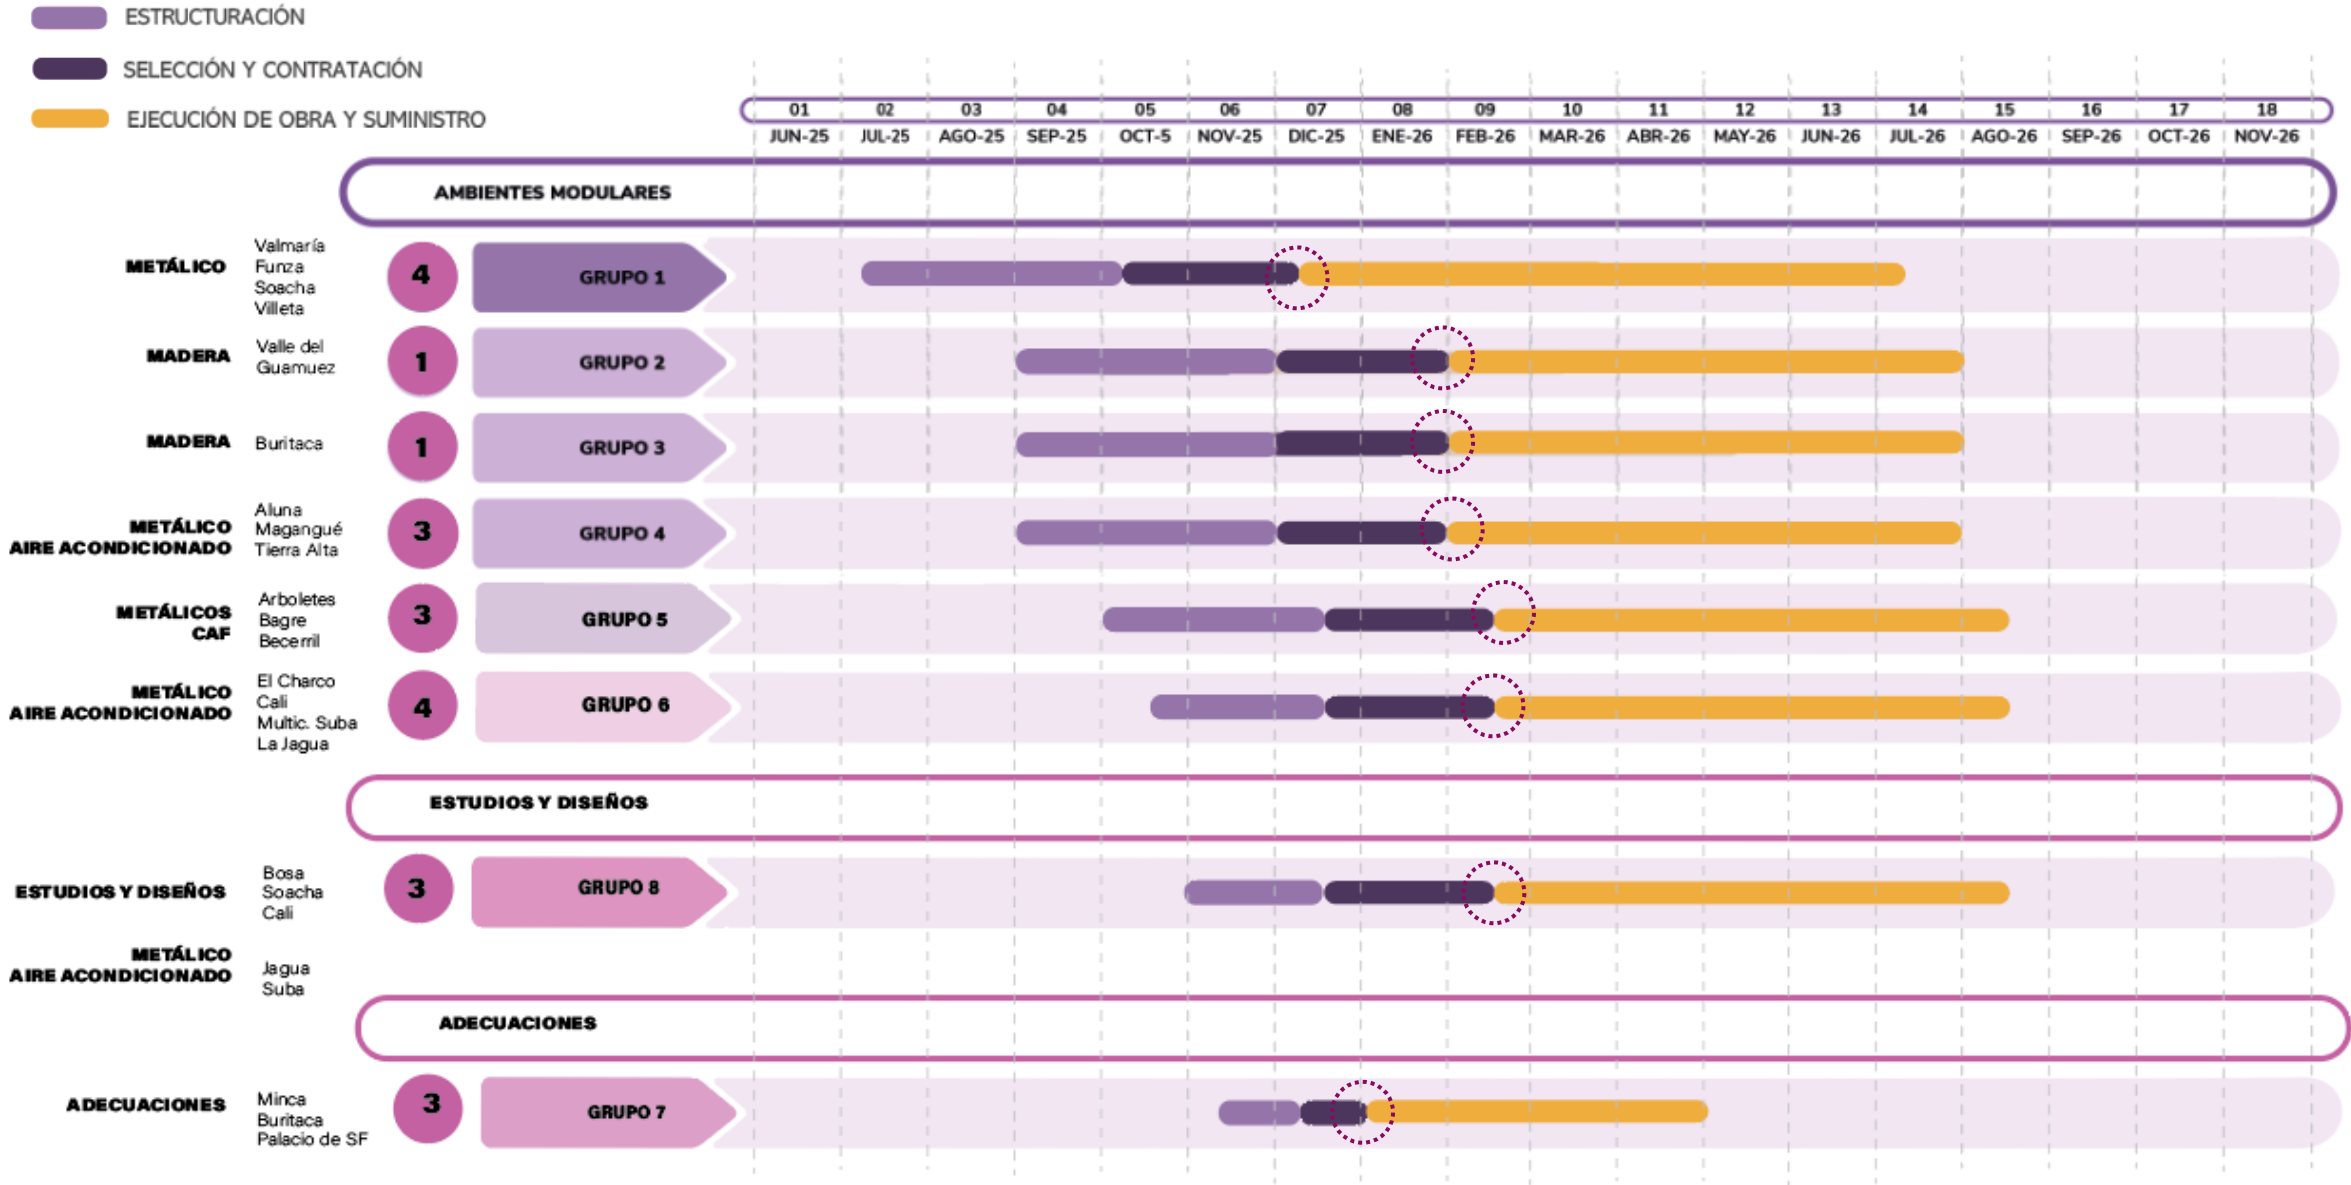

Grupo 1

HITO		OCT		NOV		DIC		ENE		FEB		MARZ		ABR		MAYO		JUN	
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
		15 días	30 días	45 días	60 días	75 días	90 días	105 días	120 días	135 días	150 días	165 días	180 días	195 días	210 días	225 días	240 días	255 días	270 días
	FASE I	150 días FASE I																	
A	PROYECTO I	90 días del Proyecto I																	
	FASE II					210 días FASE II													
A	PROYECTO I					135 días del Proyecto I													
B	PROYECTO II							135 días PROYECTO II											
C	PROYECTO III									135 días PROYECTO III									
D	PROYECTO IV										135 días PROYECTO IV								

Contratación Derivada

GRUPO 1 - PROCESOS DE SELECCIÓN (VALMARÍA, FUNZA., SOACHA, VILLETA)

CONTRATO DE SUMINISTRO

El 20 de noviembre se publica el informe final de evaluación. De los cinco (5) proponentes iniciales, únicamente dos (2) quedaron habilitados:

- **Unión Temporal DONSA MODULAR** – Puntaje: 98,148
- **Consorcio Centro Vida 3G1C** – Puntaje: 99,750
- Aplicando el método de ponderación definido (media geométrica), el proponente con mayor favorabilidad es el **Consorcio Centro Vida 3G1C**, para quien se recomienda adjudicar la oferta por un valor de \$45.465.441.719,59.

CONTRATO DE SUMINISTRO E INTERVENTORÍA

- El 20 de noviembre se publica igualmente el informe final de evaluación. De los dos (2) proponentes participantes, solo uno (1) cumple los requisitos habilitantes.
- Por tanto, se recomienda la oferta del **Consorcio Inter Modulares CCP**, por un valor de \$3.287.967.750,00.

GRUPO 2 - VALLE DEL GUAMUEZ – ESTRUCTURACIÓN

- Se consolida el DRT final en conjunto con sus anexos técnicos.
- Se inician TdR.
- Se avanza en la estimación presupuestal y en la consolidación del Formulario 2.

GRUPO 5 - ALUNA/MAGANGUÉ/TIERRA ALTA - ESTRUCTURACIÓN

Se inicia la estructuración del DRT para el contrato de suministro.

Se inician TdR.

El proyecto ALUNA actuará como proyecto habilitante del proceso contractual.



Estado proyectos

Grupo I

ESTRUCTURACIÓN Y CONTRATACIÓN

FASES		Actividad	Porcentaje por fase	GRUPO 1			
				VALMARIA	FUNZA	SOACHA	VILLETA
ESTRUCTURACIÓN	20%	DIAGNÓSTICO	5,00%	91%	82%	27%	73%
		VIABILIDAD	15,00%	100%	79%	79%	42%
		ESTUDIOS	15,00%	100%	100%	100%	0%
		DISEÑOS	60,00%	100%	100%	80,0%	0,0%
		VISITAS DE CAMPO	5,00%	100%	100%	100%	100%
		TOTALPARCIAL	100,00%	99,55%	95,93%	81,21%	14,95%
CONTRATACIÓN DERIVADA	15%	SOPORTES / DOCUMENTOS	40,00%	35%	35%	35%	35%
		PUBLICACION Y DESARROLLO DE LA SELECCIÓN	30,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
		SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		EXPEDICIÓN DE POLIZAS Y FIRMA DE ACTAS DE INICIO	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALPARCIAL	100,00%	32%	32%	32%	32%
TOTAL AVANCE POR PROYECTO				25%	24%	21%	8%

Grupo 2- 6

ESTRUCTURACIÓN

FASES		GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4 METALICOS			GRUPO 5 METÁLICOS CAF			GRUPO 6			
		VALLE DEL GUAMUEZ	BURITACA MODULARES	SANTA MARTA Universidad de Magdalena	MAGANGUE	TIERRA ALTA Universidad de Cordoba	BECERRIL	ARBOLETE S	BAGRE Universidad de Antioquia	CALI Modulares(REDT TU)	LA JAGUA	BOGOTA MULTICAMPUS	EL CHARCO
ESTRUCTURACIÓN	20%	64%	82%	45%	36%	73%	9%	73%	73%	27%	73%	0%	0%
		79%	68%	68%	58%	37%	37%	37%	58%	42%	79%	0%	37%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		70%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
		62,02%	19,35%	32,54%	10,50%	9,16%	5,98%	9,16%	12,32%	12,68%	20,48%	0,00%	5,53%
TOTAL AVANCE POR PROYECTO		12%	4%	7%	2%	2%	1%	2%	2%	3%	4%	0%	1%



**Estado de convenios
e implantaciones**

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS


ID	Departamento	Municipio	Universidad	Avance	Estado Implantaciones	Estado Coonvenio
ID_208	Bogotá D.C.	Bogotá D.C	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaría	90,9%	Termianda	Firmado
ID_147	Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	72,7%	Termianda	Firmado
ID_021	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	27,3%	Termianda	Firmado
ID_009	Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	63,6%	Termianda	Publicado en SECOP (Falta firma Jagua)
ID_165	Putumayo	Valle Guamuez	Universidad del Putumayo	54,5%	Terminada	Firmado
	Magdalena	Santa Marta - Buritaca	Institución Universitaria Santa Marta	81,8%	Terminada	Firmado
	Magdalena	Santa Marta -Minca	Institución Universitaria Santa Marta	81,8%	No aplica	Firmado
ID_030	Valle del Cauca	Cali	INTENALCO	27,3%	En revisión (Se tiene predio)	Revisión y ajuste IES
ID_128	Cundinamarca	Villeta	Universidad Pedagógica Nacional Gobernación de Cundinamarca	63,6%	Terminada	Firmado
ID_134	Bolívar	Magangué	Universidad de Cartagena	36,4%	En revisión (Se tiene predio)	Firmado
ID_133	Magdalena (Aluna)	Santa Marta	Universidad del Magdalena	45,5%	En ajuste	Firmado
ID_057	Córdoba	Tierralta	Universidad de Cordoba	81,8%	En revisión (Se tiene predio)	Firmado
ID_028	Bogotá D.C.	Bogotá D.C .	Multicampus Suba	0,0%	No se tiene información	No tenemos IES.
ID_033	Antioquia	Arboletes	Universidad de Antioquia	72,7%	En revisión (Se tiene predio)	Firmado
ID_034	Antioquia	El Bagre	Pascual bravo	72,7%	En revisión (Se tiene predio)	
ID_214	Cesar	Becerril	Universidad Militar de nueva Granada	9,1%	En revisión (Se tiene predio)	
	Nariño	El charco	Universidad de Nariño	18,2%	No se tiene información	
ID_021	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	27,3%	Terminado	Firmado
ID_030	Valle del Cauca	Cali	INTENALCO	18,2%	En revisión	Revisión y ajuste IES
ID_094	Bogotá D.C.	Bogotá D.C	Universidad Distrital-Francisco Jose de Caldas	0,0%		Revisión ANIM
ID_184	Bogotá D.C.	Bogotá D.C	ETITC	0,0%	No aplica	No se firmó



Implantaciones

IMPLANTACIONES


GRUPO I

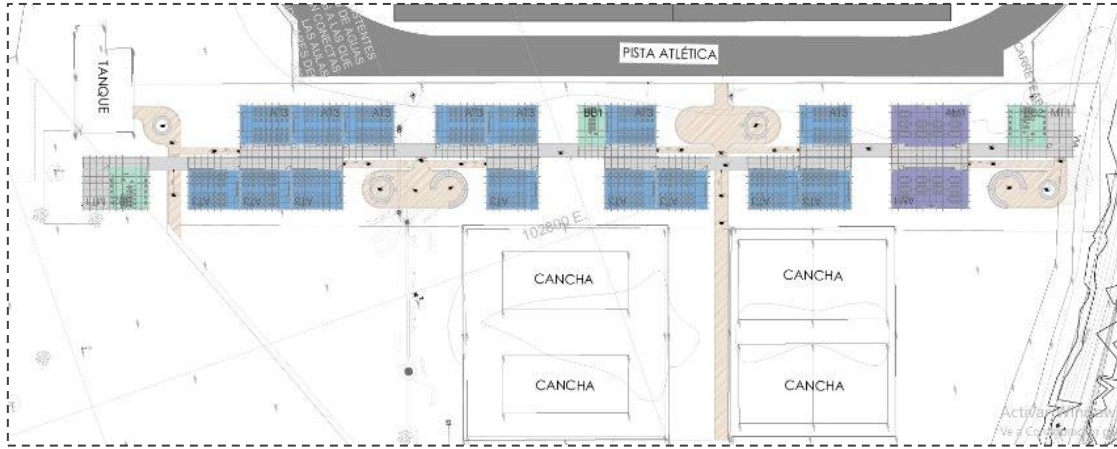


VALMARÍA



SOACHA

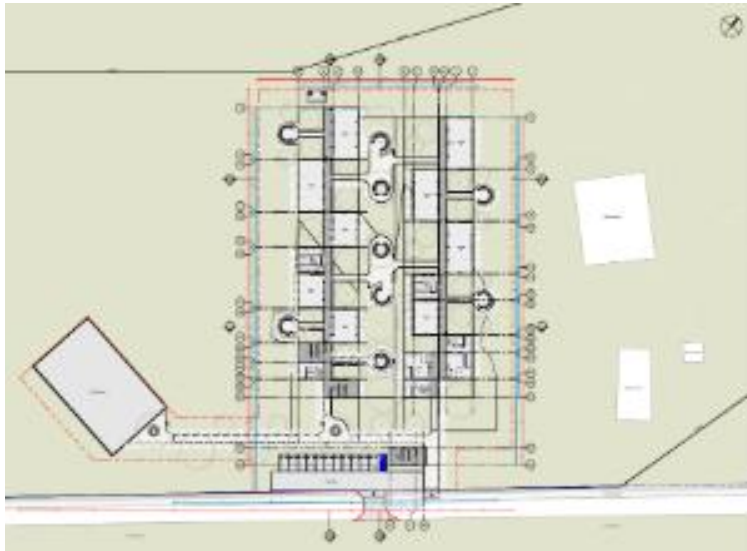

FUNZA

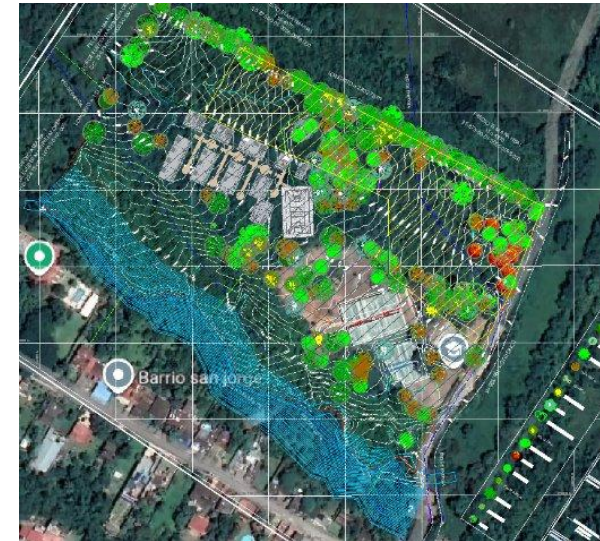

VILLETA


IMPLANTACIONES

Grupo 2



VALLE DEL GUAMUEZ

Grupo 3

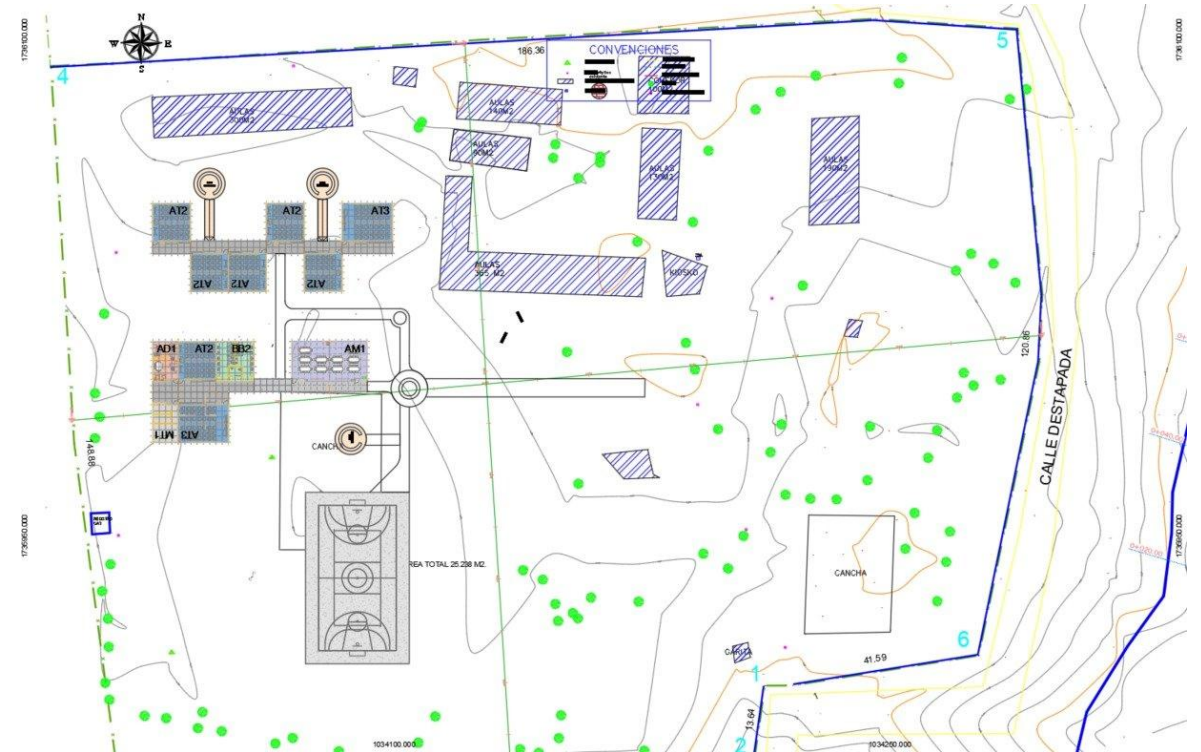


BURITACA

IMPLANTACIONES

Grupo 4



SANTA MARTA ALUNA

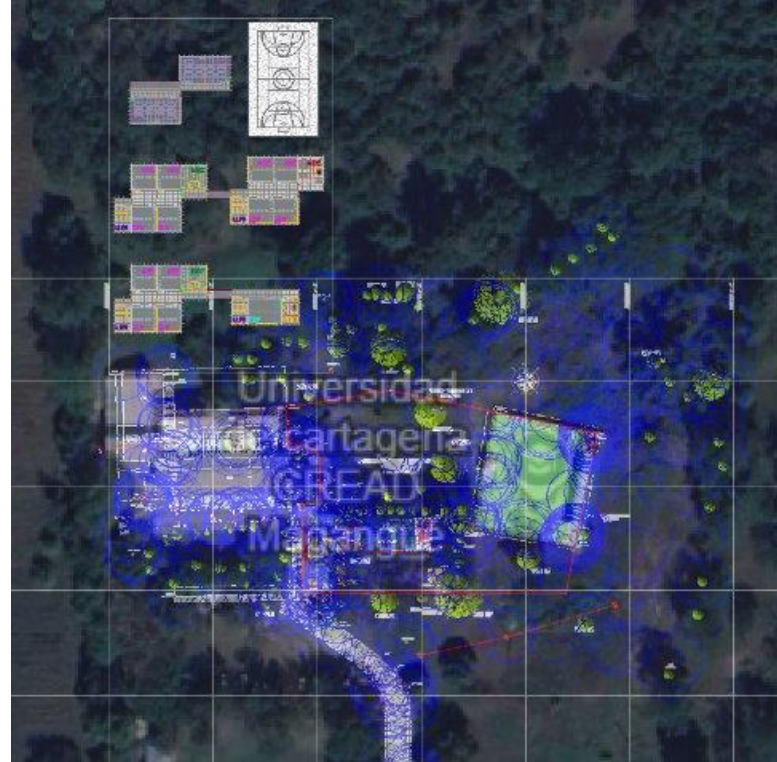

MAGANGUÉ



TIERRALTA

Temas por resolver

TEMAS POR RESOLVER

- No se tiene clara la continuidad el proyecto del Palacio de San Francisco.
- Cali sigue sin resolverse los temas asociados a la IES líder, Saneamiento predial y norma rural.
- Proyecto sin definir continuidad: la Jagua, proyecto en SUBA
- Se está en espera de la priorización de MINCA en comité MEN.
- Funza presenta múltiples inconvenientes para el desarrollo del proyecto, se deben adelantar gestiones frente a la SAE y la Secretaría de Planeación.
- Madera: Valle de Guamuez y Buritaca: La estructura se adaptará a vigas traviesas, para no usar los dados de **anclaje** planteados por diseño MEN.
- Cesión de derechos: se necesita que MEN firme acuerdo de cesión de derechos con SUMA, para tenerlo como anexo del acuerdo marco entre MEN – ANIM
- Se plateará paneles solares para todos los procesos como primera opción. Se plantea para Soacha para evitar demoras.
- Se comienza a trabajar en Villeta como proyecto “tipo” del proceso de selección en curso
- Se adjudicó el primer grupo de contratación

TEMAS POR RESOLVER

1- Desembolsos al Patrimonio Autónomo.

El valor Total del Contrato se desembolsará en tres (3) momentos al Patrimonio Autónomo a nombre del Ministerio de Educación Nacional, así:

Hito	Porcentaje del Valor Total de Recursos	Valor del Desembolso
Una vez suscrito el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución y la presentación al MEN del Plan de Trabajo (cronograma) de ejecución.	10%	\$ 27.131.594.424
Presentación al MEN de los Estudios y documentos Previos y Términos de Referencia para los procesos de selección y contratación de los proyectos de <i>"Instalación de Ambientes Modulares Priorizados"</i>	30%	\$ 81.394.783.273
Publicación de mínimo el 50% de los procesos de selección y contratación de los proyectos de <i>"Instalación de Ambientes Modulares Priorizados"</i>	60%	\$162.789.566.547
TOTAL		\$ 271.315.944.244

Al 12 de diciembre se tendrá de los seis (6) procesos de contratación de modulares:

- 
- **Un (1) procesos adjudicados.**
 - **Dos (2) publicados.**
 - **Ocho (8) proyectos en curso.**

Por lo tanto, se cumpliría el Hito con 3 de 6 publicaciones
Y 8 de 16 proyectos



GRACIAS

www.mineduccion.gov.co



mineducacion



@mineducacion



@mineducacion



Ministerio de Educación Nacional



mineducacioncol
