



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3

VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
1 de 7Alcaldía
Municipal de Iza

INFORME SUPERVISION No. 001
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
No. CIAD – 003 – 2025

1. INFORMACION CONTRATO

FECHA	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
PERIODO:	DEL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL 2025 AL VENTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025.
CONTRATISTA	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS – ERI SAS
C.C. / NIT.	901.881.213-1
REP. LEGAL	JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA
	C.C N° 1.049.602.188 EXPEDIDA EN SOGAMOSO
OBJETO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IZA – BOYACÁ"
RECUERSOS PARA ADMINISTRAR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$199.684.912,00).
VALOR ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	QUINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$5.990.547,00).
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES
PRORROGA	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL (ES) Y VALOR DE CADA RUBRO	2.3.2.02.02.005.27 Denominado, construcción y servicios de la construcción – departamento de Boyacá Convenio No. 2579 de 2024 \$75.000.000, Rubro 2.3.2.02.02.005.06.24.2402.2402041 denominado Construcción y servicios de la construcción – vías terciarias alcaldía \$ 115.076.584, rubro 2.3.2.02.02.005.05.24.2402.2402021 denominado Construcción y servicios de construcción vías secundarias alcaldía \$15.568.875
DISPONIBILIDAD	2025000137 DEL 29 DE ABRIL DE 2025
REGISTRO	2025000172 DEL 05 DE JUNIO DE 2025
VALOR ADICIONADO	N/A
TERMINO DE LA ADICION	N/A
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION AL CONTRATO	N/A
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	9485449196 – 9486867289 – 9487857396 -9489875867
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ



Código postal 152240
 Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co



modelo integrado
de planeación
y gestión

 República de Colombia	INFORME DE SUPERVISION			 Alcaldía Municipal de Iza
	NIT: 891.856.077 -3			
	VERSIÓN: 04	CÓDIGO: A-GP-F03	Página 2 de 7	

2. COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO

ITEM	CONCEPTO	VALORES
A	VALOR INICIAL	\$ 205.675.459,00
B	VALOR ADICIONADO	\$ 0.00
C	VALOR TOTAL (A+B)	\$ 205.675.459,00
E	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 0.00
F	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 205.675.459,00
G	VALOR EJECUTADO (E+F)	\$ 203.801.455,00
H	SALDO POR EJECUTAR (C-G)	\$ 1.874.004,00

3. COMPONENTE TECNICO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tramo 1, Calle 4 entre cra. 5 y 4ª			
Localización y replanteo Topográfico.	✓		Se realizó la localización y el replanteo correspondiente para verificar y ajustar cotas, pendientes, espesores y profundidades, con el fin de garantizar que la estructura de la vía cumpliera con los parámetros del diseño.
Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes.	✓		Una vez verificadas las condiciones topográficas, se procedió a la excavación mecánica de caja, enfocada en alcanzar la profundidad requerida para el mejoramiento del terreno.
Conformación compactación subrasante CBR=95%	✓		Se ejecutó la conformación, nivelación y compactación de la subrasante, asegurando su uniformidad y capacidad estructural para recibir las capas superiores.
Suministro, entendida y compactación de material seleccionado para base granular (Incluye acarreo libre de 5 km) (**)	✓		Se instaló la base granular, garantizando espesores adecuados y compactación según especificaciones técnicas. Esta actividad fue supervisada verificando densidades y uniformidades en toda la sección intervenida.
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	✓		Una vez alcanzadas las condiciones de humedad y limpieza requeridas, se realizó la imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1H, con el fin de asegurar una adecuada adherencia entre la base granular y la mezcla asfáltica.
Suministro mezcla asfáltica suelta en caliente	✓		Se realiza el suministro de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas



Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co

mipg | modelo integrado de planeación y gestión



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3

VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
3 de 7Alcaldía
Municipal de Iza

			óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material.
Construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido y compactación (incluye acarreo libre de 5 km) Norma Invias (**).	✓		Se realiza extendida de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material y la consolidación de su compactación.
Tramo 2, Calle 4 entre cra. 4a y 4	✓		
Localización y replanteo Topográfico.	✓		Se realizó la localización y el replanteo correspondiente para verificar y ajustar cotas, pendientes, espesores y profundidades, con el fin de garantizar que la estructura de la vía cumpliera con los parámetros del diseño.
Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes.	✓		Una vez verificadas las condiciones topográficas, se procedió a la excavación mecánica de caja, enfocada en alcanzar la profundidad requerida para el mejoramiento del terreno.
Conformación compactación subrasante CBR=95%	✓		Se ejecutó la conformación, nivelación y compactación de la subrasante, asegurando su uniformidad y capacidad estructural para recibir las capas superiores.
Suministro, entendida y compactación de material seleccionado para base granular (Incluye acarreo libre de 5 km) (**)	/		Se instaló la base granular, garantizando espesores adecuados y compactación según especificaciones técnicas. Esta actividad fue supervisada verificando densidades y uniformidades en toda la sección intervenida.
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	✓		Una vez alcanzadas las condiciones de humedad y limpieza requeridas, se realizó la imprimación con emulsión asfáltica tipo CRL-1H, con el fin de asegurar una adecuada adherencia entre la base granular y la mezcla asfáltica.
Suministro mezcla asfáltica suelta en caliente	✓		Se realiza el suministro de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material.
Construcción de carpeta asfáltica en caliente, incluye barrido y compactación (incluye acarreo libre de 5 km) Norma Invias (**).	✓		Se realiza extendida de la mezcla asfáltica en caliente, desarrollando la actividad bajo condiciones climáticas óptimas, lo cual permitió un adecuado manejo del material y la consolidación de su compactación.



Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co



modelo integrado
de planeación
y gestión



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3

VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
4 de 7






Alcaldía
Municipal de Iza

Construcción de carpeta
asfáltica en caliente,
incluye suministro,
barrido y compactación
(incluye acarreo libre de 5
km) Norma Invias (**).

Se realiza extendida de la mezcla
asfáltica en caliente, desarrollando la
actividad bajo condiciones climáticas
óptimas, lo cual permitió un adecuado
manejo del material y la consolidación
de su compactación.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

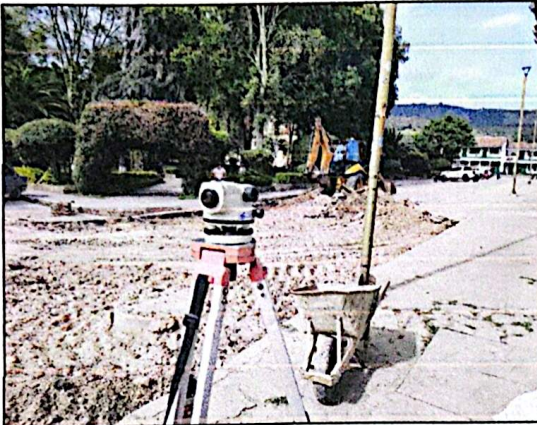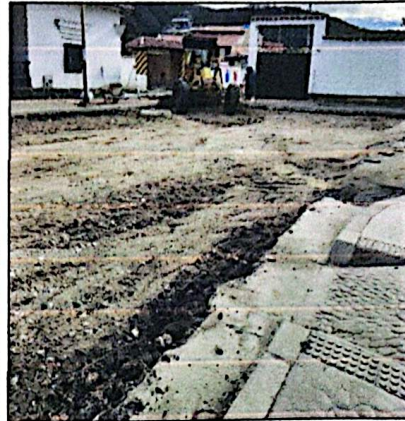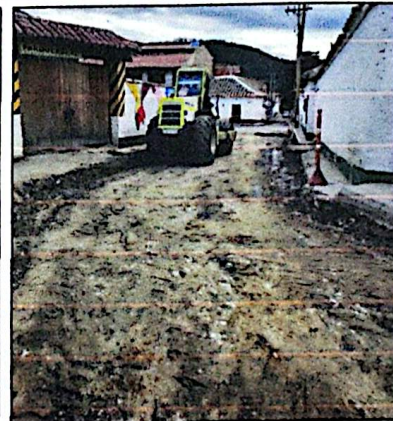

Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co



Modelo Integrado
de planeación
y gestión



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3


VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
5 de 7



Alcaldía
Municipal de Iza

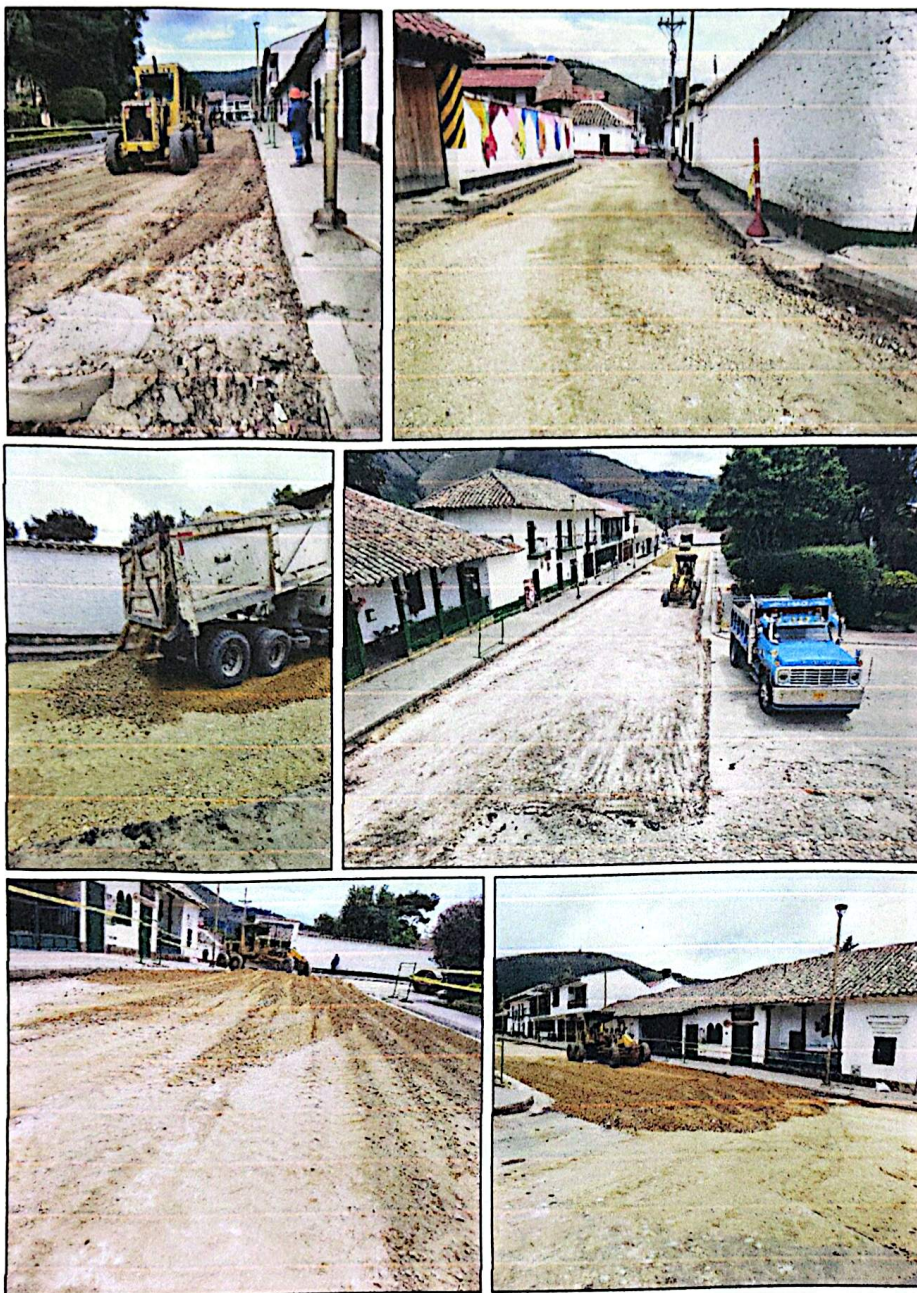

Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3


VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
6 de 7



Alcaldía
Municipal de Iza

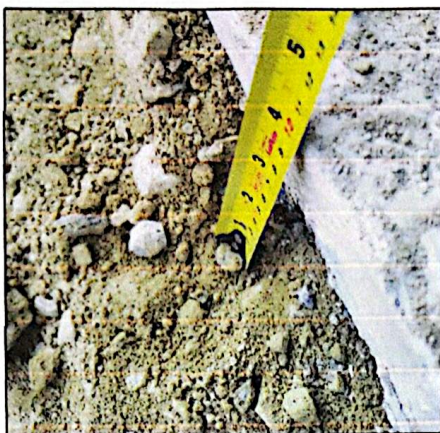

Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co

mipg

modelo integrado
de planeación
y gestión



República de Colombia

INFORME DE SUPERVISION

NIT: 891.856.077 -3


VERSIÓN: 04

CÓDIGO: A-GP-F03

Página
7 de 7



Alcaldía
Municipal de Iza

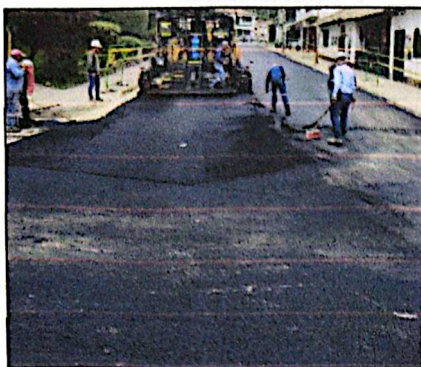

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS –ERI SAS**, ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada desde el Estudio previo, así como con el cumplimiento de la función Administrativa y la función pública y se ha contribuido con el acatamiento de los planes y programas establecidos en la Constitución política de Colombia, la ley de Régimen Municipal y el programa de gobierno. Además de ello, con el presente informe Informarse se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del presente contrato, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

6. COMPONENTE JURÍDICO

Obrando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, me permito por medio del presente escrito, informar a la Administración Municipal de Iza Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del contrato, se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató y verificó que el contratista **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS –ERI SAS**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos contenidos en el mismo realizando las actividades requeridas dentro del mismo.

Se deja constancia por medio del presente que no se presentó ninguna irregularidad o algún otro fenómeno que impida la ejecución y acorde con el objeto contractual, se anexa informe del contratista el cual posee registros de las actividades mencionadas anteriormente con este contrato.

El anterior informe se rinde en cumplimiento de lo establecido en la ley 80 de 1993, y en especial lo consagrado en la ley 1474 de 2011.

YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
Supervisor



Código postal 152240
Cra. 4 Nro. 4 – 10 Teléfono 3218680268
boyaca.gov.co
www.iza-boyaca-gov.co

