

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 08/11/2025	HOJA # 1
NOTA # 1	DIA # 1

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Contratar el mantenimiento del edificio donde funciona la agencia pública de empleo, relaciones corporativas y emprendimiento de la Regional Magdalena

**ENTIDAD CONTRATANTE:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA  
**NIT:** 899.999.034-1

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** SADAG INGIENERIA S.A.S  
**NIT:** 901753214

**RESIDENTE DE OBRA:** Ingeniera civil ELIANA VILLALBA

**PROFESIONAL SISO:** MAYRA HERNANDEZ BALLESTAS

**PLAZO DE EJECUCION:** 60 Días

CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2025 se hace apertura oficial de esta BITACORA **correspondiente a la obra** Contratar el mantenimiento del edificio donde funciona la agencia pública de empleo, relaciones corporativas y emprendimiento de la Regional Magdalena

Se ejecuta en el contrato No. **CO1.PCCNTR.8431624 de 2025**, adjudicado a la empresa SADAG INGIENERIA S.A.S por un valor de \$ \$78.755.366 incluido IVA

**FECHA DE INICIO EN EL SECOP II:** 22 DE OCTUBRE DE 2025

**FECHA DE INICIO REAL DE OBRA:** 8 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 60 días desde el 22 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2025

La entidad estará representada por el supervisor del contrato funcionario de la Dirección Regional Magdalena SENA regional, Armando Abril Montaña con apoyo técnico del arquitecto Alberto Mario Campo. Los dos profesionales están autorizados para la firma de la Bitácora

  
 ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 08/11/2025

HOJA 2

NOTA 2



DIA # 1

1. Clima soleado

Personal en obra: director de obra, ingeniero residente, profesional sst

Actividades realizadas:

- 1) Limpieza de jardinería.
- 2) Señalización.

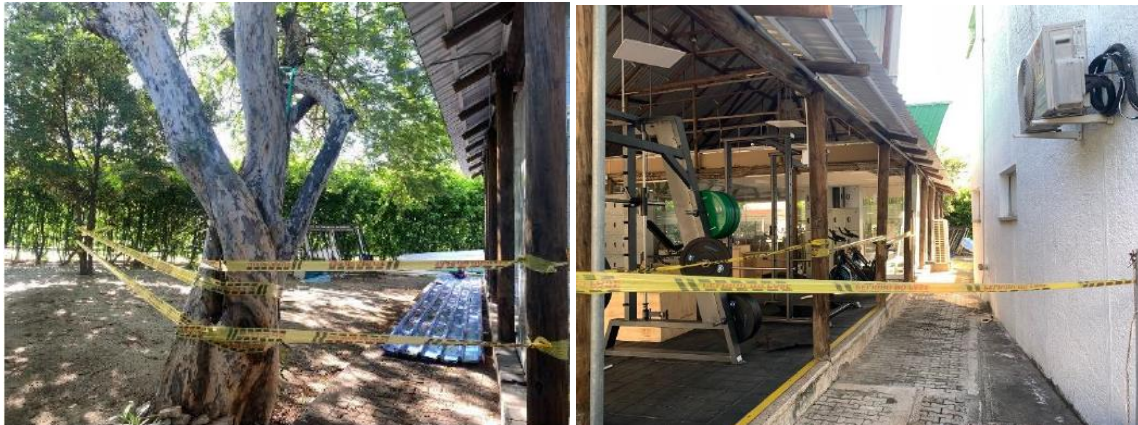ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA:09/11/2025	HOJA 3
NOTA 3	DIA # 2

DIA NO LABORAL.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 10/11/2025	HOJA 3
NOTA 4	DIA # 3

Clima: Soleado  
Personal en obra: Ninguno

Actividades realizadas

En este día se gestiona por parte de seguridad y salud en el trabajo la compra de equipos de protección contra caídas.

Adicionalmente se realiza el envío a la profesional SST del Sena información solicitada referente a la seguridad social (ARL, EPS Y FONDO DE PENSION) de todo el personal que estará laborando el obra.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 11/11/2025

HOJA 4

NOTA # 5

DIA # 4

Clima: Soleado

Personal obra: ingeniero residente, sst oficial y ayudante

Actividades realizadas

En este día se realiza inspección de la cubierta a intervenir, por primera vez, encontrado laminas deterioradas, con perforaciones debido al paso del tiempo (vida útil) decolorizacion de láminas.



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 12/11/2025

HOJA 5

NOTA # 6

DIA # 5


Clima: Soleado


Personal en obra: SST


#### Actividades realizadas

En este día se envía la información de los elementos de protección personal a Niulka Redondo (personal SST SENA), se instala la línea de vida y poleas; así mismo así mismo se recibe charla por parte de Oscar Barros (instructor de trabajo en altura) sobre el plan de rescate y la funcionaria del SENA Niulka Redondo imparte la inducción general al personal de obra.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 13/11/2025	HOJA 6
NOTA # 7	DIA # 6

Clima: Soleado

Personal en obra: residente de obra, sst, oficial, y ayudante

Actividades realizadas

En este día se realiza el diseño y fabricación de la escalera gato a instalar.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 14/11/2025	HOJA 6
NOTA # 8	DIA # 7


Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficial y ayudante

Actividades realizadas

En este día se continúa con la fabricación de la escalera gato a instalar



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 15/11/2025	HOJA 7
NOTA # 9	DIA # 8

No se laboro



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 16/11/2025	HOJA 7
NOTA # 10	DIA #9

No se laboro



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO


BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 17/11/2025	HOJA 8
NOTA # 11	DIA #10


No se laboro



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 18/11/2025	HOJA 8
NOTA # 12	DIA #11


Clima: Soleado

Personal en obra:  
Residente en obra, sst, oficial y ayudante


Actividades realizadas  
En este día se continua con la fabricación de la escalera gato que se debe instalar, adicionalmente se gestiona el alquiler de andamios certificados.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 19/11/2025

HOJA 9

NOTA # 13

DIA #12

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial y ayudante


Actividades realizadas

Se termina la fabricación de la escalera gato y se procede con la instalación en la parte de atrás de la agencia pública de empleo (APE) para ello también se arma andamio certificado.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 20/11/2025

HOJA 10

NOTA # 14

DIA #13

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficial y ayudante

Actividades realizadas

En este día continúan con la instalación de la escalera gato y se programa su finalización



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL


ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO


BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 21/11/2025	HOJA 11
NOTA # 15	DIA #14


No se laboro



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL




ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO




ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 22/11/2025	HOJA 11
NOTA # 16	DIA #15


No se laboro



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL









ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 23/11/2025	HOJA 12
NOTA # 17	DIA #16
<p>No se laboro</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. ELIANA VILLALBA RESIDENTE DE OBRA MP: 08202-433173 ATL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ARQ. ALBERTO CAMPO SUPERVISOR DEL CONTRATO APOYO TECNICO</p> </div> </div>	

FECHA: 24/11/2025	HOJA 12
NOTA # 18	DIA #17
<p>No se laboro</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. ELIANA VILLALBA RESIDENTE DE OBRA MP: 08202-433173 ATL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ARQ. ALBERTO CAMPO SUPERVISOR DEL CONTRATO APOYO TECNICO</p> </div> </div>	

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 25/11/2025	HOJA 13
NOTA # 19	DIA #18


Clima: Soleado  
 Actividades realizadas  
 No se laboró solo se recibió pedido de láminas para la intervención de la cubierta en horas de la tarde.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 APOYO TECNICO

FECHA: 26/11/2025	HOJA 13
NOTA # 20	DIA #19

Clima: Soleado con vientos fuertes.  
 Personal en obra:  
 Residente en obra, sst, oficial y ayudante

Actividades realizadas  
 En este día se inicia item de mantenimiento de cubierta, el personal de obra inicia subiendo láminas de UPVC termoacústica, suspenden actividades a medio día debido a fuerte vientos



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 APOYO TECNICO

FECHA: 27/11/2025

HOJA 14

NOTA # 21

DIA #20

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial y ayudante


Actividades realizadas

Este día inician desinstalación en cubierta de las láminas existentes en un tramo para luego instalar perfiles metálicos.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 28/11/2025

HOJA 15

NOTA # 22

DIA #21

Clima: Soleado (Mañana) Lluvias (Tarde)

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficial y ayudante

#### Actividades realizadas

En este día continúan con la instalación de láminas termoacústicas UPVC nuevos en el tramo donde se instalaron los perfiles metálicos, así mismo se continua con el siguiente tramo con la desinstalación de láminas viejas y colocación de perfiles metálicos.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

BITACORA DE OBRA	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8431624
------------------	---------------------------------

FECHA: 29 /11/2025	HOJA 16
NOTA # 23	DIA #22

Clima: Lluvioso.  
 Personal en obra:  
 Residente en obra, sst, oficial y ayudante  
 Actividades realizadas

En este día se termina la instalación de láminas nuevas en el segundo tramo, iniciando una vez que dejo de llover; dado que en este día el clima no estaba soleado se decide no seguir desinstalando laminas viejas, por tanto, el personal se dedica a bajar de la cubierta las láminas desinstaladas en días anteriores y se procede a revisar la viga para limpieza.

  
 ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 APOYO TECNICO

FECHA: 30/11/2025	HOJA 16
NOTA # 24	DIA #23

No se laboro

  
 ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 APOYO TECNICO

FECHA: 01/12/2025

HOJA 17

NOTA # 25

DIA #24

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial y ayudante


Actividades realizadas

En este día con el clima soleado se aprovecha para que el rendimiento hora hombre sea mayor por ello se continua con la desinstalación de cubierta vieja, colocación de perfiles metálicos e instalación de láminas nuevas.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA:02/12/2025

HOJA 18

NOTA # 26

DIA #25

Clima: Soleado

Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial y ayudante


Actividades realizadas

En este día se continua con el mantenimiento de la cubierta; desinstalando laminas viejas colocando perfiles metálicos e instalando laminas nuevas, logrando al final de la jornada laboral un 50% de avance con la relación a este ítem.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 03 /12/2025

HOJA 19

NOTA # 27

DIA #26

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficial y ayudante

Actividades realizadas

En este día se continua con el mantenimiento e instalación de cubierta en la zona frente a parqueadero de APE; para ello inician pintando perfiles metálicos, desinstalando laminas antiguas, instalando perfiles una vez se secó la pintura y este día no alcanzan a colocar laminas nuevas.

Se continua de igual forma con la adecuación de las jardineras la poda se termina el día de ayer.



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 04/12/2025

HOJA 20

NOTA # 28

DIA #27

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficial, ayudante y oficial de impermeabilización.

Actividades realizadas

En este día se instalan laminas nuevas en el tramo donde el día de ayer se dejaron instalados perfiles metálicos y continúan con el trabajo en un tramo nuevo con la desinstalación de láminas viejas, instalación de perfiles y colocación de láminas nuevas. Se continua de igual forma con la adecuación de las jardineras, la poda se culminó el día de ayer.



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 05/12/2025

HOJA 22

NOTA # 29

DIA #28

Clima: Soleado

Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial, ayudante y oficial de impermeabilización.


Actividades realizadas

En este día se trabaja en un tramo de cubierta, específicamente instalando laminas y antes de terminar la mañana se informa que se acaba el material, por lo que se inicia gestión para la compra de más laminas; por otra parte, en este día se inicia oficialmente la intervención en la viga canal (limpieza) y revisión de bajantes.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 06/12/2025

HOJA 23

NOTA # 30

DIA #29


Clima: Soleado

Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial, ayudante y oficial de impermeabilización.

Actividades realizadas


En este día se continua con las actividades de mantenimiento de viga canal, se aplica una pequeña plantilla con pasta de cemento en las zonas donde se presenta estanqueidad, resanes, instalación de gárgolas suministradas por el SENA. Llegan las láminas nuevas solicitadas para terminar la cubierta.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 07/12/2025

HOJA 24

NOTA # 31

DIA #30


Clima: Soleado

Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficial, ayudante y oficial de impermeabilización.

Actividades realizadas


En este día se continua con el trabajo de mantenimiento de viga canal e impermeabilización, realizando resanes y aplicando torofil. Por otra parte, se continua con la instalación de láminas nuevas en la cubierta, quedando esta actividad cumplida en un 90%.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 08/12/2025

HOJA 25

NOTA # 32

DIA #31

No se laboró



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 09/12/2025

HOJA 26

NOTA # 33

DIA #32

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, ayudantes y oficiales.


Actividades realizadas

En este día se continua con los trabajos en la cubierta, en esta ocasión instalando caballetes y colocando parches en los tornillos para mejorar y reforzar posibles ingresos de agua lluvia. También se continúan los trabajos de impermeabilización de viga canal.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 10/12/2025

HOJA 27

NOTA # 34

DIA #33

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, ayudante y oficial de impermeabilización.


Actividades realizadas

En este día se continúan los trabajos en la cubierta, se realiza enjolare, se termina de aplicar torofil y se aplica el manto aluminizado en caliente; al finalizar la jornada se terminó toda esta actividad.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 11/12/2025

HOJA 28

NOTA # 35

DIA #34

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, ayudante y oficial de acabados.


Actividades realizadas

En este día se inician las actividades de acabados para la adecuación de las oficinas de relaciones corporativas y emprendimiento; iniciando con la desinstalación del cielo raso existente en los tramos más afectados por la humedad e instalación de drywall nuevas.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 12/12/2025

HOJA 29

NOTA # 36

DIA #35

Clima: Soleado

Personal en obra:


Residente en obra, sst, ayudante y oficiales de acabados.


Actividades realizadas

En este día se continúan las actividades para la adecuación de las oficinas de relaciones corporativas y emprendimiento, en este día se inician acabados en las láminas de drywall nuevas las cuales se instalaron el día de ayer; así mismo se realiza el resane de cielo raso existente.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 13/12/2025

HOJA 30

NOTA # 37

DIA #36

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficiales de acabados y ayudantes.

Actividades realizadas

En este día se continúan las actividades de acabado y resane en el cielo raso de las oficinas de relaciones corporativas y de emprendimiento.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL



ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 14/12/2025

HOJA 31

NOTA # 38

DIA #37


Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficiales de acabados y ayudantes.


Actividades realizadas

En este día se continúan con las actividades de acabados y resanes de todos los muros en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas, también se realiza el retiro de escombros y materiales (Laminas viejas retiradas de la cubierta).

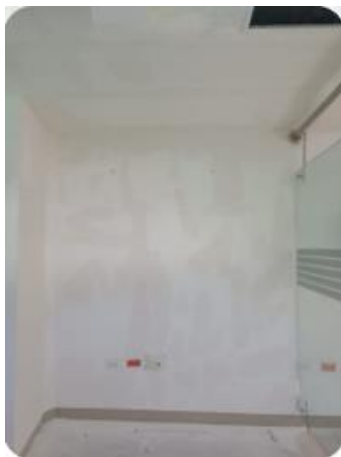

  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 15/12/2025

HOJA 32

NOTA # 39

DIA #38

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficiales de acabados y ayudantes.

Actividades realizadas

En este día se continúan con las actividades de acabados y resanes de todos los muros, adicionalmente se inician actividades de pintura específicamente tipo 1 a 3 manos en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas.



ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 16/12/2025

HOJA 33

NOTA # 40

DIA #39

Clima: Soleado


Personal en obra:


Residente en obra, sst, oficiales de acabados y ayudantes.


Actividades realizadas

En este día se continúan con las actividades de acabados, específicamente aplicando pintura tipo 1 a tres manos en las oficinas de emprendimiento y relaciones corporativas.



  
ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

  
ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO

FECHA: 17/12/2025

HOJA 34-35

NOTA # 41

DIA #40

Clima: Soleado

Personal en obra:

Residente en obra, sst, oficiales de acabados y ayudantes.

Actividades realizadas

En este día se continúan con las actividades de acabados, específicamente aplicando pintura tipo 1 a tres manos en todo el segundo piso de la agencia pública de empleo. Al finalizar el día se terminan todas las actividades contratadas y se realiza la entrega al supervisor de apoyo del contrato.





ING. ELIANA VILLALBA  
RESIDENTE DE OBRA  
MP: 08202-433173 ATL

ING. ARMANDO ABRIL MONTAÑA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARQ. ALBERTO CAMPO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
APOYO TECNICO
