



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISIÓN FINAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 5

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	09/08/2025	A	26/12/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA
NIT:	800.019.277-9
CONTRATISTA:	VILLAMIL MINING SAS
NIT:	900937895-1
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ
CEDULA NO.	7.313.098 de Chiquinquirá
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA"
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$99.979.588) M/CTE
VALOR ADICIONAL	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$9.981.277) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$109.960.865) M/CTE
DURACION INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO INICIAL:	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2025
FECHA SUSPENSION	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA CONTRATO INICIAL:	04 DE JULIO DE 2025
FECHA CONTRATO ADICIONAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR UNITAR	VR TOTAL
1	RECEBO COMUN	M3	1,526	13,700	20,906,200
2	TRANSPORTE	M3	1,526	11,500	17,549,000
IVA RECEBO					3,972,178
VALOR TOTAL					42,427,378

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 2 de 5

- Planilla presentada:

MES	AGOSTO	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9490299728	Si
FECHA DE PAGO	19/08/2025	Si
PENSION	\$ 3.341.400	Si
ARL	\$ 1.453.400	Si
CCF	\$ 835.600	Si
SALUD	\$ 835.600	Si
TOTAL	\$ 6.466.000	Si
MES	SEPTIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9491847004	Si
FECHA DE PAGO	25/09/2025	Si
PENSION	\$ 3.312.500	Si
ARL	\$ 1.440.900	Si
CCF	\$ 828.400	Si
SALUD	\$ 828.700	Si
TOTAL	\$ 6.410.500	Si
MES	OCTUBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9493514762	Si
FECHA DE PAGO	24/10/2025	Si
PENSION	\$ 3.343.600	Si
ARL	\$ 1.454.300	Si
CCF	\$ 836.200	Si
SALUD	\$ 836.300	Si
TOTAL	\$ 6.470.400	Si
MES	DICIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9496348853	Si
FECHA DE PAGO	17/12/2025	Si
PENSION	\$ 3.341.400	Si
ARL	\$ 1.453.400	Si
CCF	\$ 835.600	Si
SALUD	\$ 835.600	Si
TOTAL	\$ 6.466.000	Si

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	99,979,588.00
ANTICIPO	0.00
ADICIONAL	9,981,277.00
VALOR PAGOS ANTERIORES	67,533,487.00
VALOR PERIODO ACTUAL	42,427,378.00
SALDO POR EJECUTAR	0.00



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 5

4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato		X	
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato		X	
Reinicio del contrato		X	
Aplicación de multas			X

5 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el nueve (09) de agosto y el veintiséis (26) de diciembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia, es de aclarar que durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 15 de diciembre de 2025 el contrato estuvo suspendido, tiempo en el cual no se suministro material de afirmado.




FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 4 de 5





REGISTRO FOTOGRÁFICO

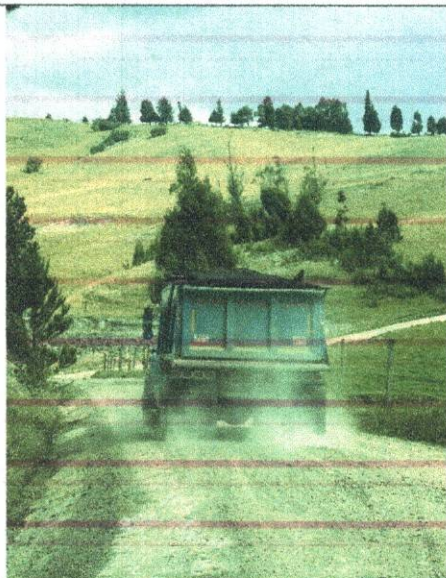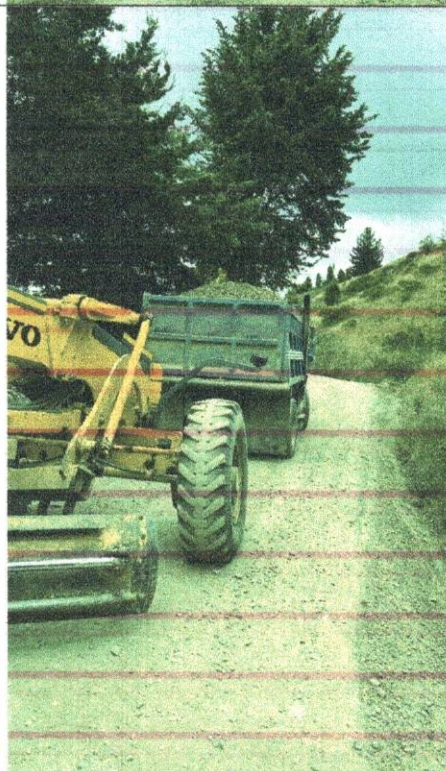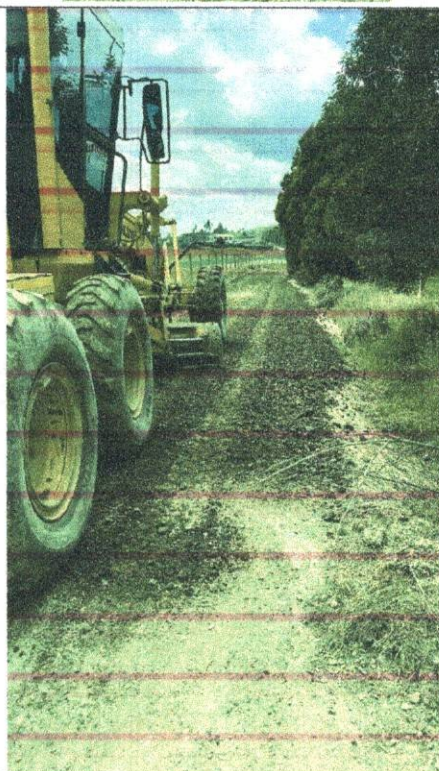



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL



FM - 000
Versión: 0.0
Página 5 de 5

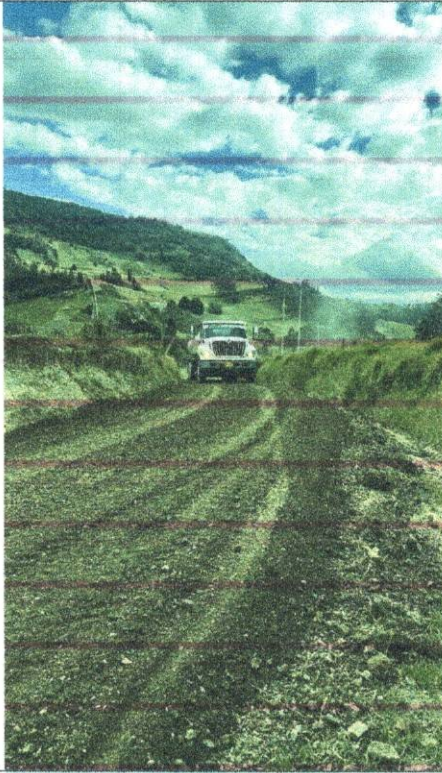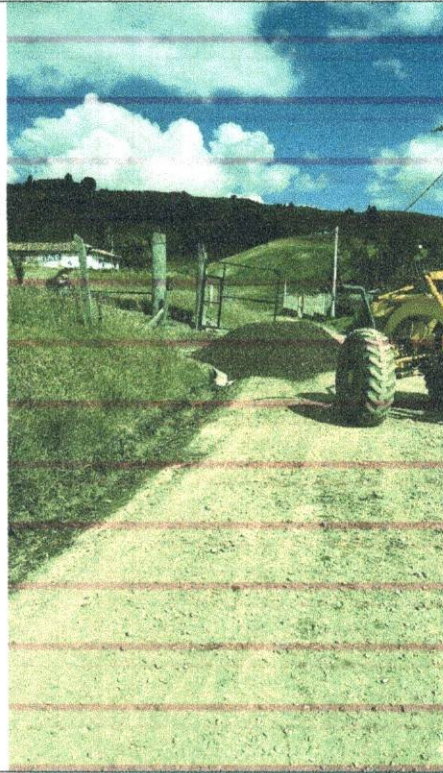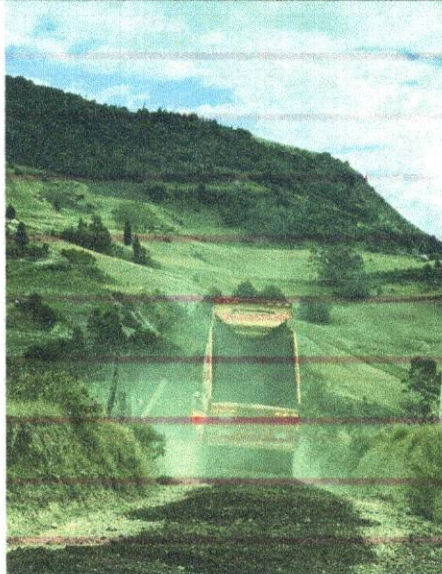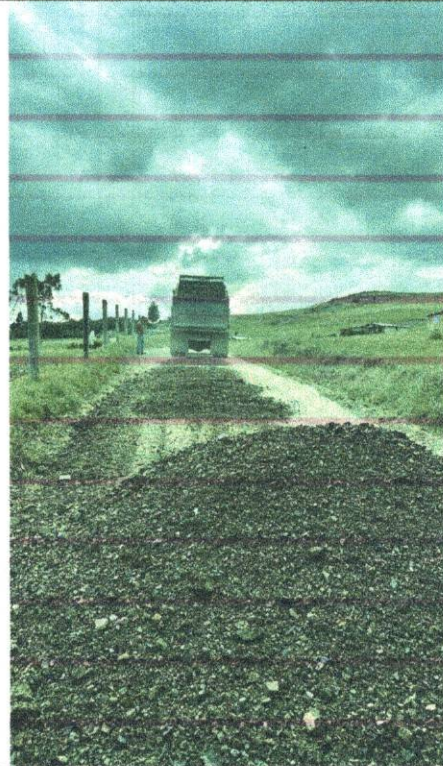



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	MS-SA-MC-002-2025	FECHA DEL CONTRATO	viernes, 4 de julio de 2025	FECHA ACTA DE INICIO	lunes, 7 de julio de 2025																								
CLASE DE CONTRATO																													
Contrato de consultoría ☐		Convenio interadministrativo ☐																											
Contrato de prestación de servicios ☒		Contrato de suministro ☐																											
Contrato de compraventa ☐		Otros ☐																											
Contrato de Obra Publica ☐																													
OBJETO CONTRACTUAL				CODIGO BPIN	2024157620038																								
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA																													
CONTRATISTA																													
Nombre / Razón Social: VILLAMIL MINING SAS		R. Legal: GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ																											
Cédula / NIT : CC. 900937895 - 1		Cédula / NIT : CC 7313098																											
VALOR INICIAL			ADICIONES EN VALOR (Escriba el valor total de las adiciones)																										
Valor en número: \$ 99.979.588,00			\$ 9.981.277,00																										
Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO P			NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL D																										
PLAZO DE EJECUCIÓN:			PRORROGAS																										
120 DIAS			22 DIAS																										
SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A																													
Nombre: FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA																													
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION																													
ASUNTO																													
HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ identificado(a) con CC : 7313098 expedida en Chiquinquirá, en su condición de representante legal de VILLAMIL MINING SAS identificado(a) con NIT: 900937895, acordaron suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato tal como lo dispone la cláusula de liquidación del mismo, en los siguientes términos:																													
CLASULA PRIMERA: Que la ejecución del contrato se efectuó a entera satisfacción del municipio, tal como lo hace constar, con su firma el supervisor y/o interventor del contrato.																													
CLASULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:																													
<table><tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>\$</td><td>99.979.588,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONADO:</td><td>\$</td><td>9.981.277,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>\$</td><td>109.960.865,00</td></tr><tr><td>VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:</td><td>\$</td><td>109.960.865,00</td></tr><tr><td>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO NO EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>109.960.865,00</td></tr><tr><td>SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:</td><td>\$</td><td>-</td></tr></table>						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	99.979.588,00	VALOR ADICIONADO:	\$	9.981.277,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	109.960.865,00	VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	\$	109.960.865,00	SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:	\$	-	SALDO NO EJECUTADO:	\$	-	VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$	109.960.865,00	SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	99.979.588,00																											
VALOR ADICIONADO:	\$	9.981.277,00																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	109.960.865,00																											
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	\$	109.960.865,00																											
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:	\$	-																											
SALDO NO EJECUTADO:	\$	-																											
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$	109.960.865,00																											
SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$	-																											
CLASULA TERCERA: La entidad deja constancia que El Supervisor y/o Interventor del Contrato, efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.																													
CLASULA CUARTA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por concepto emanado o derivado del contrato objeto de la presente liquidación. En constancia se firma En Sora Boyacá, el día 26 de diciembre del año 2025																													
 HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal		 GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ CC : 73130980 Representante Legal VILLAMIL MINING SAS Contratista																											
 FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA Supervisor/Interventor																													
<table><tr><td></td><td>Proyecto</td><td>Revisa</td><td>Aprobó</td></tr><tr><td>Nombre:</td><td>Sandra Victoria Garcia Bultrago</td><td>Fredy Alberto La Rota</td><td>Fredy Alberto La Rota</td></tr><tr><td>Cargo:</td><td>Apoyo a Planeación</td><td>Jefe Oficina Asesora De Planeación</td><td>Jefe Oficina Asesora De Planeación</td></tr><tr><td>Firma:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Proyecto	Revisa	Aprobó	Nombre:	Sandra Victoria Garcia Bultrago	Fredy Alberto La Rota	Fredy Alberto La Rota	Cargo:	Apoyo a Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Firma:											
	Proyecto	Revisa	Aprobó																										
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Bultrago	Fredy Alberto La Rota	Fredy Alberto La Rota																										
Cargo:	Apoyo a Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación																										
Firma:																													
