
 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		<b>A-GC</b>
	GESTION CONTRACTUAL		A-GC-F34
	INFORME DE SUPERVISION		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 8



### INFORME DE SUPERVISION FINAL

#### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 185 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S</b> NIT: 901.209.686-1 R/L: ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ C.C. 1.049.614.470 DE TUNJA CONTRATISTA
<b>OBJETO:</b>	“PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPRATAMENTO DE BOYACA”
<b>VALOR:</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$ 37.810.000,00)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE INICIO:</b>	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025

### INTRODUCCIÓN

El Municipio de Maripí, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural, celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 185 del 17 de diciembre de 2025 con la empresa CDNI Ingeniería y Soluciones S.A.S., mediante el cual se contrató el alquiler de maquinaria amarilla cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPRATAMENTO DE BOYACA** ya que es

 NIT: 800.024.789-8	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ</b> MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		<b>A-GC</b> A-GC-F34
	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 2 de 8
<b>INFORME DE SUPERVISION</b>			

necesaria para la atención de las vías del municipio, especialmente en sectores afectados por condiciones topográficas y fenómenos de remoción en masa.

Estos trabajos de cuneteo, limpieza, perfilado y compactación de vías se llevo a cabo principalmente en las vías de los sectores Upane, bella unión, guayabal y guazo.

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

La intervención se llevo a cabo en las veredas de Guayabal, sectores de Upane, bella unión, puerto Colombia de la vereda de Guazo.

### POLIZAS DEL PROYECTO.

- Dentro del proceso se solicitaron las siguientes garantizas:

**Cumplimiento:** Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual deberá contemplar una vigencia igual al plazo de ejecución contractual y 4 meses más.

**Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:** por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo y 12 meses más



El contratista realizo entrega de la póliza con numero By-1000060451, con los siguientes amparos actualizados:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	00:00 Horas del 17/12/2025	24:00 Horas del 01/05/2026	\$ 3.781.000,00
Calidad y correcto funcionamiento	00:00 Horas del 17/12/2025	24:00 horas del 31/12/2026	\$ 3.781.000,00

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dentro del proyecto se contrataron las siguientes actividades.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CAN T	VR. TOTAL
1.01	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	HORA	\$ 177,500.00	43	\$ 7,632,500.00
1.02	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR	HORA	\$ 170,000.00	75	\$ 12,750,000.00
1.03	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	HORA	\$ 212,500.00	82	\$ 17,425,000.00
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 37,807,500.00</b>


 NIT: 800.024.789-8	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ</b> MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		<b>A-GC</b> A-GC-F34
	<b>GESTION CONTRACTUAL</b> <b>INFORME DE SUPERVISION</b>		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 3 de 8

De las cuales se realizó la supervisión de estas desglosadas de la siguiente manera, a su vez se cuenta como soporte el informe del contratista ejecutor del contrato.

### 1. ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DOBRE LLANTA:

Se realizaron trabajos de limpieza de derrumbes sobre la vía que del sector de puerto Colombia, bella unión, Guazo y Upane, realizando un total de 43 horas trabajadas.




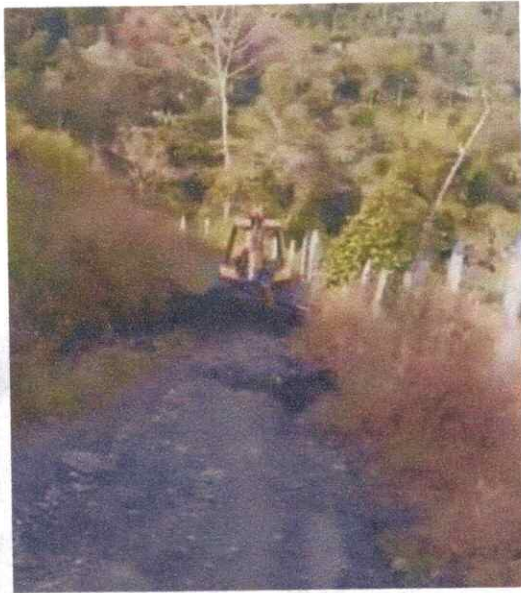



RETROEXCAVADORA			
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TRABAJADAS
18/12/2025	9242	9253.4	11.4
19/12/2025	9253.4	9260.6	7.2
20/12/2025	9260.6	9263.4	2.8
22/12/2025	9263.4	9269.8	6.4
26/12/2025	9269.8	9276.8	7
27/12/2025	9276.8	9285.2	8.4
			43

## 2. VIBROCOMPACTADOR

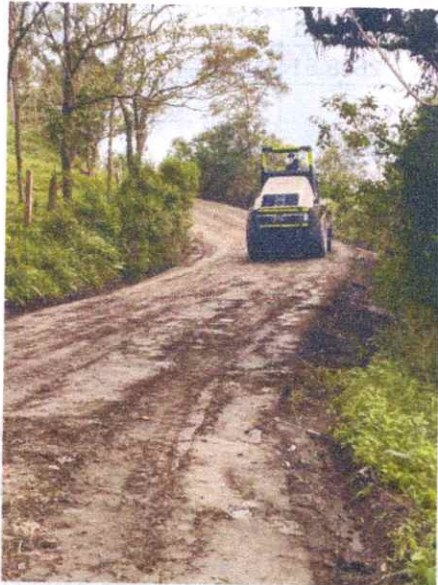Se realizo mantenimiento de la vía de la vereda de Guayabal, central a san Antonio alto y algunos ramales en condiciones riesgosas para el tránsito, teniendo en cuenta los pasos criticos que se encontraban en este sector. un total de 72 horas trabajadas



VIBROCOMPÁCTADOR			
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TRABAJADAS
18/12/2025	2613.51	2620.02	6.51
19/12/2025	2620.02	2629.81	9.79
20/12/2025	2629.81	2640.81	11
21/12/2025	2640.81	2657.01	16.2
22/12/2025	2657.01	2666.3	9.29
23/12/2025	2666.3	2671.51	5.21

 NIT: 800.024.789-8	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ</b> MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		<b>A-GC</b> A-GC-F34	
	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 6 de 8
<b>INFORME DE SUPERVISION</b>				

26/12/2025	2671.51	2679.61	8.1
27/12/2025	2679.61	2688.51	8.9
			75


### 3. MOTONIVELADORA.

Se realizo mantenimiento de la vía de la vereda de Guayabal, central a san Antonio alto y algunos ramales en condiciones riesgosas para el tránsito, teniendo en cuenta los pasos críticos que se encontraban en este sector, un total de 82 horas trabajadas.





MOTONIVELADORA			
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TRABAJADAS
17/12/2025	8546.6	8550.1	3.5
18/12/2025	8550.1	8556.12	6.02
19/12/2025	8556.12	8559.9	3.78
20/12/2025	8559.9	8568.31	8.41
21/12/2025	8568.31	8576.3	7.99

 NIT: 800.024.789-8	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ</b> MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG			<b>A-GC</b>	
	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>			A-GC-F34	
	<b>INFORME DE SUPERVISION</b>			Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 8 de 8

22/12/2025	8576.3	8580.41	4.11
23/12/2025	8580.41	8587.71	7.3
24/12/2025	8587.71	8595.2	7.49
26/12/2025	8595.2	8602.81	7.61
27/12/2025	8602.81	8611.8	8.99
28/12/2025	8611.8	8622.11	10.31
29/12/2025	8622.11	8628.21	6.1
			82

### CONCLUSIONES

El contratista realizó entrega completa de las actividades contratadas y cumple con las obligaciones descritas en el contrato 185 de 2025 cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA, MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPRATAMENTO DE BOYACA**



**ING. JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**  
 Supervisor asignado  
 Secretario de Planeación y Obras Públicas
