




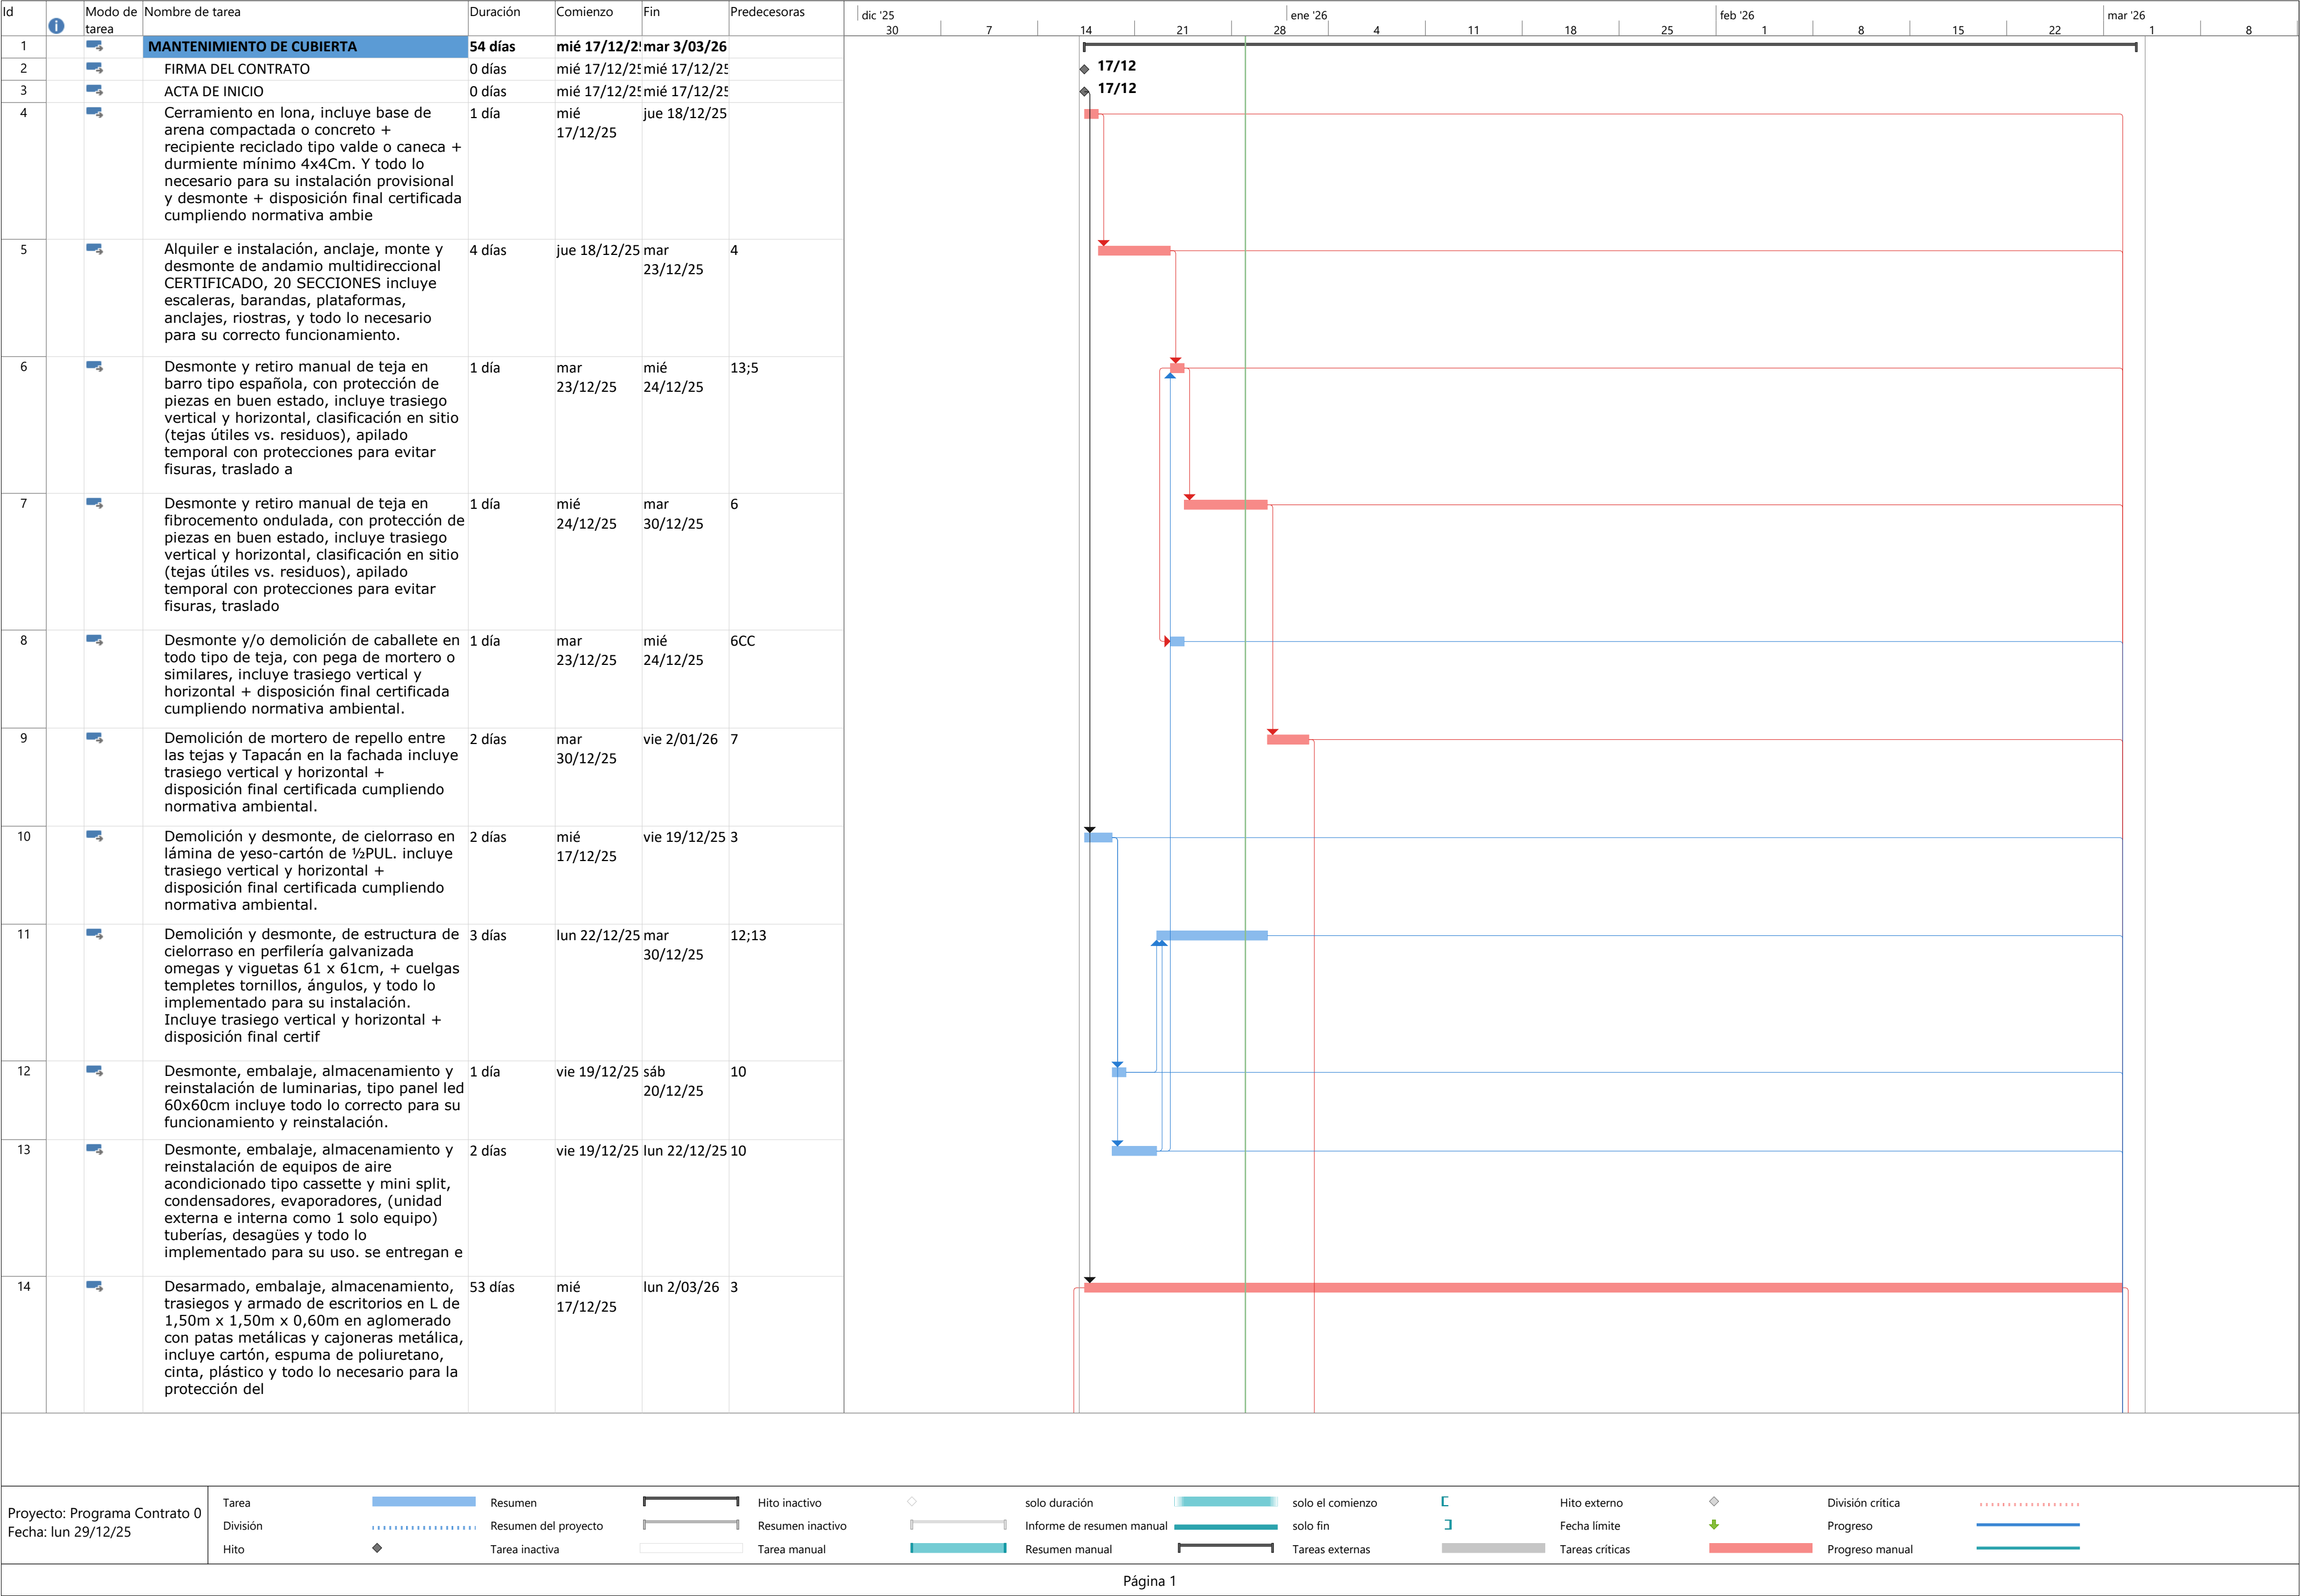

Página 2

Id		i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	dic '25	30	7	14	21	28	ene '26	4	11	18	25	feb '26	1	8	15	22	mar '26	1	8
26				Suministro e instalación flanche galvanizado 25Cm. x largo en desarrollo, acabado color negro previa aplicación primer, traslape mínimo 15Cm. fijado con chazo puntilla @0,6m - sellado con sellador de poliuretano para juntas flexibles, interior y exterior	2 días	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	24																			
27				Suministro e instalación de mortero de repello, entre Tapacán y cubierta de fibrocemento, incluye malla de gallinero metálica 1¼pul. Alambre, fijaciones, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, garantizando plomo del Tapacán, acabado en estuc	4 días	sáb 10/01/26	vie 16/01/26	26CC																			
28				Suministro e instalación de canaleta de recolección de aguas lluvias en lámina galvanizada, preformada, con pestaña, curva y desarrollo de 15cm de fondo x 20cm de profundidad, acabado color blanco hueso previa aplicación primer, fijada a fachada con ganch	3 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26	26																			
29				Suministro e instalación de accesorios para canal de aguas lluvias, uniones, esquinas, adaptadores para bajante, refuerzos y demás en lámina galvanizada preformada, acabado color blanco hueso previa aplicación primer, incluye soldadura, remates, cortes fi	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26	28																			
30				Suministro e instalación bajante de aguas lluvias en tubo PVC 4 Pulgadas tipo pesado, aplicación de primer para pinturas y color final blanco hueso, incluye cortes fijaciones a fachada con chazo puntilla, sellado con sellador de poliuretano para juntas fl	3 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26	29																			
31				Realización de regatas en concreto, demolición de cerámica y grava lavada de piso para instalación de tubería sanitaria tipo pesado 4" @1 x 4" desde bajante de canaleta hasta ubicación final, caja cárcamo o desagüe incluye tubería PVC sanitario tipo pesad	2 días	jue 22/01/26	sáb 24/01/26	30CC																			
32				Suministro e instalación de tableta 30x30cm vitrificada grafilada roja, incluye mortero de fijación, cortes instaladas de acuerdo a diseño, se entrega idéntico al original + todo lo necesario para su correcta instalación.	7 días	sáb 24/01/26	mar 3/02/26	31																			
33				Piso en concreto simple con acabado en gravilla mona #2 (GRAVILLA LAVADA) 3cm de espesor, instalada de acuerdo a diseño, se entrega idéntico al original	7 días	sáb 24/01/26	mar 3/02/26	31																			
34				Suministro e instalación de tableta 30x30cm vitrificada grafilada roja, incluye mortero de fijación, cortes, instaladas de acuerdo a diseño, se entrega idéntico al original + todo lo necesario para su correcta instalación.	7 días	sáb 24/01/26	mar 3/02/26	31																			
35				Concreto lineal 30cm x L en desarrollo con acabado en gravilla mona #2 para piso (GRAVILLA LAVADA) 3cm de espesor, instalada de acuerdo a diseño, se entrega idéntico al original	8 días	sáb 24/01/26	mié 4/02/26	31																			
36				Lineal mediacaña concreto h10cm x L en desarrollo con acabado en gravilla mona #2 para piso (GRAVILLA LAVADA) 1cm de espesor, instalada de acuerdo a diseño, se entrega idéntico al original	5 días	sáb 24/01/26	vie 30/01/26	31																			
37				suministro e instalación de junta de dilatación en bronce 5mm incluye fijación cortes y todo lo necesario para su instalación.	4 días	vie 30/01/26	jue 5/02/26	36																			

Proyecto: Programa Contrato 0

Fecha: lun 29/12/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

