

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.	05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO	27/09/2025 - 2/10/2025		
		PÁGINA	1	DE	9
REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA					
					
Descripción: TERMINAL. Ejecución de excavación mecánica al costado sur.			Descripción: TERMINAL. Ejecución de excavación mecánica al costado sur.		
					
Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación			Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.53 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°4)		
					
Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.45 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°7)			Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación		



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

27/09/2025 - 2/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.43 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°29).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación



Descripción: TORRE DE CONTROL. Izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°31).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.8 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°16).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica hasta 27.40 m, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°16).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

27/09/2025 - 2/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.60 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°8).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.30 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°34).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.40 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°19).



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado de acero de refuerzo de pilotes para cimentación



Descripción: TORRE DE CONTROL. Excavación mecánica a 27.40 metros, izaje de armadura de refuerzo y vaciado de concreto (previamente aprobada por contratista e interventoría), para el vaciado se utilizó 9 tubos Tremie (Pilote N°10).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

27/09/2025 - 2/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: SSEI. Ejecución de irrigación y compactación previa a toma de densidades.



Descripción: SSEI. Vaciado, extendido, irrigación y compactación de la segunda capa de material de rebase.



Descripción: SSEI. Irrigación y compactación de la segunda capa de material de rebase, previamente vaciado y extendido.



Descripción: PLATAFORMA. Descapote al costado sur de la plataforma actual.



Descripción: PLATAFORMA. Descapote y excavación al costado sur de la plataforma actual.



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Vaciado, extendido, irrigación y compactación de vía, entre las abscisas K0+140 y K0+245.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.	05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO	27/09/2025 - 2/10/2025		
		PÁGINA	1	DE	9



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Irrigación y compactación de vía, entre las abscisas K0+144 y K0+245.



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Vaciado, extendido, irrigación y compactación de la segunda capa de material B200 entre las abscisas K0+144 y K0+245.



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Compactación entre las abscisas K0+144 y K0+245.



Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Descapote entre las abscisas K0+099 y K0+208.



Descripción: VÍA PLATAFORMA EJE LA-01. Descapote entre las abscisas K0+068 y K0+099.



Descripción: VÍA LA-07. Irrigación y compactación entre las abscisas K0+176 y K0+240.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

27/09/2025 - 2/10/2025

PÁGINA

1

DE


9



Descripción: EJE APARCAMIENTO PARA USUARIOS:
Vaciado, extendido, irrigación y compactación de primera capa de material B200, entre las abscisas K0+090 y K0+115.



Descripción: OTROS. Incado de postes metálicos para cerramiento, frente a la zona verde contigua al terminal actual.

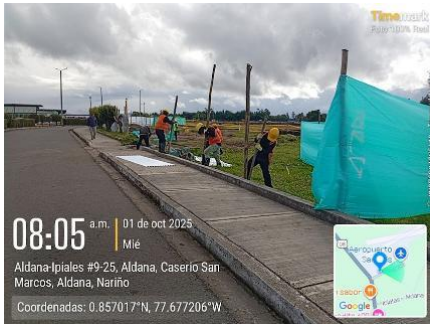

Descripción: OTROS. Excavación manual para instalación de postes metálicos e instalación de láminas de zinc en el cerramiento ubicado entre la capilla y la zona verde, contiguo al actual Terminal de Pasajeros.



Descripción: OTROS. Construcción de 48.75 ml de viga de cerramiento, ubicada paralela al Eje LT-03, entre las abscisas K0+061.75 y K0+110.5.



Descripción: OTROS. Construcción de 40 ml de solado para viga de cerramiento, colindante al predio del señor Yuri Benavides



Descripción: OTROS. Construcción de 30 ml solado para viga de cerramiento, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

27/09/2025 - 2/10/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: OTROS. Excavación manual para instalación de pedestales, frente a la capilla.



Descripción: OTROS. Curado de viga de cerramiento.



Descripción: OTROS. Instalación de 70 ml de encofrado metálico para la fundición de la viga de cerramiento, colindante con el predio del señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS. Levantamiento topográfico para la instalación de estacas con abscisas marcadas sobre el Eje LT-04.



Descripción: OTROS. Descapote de vía carretable de 3 metros, colindante al predio en comodato de 2 Ha.



Descripción: OTROS. Ejecución del ensayo de Cono de Arena in situ para determinar densidades en la primera capa de recebo: SSEI (5 ensayos), Eje LA-07 (3 ensayos) y Eje LT-04 (2 ensayos).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.		05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
		PERIODO		27/09/2025 - 2/10/2025		
		PÁGINA		1	DE	9



Descripción: OTROS. Marcación de niveles mediante cintas en estacas, indicando -0,80 m respecto a la rasante final, como referencia de avance y material faltante.



Descripción: OTROS. Instalación de lona verde sobre cerramiento conformado por láminas de zinc previamente instaladas, localizado en el costado sur de la plataforma existente.



Descripción: OTROS. Cargue y transporte del material proveniente de la excavación de plataforma hacia zona de acopio, ubicada al costado este de Cuartos Técnicos.



Descripción: OTROS. Cargue y transporte del material proveniente de la excavación de plataforma hacia zona de acopio, ubicada al costado este de Cuartos Técnicos.




Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Conformación de zona verde, ubicada al costado suroeste de la plataforma, utilizando material proveniente de las excavaciones realizadas en plataforma.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte de material proveniente de excavaciones de pilotes hacia la zona verde, localizada frente a la planta de concreto, en proximidades de la plataforma.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME No.		05 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)		
				PERIODO		
				27/09/2025 - 2/10/2025		
			PÁGINA	1	DE	9

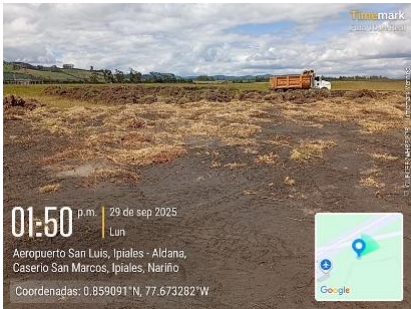

Descripción: **RELLENO LOCALIZADO.** Cargue y transporte de material proveniente de excavaciones de plataforma hacia zona verde ubicada en proximidades del Eje LA-07 y plataforma existente. Se realiza extendido y compactación del material.



Descripción: **RELLENO LOCALIZADO.** Cargue y transporte de material proveniente de excavaciones de plataforma hacia la zona verde ubicada en proximidades del Eje LA-07 y Eje LA-08. Se realiza extendido y compactación del material.
