



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA

1

DE

6

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



**Descripción:** TERMINAL. Vaciado, extendido de material de mejoramiento y compactación de la primera capa liberada por interventoría en el Bloque 3 entre los ejes G a J y entre los ejes 0 a 9



**Descripción:** TERMINAL. Irrigación y compactación, previo a toma de densidades en el en el bloque 3, en el área comprendida entre los ejes J a L y entre los ejes 0 a 9 y en el bloque 4, en el área comprendida entre los ejes 0 a 9 y entre los ejes L a N



**Descripción:** TERMINAL. Evacuación de empozamientos de agua en los puntos 5G, 4J, 9F y 4G. Posterior nivelación y compactación.



**Descripción:** TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



**Descripción:** TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



**Descripción:** TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA

1

DE

6



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Ejecución de pruebas PIT en los pilotes N° 6, 22, 33, 37, 60



Descripción: SSEI. Armado de casetones de madera



Descripción: SSEI. Armado de casetones de madera



Descripción: SSEI. Verificación de Ejes con topografía.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA


1

DE

6



**Descripción:** PLATAFORMA. Nivelación, irrigación y compactación en el costado oeste de plataforma actual.

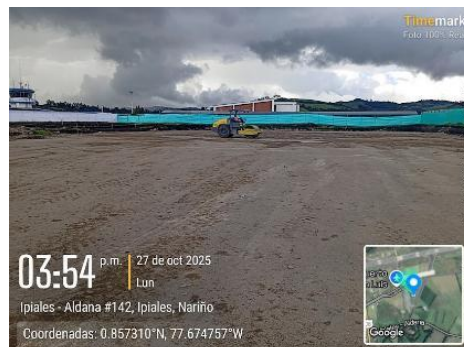

**Descripción:** PLATAFORMA. Compactación en el costado oeste de plataforma actual.



**Descripción:** PLATAFORMA. Excavación mecánica en la esquina oriental, hasta el punto donde finaliza la plataforma en dicho sector.



**Descripción:** PLATAFORMA: Excavación mecánica en el sector Este de plataforma actual, con el fin de extraer el material previamente acopiado y proceder al mejoramiento del mismo



**Descripción:** VÍA EJE LT05: Excavación mecánica entre los ejes K0+080 y K0+120.



**Descripción:** VÍA EJE LT05: Excavación mecánica entre las abscisas K0+120 y K0+126.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA

1

DE

6



**Descripción:** VÍA EJE LT05: Excavación mecánica entre los ejes K0+080 y K0+120.



**Descripción:** VÍA EJE LT05: Excavación mecánica entre las abscisas K0+120 y K0+126.



**Descripción:** VÍA EJE LT05: Vaciado y extendido de material de rajón, seguido de la colocación de una capa de recebo y su respectiva compactación



**Descripción:** RELLENO LOCALIZADO: Cargue y transporte de material producto de excavaciones de plataforma, hacia zona verde ubicada frente a la planta de concreto y en las proximidades de plataforma y posterior explanación.



**Descripción:** RELLENO LOCALIZADO: Explanación de material previamente dispuesto en zona verde, ubicada al costado derecho de la vía correspondiente al Eje LA-07 y al costado izquierdo de la vía correspondiente al Eje LA-10.



**Descripción:** OTROS. Explanación y nivelación de material producto de excavaciones de plataforma y terminal, el cual había sido previamente dispuesto en zona de acopio, situada en proximidades de cuartos técnicos.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA

1

DE

6



**Descripción: OTROS.** Toma de densidades mediante el ensayo del Cono de Arena para liberación de la segunda capa de material de mejoramiento en el bloque 3, en el área comprendida entre los ejes J a L y entre los ejes 0 a 9 y en el bloque 4, en el área comprendida entre los ejes 0 a 9' y entre los ejes L a N.



**Descripción: OTROS.** Excavación al costado oeste de terminal y plataforma para drenaje de aguas lluvias.



**Descripción: OTROS.** Fundición de 84.3 ML de viga de cerramiento entre las abscisas K0+261.63 y K0+343.50, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Instalación de 43 ML de formaleta para construcción de viga de cerramiento definitivo, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Instalación de 30 metros lineales de malla eslabonada y ángulos superiores para el cerramiento definitivo, colindante con el Eje LT-03, hasta el cerramiento de los cuartos técnicos existentes.



**Descripción: OTROS.** Marcación de abscisas en el cerramiento definitivo, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



AERONÁUTICA CIVIL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA  
AERONÁUTICA CIVIL  
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

15 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

25/10/2025 - 31/10/2025

PÁGINA

1

DE

6



**Descripción: OTROS.** Excavación mecánica para pozo de recolección de aguas lluvias en proximidades de la abscisa K0+200 de la vía Eje LA-01.



**Descripción: OTROS.** Instalación de ángulos superiores para cerramiento definitivo, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



**Descripción: OTROS.** Instalación de 5 metros de malla eslabonada para cerramiento definitivo, colindante a la vía Eje LT03



**Descripción: OTROS.** Evacuación de encharcamientos, localizados en Terminal y en la vía LT-04, en los puntos K0+225, K0+180 y K0+150,



**Descripción: OTROS.** Corrección de fallas evidenciadas en la vía correspondiente al Eje LT-04, consistentes en la presencia de material suelto, material con sobretamaños y encharcamiento localizado en la abscisa K0+220.



**Descripción: OTROS.** Instalación de postes para cerramiento definitivo, colindante al predio del señor Yuri Benavides.
