



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: SSEI. Armado de casetones de madera.



Descripción: SSEI. Regatas en el solado, empleando cortadora de concreto para la apertura de zanjas lineales destinadas a la instalación del sistema de apuntalamiento y puesta a tierra.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9




Descripción: SSEI. Regatas en el solado, empleando cortadora de concreto para la apertura de zanjas lineales destinadas a la instalación del sistema de apantallamiento y puesta a tierra.



Descripción: SSEI. Regatas en el solado, empleando cortadora de concreto para la apertura de zanjas lineales destinadas a la instalación del sistema de apantallamiento y puesta a tierra.



Descripción: PLATAFORMA.. Instalación de 924 M2 de geotextil en el sector oeste de plataforma actual.

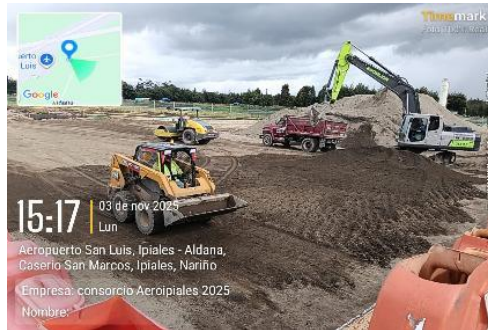

Descripción: PLATAFORMA. Conformación de primera capa de material de mejoramiento en el costado oriental.



Descripción: PLATAFORMA. Instalación de 462 M2 de Geotextil en el costado oeste.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de primera capa de material de mejoramiento en el costado oriental.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: PLATAFORMA. Excavación mecánica en el costado oriental.



Descripción: PLATAFORMA. Corrección de fallas por acolchamiento.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de segunda capa de material de mejoramiento, en el sector sur oriental.



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Excavación mecánica entre los ejes K0+120 y K0+125.80 y conformación de primera, segunda y tercera capa de material de mejoramiento..



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-04. Corrección de fallos en las abscisas K0+010 y K0+120



Descripción: VÍA EJE LT-05. Excavación mecánica.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: VÍA PRINCIPAL EJE LT-03. Corrección de fallas por acolchonamiento.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Explanación de material previamente dispuesto en zona verde, localizada al Eje izquierdo de la vía correspondiente al Eje LT04, entre las abscisas K0+070 y K0+120.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Cargue y transporte de material producto de excavaciones de plataforma hacia zona verde, localizada a la derecha de la vía correspondiente al Eje LT-07.



Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Extendido de material de excavación, previamente acopiado en zona verde al costado izquierdo de la vía, correspondiente al LT-04, en proximidades de la abscisa K0+110.



Descripción: OTROS. Instalación de postes metálicos estructurales que conforman el cerramiento definitivo, en el tramo colindante con el predio del señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS. Fundición de 54.57 ML de viga de cerramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+207.06 y K0+261.63, colindante al predio del señor Yuri Benavides.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9




Descripción: OTROS. Instalación de los ángulos superiores y de los postes metálicos, correspondientes al cerramiento definitivo colindante con el predio del señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS. Instalación de los ángulos superior e inferior y de los postes metálicos, correspondientes al cerramiento definitivo colindante con el predio del señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS. Fundición de 81.87 ML de viga de cerramiento, colindante al predio del señor Yuri Benavides, entre las abscisas K0+229,13 y K0+261,63.

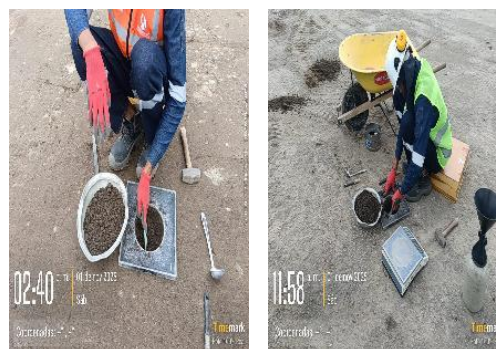

Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del cono de arena, en los puntos de control establecidos: bloque 2 del Terminal (Ejes 1E, 2F, 3D', 4F', 5E y 7F'), en la abscisa K0+123 del Eje LT-04, y en el costado occidental de la plataforma actual para verificar la compactación del material de mejoramiento.



Descripción: OTROS. Evacuación manual de empozamientos de agua lluvia en la vía correspondiente al Eje LT-04 y en Plataforma.



Descripción: OTROS. Fundición de 81.87 ML de viga de cerramiento, colindante al predio del señor Yuri Benavides, entre las abscisas K0+229,13 y K0+261,63.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

16 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

01/11/2025 - 7/11/2025

PÁGINA

1

DE

9



Descripción: OTROS: Toma de densidades, mediante el ensayo del cono de arena, al costado sur oriental de la plataforma actual para verificar la compactación del material de mejoramiento y proceder a la liberación de la segunda capa.



Descripción: OTROS. Acopio de material de recebo en proximidades del Eje aparcamiento para usuarios.



Descripción: OTROS. Toma de densidades mediante el ensayo del cono de arena, al costado sur oriental de la plataforma actual para verificar la compactación del material de mejoramiento y proceder a la liberación de la segunda capa.



Descripción: OTROS. Montaje de campamento provisional, localizado en cercnias de la glorieta.



Descripción: OTROS. Montaje de campamento provisional, localizado en cercnias de la glorieta.



Descripción: OTROS. Acondicionamiento de vía, localizada en proximidades de campamento
