



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TORRE DE CONTROL. Descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Evacuación de escombros producto de descabece de pilotes.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Relleno con material de rebase y compactación



Descripción: TORRE DE CONTROL. Compactación de material previamente dispuesto.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Evacuación manual del agua empozada generada por las precipitaciones.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Evacuación manual del agua empozada generada por las precipitaciones.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



Descripción: SSEI. Instalación del cableado del sistema de puesta a tierra y apantallamiento.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación



Descripción: SSEI. Relleno de zanjas con material de recebo y fundición de solados sobre las mismas.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de segunda capa de material de mejoramiento, en el sector sur oriental.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de segunda capa de material de mejoramiento, en el sector sur oriental.




Descripción: PLATAFORMA. Conformación de la 3ra capa de material de mejoramiento en el costado oriental.



Descripción: PLATAFORMA. Instalación de geotextil en el costado occidental.



Descripción: PLATAFORMA. Evacuación manual del agua empozada generada por las precipitaciones en el costado oriental.

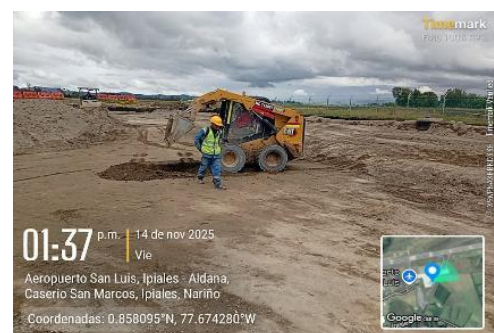

Descripción: TORRE DE CONTROL. Corrección de fallos por acolchonamiento



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ mediante el ensayo del cono de arena, en el costado sur oriental de la plataforma, con el fin de verificar la compactación del material de mejoramiento y proceder a la liberación de la segunda capa.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ mediante el ensayo del cono de arena, en el costado sur oriental de la plataforma, con el fin de verificar la compactación del material de mejoramiento y proceder a la liberación de la tercera capa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TERMINAL. Corrección de fallos



Descripción: TERMINAL. Extracción de agua empozada producto de lluvias intensas mediante el uso de motobombas portátiles



Descripción: Eje vial LT-04. Corrección de fallos en la abscisa K0+110



Descripción: Eje vial LT-04 Corrección de fallos en la abscisa K0+200



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8




Descripción: Eje vial LT-04 Vaciado y extendido con material de mejoramiento y compactación entre las abscisas K0+143 y K0+200.



Descripción: Eje vial LT-04 Se realizo compactación y mejoramiento de via LT-04 en K0+170 a K0+200



Descripcion: Eje vial LT-04. Se ejecutó una prueba para verificar el comportamiento mecanico de materiales previamente acordada entre la interventoria y el contratista

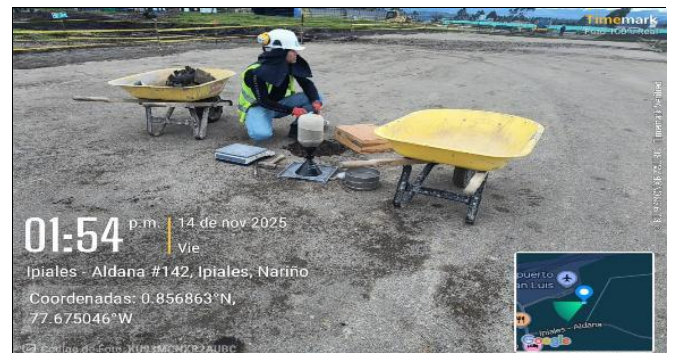

Descripcion: Eje vial LT-04 toma de dos pruebas de densidad in situ, ubicadas en las abscisas K0+186 y K0+228.



Descripción: Eje vial LT-03 Corrección de fallos.



Descripción: Eje vial LT-03 vaciado, extendido y nivelación del material de rajón y su correspondiente sello de rajón en el tramo comprendido entre las abscisas K0+082 y K0+115.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



08:29 a.m. | 08 de nov 2025
Sáb
Aldana-Ipiales #9-25, Aldana, Caserio San
Marcos, Aldana, Nariño
Coordenadas: 0.857042°N, 77.677013°W

Descripción: Eje vial LT-05 Conformación de 7cm restantes, correspondientes a la primera capa de material de mejoramiento



03:56 p.m. | 12 de nov 2025
Mie
Aldana-Ipiales #9-25, Aldana, Caserio
San Marcos, Aldana, Nariño
Coordenadas: 0.856986°N,
77.676904°W

Descripción: Eje vial LT-05 excavación del terreno destinada a la futura instalación de 3 cajas de inspección para redes eléctricas y de fibra óptica



03:53 p.m. | 12 de nov 2025
Mie
Ipiales Aldana, 524547 Aldana
Coordenadas: 0.856391°N,
77.675957°W

Descripción: Eje vial LT-05 instalación de un sistema de encamisado mediante tubería tipo Novafort, destinado a la canalización y protección de las redes eléctricas y de fibra óptica existente.



09:22 a.m. | 08 de nov 2025
Sáb
Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana,
Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño
Coordenadas: 0.858588°N, 77.671798°W

Descripción: OTROS • Instalación de malla eslabonada para cerramiento definitivo colindante al predio del Señor Yuri Benavides



09:07 a.m. | 10 de nov 2025
Lun
Aeropuerto San Luis, Ipiales - Aldana,
Caserio San Marcos, Ipiales, Nariño
Coordenadas: 0.858414°N, 77.671755°W

Descripción: OTROS Instalación de malla eslabonada y platinas en el cerramiento definitivo colindante al predio del Señor Yuri Benavides.



Descripción: OTROS Se realizó la instalación de dos (2) rollos de malla eslabonada y encauchetada de 10 metros de longitud cada uno



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



Descripción: OTROS Se realizó la instalación de tres (3) rollos de malla eslabonada y encauchetada de 10 metros de longitud cada uno, como parte del cerramiento oriental colindante con el predio del señor Yuri Benavides



Descripción: OTROS instalación de cuatro (4) rollos de malla eslabonada encauchetada, cada uno con una longitud de 10 metros, como parte del cerramiento perimetral oriental



Descripción: OTROS Excavación manual para instalación de pedestales para cerramiento definitivo colindante al predio del Señor Yuri Benavides



Descripción: OTROS Instalación de alambre de púas en el cerramiento definitivo, colindante al Eje LT-03, en proximidades de cuartos técnicos



Descripción: OTROS Montaje de viga en el cerramiento definitivo, en el tramo colindante al predio del señor Yuri Benavides



Descripción: OTROS Montaje de viga en el cerramiento definitivo, en el tramo colindante al predio del señor Yuri Benavides



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

17 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

8/11/2025 - 14/11/2025

PÁGINA

1

DE

8



Descripción: OTROS Instalacion de postes en el cerramiento oriental



Descripción: OTRO Toma de muestras la toma de muestras de concreto fresco en sitio mediante el uso de camisas metálicas cilíndricas de 3" x 6"



Descripción: OTROS Verificacion de Niveles y armado de estructura para posterior fundicion



Descripción: OTROS la fundición de la viga de cerramiento con una longitud total de 17.56 metros y un volumen aproximado de 1.5 m³ de concreto estructural.



Descripción: OTROS Instalacion alambre de puas paralelo al eje vial LT-03



Descripción: OTROS Instalacion de tapones para postes de cerramiento.
