



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TORRE DE CONTROL. Inicio de soldadura del cable de apantallamiento, mediante unión exotérmica.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Continúa soldadura del cable de apantallamiento, mediante unión exotérmica.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Instalación de tubos Gerfor de 24 cm x 4" para la protección del cable de cobre correspondiente al sistema de puesta a tierra y apantallamiento, garantizando su adecuada canalización y resguardo dentro de la infraestructura.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Instalación y verificación de niveles para la ejecución del solado de limpieza, garantizando la correcta cota antes del vaciado.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Relleno de las excavaciones realizadas para la instalación del cable de cobre de apantallamiento, utilizando material de recebo previamente seleccionado y posterior nivelación del material y compactación mecánica.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Fundición de solado de 10 cm de espesor.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: BLOQUE TÉCNICO. Nivelación manual y compactación mecánica del terreno previo a la fundición del solado.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas y excavación manual de regatas para instalaciones sanitarias.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4




Descripción: SSEI. Corte en solado para apertura de regatas, destinadas a la instalación de tubería eléctrica.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de la primera capa de material de mejoramiento en el costado oriental, en el sector donde anteriormente se encontraba el acopio de material, mediante extendido, nivelación y compactación.

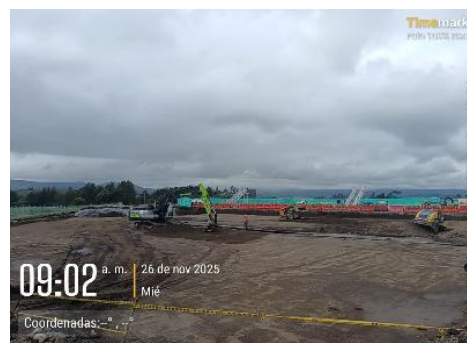

Descripción: PLATAFORMA. Nivelación del terreno y conformación de segunda capa de material de mejoramiento sobre geotextil en el costado oriental, entre las abscisas K0+145 y K0+160.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de tercera capa de material de mejoramiento sobre geotextil en el costado oriental, entre las abscisas K0+145 y K0+160.



Descripción: PLATAFORMA. Excavación mecánica en el costado sur oriental.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: VÍA. Excavación mecánica en la vía correspondiente al eje LA-08.




Descripción: RELLENO LOCALIZADO. Conformación de zona verde, localizada frente a planta de concreto.



Descripción: OTROS. Evacuación mecánica y manual de agua acumulada en la vía correspondiente al eje LA-08, producto de las lluvias recientes, mediante uso de minicargador y herramientas manuales.



Descripción: OTROS. Evacuación manual de agua empozada en la plataforma sur oriental, mediante el uso de herramientas manuales

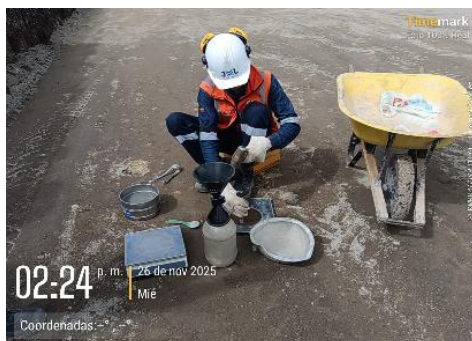

Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, mediante el ensayo del cono y arena en el sector sur oriental de plataforma, para liberar la quinta capa del tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+060.



Descripción: OTROS. Evacuación manual de agua empozada en la plataforma sur oriental, mediante el uso de herramientas manuales



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA



Descripción: TERMINAL. Actividades de extension y compactacion de la cuarta capa de los bloques 2 y 4



Descripción: TERMINAL. Actividades de extension y compactacion de la cuarta capa de los bloques 2 y 4



Descripción: TERMINAL. actividad de extendido, compactación y nivelación de material de la cuarta capa en los bloques 3 y 4



Descripción: Eje vial LT-04. • Replanteo de niveles de subrasante en LT-04 de la abscisa k0+00 hasta la k0+140



Descripción: Eje vial LT-04 actividades de perfilamiento de la vía, dejando la estructura lista para las siguientes capas viales.



Descripción: Eje vial LT-05 • Se realizó la implantación de puntos de control topográfico destinados a la futura localización de la caja de inspección para redes existentes.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: Parqueadero de usuarios • extendido y compactación de la tercera capa de material granular entre las abscisas K0+047 a K0+125.



Descripción: Parqueadero de usuarios se tomaron 4 densidades en los puntos K0+115 NOR OCCIDENTAL, K0+095 NOR OCCIDENTAL, K0+070 EJE y K0+060 SUR ORIENTE



Descripción: OTROS evacuación de agua acumulada en zona de pozos frente a terminal y parqueadero



Descripción: OTROS nivelación y excavación del terreno, para la futura viga de cerramiento en el costado suroriental



Descripción: OTROS • excavación del terreno y colocacion de solado, orientadas a la adecuación de la franja destinada a la futura instalación de la viga de cerramiento en el costado suroriental,



Descripción: OTROS excavación y colocación de solado en el cerramiento costado suroriental



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

19 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

22/11/2025 - 28/11/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: OTROS nivelación, formateo y excavación del terreno, así como al armado del acero de refuerzo correspondiente a la viga de cerramiento el **costado suroriental**



Descripción: OTROS • Instalación de malla eslabonada y encauchetada en la parte del cerramiento oriental



Descripción: OTROS fundición de viga de cerramiento en el costado sur colindante al predio Ignacio Benavides.



Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO •levantamiento de cerramiento perimetral con acopio correspondiente al predio # 27 colindante al predio del señor Ignacio Benavides.



Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO •actividades de conformación del relleno localizado en el canal VOR (lado aire)
