



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025


PÁGINA

1

DE

4

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

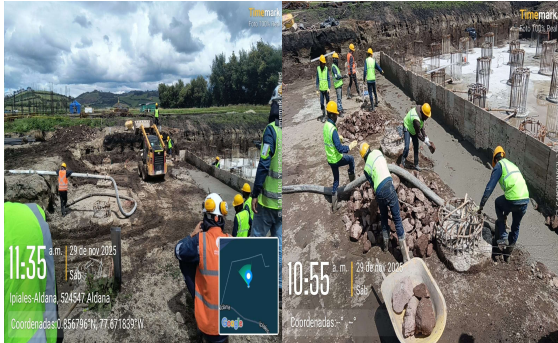

Descripción: TORRE DE CONTROL. Nivelación mecánica del terreno y posterior fundición de una capa de 10 cm de solado de limpieza en el área correspondiente al bloque técnico.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado y disposición del acero de refuerzo para la losa de concreto.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado y disposición del acero de refuerzo para la losa de concreto.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado y disposición del acero de refuerzo para la losa de concreto.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado y disposición del acero de refuerzo para la losa de concreto.



Descripción: TORRE DE CONTROL. Armado y disposición del acero de refuerzo para la losa de concreto.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA


1

DE

4




Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas

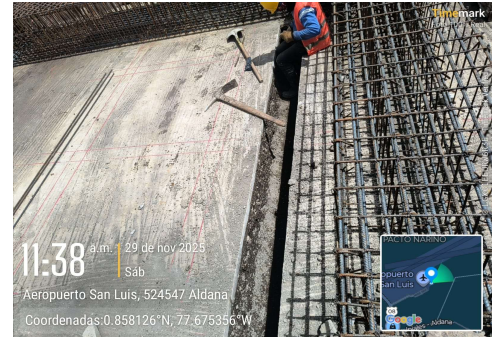

Descripción: SSEI. Excavación manual de zanjas para la instalación de redes sanitarias e hidráulicas.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas

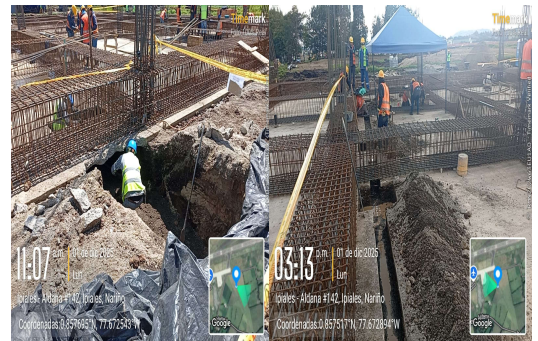

Descripción: SSEI. Excavación manual de zanjas para la instalación de redes eléctricas y sanitarias.



Descripción: SSEI. Figurado de acero de refuerzo para flejes.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas, viguetas de cimentación y columnas.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4




Descripción: SSEI. Excavación manual de zanjas para la instalación de redes sanitarias.



Descripción: SSEI. Construcción de cajas de inspección en ladrillo e instalación de tubería de 4 pulgadas para redes sanitarias.



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas, viguetas de cimentación y columnas.

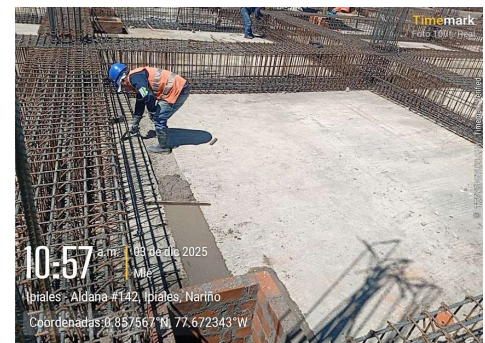

Descripción: SSEI. Relleno y fundición de solado en las zanjas donde previamente se efectuó la instalación de las redes sanitarias



Descripción: SSEI. Instalación de tubería de 4 pulgadas para red eléctrica.



Descripción: SSEI. Figurado de acero de refuerzo para conformación de flejes y bastones.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas, viguetas de cimentación y columnas.




Descripción: SSEI. Armado de acero de refuerzo para vigas, viguetas de cimentación y columnas.



Descripción: SSEI. Figurado de acero de refuerzo para conformación de flejes y bastones.



Descripción: PLATAFORMA. Conformación de tercera capa de material de mejoramiento sobre geotextil en el costado oriental, entre las abscisas K0+145 y K0+160.

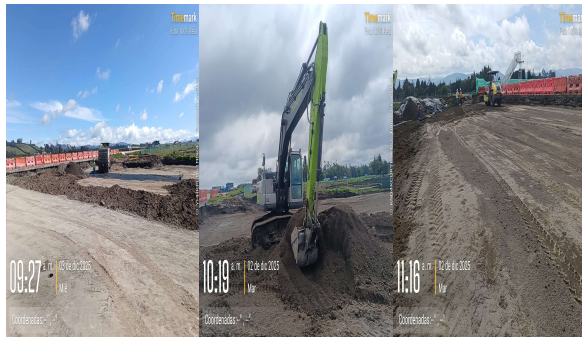

Descripción: PLATAFORMA. Conformación de la primera capa de material de mejoramiento sobre geotextil, mediante actividades de vaciado, extendido y compactación en el tramo comprendido entre las abscisas K0+165 y K0+185, área previamente liberada por la Interventoría.



Descripción: PLATAFORMA. Instalación de 2 líneas de geotextil y extendido de la primera capa de material de mejoramiento sobre geotextil, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+165 y K0+185, área previamente liberada por la Interventoría.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO


29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4

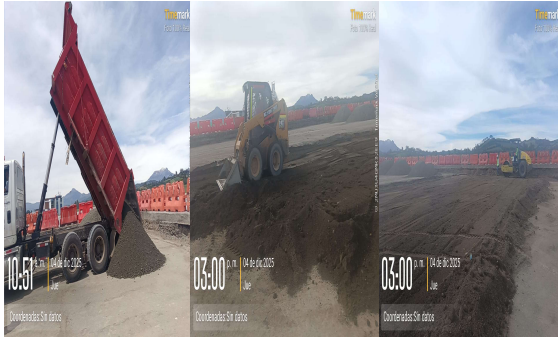

Descripción: PLATAFORMA. Conformación de la segunda capa de material de mejoramiento sobre geotextil, mediante actividades de vaciado, extendido y compactación en el tramo comprendido entre las abscisas K0+165 y K0+180, área previamente liberada por la Interventoría.




Descripción: VÍA. Extendido de segunda capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+110, en la vía correspondiente al Eje LA-07.




Descripción: VÍA. Compactación en la segunda capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+110, en la vía correspondiente al Eje LA-07.



Descripción: VÍA. Compactación en la tercera capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+110, en la vía correspondiente al Eje LA-07.

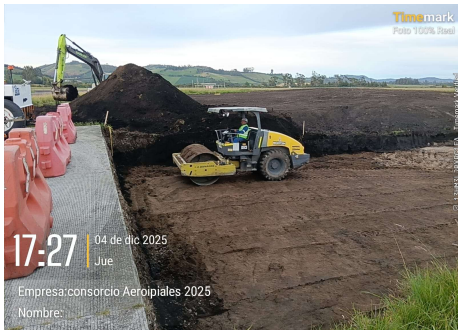

Descripción: VÍA. Compactación en la vía correspondiente al Eje LA-08, previo a conformación de primera capa de material de mejoramiento.

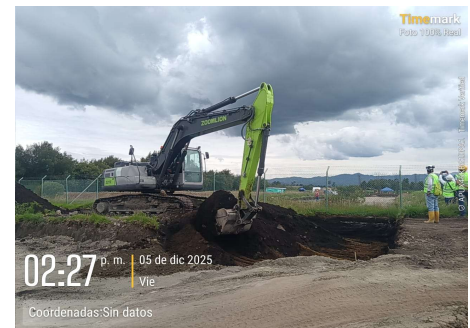

Descripción: VÍA. Excavación mecánica, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+160 y K0+170., en la vía correspondiente al Eje LA-07.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: VÍA. Extendido y compactación de tercera capa de material de mejoramiento en el tramo comprendido entre las abscisas K0+110 y K0+140, en la vía correspondiente al Eje LA-07.



Descripción: VÍA. Extendido de primera capa de material de mejoramiento, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+020, en la vía correspondiente al Eje LA-08.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, mediante el ensayo del cono y arena en plataforma, en el costado sur oriental



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, mediante el ensayo del cono y arena para liberación de segunda capa de material de mejoramiento en plataforma sur oriental.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para liberación de segunda capa de material de mejoramiento en la vía correspondiente al Eje LA-07.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, en conjunto entre laboratorio del contratista y laboratorio de interventoría para liberación de tercera capa de material de mejoramiento en plataforma oriental, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+020 (Eje Y).



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO


29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4

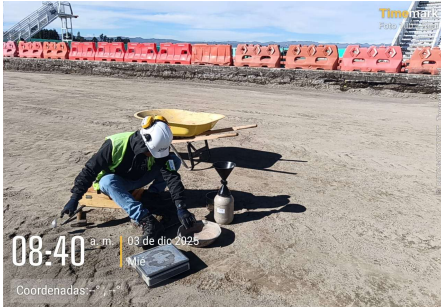

Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ para liberación de tercera capa de material de mejoramiento en plataforma sur oriental, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+060 (Eje Y), para verificación del punto ubicado en la abscisa K0+010 del Eje Y.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para la liberación de la primera capa de material de mejoramiento en la vía correspondiente al Eje LA-07, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+160, para verificación del punto ubicado en la abscisa K0+050.




Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para la liberación de la segunda capa de material de mejoramiento en la vía correspondiente al Eje LA-07, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+110.



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para liberación de primera capa de material de mejoramiento en plataforma sur oriental, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+165 y K0+180 (Eje x).



Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para liberación de segunda capa de material de mejoramiento en la vía correspondiente al Eje LA-07, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+060 y K0+110.

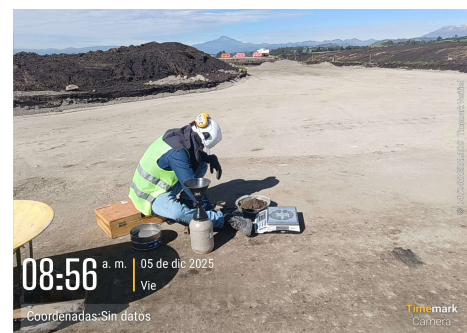

Descripción: OTROS. Toma de densidades in situ, para liberación de segunda capa de material de mejoramiento en la vía correspondiente al Eje LA-07, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+110 y K0+160, para verificación de los puntos ubicados en las abscisas K0+115 y K0+135.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA




Descripción: Parqueadero de usuarios • extendido de la tercera capa de material granular



Descripción: Parqueadero de usuarios • extendido y compactación de la tercera capa de material granular.



Descripción: Eje vial LT-04. • excavación, escarificación y perfilamiento de la vía entre la abscisa K0+385 y K0+470

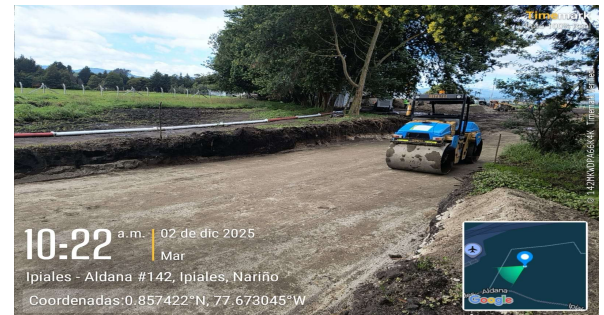

Descripción: Eje vial LT-04. • excavación, escarificación y perfilamiento de la estructura de la vía.e la abscisa K0+300 y K0+470



Descripción: Eje vial LT-04 excavación y retiro de material de acopio previamente dispuesto en este sector, entre las abscisas K0+380 y K0+342.



Descripción: OTROS nivelación, formateo y excavación , así como al armado del acero de refuerzo correspondiente a la viga de cerramiento sur-oriental



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE


4



Descripción: OTROS nivelación, formateo y excavación , así como al armado del acero de refuerzo correspondiente a la viga de **cerramiento sur-oriental**



Descripción: OTROS actividad de resane de pintura 2 en 1 en postes y perfiles de la estructura de **cerramiento oriental**.

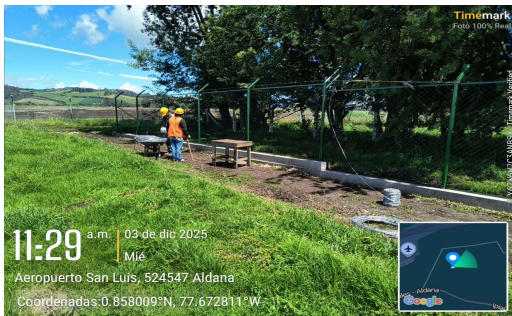

Descripción: OTROS instalación de alambre de pua en el **cerramiento oriental** entre las abscisas K0+315 y K0+331



Descripción: OTROS instalación de alambre de pua en el **cerramiento oriental** hasta la abscisa K0+250



Descripción: OTROS nivelación y excavación del terreno, para la futura viga de cerramiento en el costado suroriental



Descripción: OTROS • El material resultante del perfilamiento del sector LT-04 fue retirado y acopiado en la zona destinada a área verde, ubicada frente al bloque técnico



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO

29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4



Descripción: OTROS El material resultante del perfilamiento del sector LT-04 fue retirado y acopiado en la zona destinada a área verde, ubicada frente al bloque técnico



Descripción: OTROS instalación de malla en el cerramiento sur colindante al predio del señor Ignacio Benavides



Descripción: OTROS instalación de malla en el cerramiento sur colindante al predio del señor Ignacio Benavides



Descripción: Bloque Tecnico actividades de descapote y excavación en el área destinada a bloque técnico



Descripción: Bloque Tecnico actividades de descapote y excavación en el área destinada a bloque técnico



Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO actividades de conformación del relleno localizado en el canal VOR (lado aire)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA CIVIL
MANUAL DE INTERVENTORÍA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INFORME No.

20 (ETAPA CONSTRUCCIÓN)

PERIODO


29/11/2025 - 05/12/2025

PÁGINA

1

DE

4

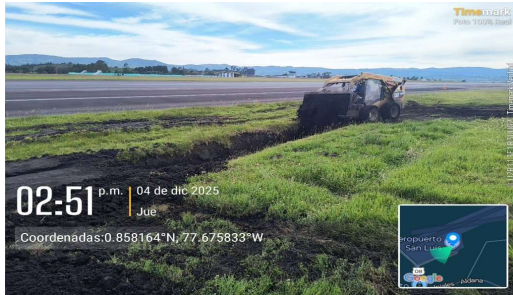

Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO • actividades de conformación del relleno localizado en el canal VOR (lado aire)



Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO • actividades de conformación del relleno localizado Cabecera 8 (lado aire)



Descripción: URBANIZACION Y PAISAJISMO • actividades de conformación del relleno localizado en el canal BRAVO (lado aire)



Descripción: Eje vial LT-05 Construcción de caja de inspección redes eléctricas y fibra óptica existentes en la abscisa K0+080.



Descripción: Eje vial LT-05 Construcción de caja de inspección redes eléctricas y fibra óptica existentes en la abscisa K0+110.



Descripción: Eje vial LT-03 Construcción de caja de inspección redes eléctricas y fibra óptica existentes .
