

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		
Número del Contrato:	SA-MT-004-2025	
Objeto:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DIFERENTES SEDES RURALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ.	
Fecha de suscripción del contrato:	Octubre 09 de 2025	
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO NIT N° 891.856.131-3 R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA	
Nombre Contratista:	GEA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT N° 901.108.817-4 R/L FELIPE ARTURO REYES MÁRQUEZ C.C. N°: 1.049.626.857 DE TUNJA	
Supervisor:	FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO	
Valor fiscal:	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$82.783.285,97) M/CTE.	
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	
Fecha de Inicio:	14 de octubre de 2025	
Fecha de terminación:	14 de diciembre de 2025	
Avance Físico:	100.00 %	
Avance Financiero:	100.00 %	
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)		
Valor adicional:	N/A	
Motivo:	N/A	
Fecha de suscripción:	N/A	
Valor total contrato:	N/A	
PRORROGA (Si aplica)		
Período autorizado:	N/A	
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)		
Fecha de suspensión 01:	N/A	

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 2 de 12

ESTADO ACTUAL	
Valor Total	OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$82.783.285,97) M/CTE.
Ejecutado (Según actas)	

1) CONTROL TÉCNICO

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas en el presente contrato con el registro fotográfico correspondiente.

Las actividades desarrolladas en cada una de las sedes de las intuiciones educativas del municipio de Tasco obedecen principalmente a:

- De manera general en la totalidad de las sedes intervenidas se desarrollaron actividades de suministro e instalación de vinilo tipo II sobre pañete o estuco a dos manos en muros y bajo placa y el suministro e instalación de esmalte lamina llena 3 manos y esmalte lamina lineal 3 manos.

Ya de manera independiente en cada sede desarrollan algunas actividades específicas tal y como se relacionan a continuación:

- En la **escuela costa rica** se desarrollaron actividades necesarias para la construcción de una nueva placa deportiva, tales como la demolición de pisos en concreto, el relleno con material de afirmado compactado rana y/o Vibrocompactador, la construcción de placa base en concreto $e = 8.0$ cm. 17.5 Mpa (2500 psi) reforzada con malla electrosoldada, la demarcación con pintura para canchas a base agua, actividades y algunas actividades específicas de mantenimiento como la impermeabilización con manto asfáltico de 3 mm, el suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 4, el suministro e instalación de marco en lámina $0.80 < a < 1.00$ m. cal. 18 inc y puerta en lámina cal. 18, que incluyen anticorrosivo, con cerradura doble cilindro, el suministro e instalación de lavadero prefabricado, enchapado de $80 \times 40 \times 60$ apoyado sobre un muro en ladrillo tolete común de $e = 0.10$ m, pañetado y con sus respectivas instalaciones hidrosanitarias, como lo es la salida de agua fría en tubería Pvc de 1/2" T.P. una llave de jardín de 1/2" cromada, un registro de bola soldado Pvc de 1/2" T.P, un punto sanitario o de desagües de 2" y la tubería sanitaria de 2" Pvc T.P, para la conducción de la salida de desagüe hasta el punto final de descarga.
- En la **escuela Nariño 2** se desarrollaron actividades con el fin de restaurar un muro en adobe que se encontraba en condiciones de colapso, para lo cual fue necesario ejecutar actividades de desmonte cubiertas teja de asbesto y/ o asbesto

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 3 de 12

cemento, la demolición de muro en adobe, concreto ciclópeo de 21 MPa (3000 PSI) relación 60C/40P con el fin de nivelar la superficie de cimentación y posteriormente construir el muro que consta de las siguientes actividades; el suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI 420 MPA, concreto para viga de amarre 21 MPa (3000 PSI) sección rectangular, columnas y pedestales en concreto de 21 MPa - (3000 PSI), $H < 3.00$ M. (formaleta madera), muro en ladrillo tolete común de $E = 0.10$ M y viga de amarre sobre muro de 21 MPa - (3000 PSI) y pañete liso muros 1:4, se hace nuevamente el montaje de la cubierta remplazando la madera por el suministro e instalación perfilera metálica para estructura de cubierta de edificaciones. dimensiones y calibres según diseño y finalmente la instalación cubierta en teja fibrocemento.


- En la **escuela canelas** se desarrollaron actividades eléctricas necesarias para adecuar de una manera segura el TGD de las instalaciones, para lo cual se suministró e instaló tablero de distribución monofásico de 4 circuitos y breaker termomagnético monopolar enchufable de 1 X 15/20 AMP; se suministró e instaló una válvula con flotador para tanque elevado 1/2", con flotador en bola plástica con el fin de que el tanque de reversa funcionara correctamente evitando el desperdicio de agua; se suministró e instaló bajante pvc de aguas lluvia. (ref. Amazonas o similar) con el fin de conducir adecuadamente el agua que por precipitación cae a la terraza en donde se encuentra el tanque de reserva y de esta manera evitar que esta se infiltre por el costado posterior de la cocina originando humedad en los muros de la misma; se realizó actividades de demolición de pañetes en mal estado a causa de humedad por capilaridad y se realizó la aplicación de impermeabilizante para muros sika imper mur o similar (3 manos), posterior mente se realizaron actividades de pañete liso muros 1:4 y suministro e instalación de estuco muros; se enchapa el muro del comedor de la cocina con el fin de mejorar su apariencia ante la presencia de deterioro por humedad, en los baños se realiza el suministro e instalación de grifería tanque conjunto hidrostática entrada-salida y llave de jardín de 1/2" cromada y se suministra e instalación de vidrio crudo incoloro de 4.0 mm en el área de la cocina y comedor.
- En la **escuela santa lucia** se desarrollaron actividades de enchape de muro en el área de la cocina, se realizó el suministro e instalación teja de barro de fabricación artesanal con el fin de corregir goteras existentes en la cubierta, y se realizó el suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 6.
- En la **escuela santa lucia** se desarrollaron actividades eléctricas necesarias para adecuar la acometida parcial realizando el suministro e instalación de alimentador parcial monofásico en cable de cobre No.10 AWG (F,N,T). (no incluye tubo PVC)

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 4 de 12

y el suministro e instalación de caja de paso y/o inspección metálica de 15 cm x 15 cm.

Y a manera de suministro dentro del alcance del contrato se suministraron 3 kits internet satelital starlink mini dual band wifi.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

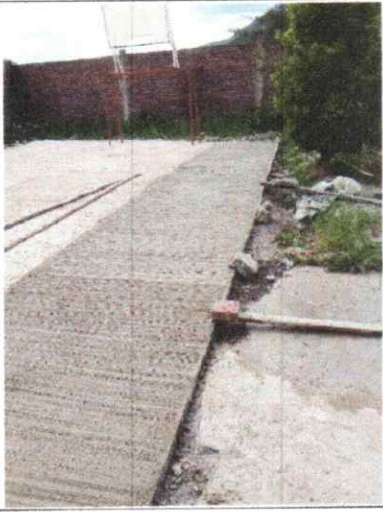ESCUELA COSTA RICA	
Actividades desarrolladas relacionadas con la construcción de la nueva placa deportiva	
	
FOTO N° 1	FOTO N° 2
	
FOTO N° 3	FOTO N° 4

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 5 de 12



FOTO N° 5



FOTO N° 6

Actividades relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento del lavadero prefabricado



FOTO N° 7



FOTO N° 8



FOTO N° 9



FOTO N° 9



FOTO N° 10

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 6 de 12

Actividades relacionadas con el desmonte e instalación de puertas



FOTO N° 11



FOTO N° 12

Actividades de mantenimiento de cubierta



FOTO N° 13



FOTO N° 14

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 7 de 12

Actividades de mantenimiento en Pintura Vinilo tipo II y Esmalte en lamina



FOTO N° 15



FOTO N° 16

ESCUELA NARIÑO 2

Actividades relacionadas con la demolición y construcción de muro de cerramiento



FOTO N° 17



FOTO N° 18




FOTO N° 19



FOTO N° 20

Actividades de mantenimiento en Pintura Vinilo tipo II y Esmalte en lamina

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 8 de 12

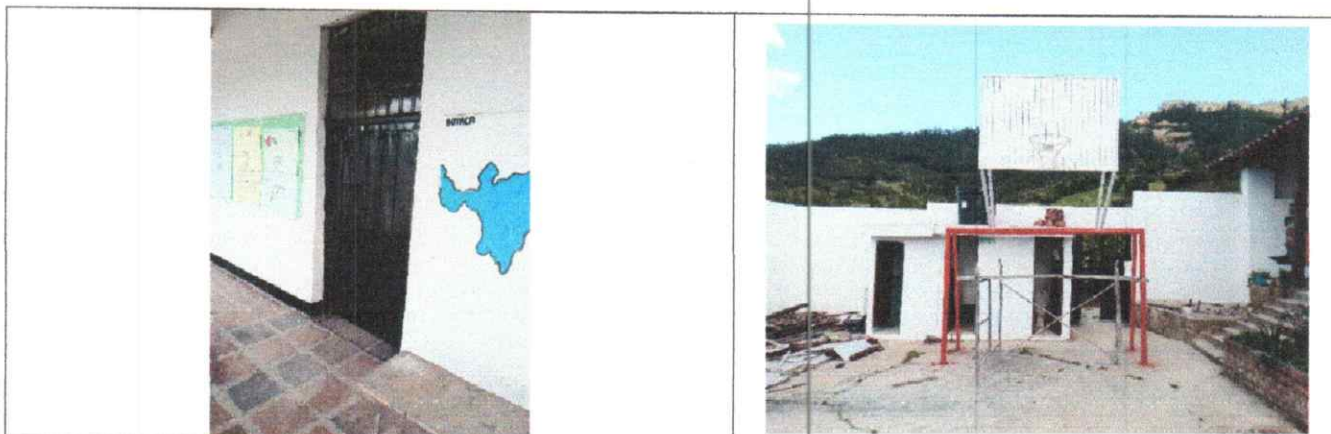

ESCUELA LIBERTADOR

Actividades eléctricas



FOTO N° 21

FOTO N° 22

Actividades de control de agua y humedad



FOTO N° 23

FOTO N° 24

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 9 de 12

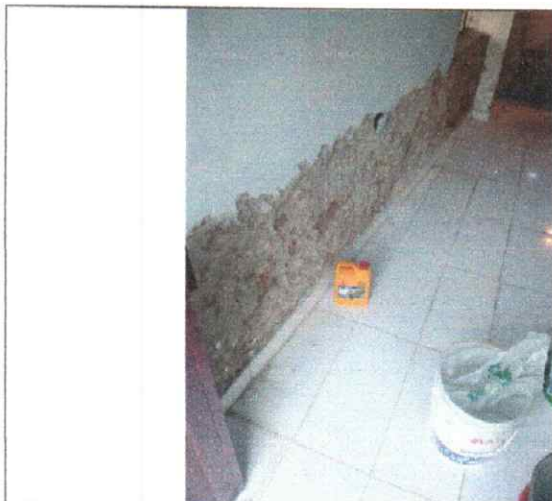


FOTO N° 25



FOTO N° 26



FOTO N° 27



FOTO N° 28

Actividades de mantenimiento en Pintura Vinilo tipo II y Esmalte en lamina



FOTO N° 29



FOTO N° 30

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 10 de 12

ESCUELA CANELAS

Actividades de mantenimiento en Pintura Vinilo tipo II, Esmalte en lámina y enchape



FOTO N° 31



FOTO N° 32



FOTO N° 33



FOTO N° 34

Actividades de mantenimiento de cubierta



FOTO N° 35



FOTO N° 36

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 11 de 12

ESCUELA SANTA LUCIA

Actividades eléctricas



FOTO N° 37



FOTO N° 38

Actividades de mantenimiento en Pintura Vinilo tipo II y Esmalte



FOTO N° 39



FOTO N° 40



FOTO N° 41



FOTO N° 42

	Alcaldía Municipal de Tasco - Boyacá		Código:
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Proceso	Procesos de Apoyo	Versión: 000
	Tipo de Documento	INFORME	Página: 12 de 12

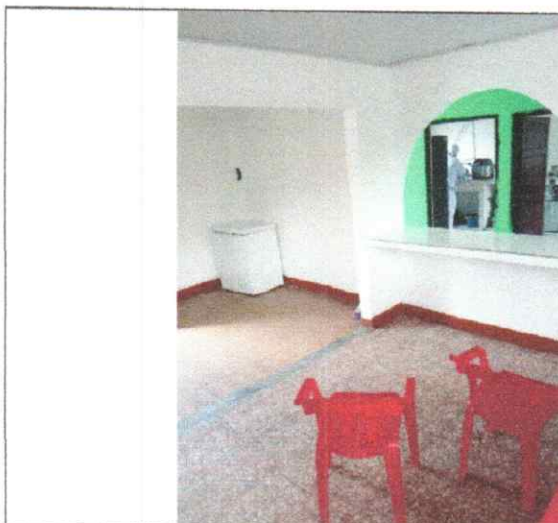


FOTO N° 43



FOTO N° 44

SUMINISTRO

kit internet satelital starlink mini dual band wifi



FOTO N° 45



FOTO N° 46

Durante la ejecución del presente contrato se cumplió con las actividades contempladas sin ninguna eventualidad.

FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
