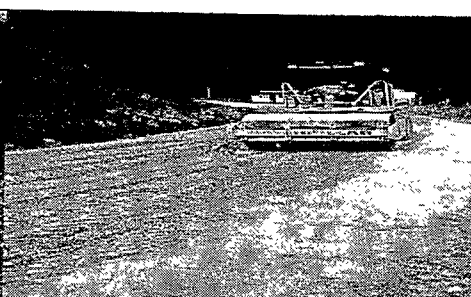
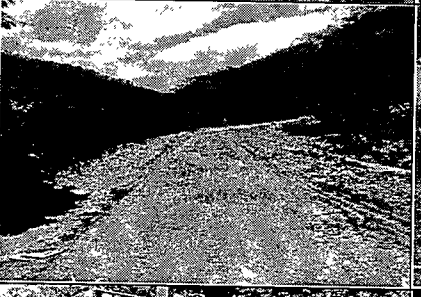



55

 Gobernación de Norte de Santander SECRETARÍA DE VÍAS		GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER SECRETARÍA DE VÍAS INFORME FINAL					
FECHA	12/4/2025	PERIODO INFORME		Thu, 30/10/2025		AL	Wed, 03/12/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	NUMERO DE CONTRATO	CONV-SOLID-002-2025	NUMERO DE CONVENIO	No.02372 -2025	Gobernación Norte de Santander - Municipio de Cucutilla	
OBJETO:		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	247.191.701,00	VALOR ADICIONAL	\$	100.000.000,00	VALOR FINAL CONTRATO	\$ 347.191.701,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 003039 DE 18 JUNIO DE 2025 - 140.000.000,00 No. 003040 DE 18 JUNIO DE 2025 - 60.000.000,00						
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 003003 DE 25 JUNIO DE 2025 - 140.000.000,00 No. 003004 DE 25 JUNIO DE 2025 - 60.000.000,00						
PLAZO EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS			
ALCANCE:	0.125 KM DE PAVIMENTACIÓN DE VIA						
DESEMBOLSOS	N°1	\$	100.000.000,00	DESCUENTOS APLICADOS		PAGOS O DESEMBOLSOS	\$ 100.000.000,00
	N°2	\$	80.000.000,00		\$ 80.000.000,00		
	N°3	\$	120.000.000,00		\$ 120.000.000,00		
	N°4	\$	-		\$		
SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION	N°1	0	REINICIOS	0	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	
	N°2	0		0			
	N°3	0		0			
OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:							
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUESTA RICA		EJECUTOR DE LAS OBRAS		MUNICIPIO DE CUCUTILLA NIT. 800013237-7		
INTERVENTORIA:	-		CONTRATO DE INTERVENTORIA		-		
SUPERVISOR:	Angel Evelio Albarracín Rubio		INGENIERO DE APOYO				
FECHA DE INICIO	7/7/2025		FECHA FIN DE PROYECTO	12/3/2025		TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS)	-1
% AVANCE PROYECTADO	100%		% AVANCE FINANCIERO PROYECTADO	100%			
% AVANCE REAL EJECUTADO	100%		% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	100%			
% ATRASO	0%		% AVANCE FINANCIERO ATRASO	0%			
CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)		ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)		
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE, RASPAO, PERFILADO Y CUNETEO MEDIANTE USO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) PARA LA EDUCACION Y ESTABILIZACION DE LA CAPA SUBRASANTE	KD+000 AL K35+308	100%					




Handwritten signature

MATERIAL DE AFIRMADO CONFORMACION DE CAPA RASANTE e=10 CM, ANCHO PROMEDIO =6M MEDIANTE USO DE MAQUINARIA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EXTENDIDO (MOTONIVELADORA) Y COMPACTADO (VIBROCOMPACTADOR)	K0+000 AL K35+308	10		
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	K0+000 AL K35+308	10		
LIMIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS EXISTENTE	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		

128

	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		

580

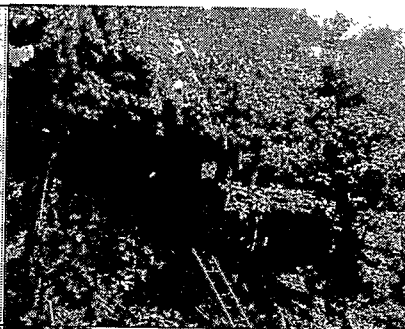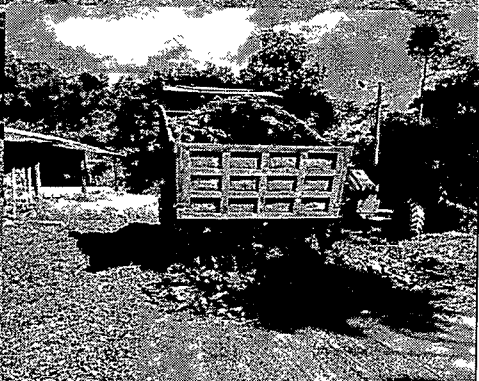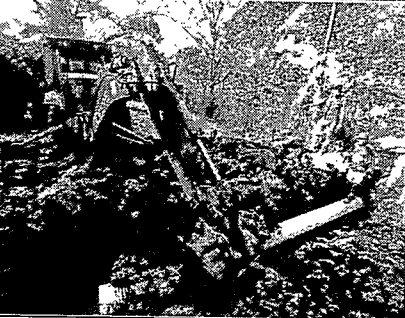	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
	K0+000 AL K35+308	10		
INFORMACIÓN DE SECOP		Al día.		
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				

NOTA

fas



Gobernación
de Norte de
Santander

SECRETARÍA DE VIAS

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE VIAS

INFORME FINAL



FOTO 1 Obra terminada



FOTO 2 Obra terminada




FOTO 3 Obra terminada



FOTO 4 Obra terminada


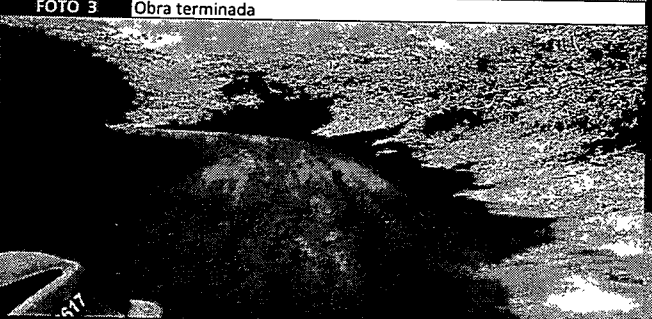


FOTO 5 Obra terminada



FOTO 6 Obra terminada

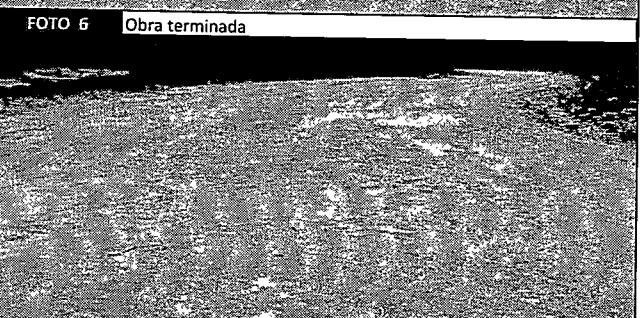

[Handwritten signature]

FOTO 7 Obra terminada

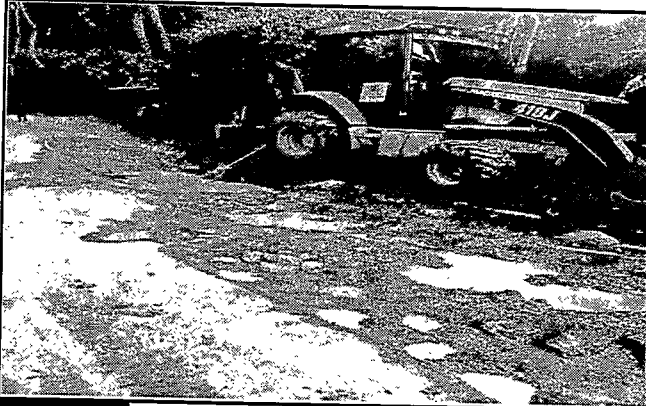


FOTO 8 Obra terminada



FOTO 9 Obra terminada



FOTO 10 Obra terminada



FOTO 11 Obra terminada



FOTO 12 Obra terminada



FOTO 13 Obra terminada

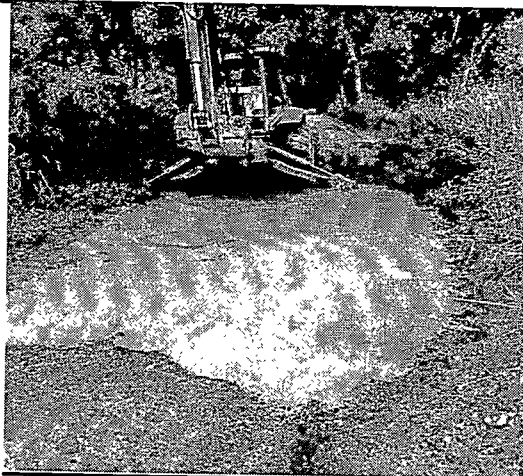


FOTO 14 Obra terminada



[Signature]

INFORME REALIZADO POR

[Signature]

INFORME REVISADO POR
