

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 159 de 2025

1. DATOS DEL INFORME	
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:	09 de diciembre del 2025
INFORME NUMERO:	6
PERIODO EJECUTADO:	Noviembre
VALOR PARA COBRAR:	\$ 2.900.000
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO (Contrato de Prestación de Servicios, Suministro o Compraventa)	Contratos Prestación de Servicios Profesionales
NUMERO DE CONTRATO	159
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONVOTARIA PUBLICA Y EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA Y CONSULTORIA QUE PUEDA LLEGAR A TENER EL HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TITO ANDRES CESPEDES TORRES
IDENTIFICACION	86.062.752 de Villavicencio
FECHA DE INICIO	26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION	25 de noviembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	14.500.000
ADICIÓN 1:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0
PRORROGA 1:	
FORMA DE PAGO	MENSUAL
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO	FRANKLIN SHIRLEY GUZMAN NIETO
ADICIONES O PRORROGAS (Si aplica)	N/A

INFORMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO NOVIEMBRE 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	EJECUTADO DURANTE EL PERIODO		ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIA O SOPORTE
	SI	NO	
Apoyar en cooperación con la secretaria de planeación del municipio de fuente de oro en las actividades relacionadas con la evaluación técnica de las propuestas de las convocatorias públicas No. 01 y las que llegue a sacar la entidad.		X	Se realizo en periodos anteriores.

Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cel: 3175151318
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				

Apoyar las actividades de supervisión tendientes a soportar el seguimiento de la ejecución de la obra ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA LA UNION DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	X		Se continuan haciendo visitas de campo con el fin de verificar las actividades realizadas a la fecha.
Apoyar las actividades de supervisión tendientes a soportar el seguimiento de la ejecución de la interventoria ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA LA UNION DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	X		Se solicita informacion sobre los informes de interventoria que deben presentar mes a mes, de igual manera, cada vez que se hace visita tecnica a las obras se corrobora las actividades que ejerce el personal de interventoria.
Apoyar las actividades de supervisión tendientes a soportar el seguimiento de contratos que pueda desarrollar la entidad relacionados con obra pública.	X		Se presenta informe de avance de actividades del contrato de obra 187 de 2025 y del contrato de obra 208 de 2025.
Revisar los entregables. Productos, en general, los requisitos para el pago y darle su concepto al supervisor.	X		Se recibe la documentación necesaria para iniciar el proceso de pago y liquidación del contrato de obra No. 208 Septiembre De 2025 Mantenimiento De La Infraestructura Fisica Del Hospital Local Primer Nivel Ese Fuentedeoro.
Presentar informes del avance de actividades mensuales con el visto bueno del supervisor.	X		Se presenta el informe mensual correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de la ejecución del contrato de prestación de servicios 159 de 2025.
Las demás actividades que sean atinentes con el objeto contractual.		X	

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

FuentedeOro - Meta, 04 de Noviembre de 2025.

Señor:

HENRY POVEDA REINA

Auxiliar Administrativo de Almacén.

Hospital de Fuentedeoro - Meta

Ciudad.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 248 de 2025, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE LA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO".

Asunto: Solicitud de documentos:

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos su colaboración haciendonos llegar la siguiente información, con el fin de supervisar la ejecución de las actividades del contrato de interventoría N° 248 de 2025.

- Hoja de vida del director de interventoría (dedicación 30%) quien deberá ser Profesional de la Ingeniería Civil o Arquitecto con Especialización. Dicho profesional deberá estar afiliado al sistema de seguridad social bien sea como independiente o como dependiente, salvo que la ARL siempre deberá estar en cabeza del contratista.
- Hoja de vida del residente de interventoría (dedicación 100%) quien deberá ser Profesional de la Ingeniería Civil con especialización en gestión de proyectos. Dicho profesional deberá estar afiliado al sistema de seguridad social en cabeza del contratista como dependiente.
- Hoja de vida del inspector de interventoría (dedicación 100%) quien deberá ser técnico en construcción de edificaciones, curso de formación en interventoría de obras. Dicho profesional deberá estar afiliado al sistema de seguridad social en cabeza del contratista como dependiente.
- Programación de Obra Inicial aprobada por la interventoría con fecha de inicio 31 de octubre de 2025.

Así mismo me permito informarle que en la presentación de los informes mensuales, informes para cobros de actas parciales y para informe final deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

EVIDENCIA No 01: Se solicita información al Supervisor del contrato de obra 241 de 2025 y del contrato de interventoría los contratos de obra e interventoría 248 de 2025 para el mantenimiento del puesto de Salud de la cooperativa, con el fin de ejercer mis funciones de apoyo oportunamente, ya que se dio inicio a ambos contratos.

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			




CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S
NIT: 901120902-2

Fuentedeoro, 10 de noviembre de 2025

Señores
CONSORCIO INTERVENTORÍA SL
R/L Deisy Yamile Duran Rincón

Asunto; SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA NO. 187 DE 2025

Objeto: Adecuación y mejoramiento del Centro de Salud ubicado en la vereda La Unión del Ariari del municipio de Fuentedeoro, departamento del Meta

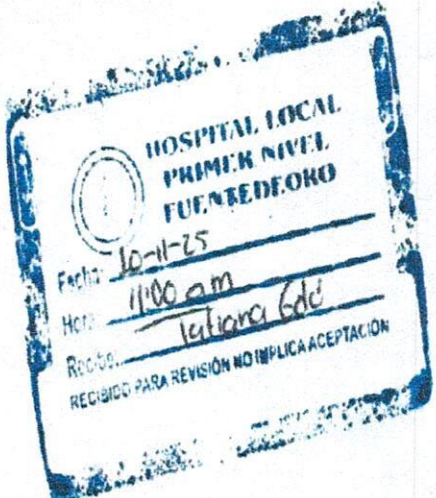

EVIDENCIA No 02: Se revisa información correspondiente a la solicitud de prórroga del contrato de obra 187 de 2025, cuyo objeto es la Adecuación y Mejoramiento del Centro de Salud ubicado en la vereda La Unión del Ariari del Municipio de Fuentedeoro Departamento del Meta.

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			

	FORMATO OFICIOS	Código	HDF-F3	
	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FUENTEDEORO NIT 822001570-3	Versión	1	
		F/Actualización	19/05/2020	



ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3

Proyecto: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA LA UNION DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Contrato de Obra No.: 187-2025
Contratista: CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS - INTERCONSTRUCOL SAS.
Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA SL

Fecha: 07 de noviembre de 2025
Lugar: Unión del Ariari

1. ASISTENTES

Nombre	Cargo / Entidad	Firma
ING. FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	R/L CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS - INTERCONSTRUCOL SAS	
ING. FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	DIRECTOR DE OBRA	
DEISY YAMILE DURAN RINCON	R/L CONSORCIO INTERVENTORIA SL	
ING JAIRO ZAMBRANO ORDONEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	
ING TITO ANDRES CESPEDES TORRES	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FRANKLIN SHIRLEY GUZMAN NIETO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN	

2. ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum.
- Revisión del avance físico y financiero.
- Problemas, riesgos y hallazgos.

EVIDENCIA No 03: Se realiza comité técnico para el contrato de obra 187 de 2025, cuyo objeto es la Adecuación y Mejoramiento del Centro de Salud ubicado en la vereda La Unión del Ariari del Municipio de Fuentedeoro Departamento del Meta, con el propósito de evaluar el estado actual de las obras y el tiempo restante para terminar todas las actividades en campo, y determinar si se amplía el plazo de ejecución.

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				

	FORMATO OFICIOS		Código	HDF-F3	
	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FUENTEDEORO NIT 822661570-3		Versión	1	
			F/Actualización	19/05/2020	

Fuentedeoro - Meta, 11 de noviembre de 2025.

Señores:

CONSORCIO INTERVENTORIA SL
R.T. DUSY YAMILE DURAN RINCON
Calle 6 No. 5-24
Puerto Ileras - Meta.

Referencia: Contrato de interventoría 200 de agosto de 2025, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA UNION DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO"

Asunto: Solicitud de informes de interventoría.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito recordarle que dentro de las obligaciones del contrato de interventoría 200 de agosto de 2025, dentro de las cuales se encuentra la presentación de un informe de avance mensual de las obras objeto de la interventoría, donde se pueda constatar la ejecución de las obras, así como los diferentes controversias presentadas y la solución que se le dio a cada una de ellas.

De igual forma solicitamos hacemos llegar las planillas de pago de seguridad social del personal de interventoría y del personal de obra, anexando un formato donde se verifique y constate que las planillas de seguridad social aportadas por el contratista de obra, fueron revisadas y verificadas, el cual deberá contener como mínimo:

Nombre	Cedula	Cargo	Dias cotizados	ARL	EPS	PENSION	# PLANILLA ARL	# PLANILLA Salud/pensión

Así mismo aun no han hecho llegar el primer informe de interventoría con las correcciones solicitadas. Finalmente les recordamos que toda información solicitada por la supervisión deberá ser radicada mediante oficio y entregada con consecutivo en las instalaciones del Hospital Local Primer Nivel ESE, Fuentedeoro.

Agradezco la atención a la presente y a la espera de recibir la información para poder revisarla.

Atentamente



SHIRLEY GUZMAN NIETO
Aux. Administrativo de Dirección
3134795365



TITO ANDRES CESPEDES TORRES
Ing. Civil Apoyo a la supervisión
CPS 159 de junio de 2025.

1
Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cef. 3134795365
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com
administracion@hospitalfuentedeorometa.gov.com

EVIDENCIA No 04: Se continua con la supervision al contrato de interventoria 200 de 2025, cuyo objeto es realizar la Interventoria Tecnica, Administrativa, financiera y Ambiental a la Adecuacion y Mejoramiento del Centro de Salud ubicada en la vereda La Union del Ariari del Municipio de Fuentedeoro Departamento del Meta.

Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cef: 3175151318
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			

INGENIERO CIVIL
TITO ANDRES CESPEDES TORRES

Fuentedeoro 12 de noviembre de 2025.

Doctora:

FRANKLIN SHIRLEY GUZMAN NIETO

Supervisor contrato interventoría N° 200 de 2025.

Hospital de Fuente de Oro

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra 187 de julio de 2025, cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA LA UNIÓN DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Aprobación prorroga en tiempo por un mes.

Por medio de la presente y una vez analizada la solicitud de prorroga avalada por la interventoría en cabeza del CONSORCIO INTERVENTORIA SL. cuya representante legal es Deisy Yamile Durán Rincón mediante el contrato de interventoría 200 de agosto de 2025, en mi calidad de ingeniero civil y ejerciendo mis funciones de apoyo a la supervisión veo viable tramitar una prórroga en tiempo por un (01) mes calendario, contados a partir de la fecha de terminación inicial del contrato la cual estaba pactada para el día 18 de noviembre del 2025.

Agradezco la atención a la presente y en espera de que se realice el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente



TITO ANDRÉS CESPEDES TORRES

Ing. Civil Apoyo a la supervisión

CPS 159 de junio de 2025.

EVIDENCIA No 05: Se aprueba solicitud de prorroga del contrato de obra 187 de 2025, por un mes contado a partir del 18 de noviembre de 2025 y fecha final de todas las actividades el día 18 de diciembre de 2025.


Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cef: 3175151318
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			

CONSORCIO INTERVENTORIA SL

Fuentedeoro, noviembre de 2025

Señores
HOSPITAL LOCAL DE FUENTEDEORO ESE
FRANKLIN SHIRKLEY GUZMAN NIETO
 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Contrato de Interventoría No. 200-2025
 Municipio de Fuentedeoro – Meta
 E. S. D.



Asunto: Aval del Informe de Obra presentado por el Contratista – Periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025.

Ref: Contrato de Obra No. 187-2025, Objeto: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA VEREDA LA UNIÓN DEL ARIARI DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 200-2025, cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la adecuación y mejoramiento del Centro de Salud ubicado en la vereda Unión del Ariari del Municipio de Fuentedeoro", me permito informar que se llevó a cabo la revisión detallada del Informe de Obra presentado por el contratista **CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S.**, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2025 y el 18 de septiembre de 2025.


EVIDENCIA No 06: Se revisa y aprueba el informe mensual de obra corregido entregado por el Consorcio Interventoria SL respecto a la ejecución de las obras del contrato 187 de 2025.

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO

CONTRATO DE OBRA NO 208 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CAPÍTULO		UNIDAD MED	DESCRIPCION	DIMENSIONES		FECHA	
Item	Med			Longitud (m)	Alto (m)	cantidad (un)	Medida Total
PASADIZO EXTERIORES							
2.70	M2	ESTUCCO PLASTICO	LABORATORIO E INCUBADORA				
			Localización				
			ALMACEN	2.31	2.40		5.55
			DESCUENTO VANO PUERTA	0.51	2.40		1.27
			DESCUENTO VANO VENTANA	1.30	0.58		0.73
			TOTAL ALMACEN				6.55
			MURO PACHOGA BANO	0.20	2.40		12.95
			DESCUENTO VANO PUERTA	2.10	2.45		5.15
			TOTAL MURO				7.80
			MUROS LABORATORIO	9.04	2.40		22.51
			DESCUENTO VANO PUERTA	1.94	2.45		2.05
			TOTAL MURO				19.96
			SALONES	3.85	2.48		23.79
			DESCUENTO VANO VENTANA	2.90	1.49		2.99
			TOTAL MURO SALONES				26.80
			MUROS LABORATORIO 2	15.09	2.49		37.57
			DESCUENTO VANOS	1.25	1.40		1.75
			DESCUENTO VANOS	2.94	1.08	2.00	5.10
			TOTAL MURO LABORATORIO 2				39.99



EVIDENCIA No 07: Se revisa la documentación y memorias de calculo para la liquidacion del contrato de obra 208 de 2025 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				




EVIDENCIA No 08: continuacion de pañete y primera mano de pintura vinilo puesto de salud de la Union.




	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				

EVIDENCIA No 09: Instalacion de piso en baldosa grano marmol puesto de salud de la Union.

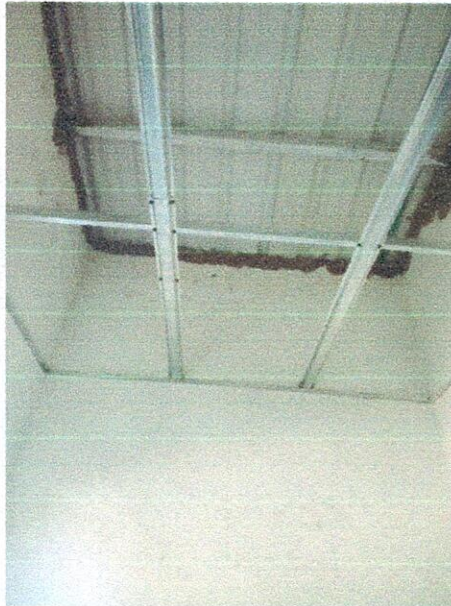

EVIDENCIA No 10: Instalacion de estructura para cielo raso. puesto de salud de la Union.

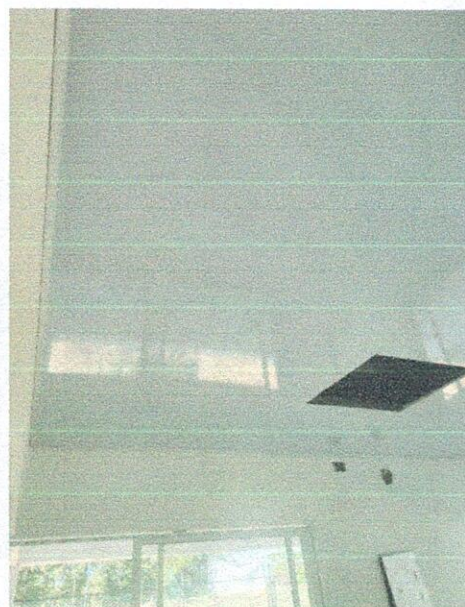

Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cel: 3175151318
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO	Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			

EVIDENCIA No 11: Instalacion de cielo raso en PVC en el puesto de salud de la Union.



EVIDENCIA No 12: Instalacion de valla informativa del contrato de obra 241 de octubre de 2025, cuyo objeto es Adecuacion Menor Del Puesto De Ssalud Ubicado En El Centro Poblado La Cooperativa Del Municipio De Fuentedeoro Departamento Del Meta. De igual forma se inician las actividades de demolicion.



Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
Cel: 3175151318
admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com

	HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO		Código	HDF-CONT	
	PROCESO DE CONTRATACION				
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO				

EVIDENCIA No 13: Demolicion de baldosa, enchape, muros en el puesto de salud de la cooperativa.

Se anexa formato de verificación pago de seguridad social No **91333028**, del mes de noviembre del 2025, entregada por el contratista


4. RESUMEN FINANCIERO

CDP N:	000403	RP N:	000607
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO		14,500,000	
VALOR DE LA ADICIÓN 1		3,383,333	
RP : 001116	CDP: 000839		
VALOR DE LA ADICIÓN 2		0	
TOTAL, DEL CONTRATO		17,883,333	
No. INFORME	PERIODO	NUMERO DE FACTURA	VALOR MENSUAL
1	JUNIO	159 - N 01	483,335
2	JULIO	159-02	2,900,000
3	AGOSTO	159-03	2,900,000
4	SEPTIEMBRE	159-04	2,900,000
5	OCTUBRE	159 - 05	2,900,000
6	NOVIEMBRE	159-06	2,900,000
VALOR TOTAL, EJECUTADO			14,983,335
VALOR NO EJECUTADO			2,899,998
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR			2,899,998

5. Cumplimiento de Actividades

El supervisor, certifica que el contratista cumplió con las actividades contratadas para el periodo del **01 al 31 de mes noviembre de 2025**, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios No. **159 de 2025** según informe presentado por el contratista.

La presente se expide a los **nueve (09) días de mes de diciembre 2025**. En constancia de lo anterior, firma el presente informe el supervisor del contrato.


 SHIRLEY GUZMAN NIETO
 Supervisora

Carrera 14 # 14-36 Barrio Las Brisas
 Cel: 3175151318
 admon.hospitalfuentedeoro@gmail.com
