



ACTA DE RECIBO FINAL DE EQUIPOS PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA  
CONTRATO No. FLT-065-2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
No. DE CONTRATO	FLT-065-2025									
OBJETO	COMPRA E INSTALACIÓN DE LINEA SEMIAUTOMATIZADA PARA LA PRODUCCION DE AGUARDIENTE DE LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA.									
CONTRATANTE	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA									
NIT	890.704.763-2									
CONTRATISTA	DODONA S.A.S									
C.C	830.134.654-3									
REPRESENTANE LEGAL	NELSY PIEDAD BARRETO MONTEALEGRE									
C.C.	65.738.045									
VALOR INICIAL	\$1.518.778.139 IVA INCLUIDO									
FECHA DE INICIO	13 de mayo del 2025									
ADICION No 1	<p>Que, mediante Otrosí adición N.º 01, Se adiciono al contrato inicial, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A la <b>CLÁUSULA SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO:</b> La suma de setenta y cuatro millones setecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos <b>\$74.737.950 IVA INCLUIDO.</b></li><li>a la <b>CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b> Adicionar el certificado de disponibilidad presupuestal No.2025000500 de fecha del 24 de noviembre del 2025.</li><li>a la <b>CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b> Adicionar el certificado de disponibilidad presupuestal No.2025000500 de fecha del 24 de noviembre del 2025.</li><li>a la <b>CLAUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,</b> los siguientes items:</li></ul> <table border="1"><tbody><tr><td>15</td><td>Bomba de trasiego para aguardiente</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>Filtro línea de llenado</td><td>1</td></tr><tr><td>17</td><td>Filtro para bomba de lavado</td><td>1</td></tr></tbody></table>	15	Bomba de trasiego para aguardiente	1	16	Filtro línea de llenado	1	17	Filtro para bomba de lavado	1
15	Bomba de trasiego para aguardiente	1								
16	Filtro línea de llenado	1								
17	Filtro para bomba de lavado	1								
VALOR ADICIÓN	\$74.737.950									
VALOR TOTAL	\$1,593,516,089									
FORMA DE PAGO	<p>Se realizarán tres (3) pagos así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Un (1) pago una vez se suscriba el acta de inicio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato a título de anticipo <u>Garantizado conforme al Artículo Cuadragésimo Séptimo. Punto Segundo. Acuerdo No. 01 del 28 de febrero de 2025, Manual de Contratación de la Fábrica de Licores del Tolima.</u></li><li>Un segundo (2) pago una vez lleguen los equipos y sean recibidos en las instalaciones de la fábrica de licores del Tolima, consistente en el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</li><li>Un tercer (3) pago una vez se instalen los equipos y se entreguen a plena satisfacción y en funcionamiento en las instalaciones de la fábrica de licores del Tolima, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor</li></ul>									



**ACTA DE RECIBO FINAL DE EQUIPOS PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA  
CONTRATO No. FLT-065-2025**

total del contrato.

Que el 13 de diciembre de 2025, se suscribió acta de recibo parcial de equipos, que hacen parte de la ejecución del contrato No FLT-065-2025, que, en la mencionada acta, quedaron pendiente de entrega los ítems 2,7,10 y 14 de las especificaciones técnicas.

Que hoy tres (03) de febrero de 2026, en la ciudad de Ibagué, en las instalaciones de la Fábrica de Licores del Tolima, se suscribe la presente **ACTA DE RECIBO TOTAL DE EQUIPOS**, conforme a la siguiente información que se detalla a continuación:

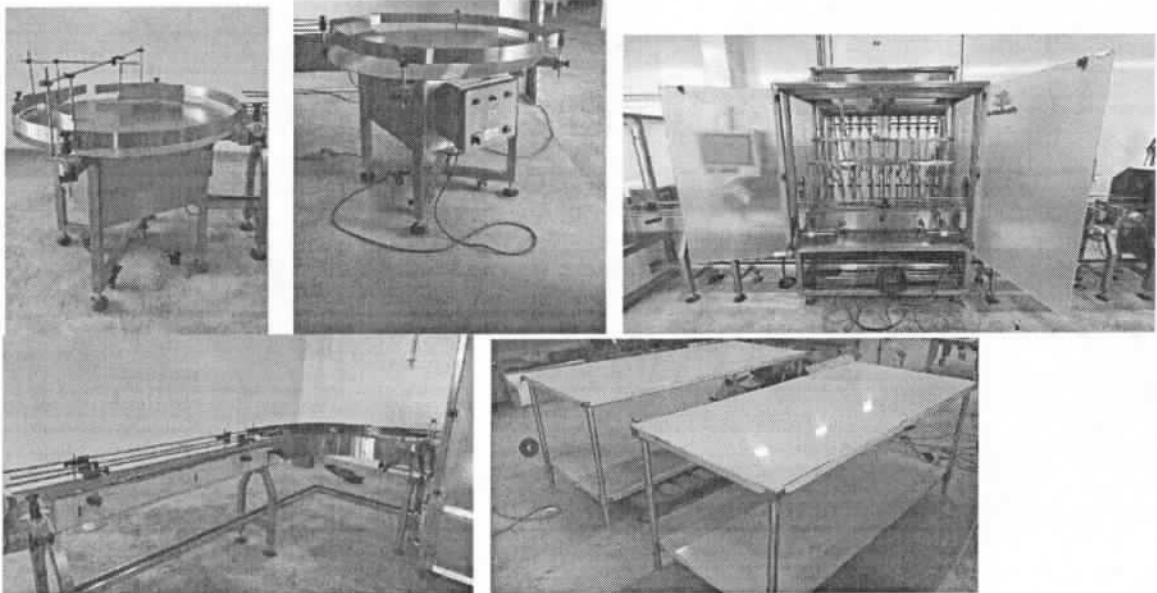
**1. ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ITEM	CANT	DESCRIPCION ELEMENTOS	RECIBIDO	OBSERVACIONES
2	1	Sistema de lavado de envases	SI	
7	1	Inserción de corcho y tapa guala neumática (Taponadora).	SI	
10	1	Túnel de secado	SI	
14	1	Instalación, capacitación y puesta en marcha	SI	

**2. OBSERVACIONES**

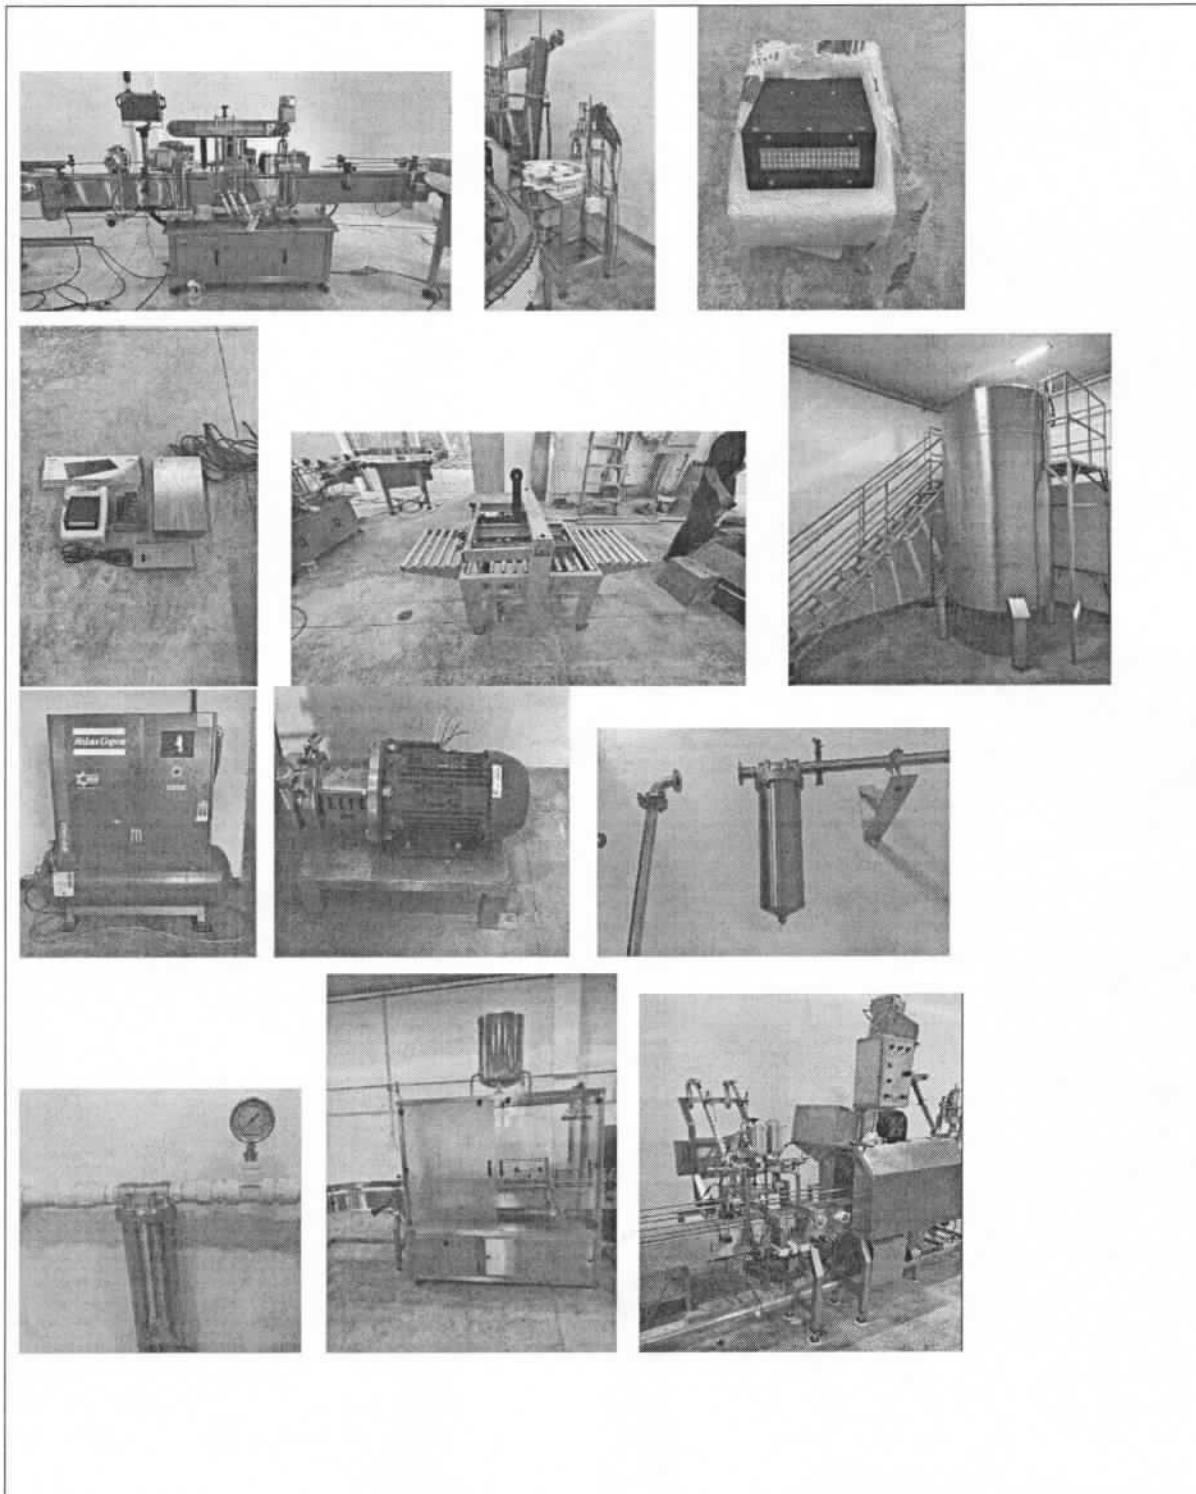
- Que, conforme a lo anterior, **DODONA S.A.S.** realizó la entrega de los ítems 2,7,10 y 14 en ese último ITEM, estableció la "capacitación" la cual ya fue capacitado el personal del área de producción y se hizo entrega de los manuales de manejo y mantenimientos.

**3. EVIDENCIA FOTOGRAFICA**





ACTA DE RECIBO FINAL DE EQUIPOS PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA  
CONTRATO No. FLT-065-2025



15/11



**ACTA DE RECIBO FINAL DE EQUIPOS PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA  
CONTRATO No. FLT-065-2025**

**4. CONSTANCIA**

- Que, en atención a la forma de pago establecida contractualmente, la cual dispone: "Un tercer (3) pago una vez se instalen los equipos y se entreguen a plena satisfacción y en funcionamiento en las instalaciones de la fábrica de licores del Tolima, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato", se constata el cumplimiento de la condición allí prevista, en tanto se ha efectuado la recepción física de los equipos entregados, sin perjuicio de las verificaciones técnicas, funcionales y de puesta en marcha pendientes
- Que, el Subgerente de Producción y la Subgerente Administrativa, en su calidad de supervisores del contrato, dejan constancia de que los elementos recibidos corresponden a las Especificaciones Técnicas establecidas en la cláusula séptima del contrato inicial, así como a las modificaciones introducidas mediante la cláusula cuarta del Otrosí N.º 01.
- Se deja constancia que el contratista de apoyo al Area Administrativa Manuel Santiago Ossa Zamora (Ingeniero Mecánico), hace entrega del informe del recibo de los elementos pendientes de entrega verificando las especificaciones técnicas de estos. Además, en el mismo, deja constancia de la puesta en marcha y funcionamiento de la totalidad de los elementos de la nueva línea de producción.

**5. BALANCE CONTRACTUAL PARA LA PRESENTE ACTA**

ITEM	CANT	DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
2	1	Sistema de lavado de envases	218.113.207,55	259.554.716,98
7	1	Inserción de corcho y tapa guala neumática (Taponadora).	52.075.471,70	61.969.811,32
10	1	Túnel de secado	26.415.094,34	31.433.962,26
14	1	Instalación, capacitación y puesta en marcha	54.716.981,13	65.113.207,54
				<b>418.071.698,12</b>

VALOR CONTRATO INICIAL	1.518.778.139,00
VALOR ADICION	74.737.950,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.593.516.089,00
VALOR FACTURA DO 1541	1.175.444.391,38
PAGO ANTICIPADO VALOR INICIAL (50%)	759.389.069,50
VALOR FACTURA DO 1565	418.071.697,59
SALDO A CANCELAR DE LA FRA 1541	63.422.004,47
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	481.493.702,06

Que, la presente acta se suscribe en observancia de los principios de buena fe contractual, de conformidad con lo



**ACTA DE RECIBO FINAL DE EQUIPOS PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA  
CONTRATO No. FLT-065-2025**

dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 1603 del Código Civil, normas que rigen la ejecución de los contratos y las actuaciones de las partes.

Para constancia se firma en Ibagué, a los tres (3) días del mes de febrero de 2026.

Contratante,


  
**JHON JAIRO URIBE BOTERO**  
Subgerente Producción

  
**MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ**  
Subgerente Administrativa

Contratista,

  
**NELSY PIEDAD BARRETO MONTEALEGRE**  
Representante legal de DODONA S.A.S

  
**ALVARO CAICEDO BARRETO**  
Representante empresa DODONA SAS

Blanca Ena Barrajan Toro   
Abogada Externa (C)

Manuel Santiago Ossa Zamora Manuel Ossa  
Ingeniero Civil (C)

*Handwritten mark*



**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)**

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

INFORME TÉCNICO DE RECIBO DE ELEMENTOS PENDIENTES Y PUESTA EN MARCHA DE LA  
LINEA SEMIAUTOMATICA PARA LA PRODUCCION DE AGUARDIENTE DE LA FABRICA DE  
LICORES DEL TOLIMA CONTRATO No. FLT-065-2025.

Ibagué, Tolima  
03/02/2026

Elaborado por:  
Manuel Santiago Ossa Zamora  
Ingeniero Mecánico  
Contratista

Aprobado por:  
María Norelly Brragan Méndez  
Subgerente administrativa



**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO**  
**No. FLT-065-2025**  
**(03/02/2026)**

### Introducción

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la **entrega final de los equipos** suministrados e instalados en el marco del contrato No. FLT-065-2025, conforme a los requerimientos técnicos y operativos establecidos. Así mismo, se verifica que los equipos entregados se encuentran en **condiciones óptimas de funcionamiento**, debidamente instalados para su operación por parte de la Fábrica de Licores del Tolima para la producción de aguardiente.

### Objetivos

- Documentar formalmente la entrega de los equipos, junto a su capacitación y puesta en marcha.
- Relacionar los equipos suministrados.
- Verificar el estado físico y funcional de cada equipo.
- Dejar evidencia del cumplimiento de los requisitos técnicos y del contrato.
- Servir como apoyo y soporte para la aceptación final por parte de la Fábrica de Licores del Tolima.

### Relación de equipos entregados

A continuación, se detallan los equipos incluidos en la entrega final:

Ítem	Equipo	Estado	Instalación
1	Sistema de lavado de envases	Operativo	Si
2	Sistema de inserción de corcho y tapa guala neumático (Taponadora)	Operativo	Si
3	Túnel de secado	Operativo	Si

### Estado de entrega y verificación

Todos los equipos fueron entregados bajo las siguientes condiciones:

- Instalación completa según especificaciones técnicas.
- Sin daños físicos visibles.
- Pruebas básicas de funcionamiento realizadas.
- Accesorios y componentes completos.
- Puesta en marcha de las diferentes presentaciones.



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

Checklist de entrega y verificación

Ítem	Criterio de verificación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
1	Equipo correctamente instalado	SI	
2	Conexiones eléctricas/neumáticas seguras	SI	
3	Funcionamiento probado	SI	
4	Sin golpes, fisuras o daños visibles	SI	
5	Manuales / documentación entregados	SI	
6	Instalación, capacitación y puesta en marcha	SI	

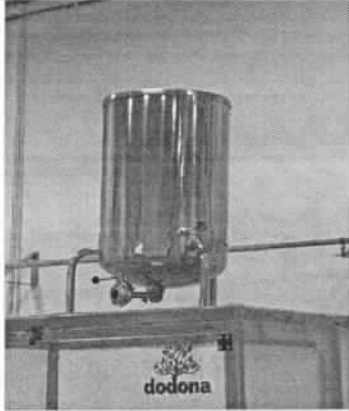
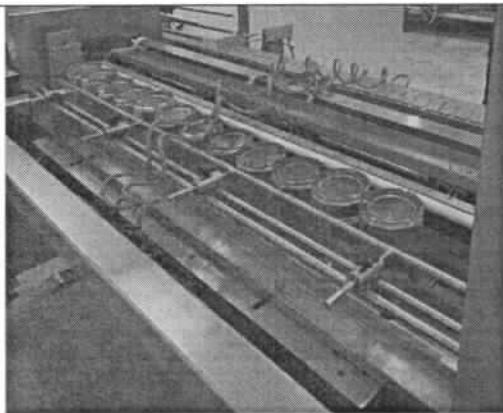
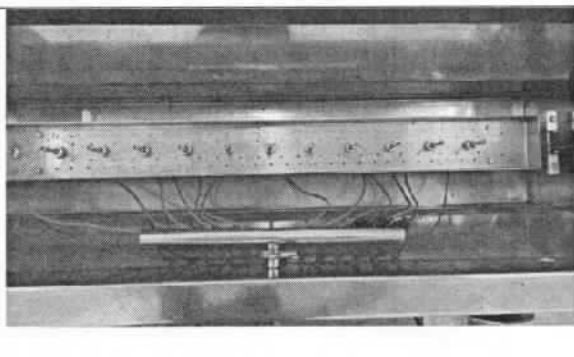
Especificaciones técnicas y verificación de los equipos entregados

Especificaciones Técnicas de los Equipos Entregados	Descripción del ítem	Recibido (Si/No)
<b>Equipo 1: Sistema de lavado de envases</b> 	Pedestal en platina calibre de 1/2 en acero inoxidable 304 graduable para varios formatos.	SI

15



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		Tanque de almacenamiento de 100 litros superior redondo cerrado en acero inoxidable 304 calibre 14.	SI
		Guía neumática en varilla de ½ para guía de botellas.	SI
		Sistema lineal con 12 boquillas de presión de agua para lavado.	SI

15



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

	Tanque inferior de 50 litros	SI
	Tubería de boquillas de lavado en acero inoxidable en 1/2"	SI
	Bomba de trasiego de 1 HP a 220 V	SI

Handwritten signature or initials.



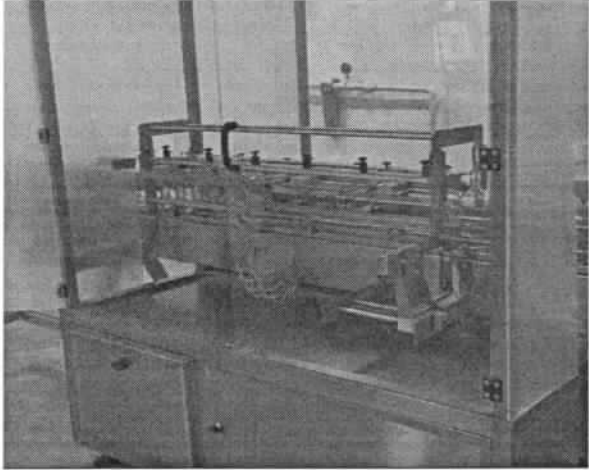
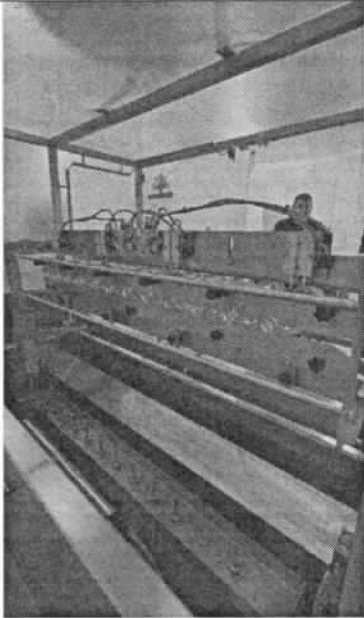
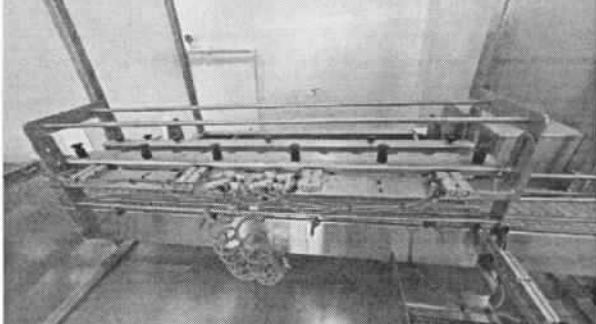
INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		Filtración de partícula por mechs 36	SI
		Retorno de agua a tanque inferior de 50 litros	SI
		Mangueras accesorios	y SI

12



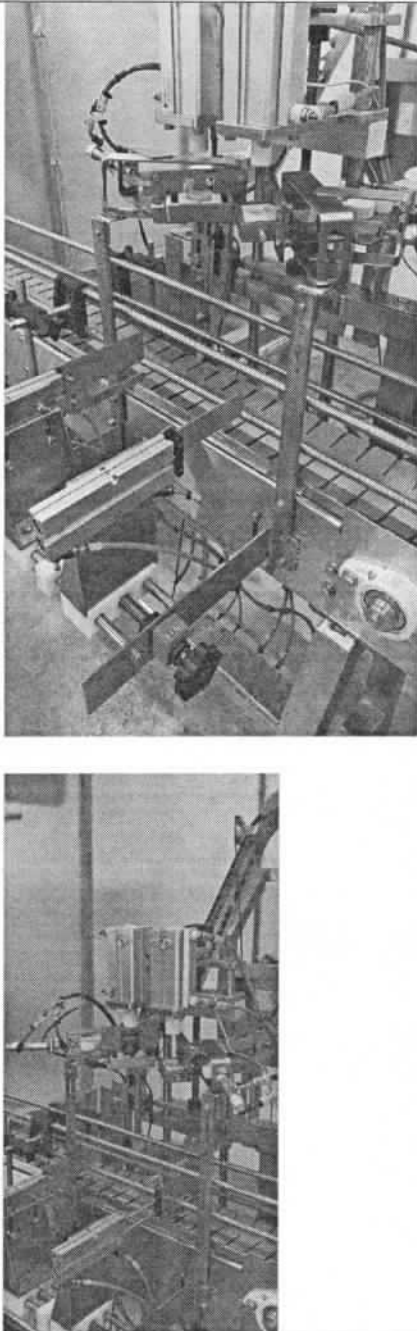
INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

	Encabinada	SI
	Sistema de sujeción	SI
	Fabricada en materiales resistentes a la corrosión (acero inoxidable)	SI

*Handwritten signature*



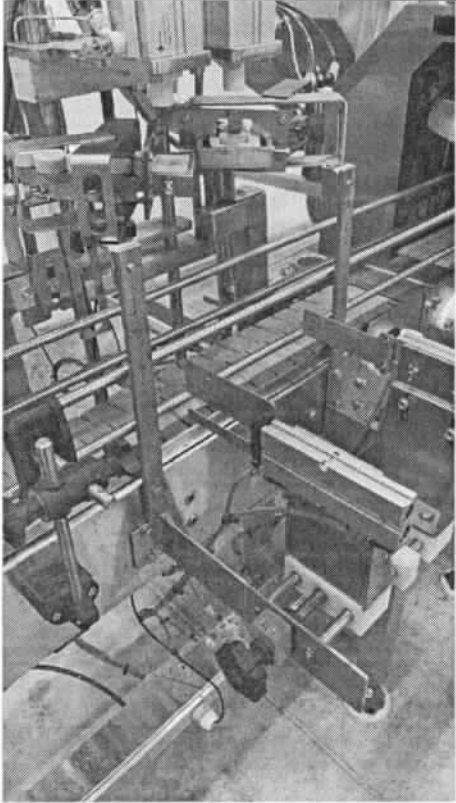
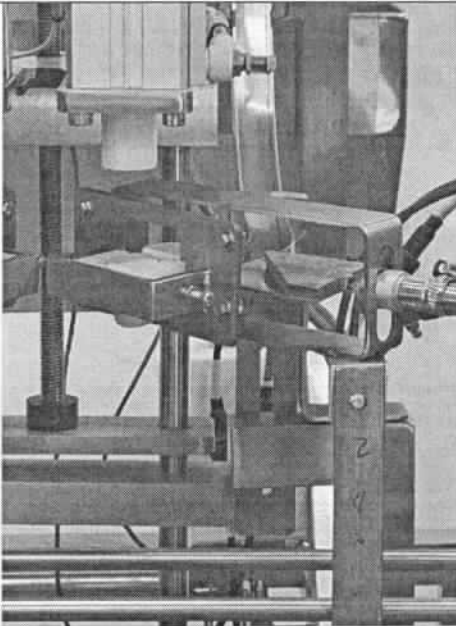
INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

Equipo 2: Sistema de insercion de corcho y tapa guala neumatico	Descripción del ítem	Recibido (Si/No)
	Banda Transportadora	SI

*Handwritten signature or initials.*



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		Barandillas laterales	SI
		Sistema neumático de inserción de corchos y tapa guala	SI

*Handwritten signature or mark.*



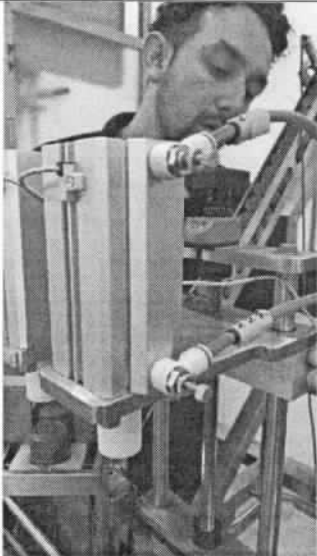

INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		Postura manual	SI
		Guías para formatos de envases	SI

*Handwritten signature or initials.*


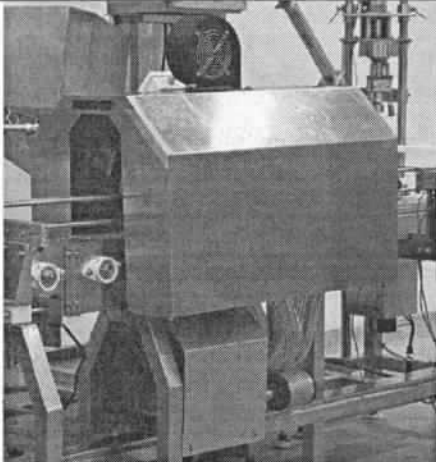


INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

	Cilindro neumático taponador de inserción	SI
	Sensores	SI
Equipo 3: Tunel de secado	Descripción del ítem	Recibido (Si/No)



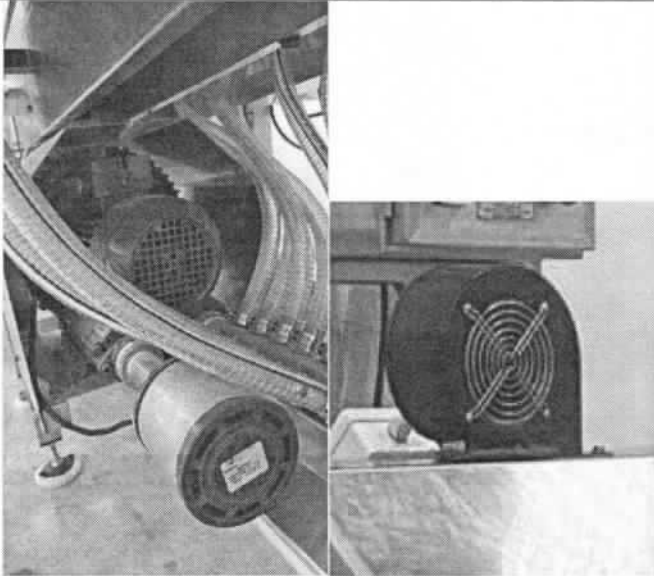
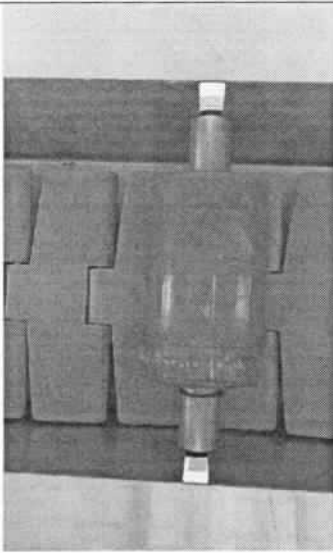
INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		Banda transportadora de 1.5 metros	SI
		Túnel de secado en lamina acero inoxidable 304 cal 16	SI

Handwritten signature or initials.


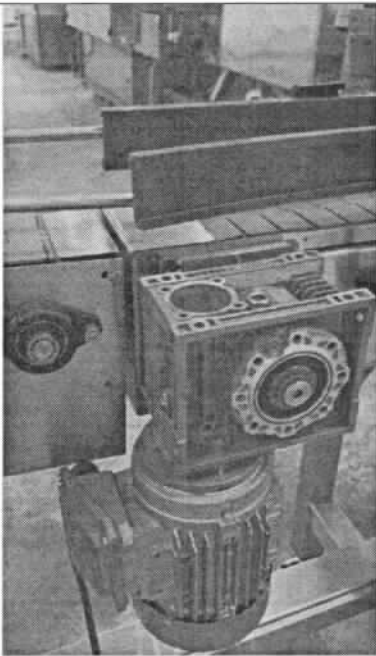


INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

	2 turbinas de secado	SI
	4 tensores en polietileno de alta	SI
	Banda Tableé de 3" 1/2	SI



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

		6 metros de barandilla para guías con accesorios	SI
		Moto reductor de ½ hp a 60rpm	SI

**Instalación, capacitación y puesta en marcha**

Se ejecutaron las actividades de **instalación, integración y configuración** de los sistemas mecánicos, neumáticos y de control asociados a los equipos entregados. Evidenciado en la descripción técnica de los equipos a entregar.

42



**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)**

Así mismo, se realizó la **capacitación técnica al personal designado**, enfocada en la operación, ajustes y seguridad industrial.

La **puesta en marcha** se efectuó durante el siguiente proceso:

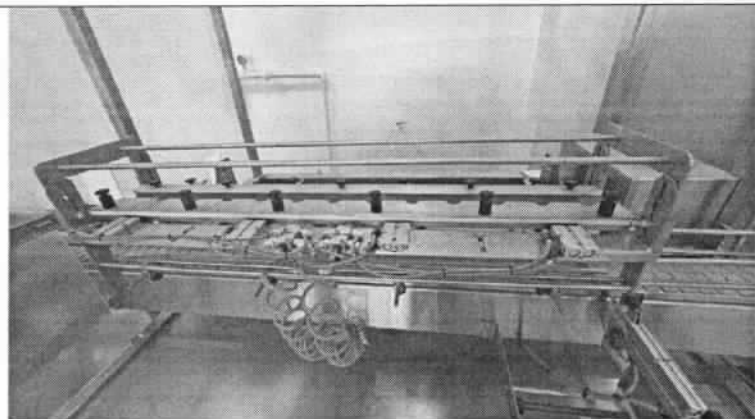
1. Alimentación tornamesa con las botellas del producto correspondiente a producción.
2. Flujo de botellas a través de la banda transportadora a los diferentes procesos.
3. Proceso de lavado interno de las botellas.
4. Proceso de inyección del producto a través de las boquillas alimentadas por el tanque superior.
5. Proceso de taponado por medio de corcho o guala. (Si aplica a la presentación).
6. Proceso de dispensación de tapas tipo Pilfer de 38mm por medio del elevador y tobogán, como consiguiente su debido roscado. (Si aplica a la presentación)
7. Proceso de secado a través del túnel de secado.
8. Proceso de codificado.
9. Proceso de etiquetado para el producto (Si aplica a la presentación)
10. Acumulación en el tornamesa final de la línea de producción.
11. Liberación del producto final del tornamesa a las mesas de acero inoxidable.
12. Proceso de encintado de las cajas con el producto final.

Se efectuó la **puesta en marcha bajo condiciones controladas**, validando parámetros operativos, respuesta de los actuadores y funcionamiento adecuado de los sistemas de seguridad y control. Esta se encuentra evidenciado en registro fotográfico.

### Evidencias

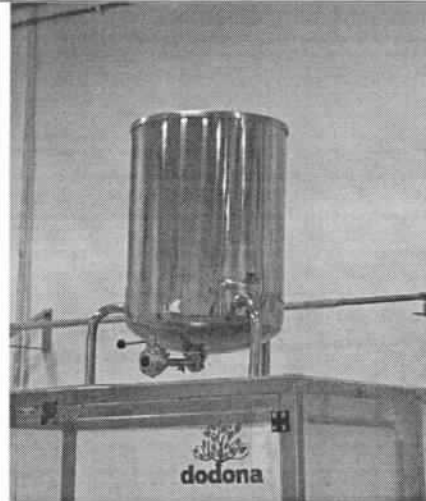
#### Instalación

Equipo 1:  
Sistema de lavado de envases y Tanque de 100 litros.

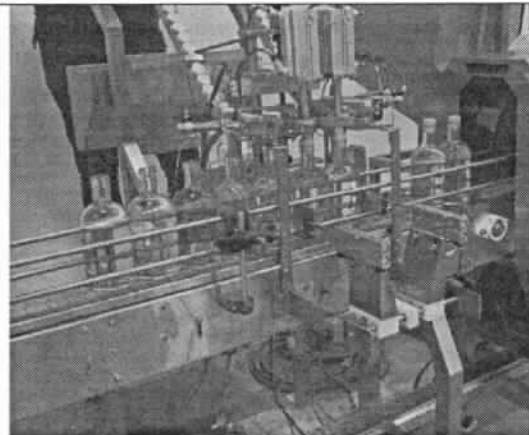




INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)



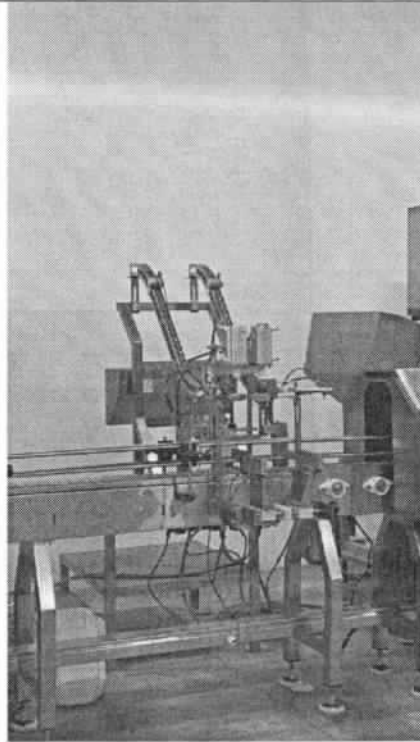
Equipo 2: Sistema de inserción de corcho y tapa guala neumático.



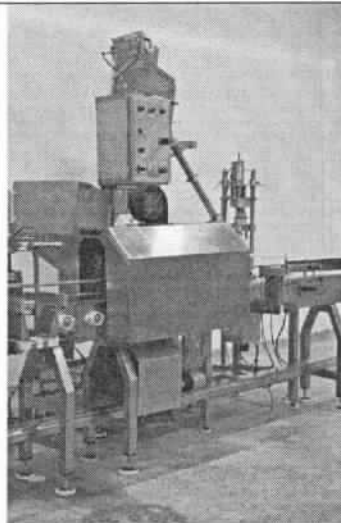
*Handwritten signature or initials.*



**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)**



Equipo 3: Túnel de secado con dos turbinas (Superior e inferior)

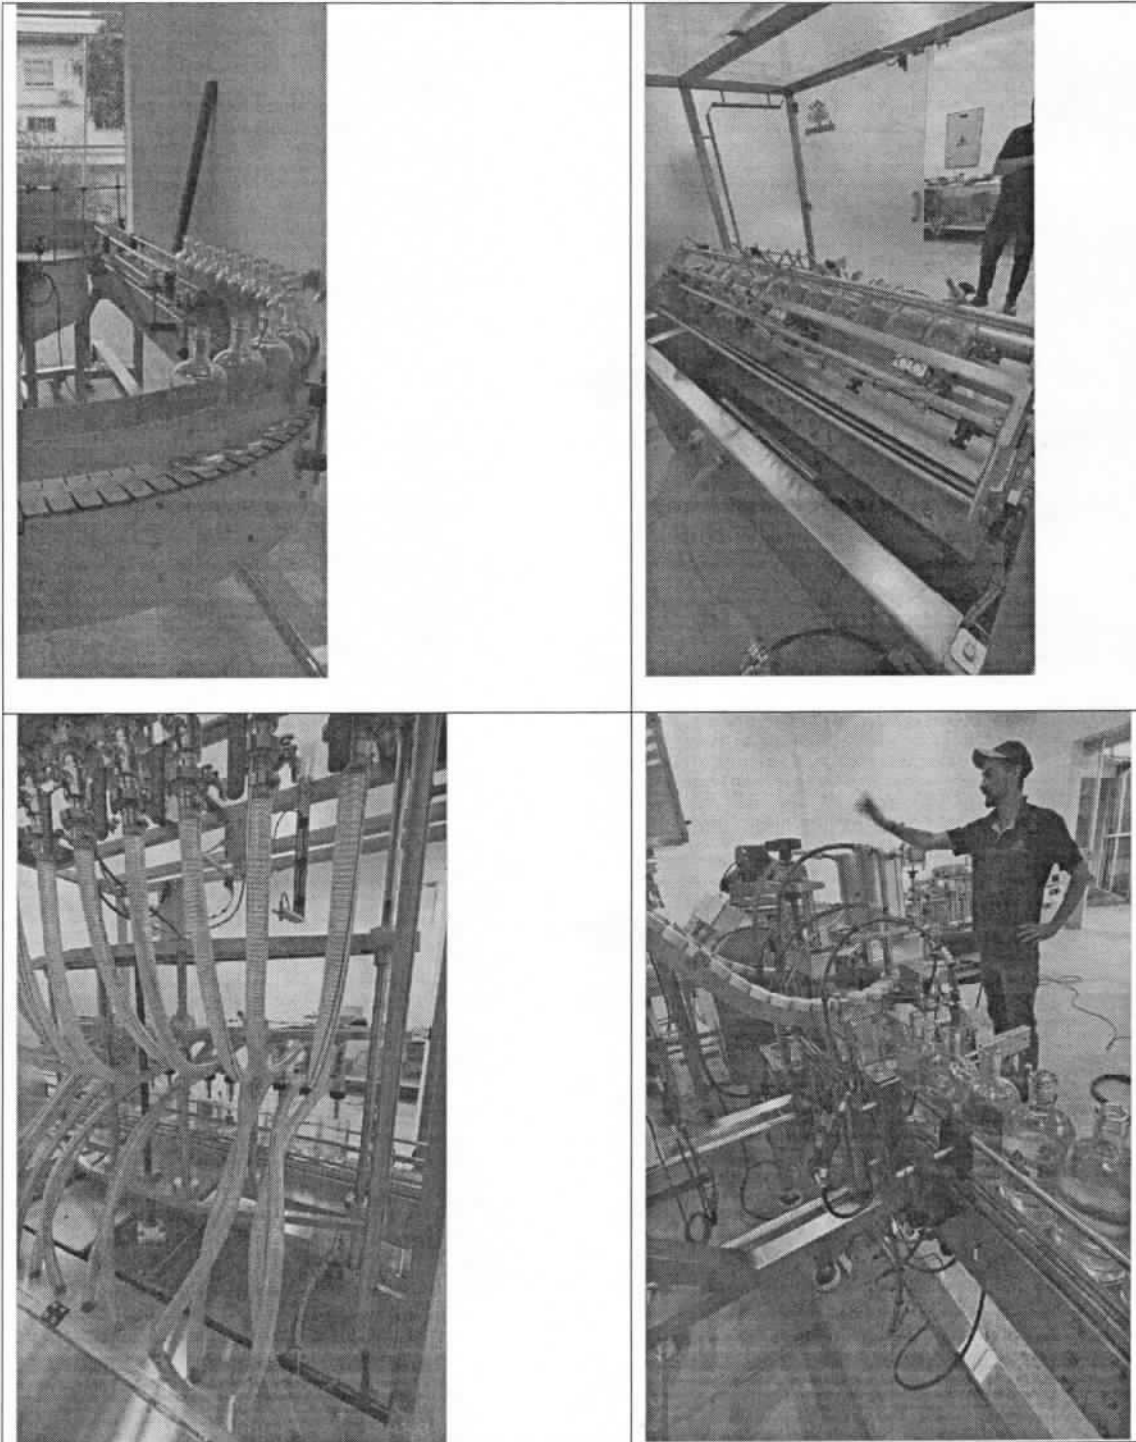


*Handwritten signature or initials.*



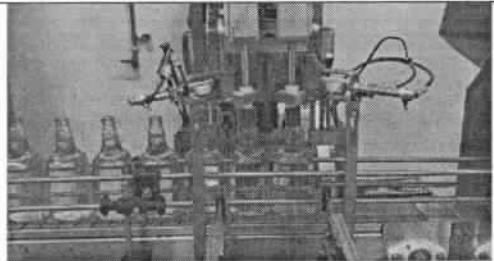
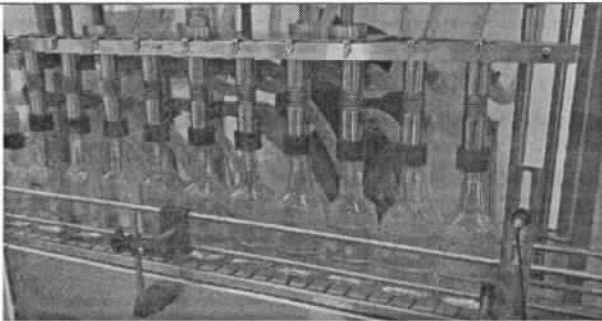
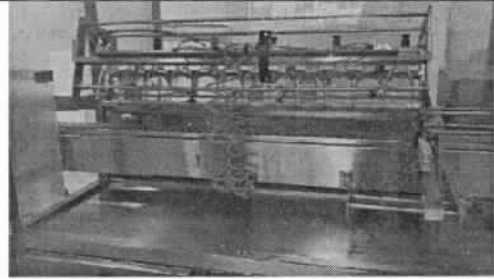
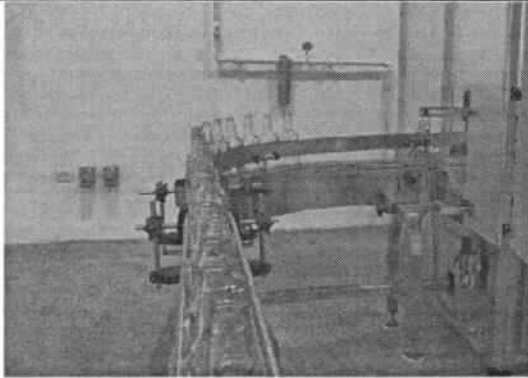
INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

Puesta en marcha





**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)**



*Handwritten signature or mark.*



**INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)**



### **Conclusiones**

- Se realizó el acompañamiento y verificación de los equipos relacionados en el presente informe, validando las especificaciones técnicas, cantidades y características establecidas, encontrándose conformes para su recepción.
- Los equipos entregados se encuentran en buen estado físico y funcional, sin evidenciar daños aparentes, golpes o faltantes al momento de la inspección visual y verificación inicial.
- Se constató que los equipos fueron entregados con sus componentes, accesorios y elementos complementarios, necesarios para su correcta instalación, operación y puesta en servicio.
- Durante el proceso de entrega se llevó a cabo la verificación operativa básica, confirmando el correcto funcionamiento de los equipos, dentro de los parámetros normales de operación.
- El personal designado por la Fábrica de licores del Tolima recibió la capacitación e información básica para la operación, manejo y recomendaciones generales de uso de los equipos entregados.



INFORME TECNICO DE RECIBO PARA LA LINEA SEMIAUTOMATIZADA CONTRATO  
No. FLT-065-2025  
(03/02/2026)

- Con la firma del presente documento, la Fabrika de licores del Tolima se apoya con el manifiesto de conformidad con la entrega, dejando constancia de que los equipos quedan bajo su custodia, uso y responsabilidad.
- Cualquier ajuste, mantenimiento o intervención posterior a la entrega se realizará conforme a los procedimientos establecidos y a las condiciones contractuales vigentes.

Manuel Ossa

Manuel Santiago Ossa Zamora

CC.1005753689

Ingeniero Mecánico

Contratista
