

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 023
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO Y DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Manuel Ruiz, Cristian Serna, Miguel Suarez, Francisco	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA ESPERANZA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Sebastian Rueda, Sebastian Martinez, Jhon Niño	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Ferney Gomez, Robinson Parra, Gilberto Estrada, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas en dos frentes de trabajo, avanzando de manera ordenada y segura según la programación establecida.</p> <p>*Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, garantizando adecuada adherencia y visibilidad.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos y material vegetal para mantener el flujo hidráulico.</p> <p>*Se avanzó en la conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias La Esperanza y Regaderos, utilizando el equipo y personal asignado conforme a la planificación operativa.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>*Las actividades correspondientes a la jornada se ejecutaron con normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un desarrollo continuo, coordinado y conforme a la planificación operativa establecida, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos para el día.</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del peaje la punta en el departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	SABADO 08 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 024
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO Y DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA TECNICA LA ESPERANZA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Sebastian Rueda, Sebastian Martinez, Jhon Niño	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
FerneY Gomez, Robinson Parra, Gilberto Estrada, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, Ing. Elibardo Santos.	

EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
*Durante la presente jornada de trabajo únicamente se mantuvieron activas las cuadrillas encargadas de la conformación en vías terciarias, concentrando todos los esfuerzos en la nivelación, mejoramiento y adecuación de los tramos más críticos. Estas labores se desarrollaron de manera continua con el apoyo de maquinaria y herramienta menor, permitiendo optimizar el perfil de la vía, mejorar la transitabilidad y garantizar el avance efectivo de las actividades programadas para el corredor vial.	
OBSERVACIONES	
*Las actividades correspondientes a la jornada se ejecutaron con normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un desarrollo continuo, coordinado y conforme a la planificación operativa establecida, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos para el día.	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra	Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 025
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO Y DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Manuel Ruiz, Cristian Serna, Miguel Suarez, Francisco	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA ESPERANZA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Sebastian Rueda, Sebastian Martinez, Jhon Niño	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Ferney Gomez, Robinson Parra, Gilberto Estrada, Luis Armando, Miguel Pinzon	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Esperanza y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>Las actividades correspondientes a la jornada se desarrollaron con total normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo, coordinado y acorde con la planificación operativa establecida, lo que permitió garantizar el cumplimiento de los objetivos programados para el día y asegurar un desempeño eficiente por parte del equipo técnico y operativo.</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO





BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 026
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
HORAS DE LLUVIA	DOS HORAS DE PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Suarez	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA ESPERANZA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando, Miguel Pinzon	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltes de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Esperanza y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>Las actividades correspondientes a la jornada se desarrollaron con total normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo, coordinado y acorde con la planificación operativa establecida, lo que permitió garantizar el cumplimiento de los objetivos programados para el día y asegurar un desempeño eficiente por parte del equipo técnico y operativo.</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 027
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO Y LUEGO SOLEADO
HORAS DE LLUVIA	MENOS DE UNA HORA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Suarez	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA ESPERANZA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando, Miguel Pinzon	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltes de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Esperanza y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>Las actividades correspondientes a la jornada se desarrollaron con total normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo, coordinado y acorde con la planificación operativa establecida, lo que permitió garantizar el cumplimiento de los objetivos programados para el día y asegurar un desempeño eficiente por parte del equipo técnico y operativo.</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO





BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del peaje la punta en el departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 028
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO CON PRESENCIA DE LLUVIA
HORAS DE LLUVIA	APROXIMADAMENTE UNA HORA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Suarez	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA NAVARRA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando, Miguel Pinzon	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltes de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades correspondientes a la jornada se desarrollaron con total normalidad en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado según la planificación operativa establecida; adicionalmente, la cuadrilla asignada al sector de La Esperanza finalizó las labores programadas y fue trasladada al sector de La Navarra para continuar con las actividades previstas, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos para el día.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO





BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 029
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA LA NAVARRA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

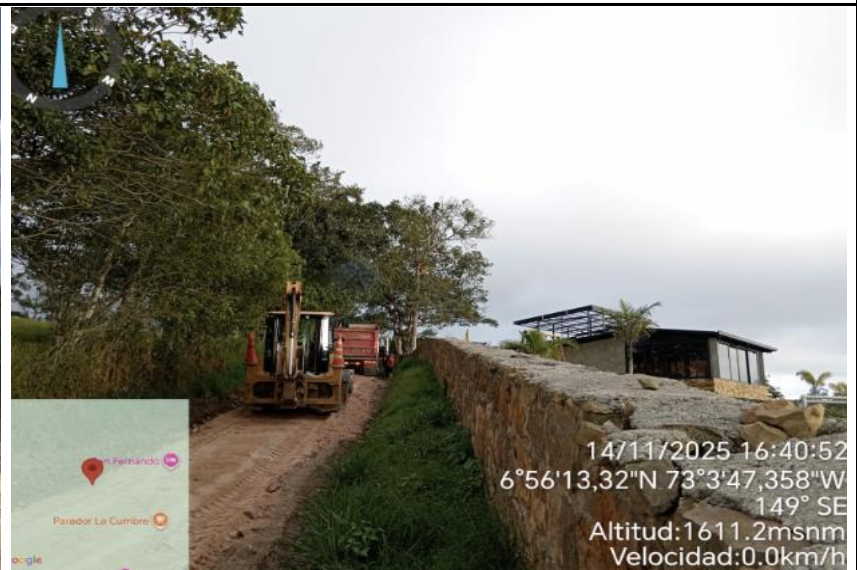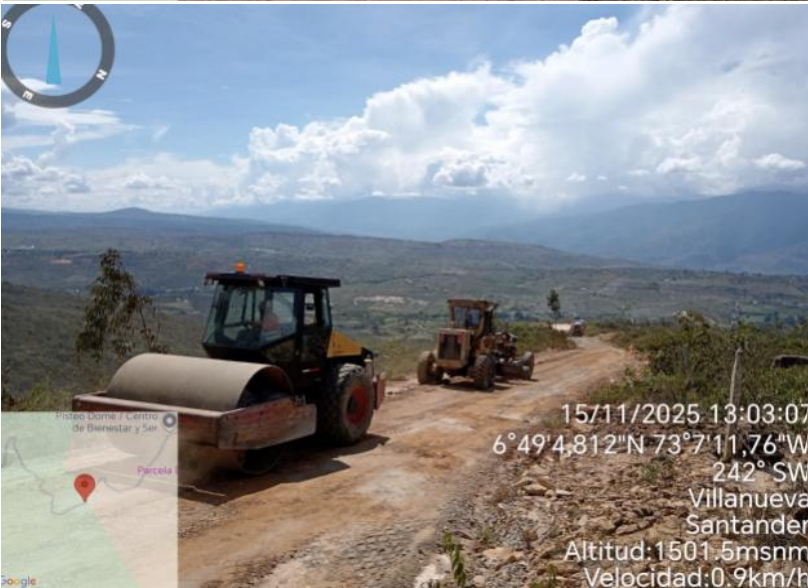

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 030
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de Mesitas de San Javier y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Iniciamos actividades en Mesitas de San Javier sector Pdta.</p> <p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

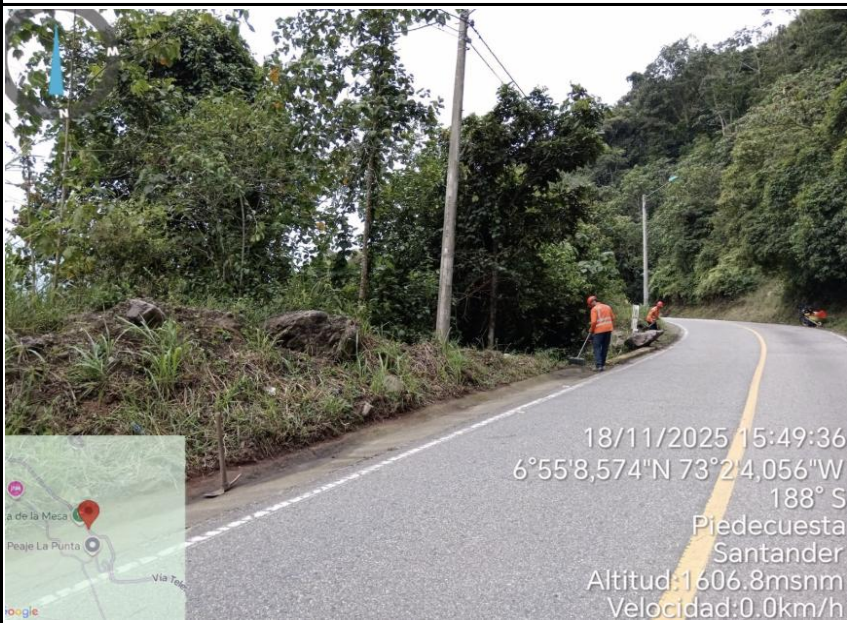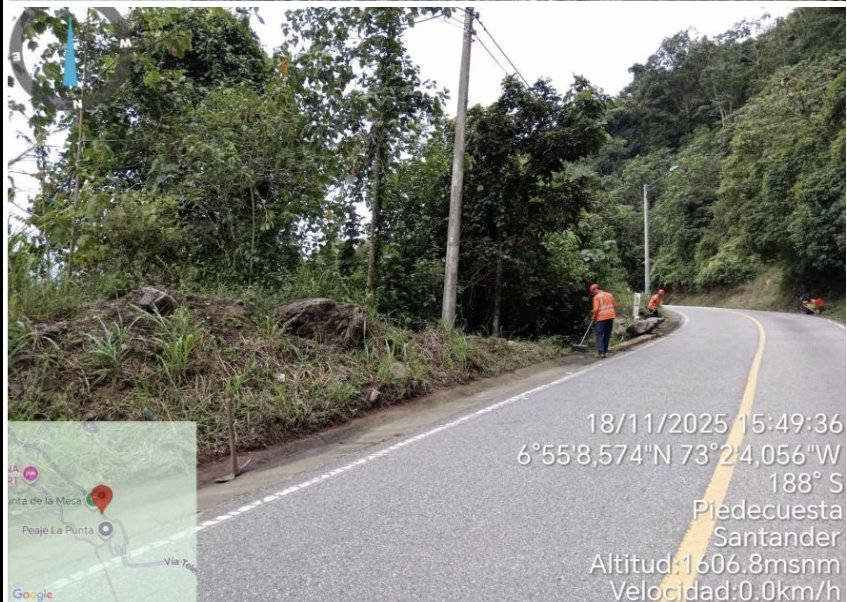

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 031
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA REGADEROS (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltes de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p> <p>*Se prosiguió con la limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, en cumplimiento de la programación técnica definida.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>La cuadrilla vuelve a intervenir la via La Navarra.</p> <p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO






BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 032
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	NUBLADO EN LA MAÑANA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p> <p>*Se prosiguió con la limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, en cumplimiento de la programación técnica definida.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias en la zona de influencia del Peaje La Punta en el Departamento de Santander"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 033
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	PRESENCIA DE UNA HORA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadalupe: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadalupe: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadalupe"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y acorde con la programación establecida.</p> <p>Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, asegurando una adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad de la señalización.</p> <p>Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor.</p> <p>Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

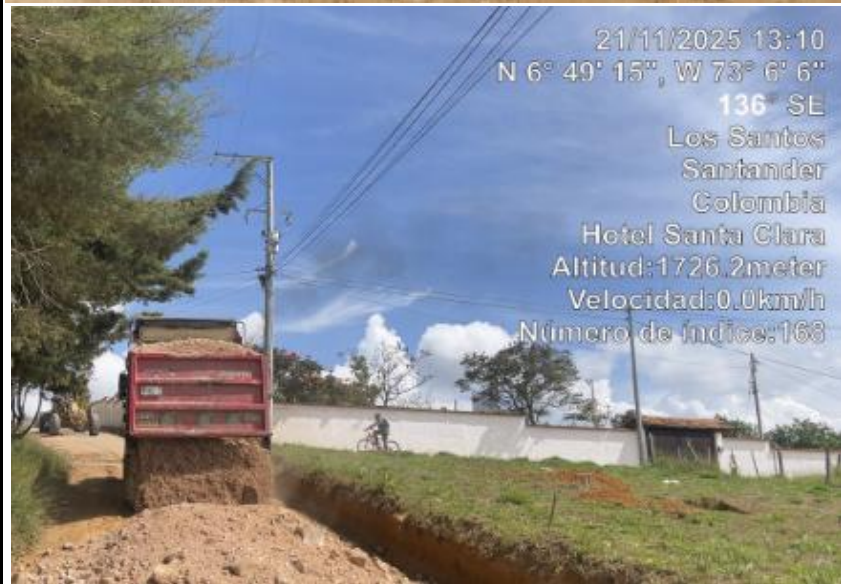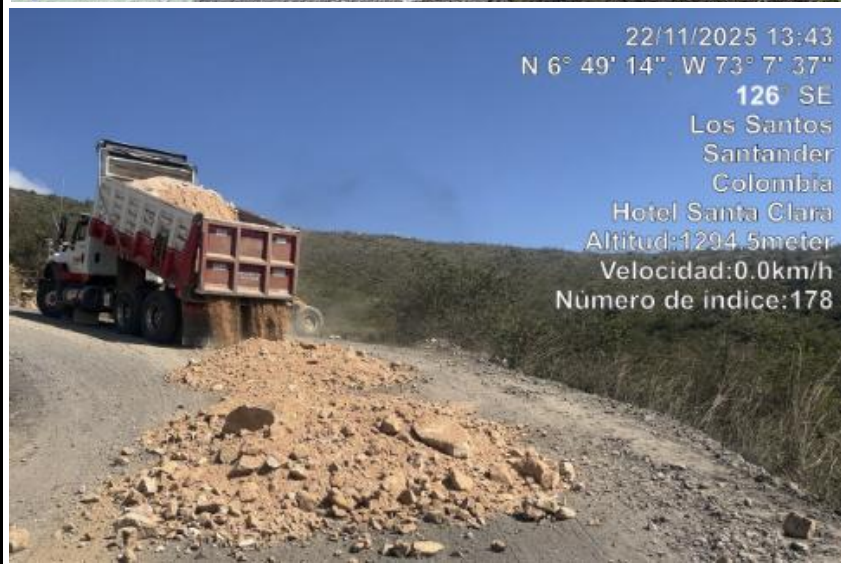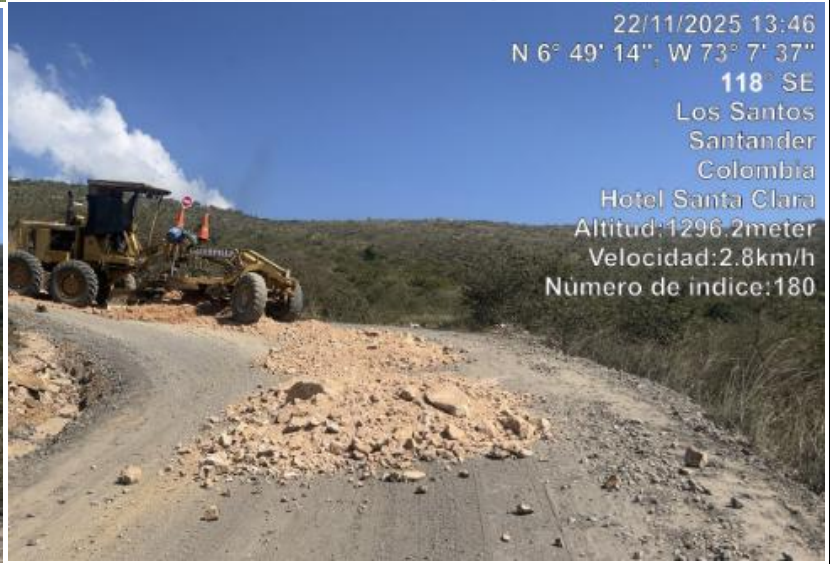

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 034
ESTADO DEL TIEMPO	PRESENCIA DE LLUVIA
HORAS DE LLUVIA	DOS HORAS APROXIMADAMENTE
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Continuaron las actividades de suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente en colores blanco y/o amarillo sobre los resaltos de concreto existentes, garantizando adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad en la señalización. Esta tarea presenta un avance aproximado del 95%.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Navarra y Regaderos, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Se traslada la maquinaria a el sector LA LOMA EL POTRERO Y LA PURNIA</p> <p>Se inicia la instalacion de delineadores de curva horizontal y terminal de barrera abatida empotrada.</p> <p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO




BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 035
ESTADO DEL TIEMPO	PRESENCIA DE LLUVIA
HORAS DE LLUVIA	UNA HORA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p> <p>*Se prosiguió con la limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, en cumplimiento de la programación técnica definida.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 036
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
HORAS DE LLUVIA	APROXIMADAMENTE DOS HORA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p> <p>*Se prosiguió con la limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, en cumplimiento de la programación técnica definida.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

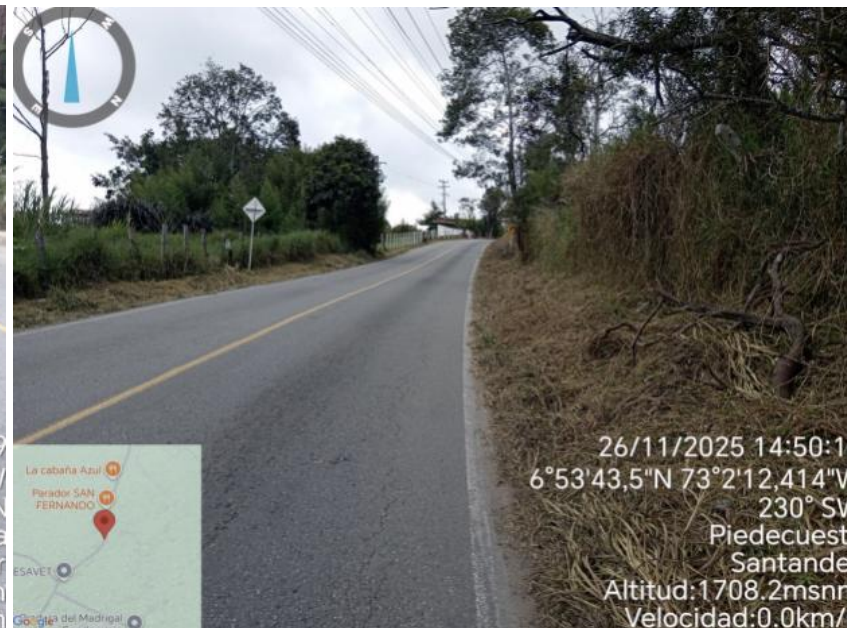

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 037
ESTADO DEL TIEMPO	PARCIALMENTE NUBLADO
HORAS DE LLUVIA	APROXIMADAMENTE UNA HORA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO




BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 038
ESTADO DEL TIEMPO	DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 039
ESTADO DEL TIEMPO	DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

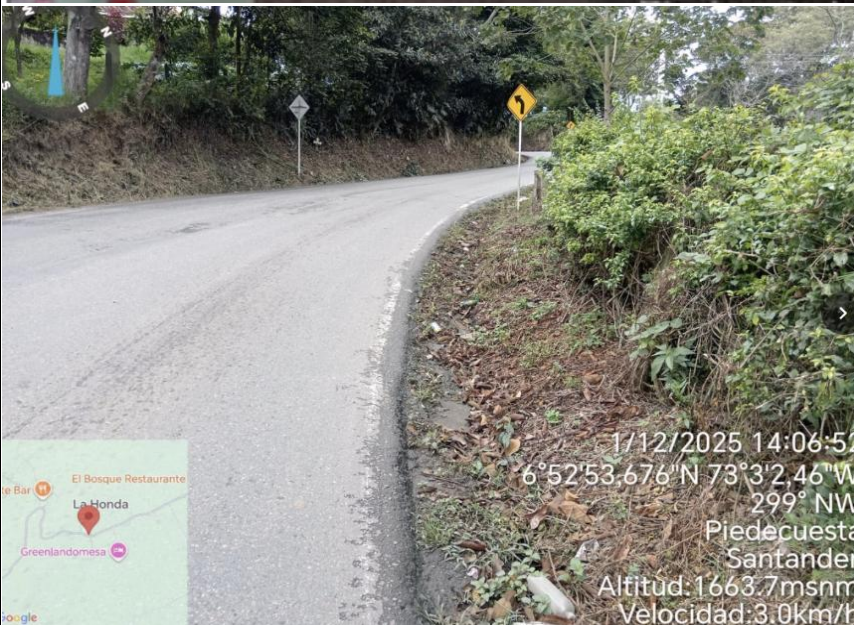


BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MARTES 02 DE DICIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 040
ESTADO DEL TIEMPO	DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se mantuvieron las labores de limpieza y desmonte en zonas no boscosas mediante dos frentes de trabajo activos, avanzando de manera ordenada, segura y conforme a la programación establecida. Estas actividades presentan un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se continúa con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada, actividades que avanzan de manera rápida y conforme a la programación establecida.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
 <p>02/12/2025 09:50 N 6° 51' 2", W 73° 8' 22" 170° S Altitud:1144.2meter Velocidad:4.1km/h Número de índice:271</p> <p>Siguiente</p>	 <p>martes, 2 de diciembre de 2025, 11:00 a.m. N 6° 52' 31.955", W 73° 3' 23.612" 170° S Piedecuesta Altitud:1621.3meter Velocidad:0.0km/h</p>
 <p>martes, 2 de diciembre de 2025, 1:02 p.m. N 6° 52' 23.867", W 73° 3' 22.255" 222° SW Los Santos Altitud:1614.1meter Velocidad:1.8km/h</p>	 <p>02/12/2025 15:43 N 6° 51' 15", W 73° 8' 27" 117° SE Los Santos Santander Colombia Altitud:1175.0meter Velocidad:0.0km/h Número de índice:274</p>
 <p>martes, 2 de diciembre de 2025, 3:06 p.m. N 6° 52' 58.949", W 73° 3' 13.249" 240° SW Piedecuesta Altitud:1634.2meter Velocidad:4.1km/h</p>	 <p>martes, 2 de diciembre de 2025, 4:56 p.m. N 6° 51' 16.197", W 73° 8' 13.488" 340° N Los Santos Altitud:1226.2meter Velocidad:4.5km/h</p>


BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 041
ESTADO DEL TIEMPO	DESPEJADO
HORAS DE LLUVIA	SIN PRESENCIA DE LLUVIA
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA EL BWEY	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Juan Miguel, Kevin Perez, Henry Julian.	
Operario de Guadaña: Eduardo Rafael Torres	
CUADRILLA LOS SANTOS	
Ayudantes: Héctor Gomez, Ferney Serna, Cristian Serna, Manuel Ruiz, Francisco, Miguel Pinzon	
Operario Guadaña: Jose Ignacio Gomez	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
CUADRILLA TECNICA (MAQUINARIA)	
Edinson Navarro, Robinson Parra, Ferney Gomez, Luis Armando	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se finalizo la actividad correspondiente a la limpieza y desmonte en zonas no boscosas.</p> <p>*Se finalizo con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada.</p> <p>*Se dio continuidad a la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en los sectores de Los Santos y El Bwey, retirando sedimentos, material vegetal y obstrucciones para garantizar el correcto flujo hidráulico del corredor. Estas labores registran un avance significativo y se encuentran próximas a su finalización.</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en las vías terciarias de La Loma y Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

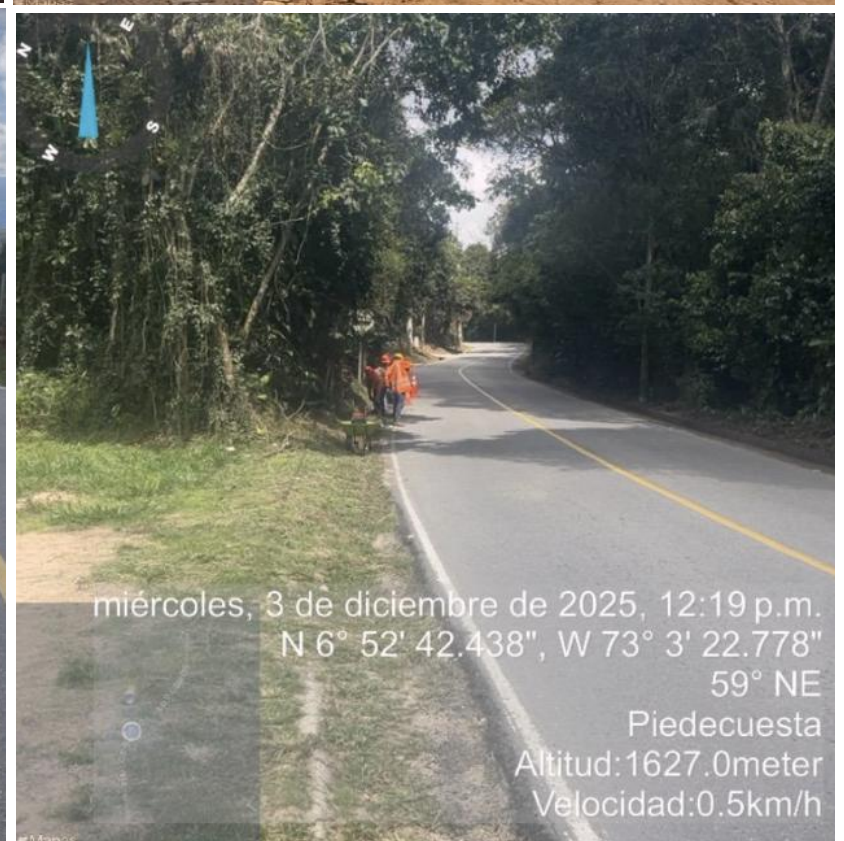

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 042
ESTADO DEL TIEMPO	CON PRESENCIA DE LLUVIA
HORAS DE LLUVIA	UNA HORA APROXIMADAMENTE
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA DE LIMPIEZA FINAL ZONAS INTERVENIDAS	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Kevin Perez.	
Ayudantes: Ferney Serna, Manuel Ruiz, Francisco	
CUADRILLA TECNICA LLANADAS ESPINAL (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se finalizo la actividad correspondiente a la limpieza y desmonte en zonas no boscosas.</p> <p>*Se finalizo con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada.</p> <p>*Se finalizo la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en todo el corredor vial (via secundaria)</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en la via Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</u></p> <p><u>La cuadrilla de limpieza final es la encargada de remover material vegetal que quedo sobre zanjas y cunetas</u></p> <p><u>Una cuadrilla de maquinaria esta en mantenimiento</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

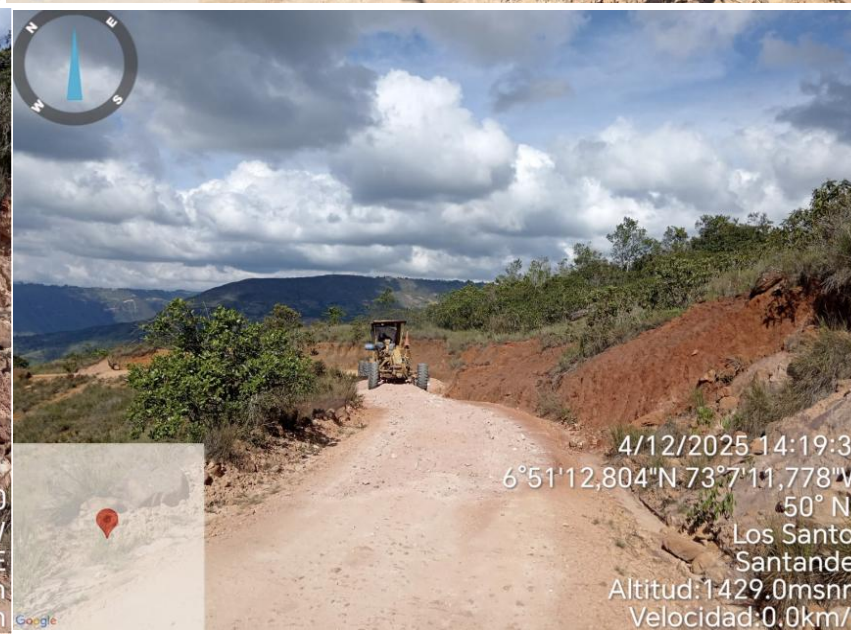

BITACORA DE OBRA	
DATOS GENERALES	
PROYECTO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATO No.	C01.PCCNTR.8279406
MUNICIPIO(S)	PIEDRECUESTA Y LOS SANTOS
DEPARTAMENTO	SANTANDER
DATOS ESPECIFICOS	
FECHA	VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025
DIA DE OBRA No.	No. 043
ESTADO DEL TIEMPO	CON PRESENCIA DE LLUVIA
HORAS DE LLUVIA	UNA HORA APROXIMADAMENTE
PERSONAL EN OBRA	
CUADRILLA DE LIMPIEZA FINAL ZONAS INTERVENIDAS	
Ayudantes: Carlos Javier, Jenny Carolina, Eduardo Forero, Kevin Perez.	
Ayudantes: Ferney Serna, Manuel Ruiz, Francisco	
CUADRILLA TECNICA LLANADAS ESPINAL (MAQUINARIA)	
Gilver Fernando, Fabian Duarte, Andres Parra, Sebastian Martinez, Brayan Naranjo	
PERSONAL PROFESIONAL	
Ing. Alex Reatiga, ing. Elibardo Santos	
EQUIPOS / MAQUINARIA EN OBRA	
Dos (2) equipos para roceria "Guadaña"	
Una (1) Camioneta 4x4 para el transporte del personal y de la señalizacion	
Herramienta menor y señalizacion	
Dos (2) motoniveladora	
Dos (2) vibrocompactador	
Un (1) retrocargador "pajarita"	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<p>*Se finalizo la actividad correspondiente a la limpieza y desmonte en zonas no boscosas.</p> <p>*Se finalizo con la instalación de los delineadores de curva horizontal y del terminal de barrera abatida empotrada.</p> <p>*Se finalizo la limpieza de alcantarillas y obras de drenaje en todo el corredor vial (via secundaria)</p> <p>*Se avanzó en las labores de conformación y compactación de la calzada existente en la via Llanadas, utilizando el equipo y el personal asignado conforme a la planificación operativa, asegurando una adecuada nivelación y estabilidad del terreno. Las actividades programadas en estos dos sectores fueron culminadas en su totalidad.</p>	
OBSERVACIONES	
<p><u>Las actividades de la jornada se desarrollaron con total éxito en los distintos frentes de trabajo, manteniendo un avance continuo y coordinado conforme a la planificación operativa establecida.</u></p> <p><u>La cuadrilla de limpieza final es la encargada de remover material vegetal que quedo sobre zanjas y cunetas</u></p> <p><u>Una cuadrilla de maquinaria esta en mantenimiento</u></p>	
FIRMA DE LOS RESPONSABLES	
<div><div></div><div>Ing. Alex Reatiga Ordoñez Residente de obra</div></div> <div><div></div><div>Ing. Cristian Camilo Zapata H. Residente de Interventoria</div></div>	

REGISTRO FOTOGRAFICO

