

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
	INFORME FINAL	

**DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCELEJO**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°. MC-019-2025**

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

INFORME FINAL

CONTRASTISTA: INGENORTE S.A.S

SINCELEJO, NOVIEMBRE DE 2025

**PRESENTADO A:
GOBERNACIÓN DE SUCRE**

Numero de contrato de Obra AMC – 022 – 2024	PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2025
--	---

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

INFORME FINAL

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS:

No DE COPIA	DESTINATARIO DE COPIA
1.	GOBERNACIÓN DE SUCRE

CONTROL DE VERSIONES:

VERSIÓN	COMENTARIOS	Fecha
1	Versión inicial	24/11/2025

CUADRO DE FIRMAS:

 Elaboró: Ing. Andrea González Ferrer Residente de Interventoría	 Revisó: Ing. José Pastrana Medina Director de Interventoría
--	---

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	ASPECTOS GENERALES	6
2.1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.2.	LOCALIZACIÓN	6
		9
2.3.	ANTECEDENTES	13
2.4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	14
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	16
4.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	18
4.1.	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	18
4.2.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	18
4.3.	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	21
4.4.	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....	23
4.5.	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA (ACTIVIDADES VS TIEMPO)	24
5.	IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMATICAS	26
6.	GESTIÓN FINANCIERA.....	27
6.1.	GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA	27
6.2.	GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	27
7.	GESTIÓN DE CALIDAD	28
8.	CONDICIONES LABORALES DURANTE LA EJECUCIÓN	29
9.	MECANISMOS DE CONSTROL Y SEGUIMIENTO DEL PGIO	30
10.	SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL	31
3.	ANEXOS.....	35

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	--	--

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Actividades realizadas del 19 de agosto al 31 de agosto 2025	18
Ilustración 2. Actividades realizadas del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025	19
Ilustración 3. Actividades realizadas del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2025	20

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Descripción localización general	15
Tabla 2. Información general del contrato	16
Tabla 3. Seguimiento a pólizas de interventoría	17
Tabla 4. Porcentaje de avance físico y ejecución del proyecto.	21
Tabla 5. Cuadro avance físico	21
Tabla 6. Avance financiero semanal	22
Tabla 7. Seguimiento a pólizas de contrato de obra	23
Tabla 8. Gestión financiera del contrato de obra	27
Tabla 9. Relación de herramientas y equipos	28

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	---	--

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** contiene el **INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA**, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del **Contrato de Interventoría MC-019-2025**, cuyo objeto es **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**.

El Contratista **CONSORCIO HAI**, representado legalmente por **OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO** CC. N°. 1.047.369.398 de Cerete, Córdoba, responsable de las obras del **Contrato AMC-022-2024**, cuyo objeto es **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

En este Informe, la Interventoría hace una descripción a la **GOBERNACIÓN DE SUCRE** de las actividades realizadas, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del **CONTRATO** desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, social, ambiental y SST.


 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	---	--

2 ASPECTOS GENERALES

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad la malla vial del Departamento de Sucre presenta necesidad de un mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la buena visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado.

2.2. LOCALIZACIÓN

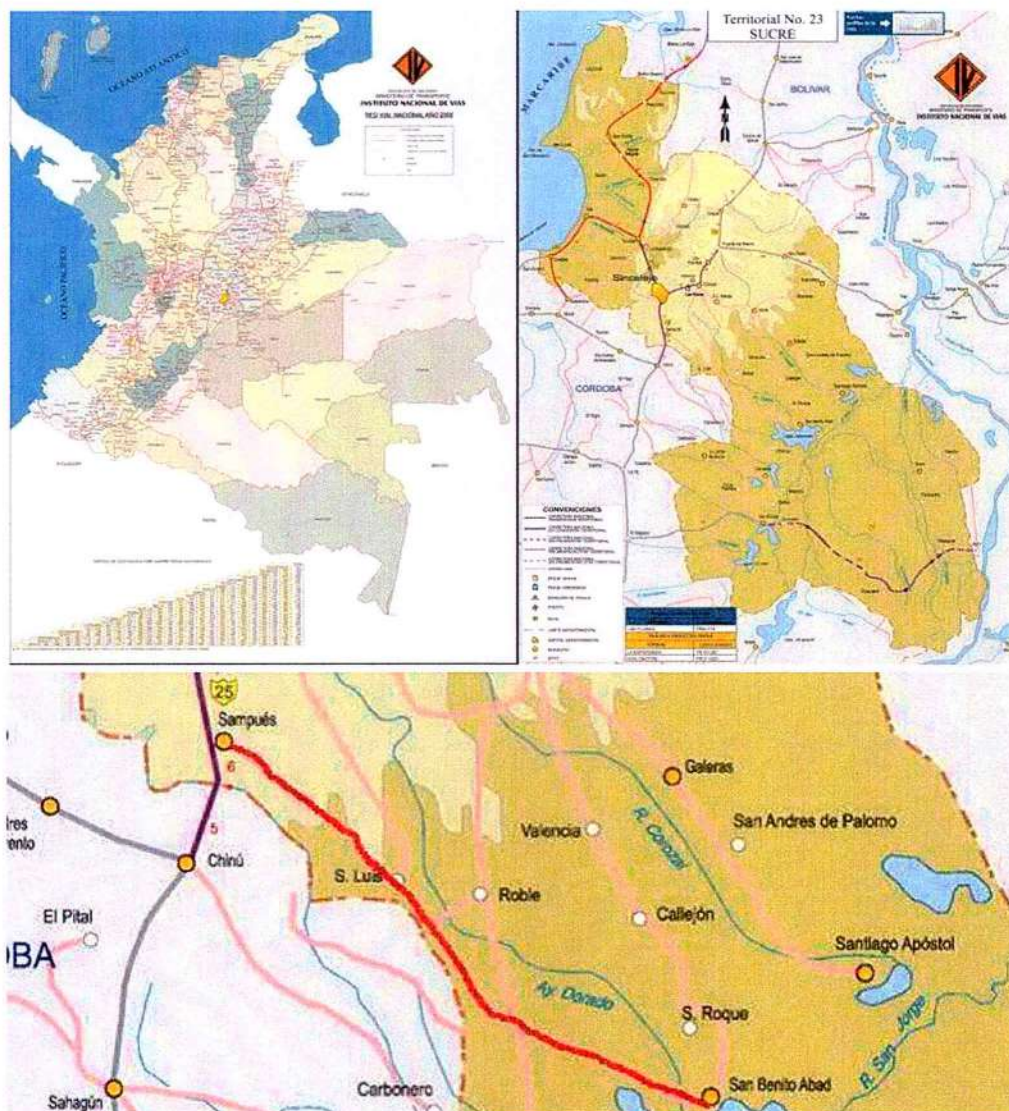

Plano 1. Localización tramo Sampués – San Benito Abad




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

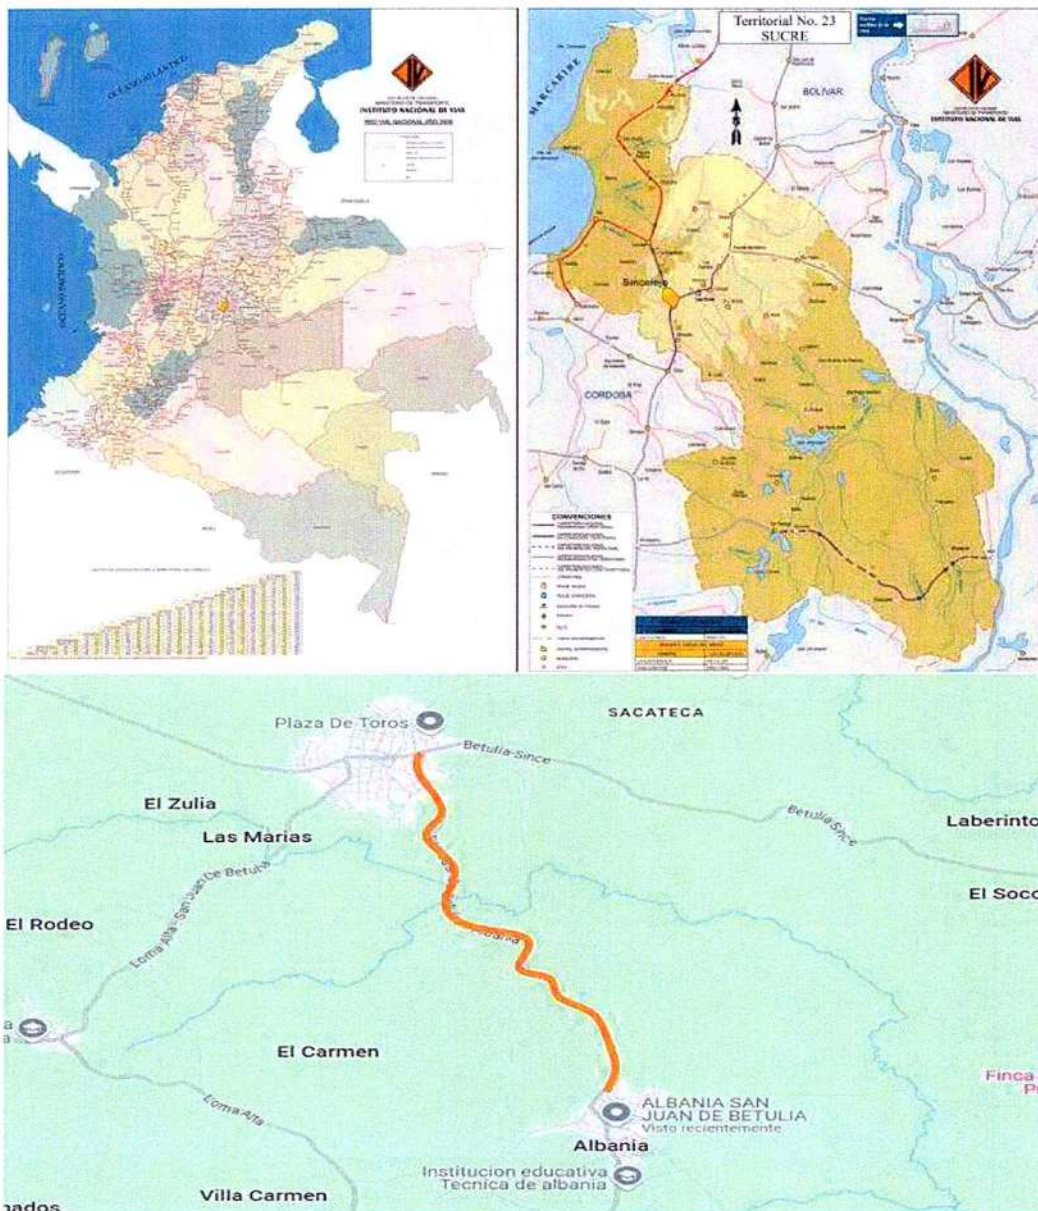

Plano 2. Localización San Juan de Betulia - Albania.




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

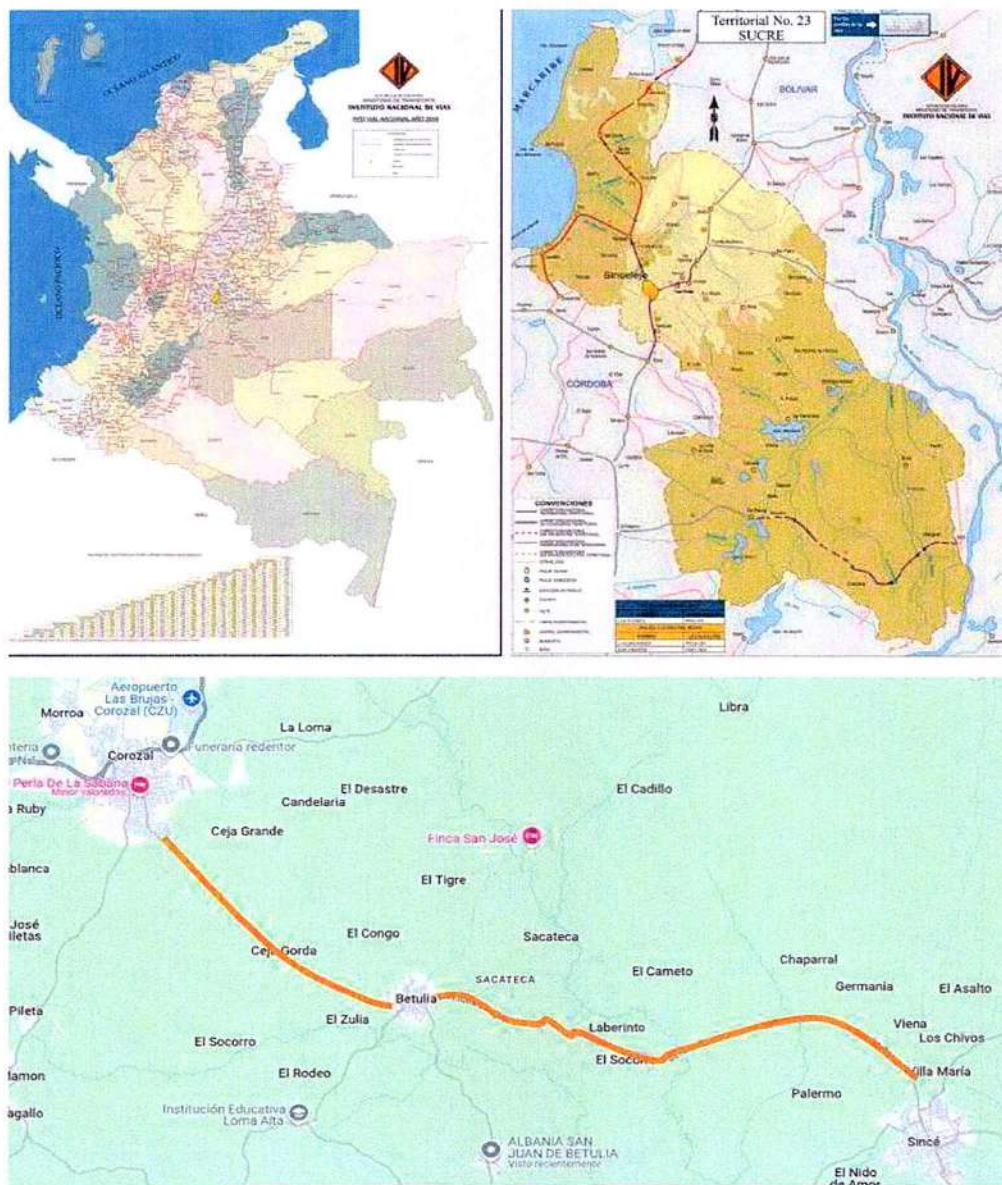

Plano 3. Localización Corozal - San Juan de Betulia - Sincé




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

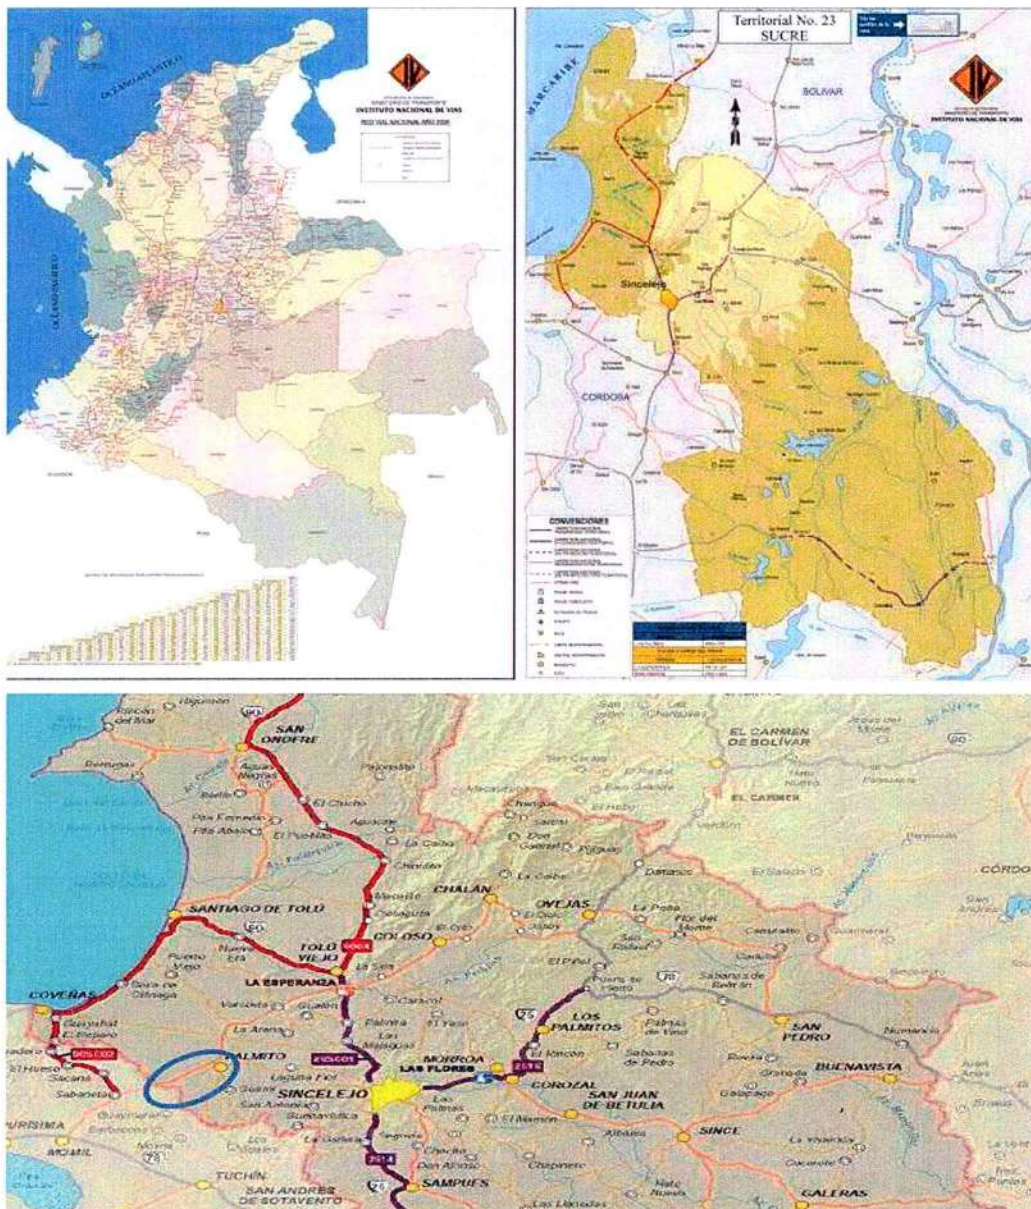

Plano 4. Localización tramos límites con Córdoba - San Antonio de Palmito




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

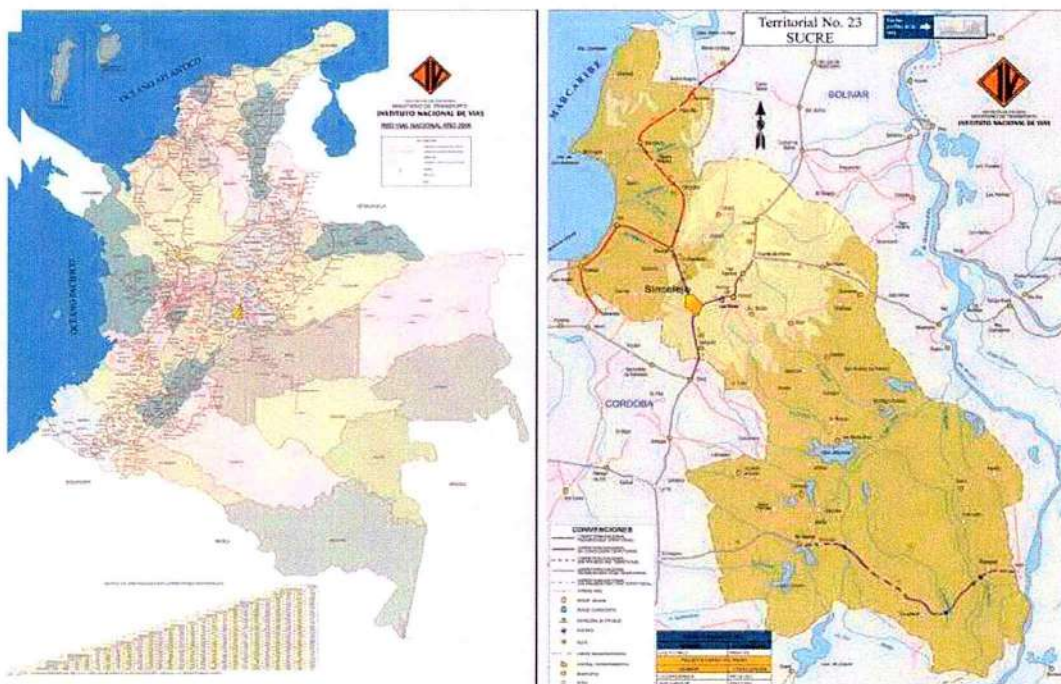

Plano 5. Localización tramo Palmito - Finca San Antonio




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

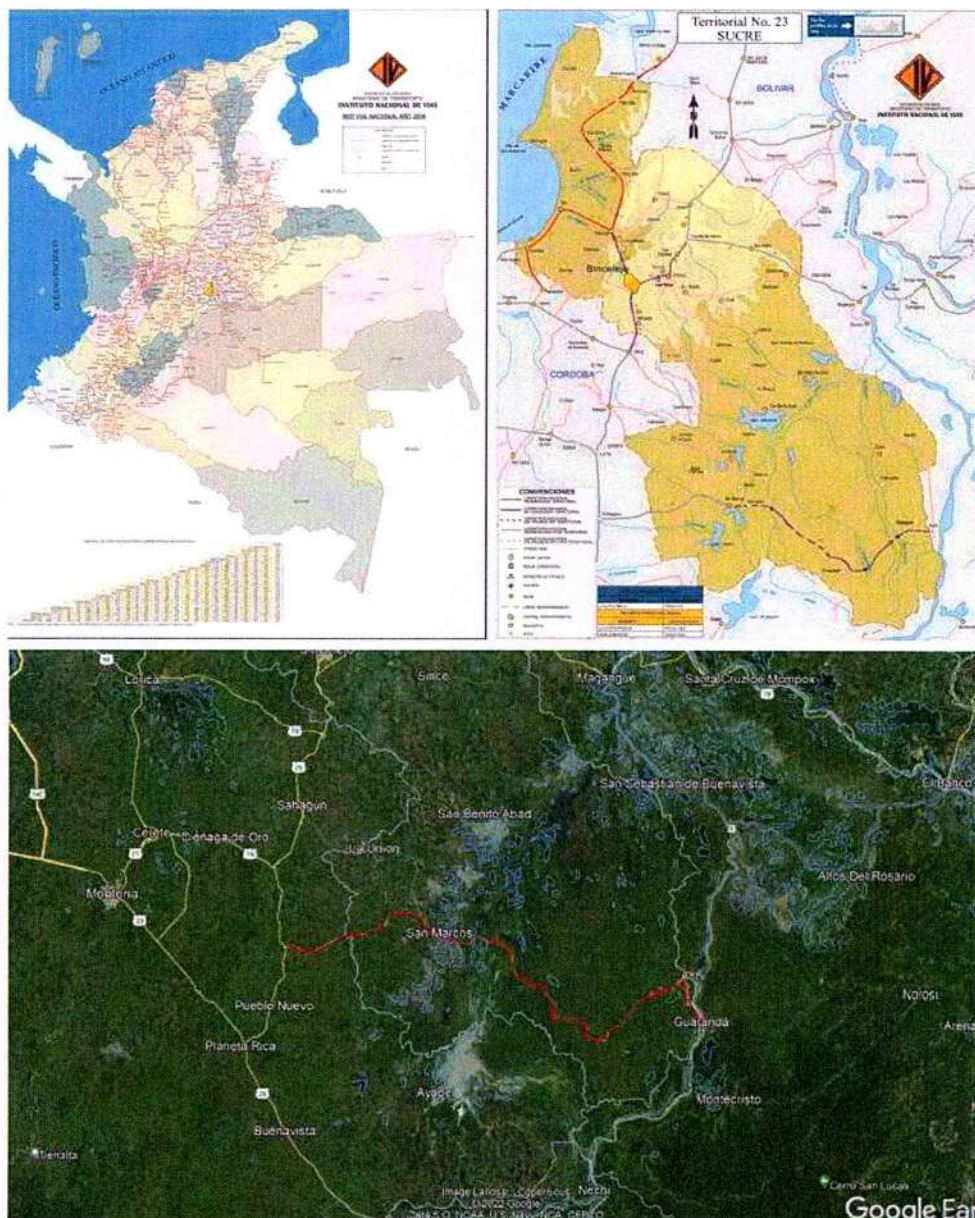

Plano 6. Localización tramo la Yee - Guaranda




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

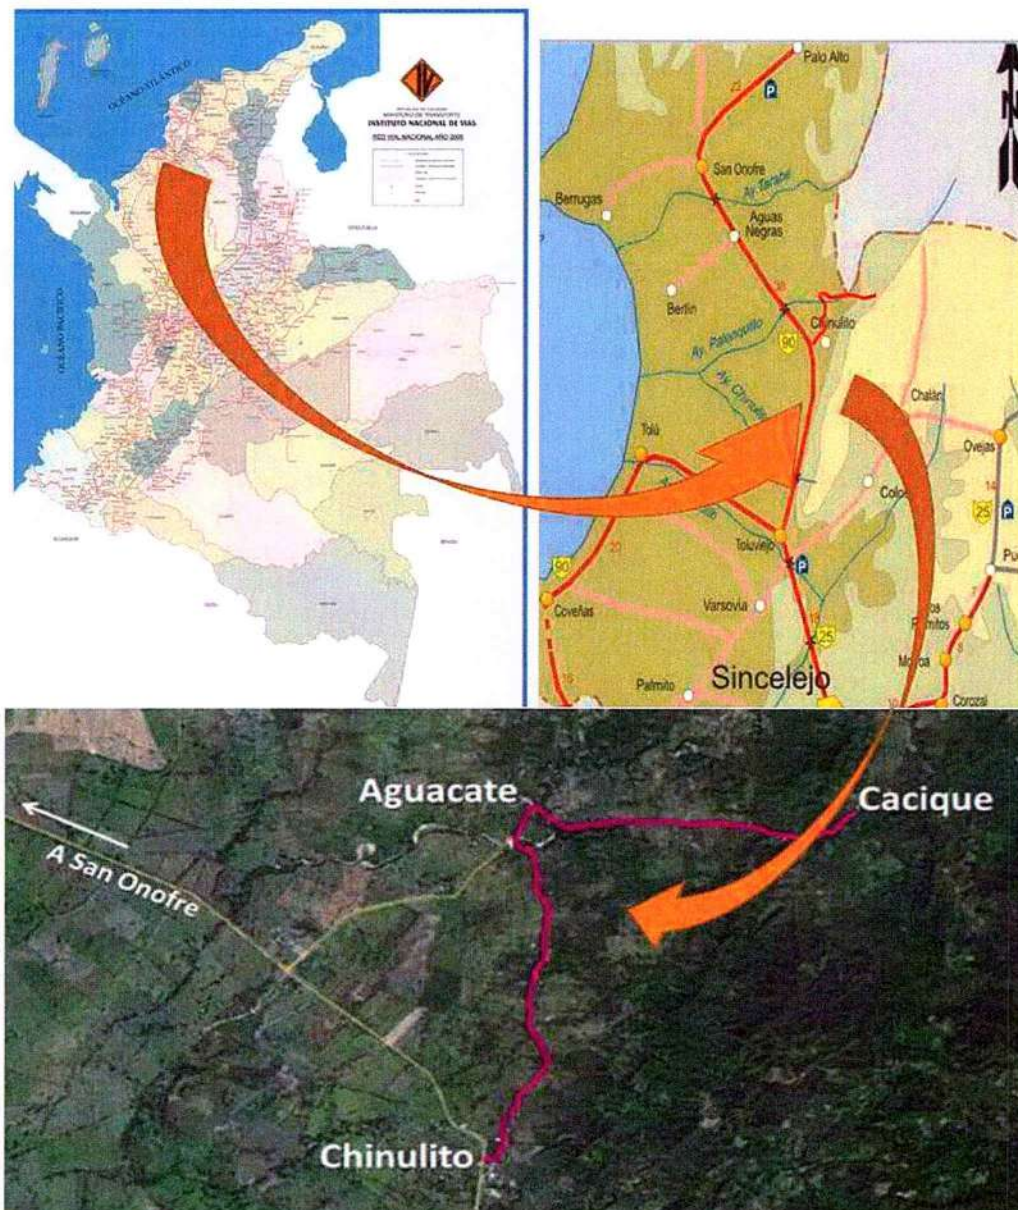

Plano 7. Localización tramo vía Chinulito - Aguacate - Cacique



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6



2.3. ANTECEDENTES

El Departamento de Sucre cuenta con una red vial de gran importancia para la conectividad regional, la movilidad de personas y el transporte de bienes y servicios. Sin embargo, debido al crecimiento de la vegetación paralela a las calzadas, la acumulación de sedimentos en cunetas y obras de drenaje, así como los efectos de las condiciones climáticas de la región, se ha identificado la necesidad de realizar labores de mantenimiento rutinario que garanticen la funcionalidad y seguridad de la infraestructura vial.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	---	--

En este contexto, la Secretaría de Infraestructura Departamental formuló el proyecto de **Mantenimiento Rutinario de la Malla Vial del Departamento de Sucre**, el cual comprende la intervención de varios tramos estratégicos de la red secundaria y terciaria. Dichos tramos incluyen corredores como Sampués – San Benito (49,5 km), San Juan de Betulia – Albania (4,9 km), Corozal – San Juan de Betulia – Sincé (18,7 km), entre otros, sumando más de 127 km de vía a intervenir.

Las actividades principales previstas en este proyecto corresponden a rocería, limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, así como la limpieza de obras de arte y/o mayores. Estas labores buscan preservar las condiciones de transitabilidad de las vías, mejorar la seguridad vial, garantizar el adecuado funcionamiento del drenaje y prolongar la vida útil de la infraestructura existente.

De esta manera, el proyecto se constituye en una acción preventiva y de conservación, enmarcada en las políticas de infraestructura del Departamento, orientada a asegurar el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiarias mediante el fortalecimiento de la conectividad regional.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto de **Mantenimiento Rutinario de la Malla Vial del Departamento de Sucre** contempla intervenciones en distintos tramos de la red vial secundaria y terciaria, con una longitud total aproximada de 127 km. Las actividades principales a ejecutar incluyen:

- **Rocería** en áreas laterales a la vía para mejorar la visibilidad y seguridad.
- **Limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles** para garantizar el adecuado drenaje.
- **Limpieza de obras de arte menores y/o mayores**, asegurando su funcionalidad.

Estas labores buscan mantener las condiciones de transitabilidad, prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir riesgos de deterioro prematuro. A continuación, se presenta la tabla con las características técnicas de cada tramo, donde se detallan el tipo de vía y las longitudes en cada uno de ellos:



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

Tabla 1.Descripción localización general

TIPO DE TRAMO	TRAMO	LONGITUD (km)
Vía Terciaria	Sampués – San Benito	49,5
Vía Terciaria	San Juan de Betulia – Albania	4,9
Vía Secundaria	Corozal – San Juan de Betulia – Albania	18,70
Vía Secundaria	Límites con Córdoba – San Antonio de Palmito	6,96
Vía Terciaria	Palmito – Finca San Antonio	5,6
Vía Secundaria	La Yee – Guaranda	11,10
Vía Terciaria	Chinualito – Aguacate – Cacique	7,9
Vía Secundaria	Sincé – Granada – Buenavista	22,60

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
	INFORME FINAL	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La siguiente tabla contiene la información general del contrato de interventoría.

Tabla 2. Información general del contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA "INTERVENTOR"				
CONTRATO:	No. MC-019-2025	CONTRATISTA:	INGENORTE S.A.S	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
ESTRUCTURA PLURAL				
RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPACIÓN	INFORMACIÓN GENERAL
INGENORTE S.A.S	901.752.114-6	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	100%	Cra 5 #7-10, Barrio Centro, San Juan de Betulia – Sucre E-mail interroceria@gmail.com
COMPONENTES	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración	Valor del Componente
ACTA DE INICIO DE CONTRATO	19 AGOSTO 2025	3 NOVIEMBRE 2025	DOS MESES Y MEDIO	\$ 55.892.215,67
TOTAL, PROYECTO	19 AGOSTO 2025	3 NOVIEMBRE 2025	DOS MESES Y MEDIO	\$ 55.892.215,67
SUPERVISOR	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO/ GOBERNACION DE SUCRE			

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
	INFORME FINAL	

La siguiente tabla, muestra el valor y vigencia de las pólizas de la interventoría (INGENORTE S.A.S):

Tabla 3. Seguimiento a pólizas de interventoría

Pólizas contrato de Interventoría					
Compañía	N° Póliza	Amparo	Valor	Vigencia	
				Desde	Hasta
Seguros Mundial	No. CRC – 100025719	Cumplimiento del contrato	\$ 5.589.221,60	19/08/2025	03/11/2026
Seguros Mundial	No. CRC – 100025719	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.794.610,80	19/08/2025	03/11/2028
Seguros Mundial	No. CRC – 100025719	Calidad del servicio	\$ 5.589.221,60	03/11/2025	03/11/2030

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
	INFORME FINAL	

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

4.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Las siguientes tablas contienen la información general del contrato de obra.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA				
CONTRATO:	AMC – 022 – 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO HAI	
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
COMPONENTES	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración	Valor del Componente
ACTA DE INICIO DE CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2025	3 DE NOVIEMBRE DE 2025	DOS MESES Y MEDIO	\$ 624.963.567,50
TOTAL, PROYECTO INICIAL	19 DE AGOSTO DE 2025	3 DE NOVIEMBRE DE 2025	DOS MESES Y MEDIO	\$ 624.963.567,50
SUPERVISOR	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACIÓN DE SUCRE			

4.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante este periodo comprendido entre el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025 se realizó por parte de la interventoría el seguimiento y control del estado del contrato de obra donde se evidenciaron diariamente las actividades realizadas durante las semanas correspondientes al presente informe.

SEMANA	TRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Semana 1 (19-24 agosto 2025)	Corozal-Betulia-Sincé (PR19-PR15)	Roceria (Incluye retiro)	HA	8	
		Limpieza de cuneta, zanjas, descoles (Incluye retiro)	ML	950	
		Limpieza de obras de arte (Incluye retiro)	UND	6	alcantarillas
		Recolección y retiro de material			
	Sampués -San Benito Abad (PR49-PR45)	Roceria (Incluye retiro)	HA	15	
		Limpieza de cuneta, zanjas, descoles (Incluye retiro)	ML	750	
		Limpieza de obras de arte (Incluye retiro)	UND	8	acantarillas
		Recolección y retiro de material			
Semana 2 (25-31 agosto 2025)	Corozal-Betulia-Sincé PR15-PR11)	Roceria (Incluye retiro)	HA	8	
		Limpieza de cuneta, zanjas, descoles (Incluye retiro)	ML	950	
		Limpieza de obras de arte (Incluye retiro)	UND	6	alcantarillas
		Recolección y retiro de material			
	Sampués-San Benito Abad (PR45-PR41)	Roceria (Incluye retiro)	HA	15	
		Limpieza de cuneta, zanjas, descoles (Incluye retiro)	ML	750	
		Limpieza de obras de arte (Incluye retiro)	UND	8	alcantarillas
		Recolección y retiro de material			
	La Yee-Guaranda (PR00-PR07)	Roceria (Incluye retiro)	HA	14	
		Limpieza de obras de arte (Incluye retiro)	UND	14	box culver

Ilustración 1. Actividades realizadas del 19 de agosto al 31 de agosto 2025



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

SEMANA	TRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Semana 3 (1-7 septiembre 2025)	Sincé-Betulia-Corozal (PR11-PR09)	Rocería (Incluye retiro)	HA	9	
		Limpieza de obras de arte	UND	14	9 alcantarillas 5 portones
		Limpieza de cuentas	ML	1200	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR41-PR37)	Rocería (Incluye retiro)	HA	14	
		Limpieza de obras de arte	UND	3	alcantarillas
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Límites Córdoba-Los Palmitos (PR05-PR07)	Rocería (Incluye retiro)	HA	3,92	
		Limpieza de obras de arte	UND	3	portones
		Limpieza de cuentas	ML	772	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	La Yee-Guaranda (PR00-PR03)	Rocería (Incluye retiro)	HA	3	
		Limpieza de obras de arte	UND	15	Box Culvert
		Recolección y retiro de material vegetal			
Semana 4 (8-14 septiembre 2025)	Sincé-Betulia-Corozal (PR09-PR03)	Rocería (Incluye retiro)	HA	9	
		Limpieza de obras de arte	UND	14	9 alcantarillas 5 portones
		Limpieza de cuentas	ML	1100	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR37-PR33)	Rocería (Incluye retiro)	HA	13	
		Limpieza de obras de arte	UND	3	alcantarillas
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Límites Córdoba-Los Palmitos (PR05-PR07)	Limpieza de obras de arte	UND	3	2 portones 1 puente
		Limpieza de cuentas	ML	300	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	La Yee-Guaranda (PR03-PR06)	Rocería (Incluye retiro)	HA	4	
		Limpieza de obras de arte	UND	14	portones
		Recolección y retiro de material vegetal			
Semana 5 (15-21 septiembre 2025)	Sincé-Betulia-Corozal (PR03-PR00)	Rocería (Incluye retiro)	HA	3,4	
		Limpieza de obras de arte	UND	5	3 alcantarillas 2 portones
		Limpieza de cuentas	ML	690	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR33-PR27)	Rocería (Incluye retiro)	HA	15	
		Limpieza de obras de arte	UND	2	portones
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Límites Córdoba-Los Palmitos (PR05-PR07)	Limpieza de obras de arte	UND	2	alcantarillas
		Recolección y retiro de material vegetal			
	La Yee-Guaranda (PR06-PR07)	Rocería (Incluye retiro)	HA	1,2	
		Limpieza de obras de arte	UND	4	2 Box Culvert 2 Portones
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sincé-Granada-Buenavista (PR00-PR05)	Rocería (Incluye retiro)	HA	9	
		Recolección y retiro de material vegetal			
Semana 6 (22-30 septiembre 2025)	Sampués-San Benito (PR27-PR24)	Rocería (Incluye retiro)	HA	10	
		Limpieza de obras de arte	UND	1	alcantarilla
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sincé-Granada-Buenavista (PR05-PR09)	Rocería (Incluye retiro)	HA	9	
		Recolección y retiro de material vegetal			

Ilustración 2. Actividades realizadas del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

SEMANA	TRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Semana 7 (1 al 7 de octubre 2025)	Sincé-Granada-Buenavista (PR09-PR23)	Rocería (Incluye retiro)	HA	15,2	
		Limpieza de obras de arte	UND	16	6 puentes
		Limpieza de cuentas	ML	2200	10 portones
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR37-PR17)	Rocería (Incluye retiro)	HA	21	
		Limpieza de obras de arte	UND	53	46 alcantarillas
		Limpieza de cuentas	ML	1329	7 portones
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Límites Córdoba-Los Palmitos (PR05-PR07)	Rocería (Incluye retiro)	HA	4	
		Limpieza de obras de arte	UND	5	5 portones
		Limpieza de cuentas	ML	800	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Palmito-Finca San Antonio (PR00-PR06)	Rocería (Incluye retiro)	HA	11,2	
		Limpieza de obras de arte	UND	4	4 portones
		Limpieza de cuentas	ML	1100	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Chinulito-Aguacate Cacique (PR00-PR05)	Rocería (Incluye retiro)	HA	11,5	
		Limpieza de obras de arte	UND	25	25 alcantarillas
		Limpieza de cuentas	ML	1485	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	San Juan de Betulia-Albania (PR00-PR05)	Rocería (Incluye retiro)	HA	9,8	
		Limpieza de obras de arte	UND	12	2 portones
		Limpieza de cuentas	ML	1450	10 alcantarilla
		Recolección y retiro de material vegetal			
Semana 8 (8-14 octubre 2025)	Sincé-Granada-Buenavista (PR09-PR03)	Rocería (Incluye retiro)	HA	11	
		Limpieza de cuentas	ML	3850	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR17-PR05)	Rocería (Incluye retiro)	HA	26	
		Limpieza de obras de arte	UND	15	10 puentes
		Recolección y retiro de material vegetal			5 portones
	Palmito-Finca San Antonio (PR05-PR06)	Limpieza de cuentas	ML	300	
		Recolección y retiro de material vegetal			
		Rocería (Incluye retiro)	HA	4,3	
	Chinulito-Aguacate Cacique (PR00-PR05)	Limpieza de cuentas	ML	4200	
		Recolección y retiro de material vegetal			
Semana 9 (15-21 octubre 2025)	Sincé-Granada-Buenavista (PR04-PR00)	Rocería (Incluye retiro)	HA	1,7	
		Limpieza de cuentas	ML	7300	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR05-PR00)	Rocería (Incluye retiro)	HA	16	
		Recolección y retiro de material vegetal			
		Limpieza de cuentas	ML	1000	
Semana 10 (22 octubre al 3 de noviembre 2025)	Sincé-Granada-Buenavista (PR01-PR00)	Limpieza de cuentas	ML	474	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sampués-San Benito (PR05-PR00)	Rocería (Incluye retiro)	HA	1,5	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	Sincé-Granada-Buenavista (PR23)	Rocería (Incluye retiro)	HA	0,4	
		Limpieza de obras de arte	UND	11	10 alcantarillas
		Recolección y retiro de material vegetal			1 porton
	Sampués-San Benito (PR00-PR7)	Rocería (Incluye retiro)	M3	445,02	
		Recolección y retiro de material vegetal			
		Rocería (Incluye retiro)	HA	0,8	
	La Yee-Guaranda (PR06)	Limpieza de berma con maquina	M3	287,5	
		Recolección y retiro de material vegetal			
		Limpieza de obras de arte	UND	7	7 puentes
	Palmito-Finca San Antonio (PR00-PR03)	Limpieza de cuentas	ML	2436	
		Recolección y retiro de material vegetal			
	San Juan de Betulia-Albania (PR00-PR01)	Limpieza de obras de arte	UND		1 puente
		Recolección y retiro de material vegetal			2 1 porton

Ilustración 3. Actividades realizadas del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2025

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	--	---

4.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se presenta el balance financiero del contrato del contratista, a la fecha el contratista no ha realizado la facturación de actas de cobro.

Tabla 4. Porcentaje de avance físico y ejecución del proyecto.

	Planeado	Ejecutado
AVANCE FÍSICO (%)	100%	100%
AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (\$)	\$ 624.973.567,50	\$ 624.973.567,50
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en \$)	\$ -	

Con base en la tabla anterior se desarrollaron las tablas y graficas mostradas a continuación las cuales detallan en avance físico y presupuestal ejecutado respecto al programado.

Tabla 5. Cuadro avance físico

CUADRO DE PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO				
SEMANA	%PROG	%PROG ACUM	%EJEC	%EJEC ACUM
1	6,58%	6,58%	8,43%	8,43%
2	6,58%	13,16%	8,43%	16,86%
3	9,29%	22,46%	7,67%	24,53%
4	11,90%	34,36%	2,93%	27,46%
5	11,90%	46,27%	5,46%	32,92%
6	11,90%	58,17%	5,77%	38,69%
7	5,43%	63,60%	12,90%	51,59%
8	7,60%	71,20%	12,90%	64,49%
9	14,40%	85,60%	12,51%	77,00%
10	14,40%	100,00%	23,00%	100,00%



DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

AVANCE DEL PROYECTO - 3 DE NOVIEMBRE 2025

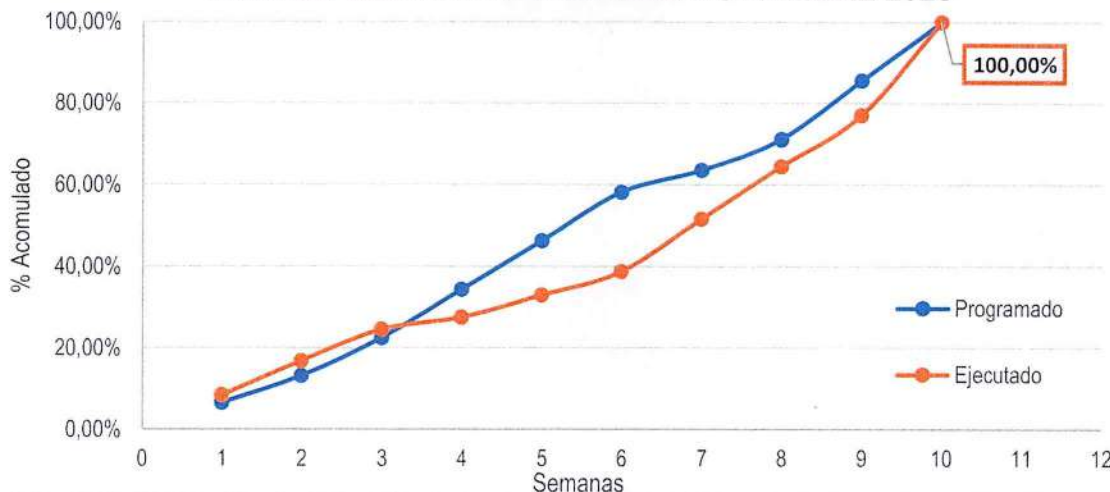

Grafica 1. Avance porcentual programado vs Avance porcentual ejecutado

La gráfica muestra el avance acumulado del proyecto hasta el 3 de noviembre de 2025, comparando el progreso programado con el realmente ejecutado. Según los datos, al llegar a la semana 10, el avance programado debía ser del 100%, mientras que el avance ejecutado alcanzó igualmente el 100%. Esto indica que el proyecto se encuentra completamente al día, cumpliendo en su totalidad con el cronograma establecido y evidenciando una ejecución eficiente y un control adecuado del progreso.

Tabla 6. Avance financiero semanal

CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL				
SEMANA	%PROG	%PROG ACUM	%EJEC	%EJEC ACUM
1	\$ 41.137.898,92	\$ 41.137.898,92	\$ 52.675.354,00	\$ 52.675.354,00
2	\$ 41.137.898,92	\$ 82.275.797,83	\$ 52.675.354,00	\$ 105.350.708,00
3	\$58.088.657,69	\$ 140.365.385,00	\$ 47.952.855,11	\$ 153.303.563,11
4	\$74.391.803,50	\$ 214.758.378,83	\$ 18.309.527,59	\$ 171.613.090,70
5	\$74.391.803,50	\$ 289.151.372,67	\$ 34.112.416,45	\$ 205.725.507,15
6	\$ 74.391.803,50	\$ 363.544.366,50	\$ 36.068.227,85	\$ 241.793.735,00
7	\$ 33.925.660,50	\$ 397.470.027,00	\$ 80.614.536,25	\$ 322.408.271,25
8	\$ 47.523.400,83	\$ 444.993.427,83	\$ 80.614.536,25	\$ 403.022.807,50
9	\$ 89.990.069,83	\$ 534.983.497,67	\$ 78.212.150,00	\$ 481.234.957,50
10	\$ 89.990.069,83	\$ 624.973.567,50	\$ 143.738.609,50	\$ 624.973.567,00




DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT 892.280.021-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

INFORME FINAL



INGENORTE S.A.S
NIT 901.752.114-6

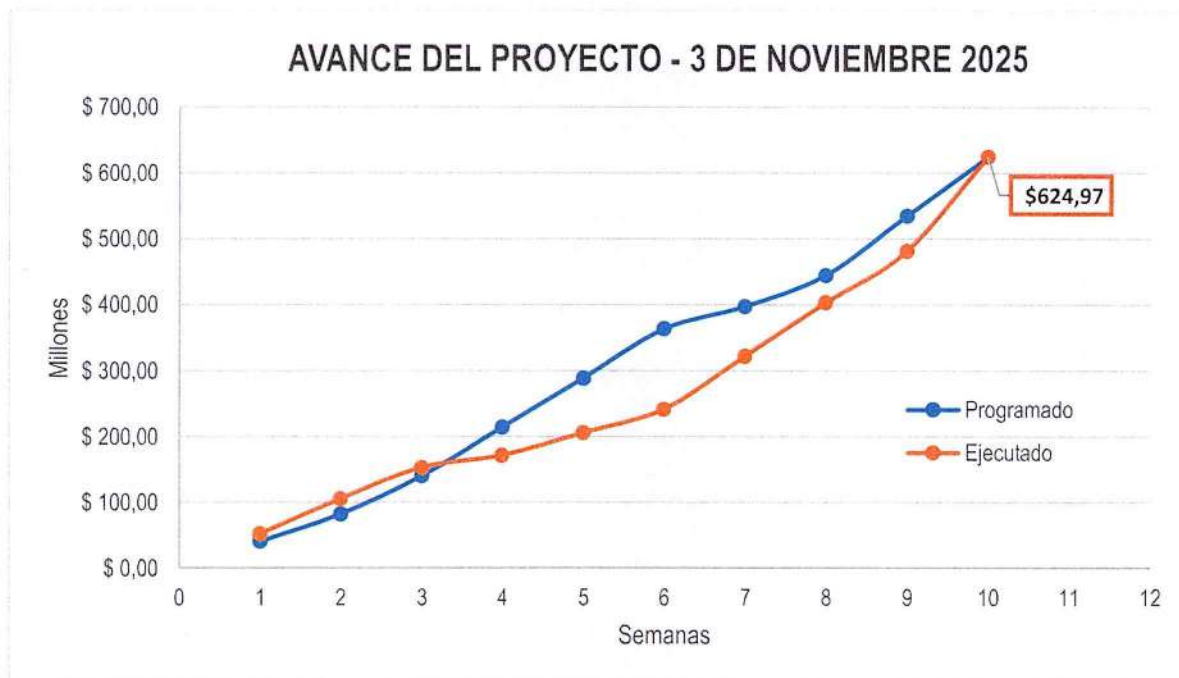

Grafica 2. Avance presupuestal proyectado vs avance presupuestal ejecutado

La gráfica muestra el avance acumulado del proyecto hasta el 3 de noviembre de 2025, comparando el progreso programado con el realmente ejecutado. Según los datos, al llegar a la semana 10, el avance programado debía ser de \$624.973.567,50, cifra que coincide exactamente con el avance ejecutado. Esto indica que el proyecto se encuentra en línea con la planificación establecida, sin presentar desviaciones en tiempo ni en valor acumulado, lo que refleja una gestión eficiente y un cumplimiento adecuado de los objetivos previstos.

4.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se recibido por parte del contratista de obra las pólizas vigentes del contrato de obra actualizadas con el acta de recibo final.

Tabla 7. Seguimiento a pólizas de contrato de obra

Pólizas contrato de Obra					
Compañía	N° Póliza	Amparo	Valor	Vigencia	
				Desde	Hasta
Seguros Mundial	B – 100064629	Cumplimiento del contrato	\$ 62.497.356,80	19/08/2025	5/03/2026

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	--	---

Seguros Mundial	B – 100064629	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labores	\$ 62.497.356,80	19/08/2025	3/11/2028
Seguros Mundial	B – 100064629	Estabilidad y calidad de la obra.	\$ 124.994.713,60	3/11/2025	al 6/05/2026
Seguros Mundial	B-100017722	Responsabilidad Civil Extracontractual.	\$ 284.700.000,00	19/08/2025	al 3/11/2025

4.5. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA (ACTIVIDADES VS TIEMPO)

Se realiza seguimiento del programa de obra con respecto al tiempo estimado para la ejecución del contrato de obra, y se concluye que se mantiene un desarrollo satisfactorio, con cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y ambientales, reflejando una gestión eficiente por parte del contratista y la interventoría. No obstante, se presentaron ligeros retrasos debido a las lluvias registradas en el periodo, lo que dificultó el desarrollo continuo de algunas actividades en campo.

4.6. BALANCE MAYORES/MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

Durante la ejecución y el seguimiento técnico del proyecto se efectuó un análisis detallado de las cantidades de obra originalmente previstas. Este proceso permitió identificar variaciones significativas en varios frentes de trabajo, registrándose tanto incrementos como disminuciones respecto a lo programado.

En la actividad de rocería se evidenció una mayor cantidad ejecutada de 1,20 hectáreas, incremento asociado a la proliferación de vegetación en zonas no contempladas inicialmente. Por su parte, en la limpieza de cunetas se registró una menor cantidad de 9.584 metros, debido a que determinados tramos presentaron condiciones más favorables que las estimadas durante la fase de planificación. En lo referente a la limpieza de obras de arte, se verificó un incremento de 87 unidades, derivado de la necesidad de atender estructuras adicionales afectadas por acumulaciones de sedimentos y residuos.

Adicionalmente, el contratista presentó la solicitud de inclusión de un ítem no previsto correspondiente a la limpieza de berma con maquinaria, justificado por la alta acumulación de sedimentos en los corredores viales Sampués–San Benito Abad y La Yee–Guaranda. Tras la verificación en campo, se determinó la necesidad de ejecutar 732,52 m³ de limpieza de berma con máquina, volumen indispensable para restablecer las condiciones adecuadas de drenaje y transitabilidad.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
	INFORME FINAL	

Toda la documentación técnica de soporte incluidos registros de campo, memorias de cálculo, y material fotográfico se encuentra organizada y adjunta en los anexos, garantizando así la trazabilidad y la verificación de los ajustes realizados a las cantidades de obra.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMATICAS

Durante la ejecución del proyecto de mantenimiento rutinario de la malla vial del departamento de Sucre se identificaron problemáticas que pudieron ser solucionadas a lo largo del proceso, permitiendo mantener la continuidad de las actividades previstas. Entre los aspectos que mayor impacto tuvieron en el desarrollo del proyecto destacó la persistencia de lluvias durante varios periodos de intervención. Estas precipitaciones generaban retrasos en las labores diarias, dificultaban el acceso a determinados tramos y dejaban superficies húmedas que requerían tiempos adicionales de secado. Además, la humedad favoreció un crecimiento acelerado de la vegetación en los bordes de la vía, obligando a ejecutar trabajos de limpieza y desbroce adicionales para garantizar la visibilidad y la seguridad.

Otra situación que requirió atención fue la acumulación de sedimentos en las bermas en los tramos de Sampués-San Benito Abad y La Yee Guaranda, producto del arrastre natural ocasionado por las lluvias y por las características del terreno. Este tipo de actividad no había sido contemplada inicialmente dentro del alcance del proyecto, por lo que fue necesario reorganizar los recursos y ajustar la programación para retirar dicho material y evitar que afectara la funcionalidad de la vía.

Asimismo, en diferentes tramos se encontró presencia de basura y residuos sólidos, tanto en zonas cercanas a poblaciones como en puntos de tránsito frecuente, un gran ejemplo fueron los tramos Sampués-San Benito Abad y Sincé-Granada-Buenavista. Estos elementos dificultaban la operación de limpieza, podían obstruir drenajes y representaban un riesgo para la conservación de la infraestructura vial. Su manejo exigió implementar acciones complementarias que, aunque no estaban previstas, permitieron restablecer las condiciones adecuadas para continuar con el mantenimiento.

En general, la resolución de estas problemáticas permitió mantener la operatividad del proyecto y generó aprendizajes útiles para futuras intervenciones, especialmente en lo relacionado con la previsión de actividades complementarias y la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
INFORME FINAL		

6. GESTIÓN FINANCIERA

6.1. GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se presenta el balance financiero del contrato del contratista, hasta la fecha se han realizado las siguientes facturaciones.

Tabla 8. Gestión financiera del contrato de obra

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA								
ACTA	FECHA	VALOR	VALOR ACUMULADO	PENDIENTE POR FACTURAR	%	% ACUM	% REST	DESEMBOLS O
# 1	17/10/2025	\$230.639.475	\$230.639.475	\$ 394.334.093	36,90%	36,90%	63,1%	SI
#2	30/10/2025	\$328.807.632,5	\$ 559.447.108	\$65.526.460	52,61%	89,52%	10,49%	NO
#3	PENDIENTE	\$65.526.460	\$ 624.963.567,50	\$ 0	10,49%	100%	0%	NO

6.2. GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En la siguiente tabla se presenta el balance financiero del contrato de Interventoría.

Tabla 9. Gestión financiera del contrato de interventoría

GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA								
ACTA	FECHA	VALOR	VALOR ACUMULADO	PENDIENTE POR FACTURAR	%	% ACUM	% REST	DESEMBOLS O
# 1	10/10/2025	\$22.356.886,26	\$22.356.886,26	\$ 33.535.329	40%	40%	60%	SI
#2	31/10/2025	\$22.356.886,26	\$44.713.773	\$65.526.460	40%	80%	20%	NO
#3	24/11/2025	\$11.178.443	\$0	\$0	20%	100%	0%	NO

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

7. GESTIÓN DE CALIDAD

7.1. DISPOSICIÓN DE MATERIAL

Durante la ejecución de las actividades se generaron 1.526.832,52 m³ de material vegetal, el cual fue manejado conforme a los lineamientos ambientales del proyecto. Todo este material fue transportado y dispuesto en el botadero certificado por la autoridad competente, operado por la empresa Inter Aseo, garantizando así un proceso de disposición final adecuado y debidamente registrado. Se anexará el certificado correspondiente.

7.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

Durante la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes equipos:

Tabla 9. Relación de herramientas y equipos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Volqueta
1	Mini cargador
10	Guadañas
10	Herramientas menores

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	--	--

8. CONDICIONES LABORALES DURANTE LA EJECUCIÓN

8.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES.

Durante la ejecución de proyecto se presentaron las siguientes condiciones climáticas:

- Durante el periodo del 19 al 31 de agosto del 2025, se registraron 2 días de lluvia.
- Durante el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, se registraron 14 días de lluvia
- Durante el periodo del 1 de octubre al 3 de noviembre del 2025, se registraron 16 días de lluvia.

8.2. CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron alteraciones del orden público que afectaran directa o indirectamente el proyecto.

8.3. CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

La obra se desarrolló según las instrucciones dadas por el contratista, que contó con un grupo de trabajadores consolidados, constituido por un ingeniero director y un ingeniero residente, operadores de maquinaria y cuadrillas de trabajo que prestó acompañamiento diario y constante y la supervisión de la Interventoría. Se realizó el debido seguimiento a las labores tanto técnicas como administrativas y financieras durante la ejecución del contrato, en la planificación, programación, ejecución presupuestal.

El suministro de insumos y herramientas se dio de manera oportuna, siempre que las condiciones climatológicas de la zona lo permitieron, brindando así rapidez y cumplimiento en el desarrollo de las distintas etapas de los procesos. Se presentó manejo eficiente de la mano de obra contratada en cada actividad desarrollada para la rocería, limpieza de cunetas, obras de arte y berma, actividades contempladas en el proyecto.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	---	--

9. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PGIO

El presente informe mensual se preparó de acuerdo con las funciones y seguimiento a los contratos de obra, establecidos en el manual operativo de la *“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”*.

9.1. EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS

Durante el desarrollo del proyecto se garantizó el cumplimiento en la entrega, instalación y disponibilidad de los elementos requeridos para la correcta gestión de la seguridad, la salud en el trabajo y el componente ambiental. Se suministraron 5 puntos ecológicos conformados por canecas de 55 litros (blanca, verde, negra y roja), así como 1 kit de derrames y 1 rollo de cinta de señalización de peligro reflectiva con sus accesorios. De igual manera, se entregó la papelería necesaria para las charlas de SST y ambiental, 1 sirena de seguridad de 12 V DC 20W, 1 botiquín Tipo B con maleta y férula espinal larga, 1 extintor multipropósito de 10 lb ABC y 4 conos de señalización reflectivos de 50 cm de alto. Todos estos elementos fueron implementados y utilizados conforme a los protocolos establecidos, asegurando el adecuado funcionamiento y apoyo a las actividades del proyecto.

9.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- **EXAMENES DE LABORATORIO PRELABORALES**

Dado inicio a las actividades, el contratista realizó la entrega de 10 exámenes de laboratorio pre laborales del personal que estuvo laborando en el proyecto desde el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025.

- **EXAMENES DE LABORATORIO POSLABORALES**

Una vez finalizaron actividades, el contratista realizó la entrega de 10 exámenes de laboratorio pos laborales del personal que estuvo laborando en el proyecto desde el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025.

- **EXAMENES MEDICO PRELABORAL**

Dado inicio a las actividades, el contratista realizó la entrega de 10 exámenes médicos pre laborales del personal que estuvo laborando en el proyecto desde el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025.

- **EXAMENES MEDICOS POSLABORAL**

Una vez finalizaron actividades, el contratista realizó la entrega de 10 exámenes médicos pos laborales del personal que estuvo laborando en el proyecto desde el 19 de agosto al 3 de noviembre de 2025.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	--	--

- **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP**

Una vez iniciadas las actividades del proyecto, se realizó la entrega de la dotación correspondiente al personal, suministrando 10 unidades de cada elemento: overoles jean de manga larga, cascos de seguridad, barbuquejos de tres puntos, anteojos de seguridad, caretas faciales con visor de policarbonato y ribete, guantes de seguridad en material nitrilo, guantes de seguridad en látex corrugado, tapabocas quirúrgicos N95, botas de caucho de seguridad y chalecos naranjas con reflectivo de 4.5 cm. Durante la ejecución del proyecto se llevó a cabo un seguimiento constante al estado y uso adecuado de estos elementos, asegurando que el personal contara en todo momento con la protección necesaria para desempeñar sus labores de manera segura.

- **REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES**

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 19 de agosto y 3 de noviembre de 2025, no se reportaron incidente ni accidentes laborales en obra.

- **INDUCCIONES Y CAPACITACIONES**

El contratista dio cumplimiento a la gestión de realizar charlas de seguridad y medio ambiente. Así mismo, esta interventoría hizo seguimiento mientras se realizaban cada una de estos requerimientos.

- **MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

El contratista cumplió con la disponibilidad de la maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades programadas, asegurando además la correcta realización de los preoperacionales correspondientes antes de su puesta en funcionamiento.

- **AFILIACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Desde el inicio de las labores en obra, el contratista cumplió con la entrega de soportes de afiliación y el envío de soportes correspondientes a cada periodo evaluado.

10. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

En el marco del proyecto de ***“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE”***, se decidió realizar las actas de socialización y actas de entrega final en las Secretarías de Planeación de los distintos municipios involucrados. Esta decisión se adoptó debido a que las actividades se llevarían a cabo en tramos viales con baja presencia de comunidades, por lo que las dependencias municipales representaban el espacio más adecuado para garantizar la comunicación, coordinación y registro formal de las actividades proyectadas.

1. **Tramo 1. Sampués – San Benito Abad**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en las Secretarías de Planeación de los municipios de Sampués y San Benito Abad. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.
2. **Tramo 2. San Juan de Betulia – Albania**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en la Secretaría de Planeación del municipio de San Juan de Betulia. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.
3. **Tramo 3. Corozal – San Juan de Betulia – Sincé**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en las Secretarías de Planeación de los municipios de Corozal, San Juan de Betulia y Sincé. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.
4. **Tramo 4. Límites de Córdoba – San Antonio de Palmito y Tramo 5. Palmito – Finca San Antonio**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría, así como el acta de recibo final, en la Secretaría de Planeación del municipio de San Antonio de Palmito. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.
5. **Tramo 6. La Yee- Guaranda**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en las Secretarías de Planeación de los municipios de Guaranda y Majagual. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
---	---	---

6. **Tramo 7. Chinulito – Aguacate – Cacique**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en la Secretaría de Planeación del municipio de Colosó. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.
7. **Tramo 8. Sincé – Granada – Buenavista**, se llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto, la elaboración del acta de veeduría ciudadana, así como el acta de recibo final, en las Secretarías de Planeación de los municipios de Sincé y Buenavista. Estas reuniones permitieron formalizar la información del alcance de las actividades y garantizar la coordinación institucional necesaria para el desarrollo del proyecto.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	---	--

11. CONCLUSIONES

El proyecto de *Mantenimiento Rutinario de la Malla Vial del Departamento de Sucre*, ejecutado entre el 19 de agosto y el 3 de noviembre de 2025, alcanzó de manera satisfactoria los objetivos establecidos en los contratos AMC-022-2024 y MC-019-2025. La interventoría verificó que las actividades ejecutadas se ajustaron a los lineamientos técnicos, administrativos, ambientales y sociales definidos, garantizando la adecuada transitabilidad y seguridad en los tramos viales intervenidos.

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron problemáticas que requirieron atención y ajustes operativos. Entre estas, destacaron las frecuentes lluvias registradas a lo largo de los periodos evaluados, las cuales ocasionaron retrasos puntuales en las actividades programadas, afectaron la movilidad de las cuadrillas y favorecieron el crecimiento acelerado de la vegetación en zonas adyacentes a la vía. Asimismo, se evidenció acumulación de sedimentos en las bermas, especialmente en los tramos Sampués–San Benito Abad y La Yee–Guaranda, situación no contemplada inicialmente en el alcance del proyecto y que hizo necesaria la inclusión de actividades complementarias para restablecer el drenaje y la funcionalidad de la vía. También se registró presencia de residuos sólidos en varios sectores, lo cual dificultó temporalmente algunas labores y exigió acciones adicionales de limpieza.

Pese a estas dificultades, el contratista logró ajustar su programación y mantener la continuidad de los trabajos, evitando desviaciones en los plazos y en la ejecución presupuestal. De igual forma, se cumplió estrictamente con los protocolos ambientales, laborales y de seguridad y salud en el trabajo, sin reportarse incidentes ni afectaciones de orden público.

El seguimiento técnico, administrativo y financiero llevado a cabo por la interventoría permitió verificar el desarrollo adecuado y la culminación total del proyecto, dejando evidencia documental completa y garantizando la trazabilidad de todas las actividades. En conjunto, el proyecto demuestra una gestión eficiente y una correcta articulación entre contratista, interventoría y entidades territoriales, cumpliendo plenamente con el objeto contractual y aportando al mejoramiento de la infraestructura vial del Departamento de Sucre.

 DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892.280.021-1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. INFORME FINAL	 INGENORTE S.A.S NIT 901.752.114-6
--	--	--

12. ANEXOS

- ANEXO 1. Correspondencia generada entre contratista e interventor
- ANEXO 2. Registro Fotográfico del Avance de las Obras.
- ANEXO 3. Copia de la Bitácora.
- ANEXO 4. Informe de Gestión de Interventoría FSI-800-003.
- ANEXO 5. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría FSI-800-018.
- ANEXO 6. Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría FSI-800-019.
- ANEXO 7. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría FSI-800-020.
- ANEXO 8. Programación de obra
- ANEXO 9. Seguimiento Garantías Contrato Interventoría FSI-800-021.
- ANEXO 10. Resumen Mensual de Estado de Obra FSI-800-023.
- ANEXO 11. Informes Quincenales FSI-800-002.
- ANEXO 12. Maquinaria y Equipo Contrato Obra FSI-800-006.
- ANEXO 13. Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra FSI-800-007.
- ANEXO 14. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra FSI-800-010.
- ANEXO 15. Estado General del Tiempo FSI-800-008.
- ANEXO 16. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra FSI-800-011.
- ANEXO 17. Programación y/o Reprogramación de inversiones FSI-800-014.
- ANEXO 18. Seguimiento Programa de Inversiones FSI-800-015.
- ANEXO 19. Actas de comité
- ANEXO 20. Informe PGIO
- ANEXO 21. Certificado de disposición de material
- ANEXO 22. Actas de Socialización y veeduría
- ANEXO 23. Actas de entrega final
- ANEXO 24. Documentos contractuales
- ANEXO 25. Aspectos presupuestales y legales

ANEXO 1.

Correspondencia Generada entre Contratista e
Interventor

CORRESPONDENCIA DE SALIDA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO	RECIBE	
17/7/2025	INORTE-001-2025	ENVIO CORREO ELECTRONICO	SI	Gob. sucre - Consorcio HAI	
16/7/2025	INORTE-002-2025	PAGO ESTAMPILLA CONTRATO	SI	Gob. sucre	
18/7/2025	INORTE-003-2025	PAGO DE POLIZAS INICIALES	SI	Gob. sucre	
23/7/2025	INORTE-004-2025	APROBACIÓN HV PERSONAL DE OBRA	SI	Gob. sucre - Consorcio HAI	
14/8/2025	INORTE-005-2025	ENTREGA HOJAS DE VIDA	SI	Gob. sucre	
25/8/2025	INORTE-006-2025	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA	SI	Gob. sucre	
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	RECIBIDO	ENTREGA	
23/7/2025		ENTREGA HOJAS DE VIDA PERSONAL DE OBRA	SI	CONSORCIO HAI	
25/7/2025	COHAI-004-2025 COHAI-005-2025	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL	SI	CONSORCIO HAI	
6/8/2025	COHAI-006-2025	REMISIÓN DE RUT ACTUALIZADO POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGA	SI	CONSORCIO HAI	
8/8/2025	COHAI-007-2025	DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO	SI	CONSORCIO HAI	
15/8/2025	COHAI-008-2025	DOCUMENTOS MAQUINARIA	SI	CONSORCIO HAI	
20/8/2025	SI-1631	COMITÉ TECNICO	SI	Gob. Departamento de sucre	

CORRESPONDENCIA 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025					
CORRESPONDENCIA DE SALIDA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO	RECIBE	
03/09/2025	INORTE-007-2025	POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA CON ACTA DE INICIO	SI	Gob. sucre	
22/09/2025	OFICIO	RADICA SOLICITUD DE ITEMS NO PREVISTO	SI	Gob.sucre	
25/09/2025	INORTE-008-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°1	SI	Gob.sucre	
25/09/2025	INORTE-009-2025	RADICADO INFORME MENSUAL N°1	SI	Gob.sucre	
30/09/2025	INORTE-010-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°2	SI	Gob.Sucre	
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	RECIBIDO	ENTREGA	
01/09/2025	SI-1764	REPROGRAMACIÓN COMITE DE OBRA	SI	Gob. de sucre	
19/09/2025	OFICIO	NOTIFICACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	SI	COHAI	

CORRESPONDENCIA 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025					
CORRESPONDENCIA DE SALIDA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO	RECIBE	
08/10/2025	INORTE-011-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°3	SI	Gob.Sucre	
08/10/2025	INORTE-012-2025	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2	SI	Gob.Sucre	
10/10/2025	INORTE-013-2025	RADICADO ACTA N°1 INTERVENTORIA	SI	Gob.Sucre	
22/10/2025	INORTE-015-2025	TRASLADO MODIFICATORIA N°1	SI	Gob.Sucre	
28/10/2025	INORTE-014-2025	RADICADO QUINCENAL N°4	SI	Gob.Sucre	
31/10/2025	INORTE-016-2025	RADICADO FACTURACIÓN N°2 INTERVENTORIA	SI	Gob.Sucre	
CORRESPONDENCIA DE ENTRADA					
FECHA	No. CONSECUTIVO	ASUNTO	RECIBIDO	ENTREGA	
21/10/2025	COHAI-013-2025	MODIFICATORIA #1	SI	COHAI	
30/10/2025	SI-1984	APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS	SI	Gob. de sucre	

ANEXO 2.

Registro Fotográfico del Avance de las Obras.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: MC-019-2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA- DEPARTAMENTO DE SUCRE- TRAMO COROZAL-SAN JUAN DE BETULIA-SINCÉ		
FECHA (D/M/A): 2/09/2025		
19 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
T : SINCÉ - BETULIA - COROZAL		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pab ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
TRAMO : SINCÉ - BETULIA - COROZAL		

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 3 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN
TRAMO 3: SINCÉ - BETULIA - COROZAL



Trabajos de rocería en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre el PR19 al PR12

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION
 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN EL TRAMO DE SINCÉ - BETULIA - COROZAL



Limpieza de obras de arte en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre los PR 19 al PR12

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE SINCÉ - BETULIA - COROZAL



ABS K19+000
21 de Agosto de 2025
9°15'16.056"N, 75°8'57.294"W
Sincé - Betulia - Corozal
Colombia

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION

INTALACIÓN DE VALLAS E IMPLEMENTACIÓN DE PGIO EN EL TRAMO DE SINCÉ - BETULIA - COROZAL



ABS K19+000
21 de Agosto de 2025
9°15'16.056"N, 75°8'57.294"W
Sincé - Betulia - Corozal
Colombia

Instalación de vallas e implementación de PGIO en tramo Sincé-Betulia-Corozal

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZÁLEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: MC-019-2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA Terciaria - Departamento de Sucre - Tramo Sampués-San Benito		
FECHA (D/M/A): 2/09/2025		
19 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SAMPUÉS - SAN BENITO		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C - Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
1. LUGAR : SAMPUÉS - SAN BENITO		



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022




Observación: Fotografía del tramo 1 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

DURANTE INTERVENCIÓN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN



TRAMO 1: SAMPUÉS - SAN BENITO

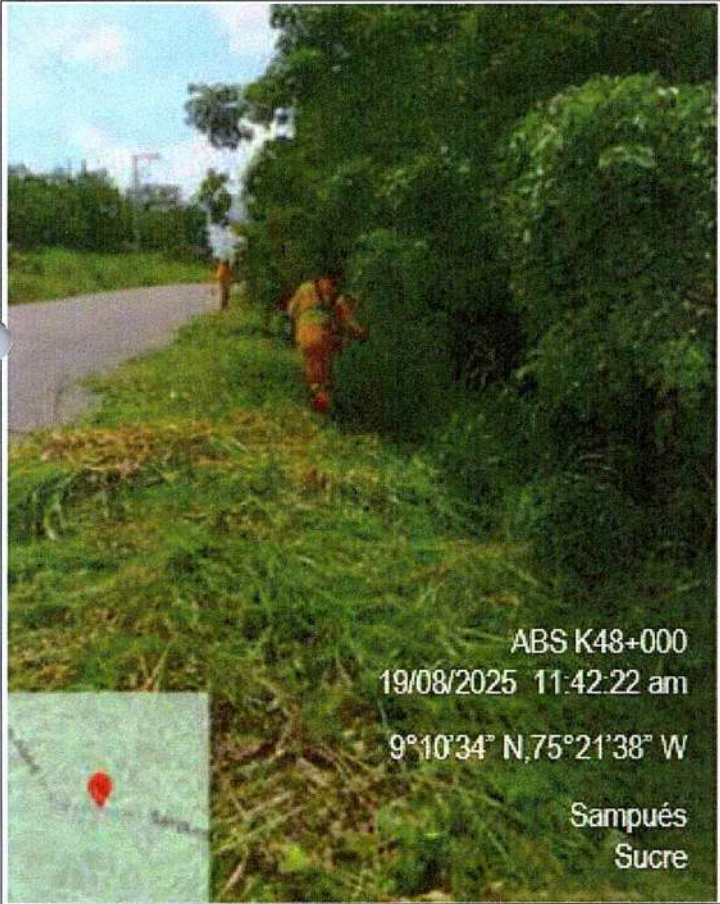

Trabajos de roceria en tramo de Sampues - San benito en la ABS K48+000


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS EN EL TRAMO DE SAMPUES - SAN BENITO



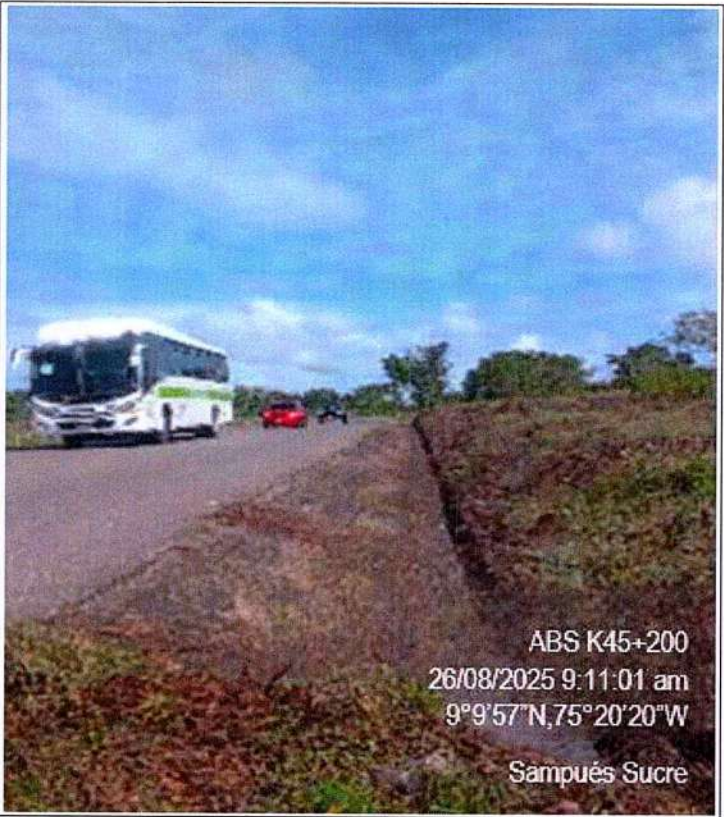
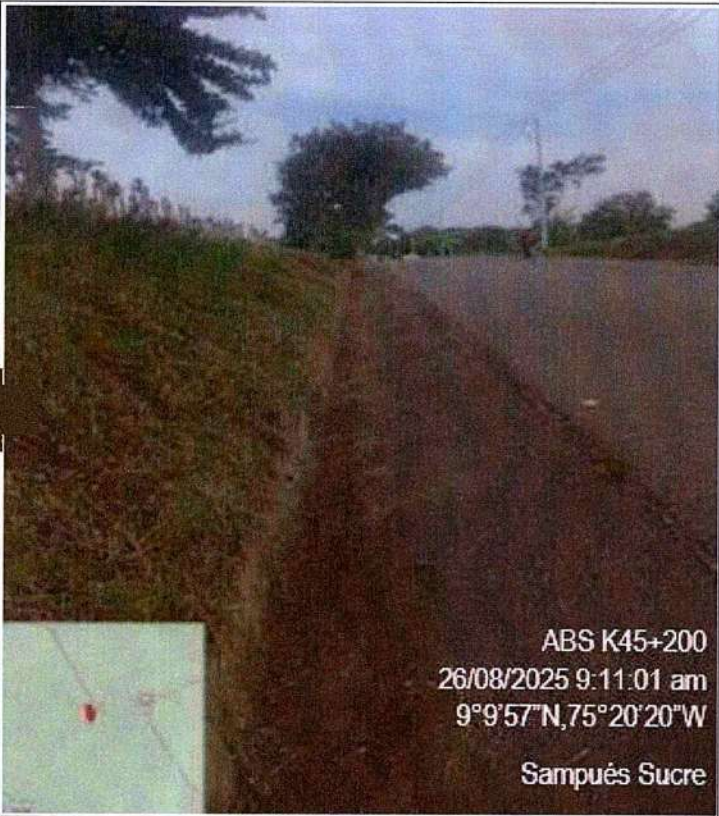


	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022


3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN
RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SAMPUÉS - SAN BENITO

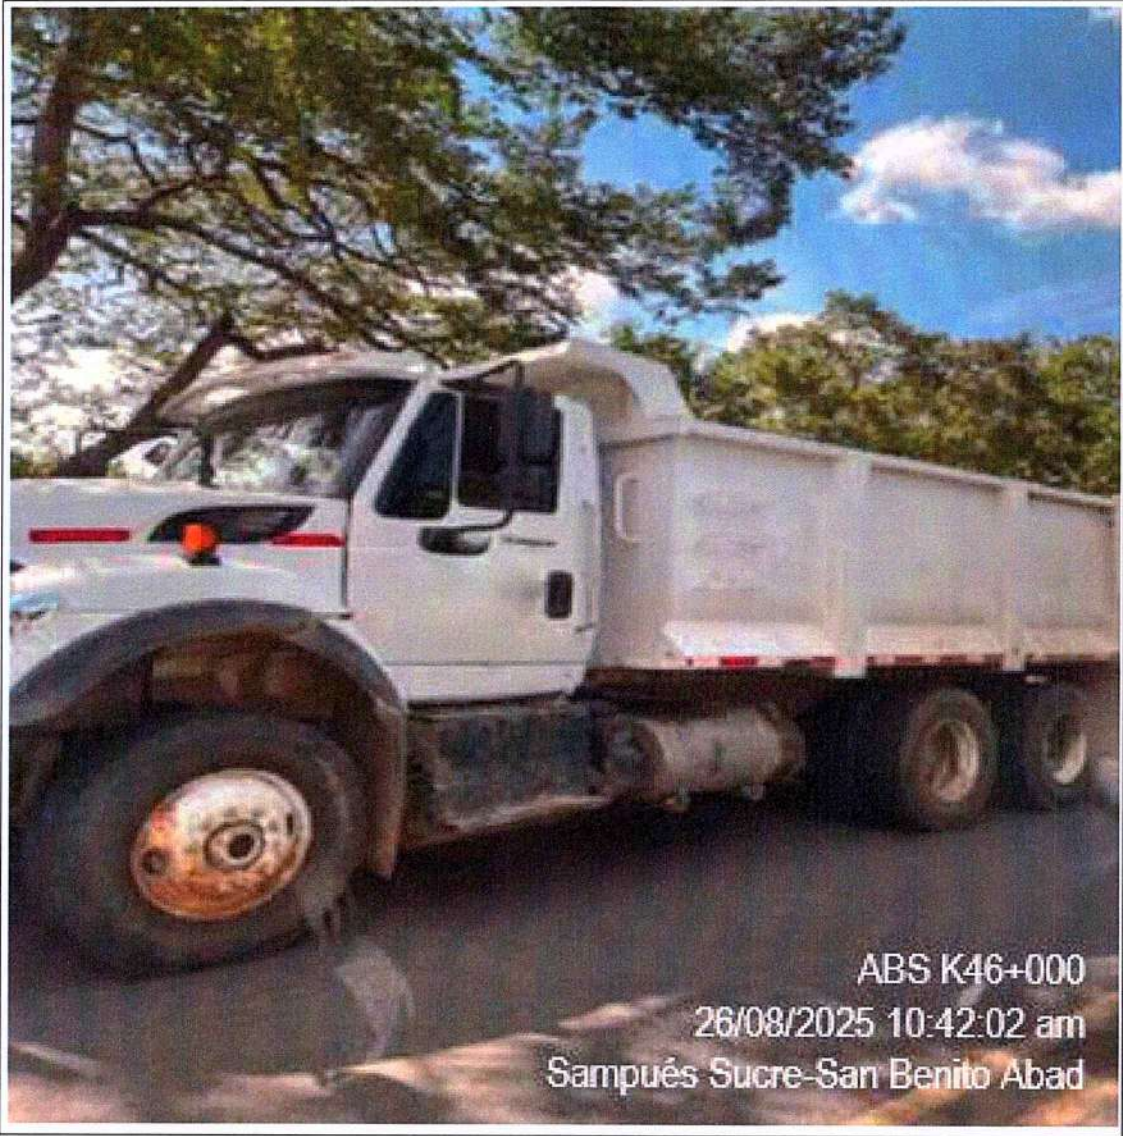

Retiro de material vegetal Sampués - San Benito

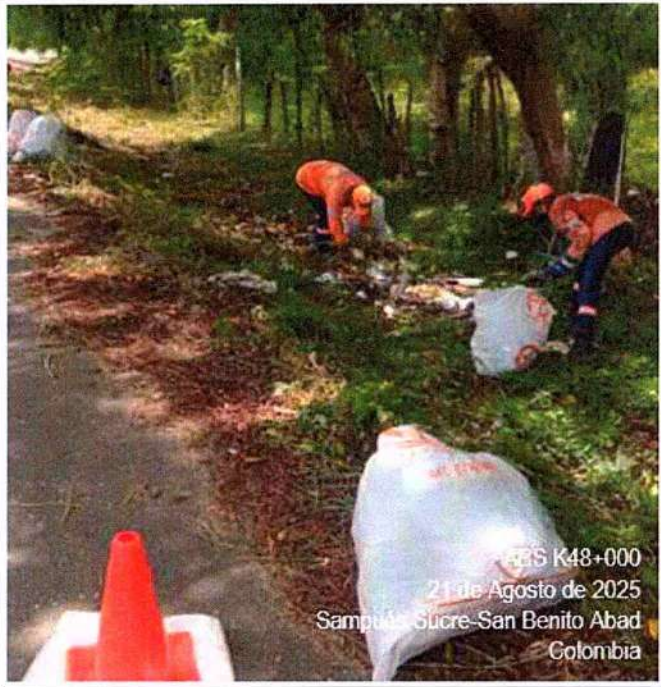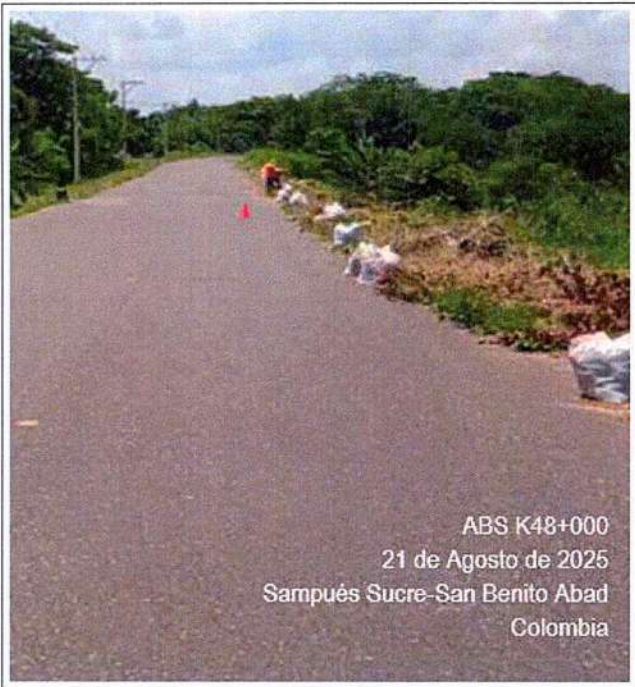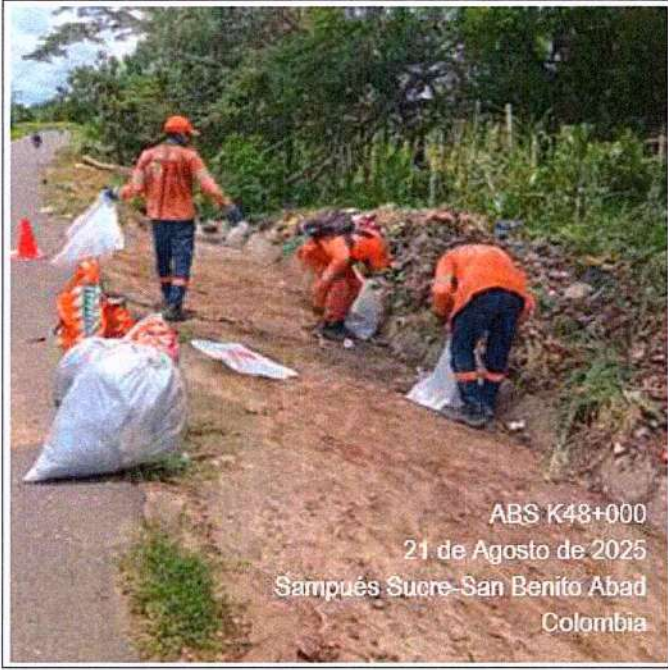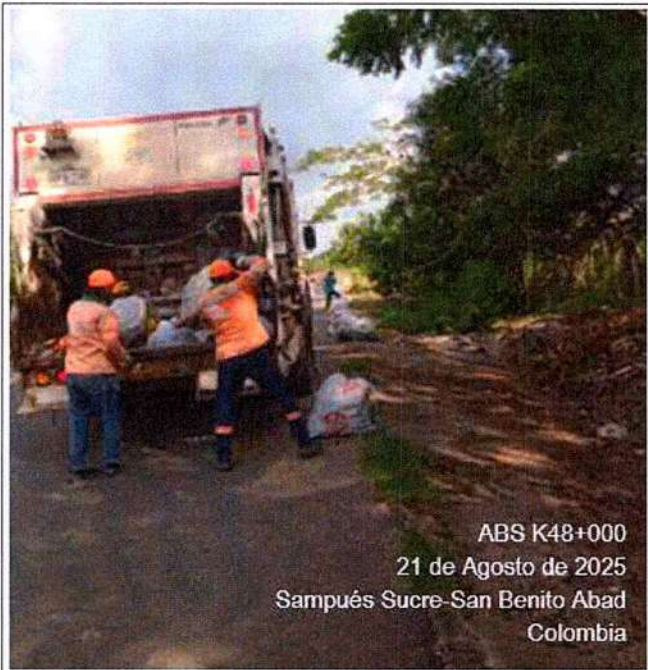	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN		
RECOLECCIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS		
 ABS K48+000 21 de Agosto de 2025 Sampués Sucre-San Benito Abad Colombia	 ABS K48+000 21 de Agosto de 2025 Sampués Sucre-San Benito Abad Colombia	
 ABS K48+000 21 de Agosto de 2025 Sampués Sucre-San Benito Abad Colombia	 ABS K48+000 21 de Agosto de 2025 Sampués Sucre-San Benito Abad Colombia	
Nota: Garantice que durante cada periodo se evidencie el cumplimiento de las actividades. Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas. En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto. Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)		
Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER	
		
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Entidad:	INGENORTE S.A.S	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: MC-019-2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE SUCRE-VIA SECUNDARIA- TRAMO SAN ANTONIO DE PALMITO - LIMITES DE CORDOBA		
FECHA (D/M/A): 2/09/2025		
19 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SAN ANTONIO DE PALMITO-LIMITES DE CORDOBA		
Z ☐ ☒ ☐ ☐ ☐		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
TRAMO : SAN ANTONIO DE PALMITO-LIMITES DE CORDOBA		

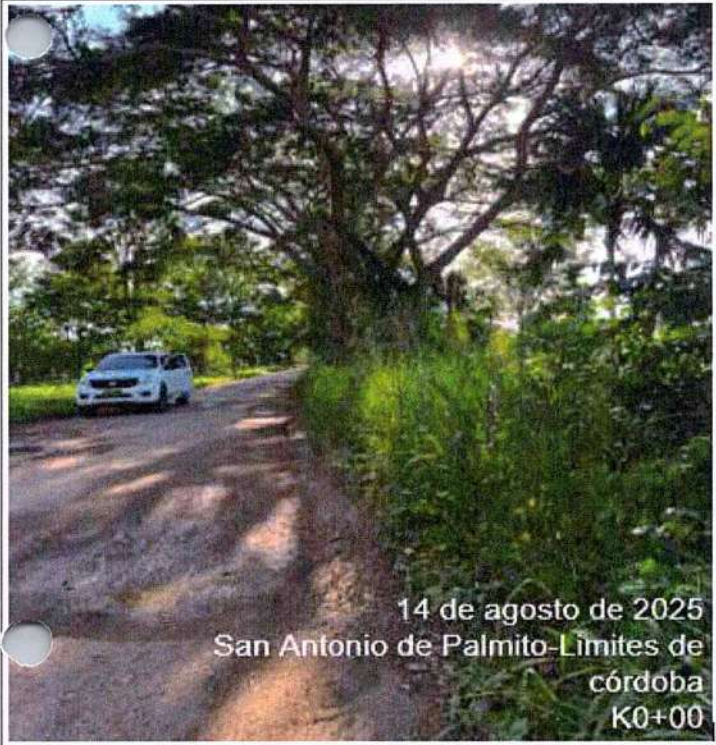

Observación: Fotografía del tramo 5 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRAMO 5: SAN ANTONIO DE PALMITO-LIMITES DE CORDOBA



Trabajos de roceria en tramo 5: San Antonio de Palmito-Limites de Cordoba entre PR 00 al PR 05

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN EL TRAMO DE PALMITO - FINCA SAN ANTONIO



ABS K6+000
27 de Agosto de 2025
San Antonio de Palmito-Limites de
Córdoba

Limpieza de obras de arte en tramo 5: San Antonio de Palmito-Limites de Cordoba del PR 04

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA-DEPARTAMENTO DE SUCRE_TRAMO SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		
FECHA (D/M/A): 30/09/2025		
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☒ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENCIÓN		
O : SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Código: F-IP-209

Versión: 03

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

Fecha de Aprobación:
Febrero 2022




Observación: Fotografía del tramo 8 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

TRAMO 5: SINCE-GRANADA-BUENAVISTA

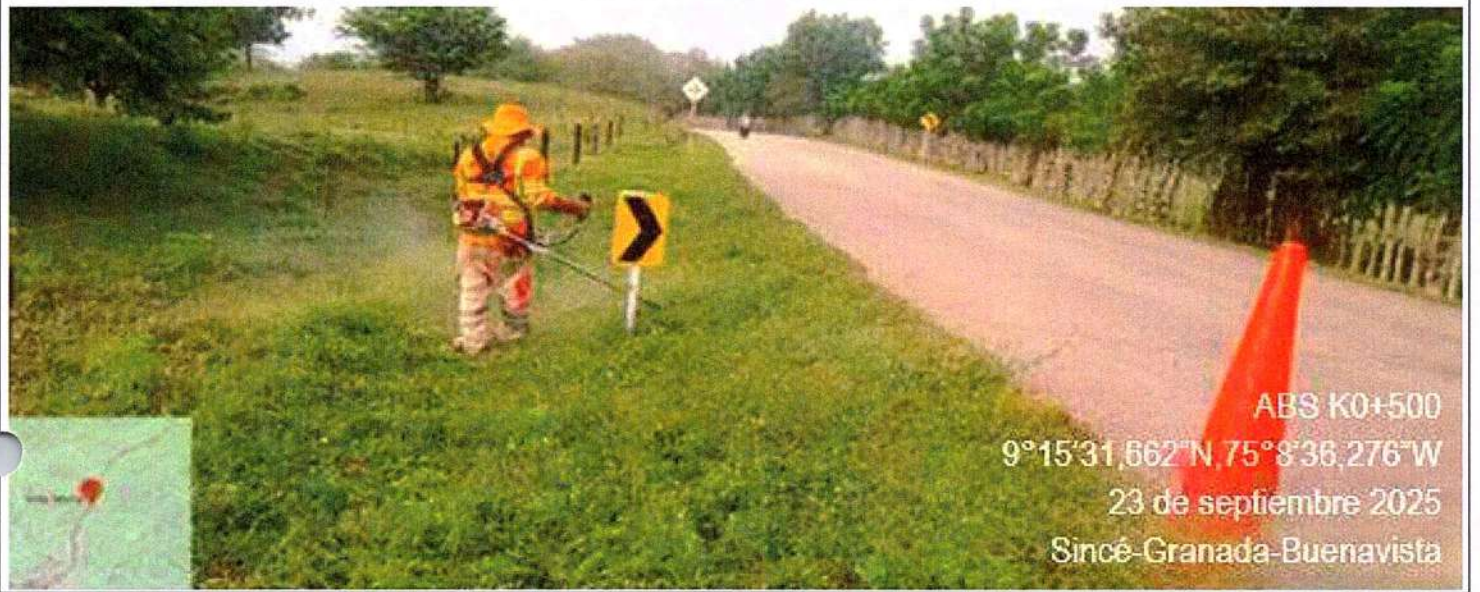

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Código: F-IP-209

Versión: 03

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

Fecha de Aprobación:
Febrero 2022



Trabajos de rocería en tramo 5: Sincé-Granada-Buenavista entre el PR00 al PR07



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Recolección y retiro de material vegetal

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea Gonzalez Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE SUCRE -VIA SECUNDARIA-TRAMO LA YEE-GUARANDA

FECHA (D/M/A): 30/09/2025

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

TRAMO : PALMITO - FINCA SAN ANTONIO

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) -
Unidad Cocinas/ Habitacional

ANTES DE INTERVENIR

O : LA YEE - GUARANDA



20 de agosto de 2025
ABS K 2+000
La Yee-Guaranda

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 6 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

DURANTE INTERVENCIÓN

TRAMO 6: LA YEE - GUARANDA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022





Trabajos de roceria en tramo 6: La Yee - Guaranda entre PR06 al PR08

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
 Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
 En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
 Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Empresa:	INGENORTE S.A.S

Andrea Gonzalez Ferrer

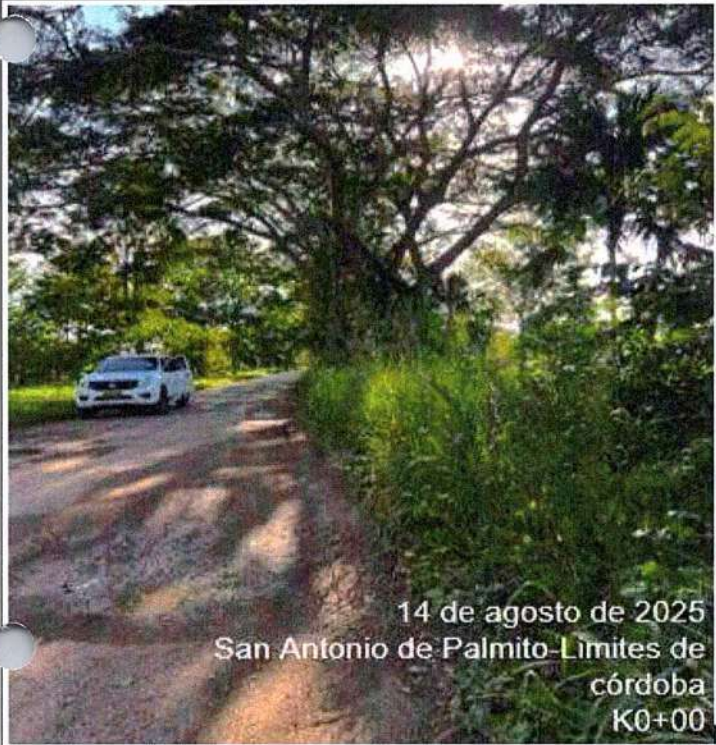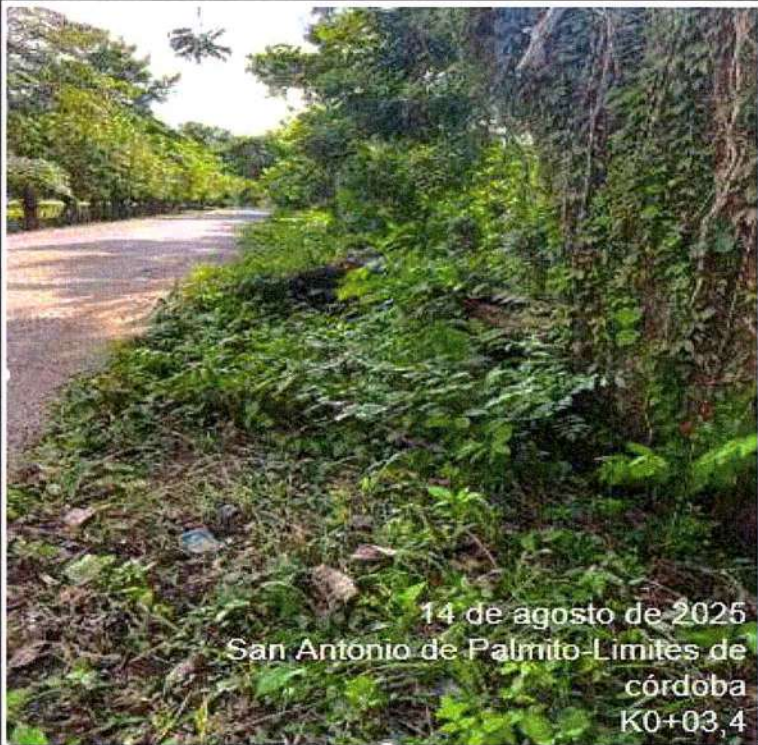	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE SUCRE		
FECHA (D/M/A): 30/09/2025		
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : LIMITES DE CORDOBA - SAN ANTONIO DE PALMITO		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ Plots ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
TRAMO : SAN ANTONIO DE PALMITO - LIMITES DE CORDOBA		
 14 de agosto de 2025 San Antonio de Palmito-Limites de córdoba K0+00	 14 de agosto de 2025 San Antonio de Palmito-Limites de córdoba K0+03,4	
 14 de agosto de 2025 San Antonio de Palmito-Limites de córdoba K0+00		

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Observación: Fotografía del tramo 5 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo		
DURANTE INTERVENCIÓN		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN		
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LÍMITES DE CORDOBA-SAN ANTONIO DE PALMITO		
 ABS K6+000 20 de septiembre 2025 9°20'23,838"N,75°32'54,918"W Palmito-Limites de Córdoba		
 ABS K6+000 20 de septiembre 2025 9°20'23,814"N,75°32'54,942"W Palmito-Limites de Córdoba		
Limpieza de obras de arte en tramo 5: San Antonio de Palmito - Limites de cordoba		
Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades. Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas. En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto. Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)		
Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER	
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Entidad:	INGENORTE S.A.S	
<i>Andrea Gonzalez Ferrer</i>		

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA- DEPARTAMENTO DE SUCRE- TRAMO COROZAL-SAN JUAN DE BETULIA-SINCÉ		
FECHA (D/M/A): 30/09/2025		
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SINCÉ - BETULIA - COROZAL		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
Tramo: SINCÉ - BETULIA - COROZAL		



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 3 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

TRAMO 3: SINCÉ - BETULIA - COROZAL



Trabajos de rocería en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN EL TRAMO DE SINCE - BETULIA - COROZAL



Limpieza de obras de arte en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre el PR13 al PR00

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCION
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE SINCÉ - BETULIA - COROZAL



Limpieza de cunetas de arte en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre el PR10 al PR00

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
 Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
 En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
 Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-IP-209
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: Febrero 2022
N° DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA Terciaria - DEPARTAMENTO DE SUCRE - TRAMO SAMPUÉS-SAN BENITO		
FECHA (D/M/A): 30/09/2025		
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SAMPUÉS - SAN BENITO		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
TRAMO : SAMPUÉS - SAN BENITO		




	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 1 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRAMO 1: ROCERIA SAMPUES - SAN BENITO


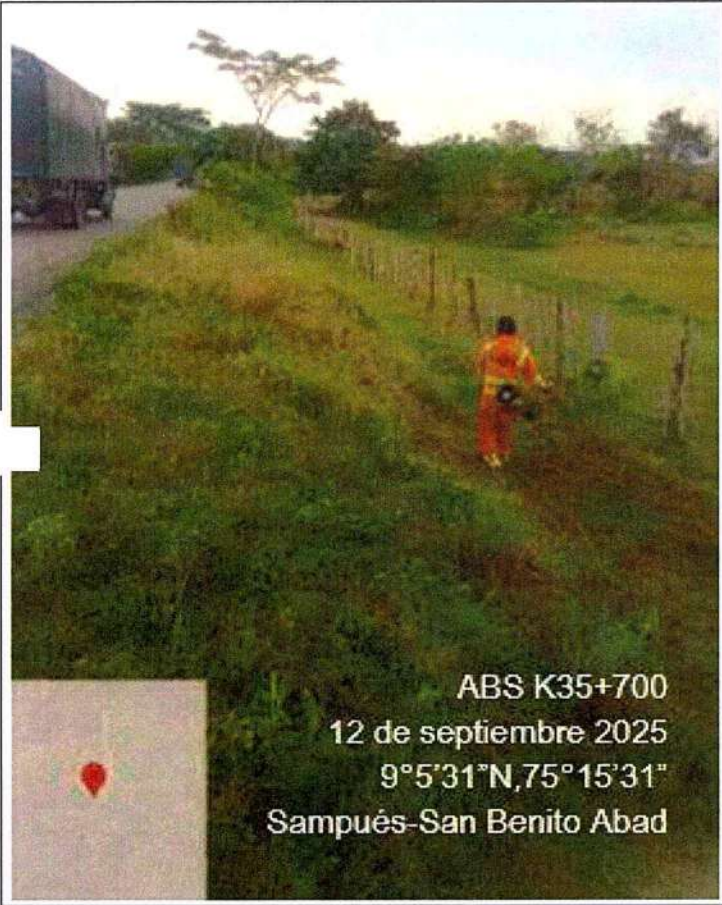


Trabajos de roceria en tramo de Sampues - San benito entre el PR36

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS EN EL TRAMO DE SAMPUES - SAN BENITO

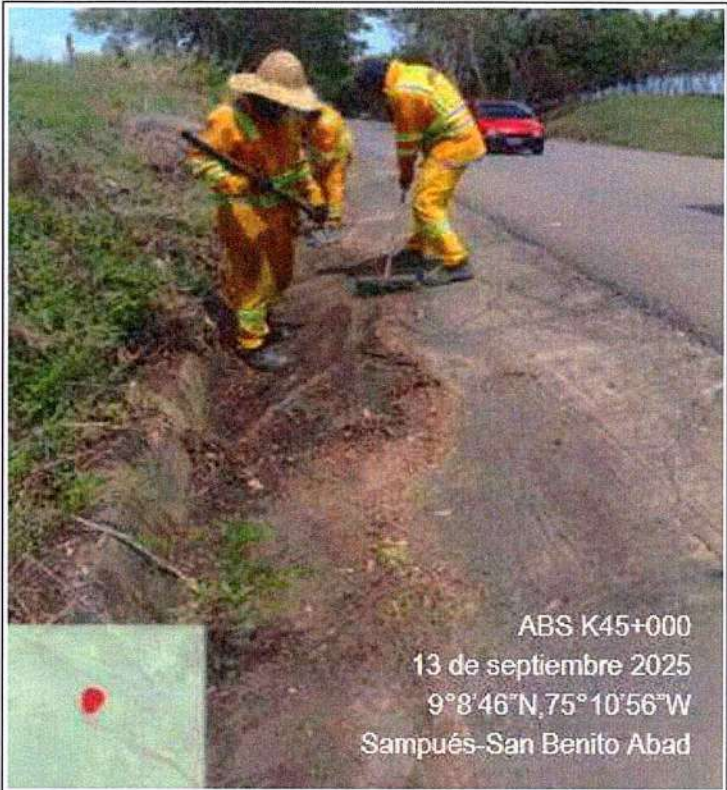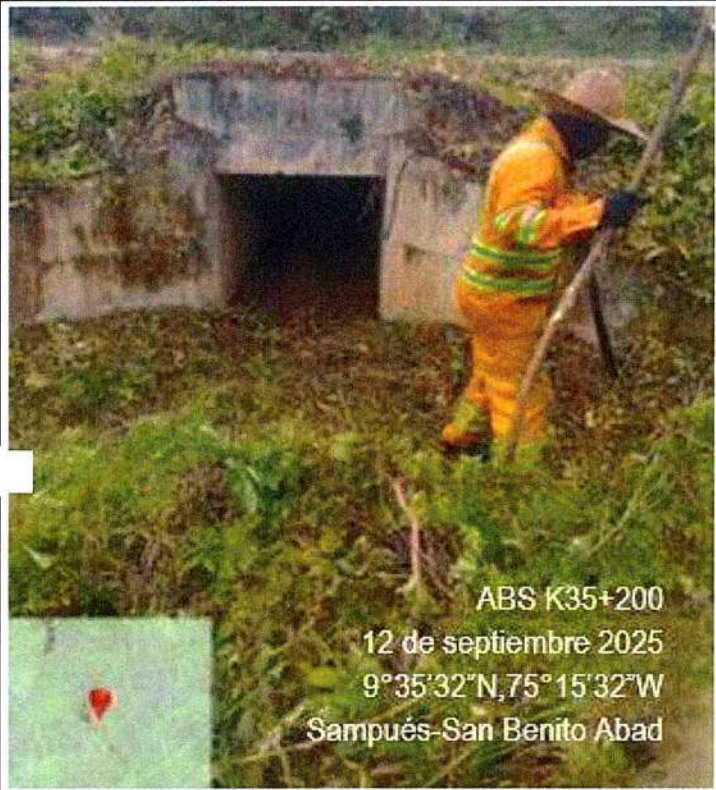

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE SUCRE -VIA SECUNDARIA-TRAMO LA YEE-GUARANDA		
FECHA (D/M/A): 3/11/2025		
1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : LA YEE - GUARANDA		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ PISO ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		

ANTES DE INTERVENIR

TRAMO : LA YEE - GUARANDA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 6 antes de intervenir, se adjuntará una memoria con el registro fotográfico antes de intervenir el tramo

DURANTE INTERVENCIÓN

TRAMO 6: LA YEE - GUARANDA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



17 de octubre de 2025
ABS K 6+500
La Yee-Guaranda

Limpieza de Berma con máquina PR 00 AL PR11

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Empresa:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-IP-209
		Versión: 03
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Fecha de Aprobación: Febrero 2022

Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE SUCRE -VIA SECUNDARIA-TRAMO CHINULITO-AGUACATE-CACIQUE

FECHA (D/M/A): 3/11/2025

1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

TRAMO : CHINULITO-AGUACATE-CACIQUE

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) -
 Unidad Cocinas/ Habitacional

ANTES DE INTERVENIR

7. TRAMO : CHINULITO-AGUACATE-CACIQUE



Chinulito-Cacique-Aguacate
16 de octubre 2025
k0+500




Chinulito-Aguacate-Cacique
20 de octubre de 2025
ABS K2+500

Observación: Fotografía del tramo 7 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN



ROCERIA TRAMO 7: CHINULITO-AGUACATE-CACIQUE

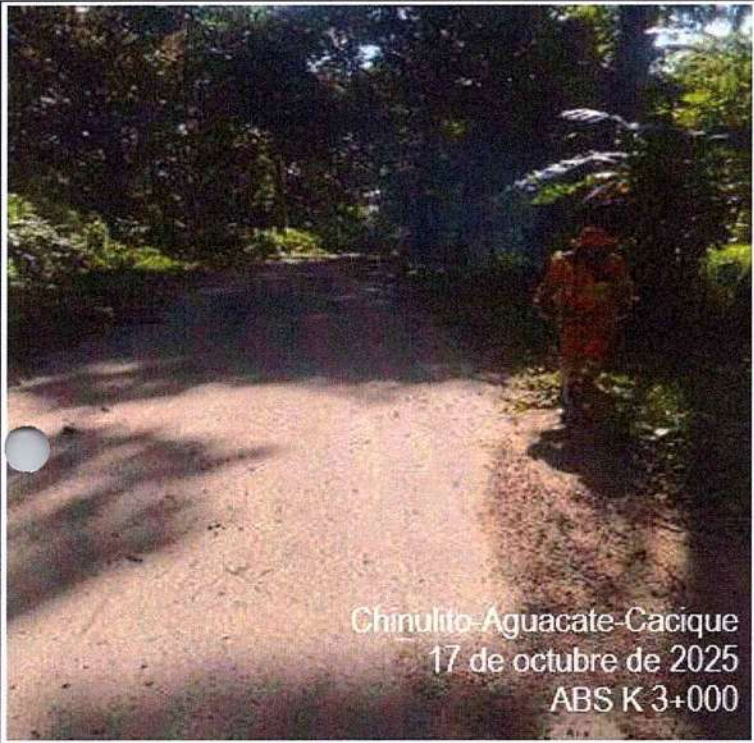

Roceria en tramo de Chinulito-Aguacate-Chinulito PR03

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS EN TRAMO 7: CHINULITO-AGUACATE-CACIQUE

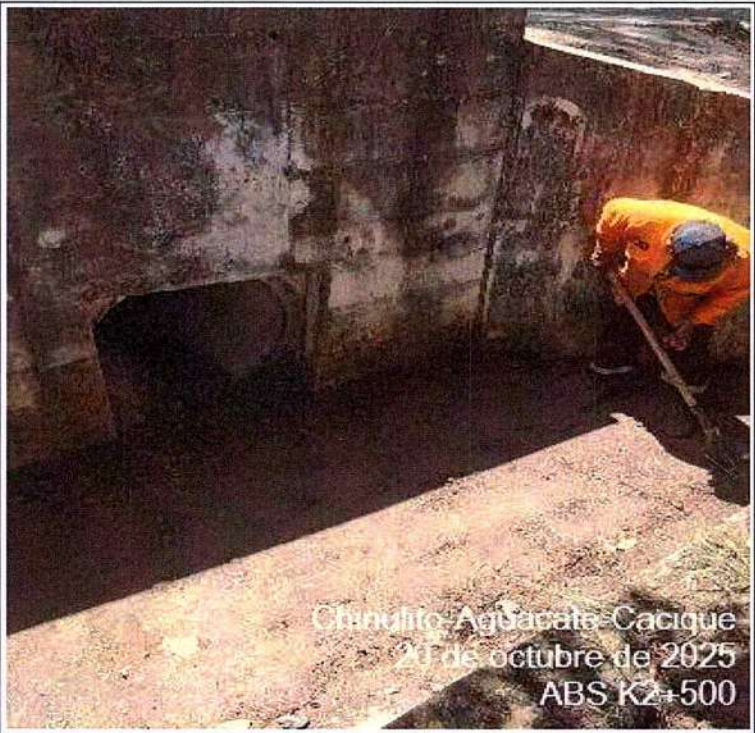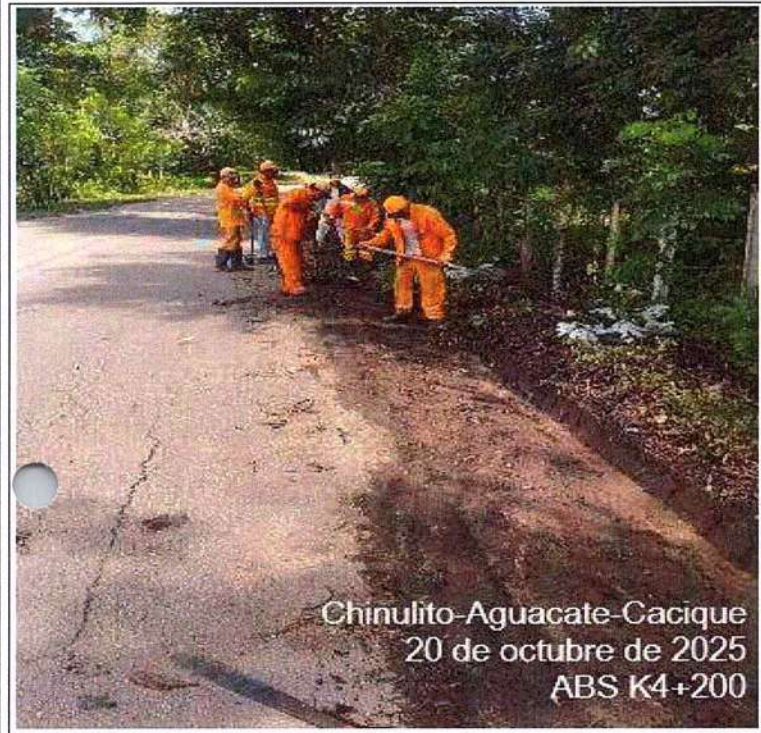

Limpieza de cunetas y obras de arte ebntre PR03 al PR05

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)



Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-IP-209
		Versión: 03
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2024		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE SUCRE		
FECHA (D/M/A): 3/11/2025		
1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : LIMITES DE CORDOBA - SAN ANTONIO DE PALMITO		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☒ Plots ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		

ANTES DE INTERVENIR

TRAMO : SAN ANTONIO DE PALMITO - LIMITES DE CORDOBA

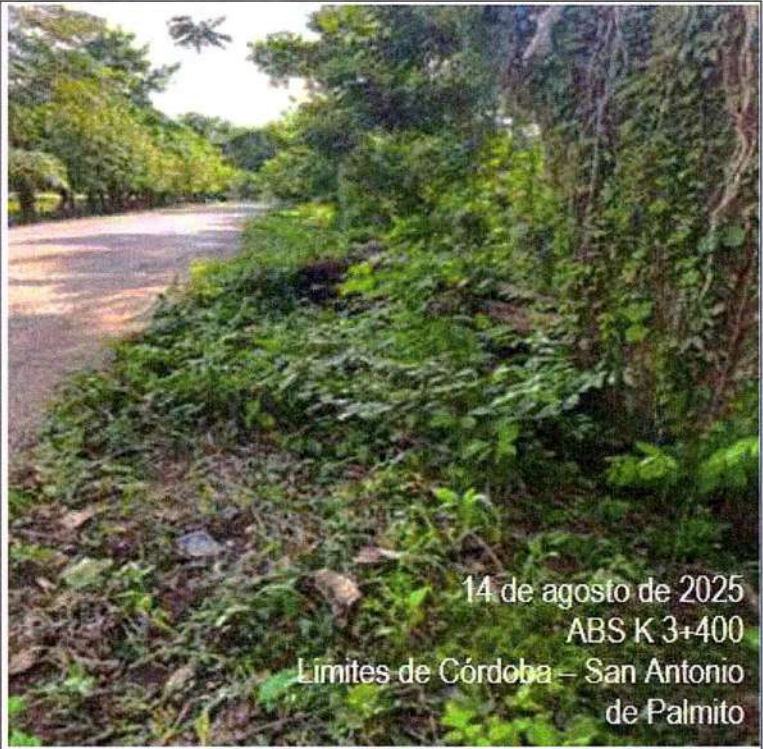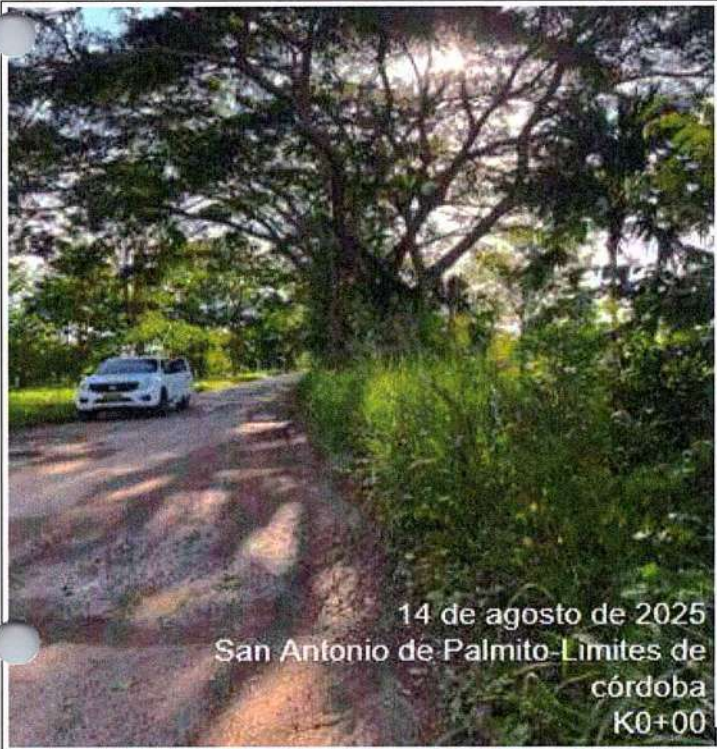

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Observación: Fotografía del tramo 5 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo		
DURANTE INTERVENCIÓN		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN		
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN LÍMITES DE CORDOBA-SAN ANTONIO DE PALMITO		





Limpeza de obras de arte en tramo 4: San Antonio de Palmito - Limites de cordoba PR00 al PR05

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZÁLEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA TERCIARIA- DEPARTAMENTO DE SUCRE - TRAMO SAN ANTONIO DE PALMITO - FINCA SAN ANTONIO		
FECHA (D/M/A): 3/11/2025		
1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE AL 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO: SAN ANTONIO DE PALMITO - FINCA SAN ANTONIO		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
O : SAN ANTONIO DE PALMITO - FINCA SAN ANTONIO		

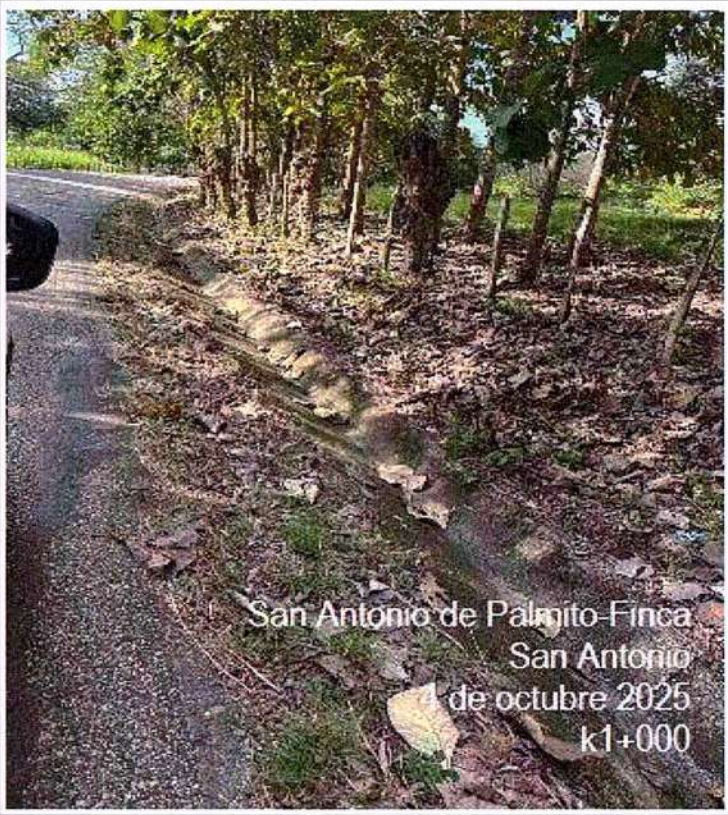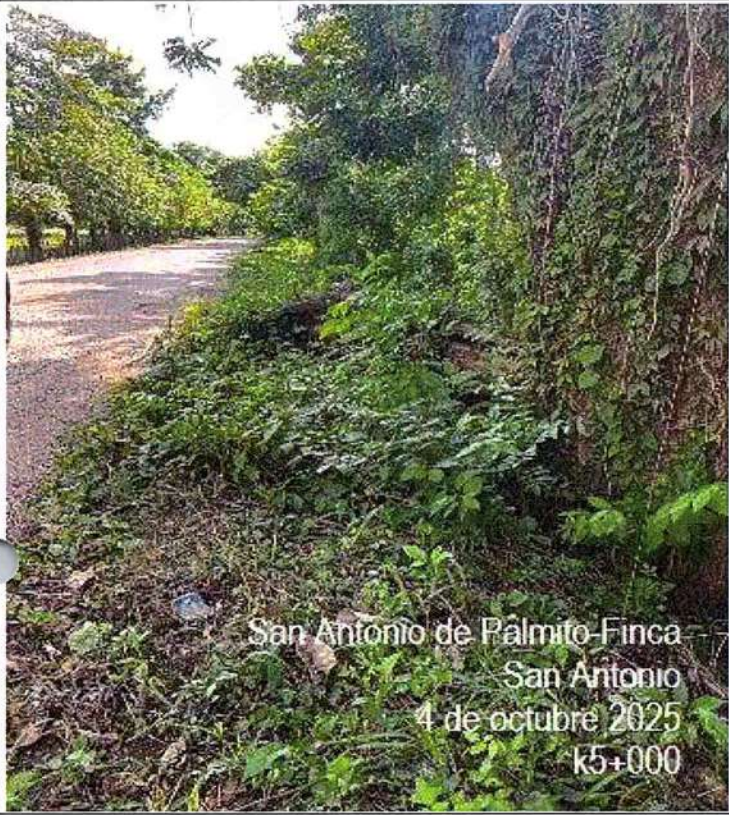

Observación: Fotografía del tramo 3 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN
TRABAJOS DEROCERIA SAN ANTONIO DE PALMITO-FINCA SAN ANTONIO



Trabajos de roceria en tramo 5: San Antonio de Palmito-Finca San Antonio PR 03 a PR04

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN EL TRAMO DE SAN ANTONIO DE PALMITO-FINCA SAN ANTONIO



Limpieza de obras de arte y cunetas en tramo 5: San Antonio de Palmito-Finca San Antonio

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea Gonzalez Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022
Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2024		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA- DEPARTAMENTO DE SUCRE- TRAMO COROZAL-SAN JUAN DE BETULIA-SINCÉ		
FECHA (D/M/A): 3/11/2025		
1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE AL 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SINCÉ - BETULIA - COROZAL		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☐ Piso ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENIR		
TRAMO : SINCÉ - BETULIA - COROZAL		



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 3 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE EN EL TRAMO DE SINCE - BETULIA - COROZAL



Limpieza de obras de arte en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre el PR15

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DE SINCÉ - BETULIA - COROZAL



Limpieza de cunetas de arte en tramo 3: Sincé - Betulia - Corozal entre el PR14

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea Gonzalez Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
VIA Terciaria - Departamento de Sucre - Tramo San Juan de Betulia-Albania

FECHA (D/M/A): 03/11/2025

1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

TRAMO : SAN JUAN DE BETULIA - ALBANIA

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☒ Social Comunitario ☒ Espacio Público ☒ Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☒ Pisos ☐ Cubierta ☒ Área Aprendizaje

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) -
Unidad Cocinas/ Habitacional

ANTES DE INTERVENIR

TÍTULO : SAN JUAN DE BETULIA - ALBANIA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 2 antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRAMO 1: ROCERIA SAN JUAN DE BETULIA - ALBANIA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



29 de octubre 2025
9°15'56,148"N,75°14'19,89"W
San Juan de Betulia – Albania
Colombia
K0+000

Trabajos de roceria en tramo de Sampues - San benito entre el PR00-PR04

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS EN EL TRAMO DE SAN JUAN DE BETULIA - ALBANIA



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



30 de octubre 2025
9°15'53,19"N,75°14'18,51"W
San Juan de Betulia – Albania
K0+470

Limpeza de obras de arte y cunetas de arte en tramo 2: SAN JUAN DE BETULIA - ALBANIA entre el PR00-PR04

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZÁLEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

Nº DE CONTRATO: AMC - 022 -2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
VIA TERCIARIA - DEPARTAMENTO DE SUCRE - TRAMO SAMPUÉS-SAN BENITO

FECHA (D/M/A): 3/11/2025

1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:

TRAMO : SAMPUÉS - SAN BENITO

SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☒ Social Comunitario ☒ Espacio Público ☒ Recreación y Deporte

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☒ Unidad Habitacional ☒ Pisos ☐ Cubierta ☒ Área Aprendizaje

KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración
☐ KIT B - Tanque de almacenamiento
☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo)
☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) -
Unidad Cocinas/ Habitacional

ANTES DE INTERVENIR

T. O : SAMPUÉS - SAN BENITO



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022





Observación: Fotografía del tramo 1 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRAMO 1: ROCERIA SAMPUÉS - SAN BENITO

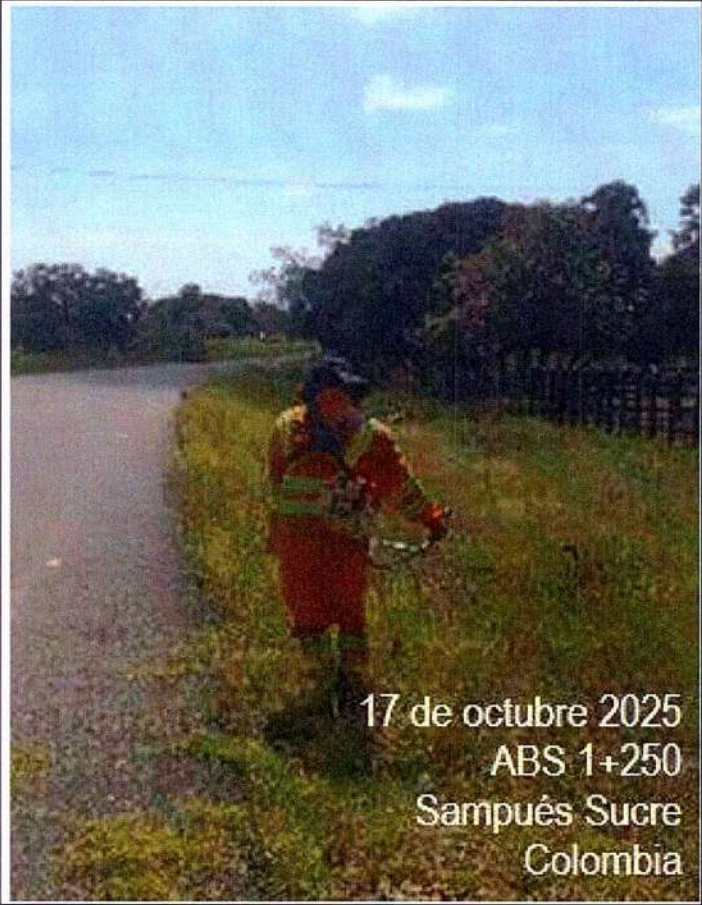
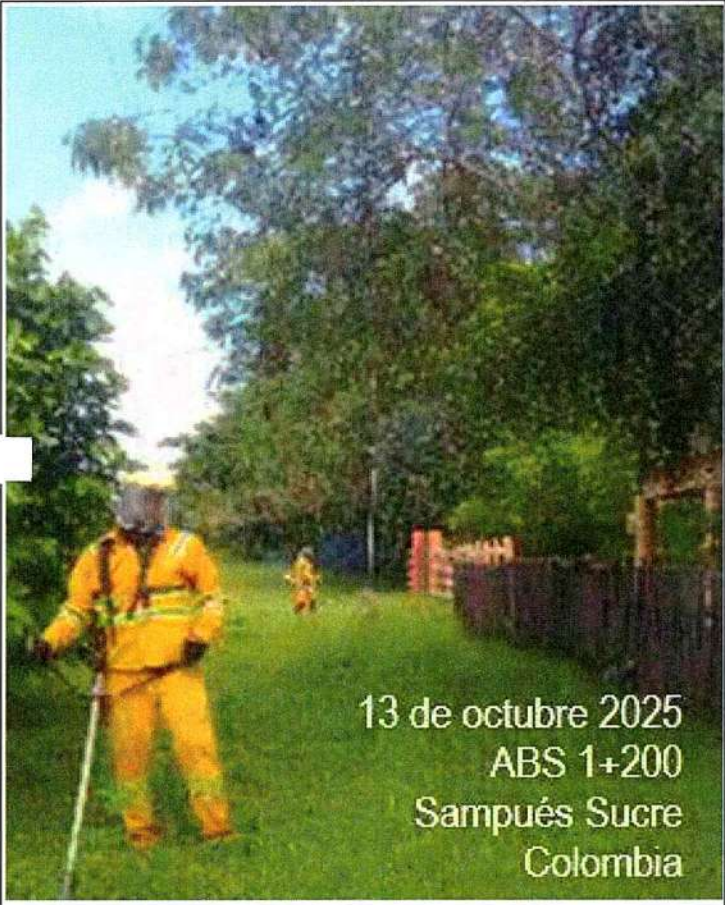


Trabajos de rocería en tramo de Sampues - San benito entre el PR24 - PR00



	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

2. REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS EN EL TRAMO DE SAMPUES - SAN BENITO

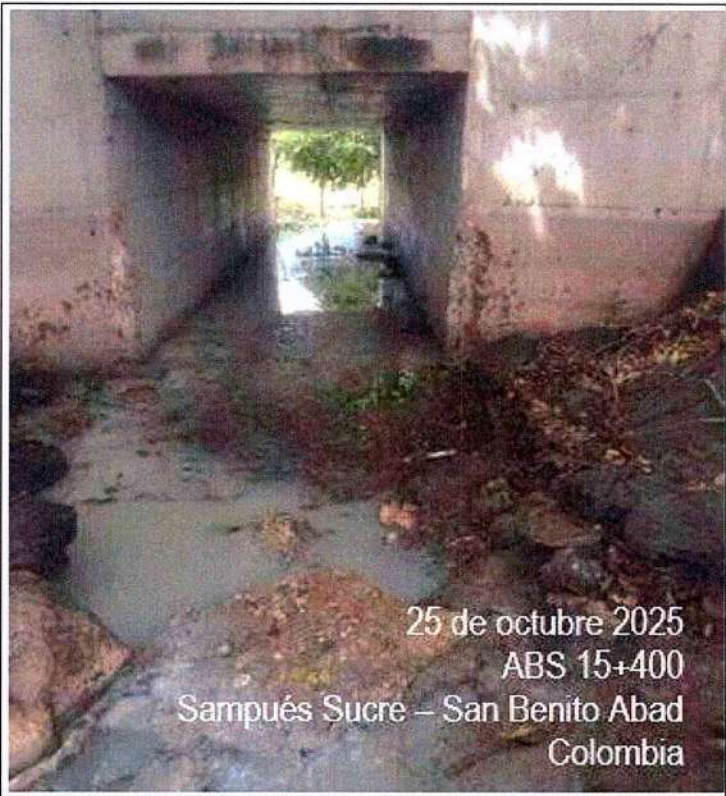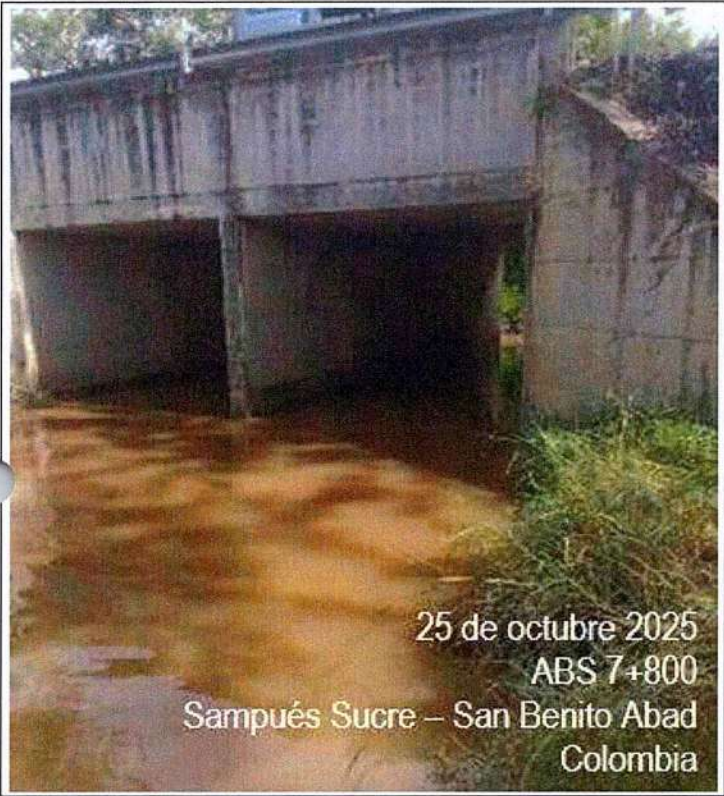

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

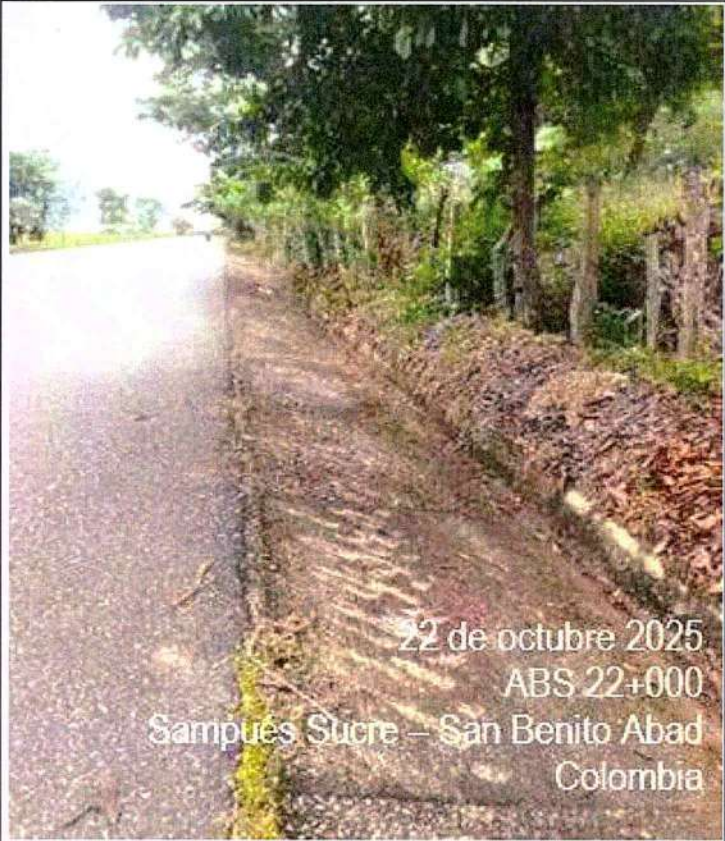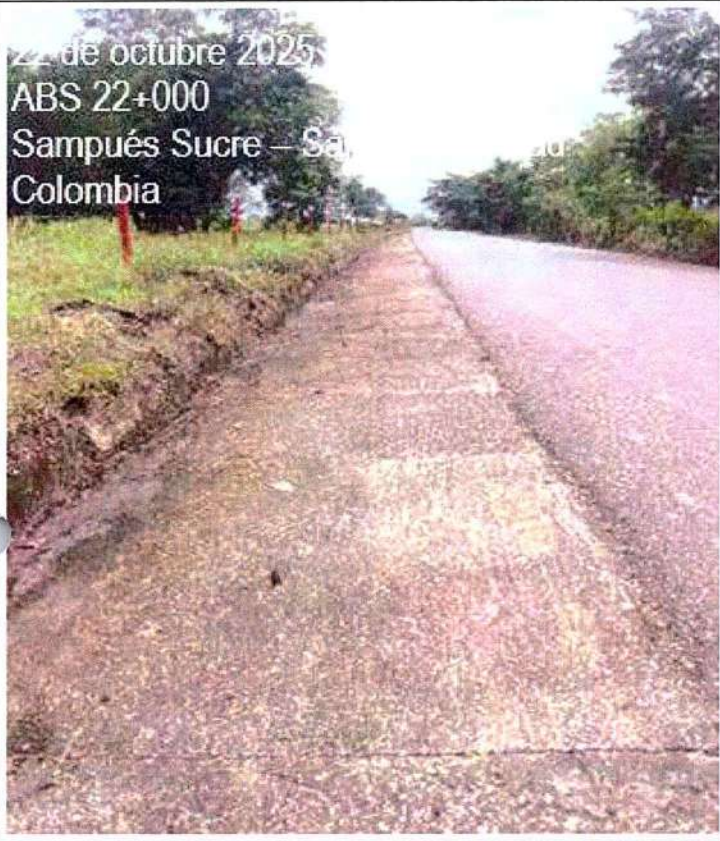

Limpieza de obras de arte y cunetas de arte en tramo 1: SAMPUES - SAN BENITO entre el PR24 al PR00

Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades.
 Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas.
 En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto.
 Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Carao:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
E d:	INGENORTE S.A.S

Andrea González Ferrer

REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-IP-209
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: Febrero 2022
N° DE CONTRATO: AMC - 022 -2025		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA-DEPARTAMENTO DE SUCRE_TRAMO SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		
FECHA (D/M/A): 31/11/2025		
1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2025		
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIO:		
TRAMO : SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público ☐ Recreación y Deporte		
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ PISO ☐ Cubierta ☐ Área Aprendizaje		
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional		
ANTES DE INTERVENCIÓN		
FO 8: SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA		



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Código: F-IP-209

Versión: 03

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

Fecha de Aprobación:
Febrero 2022



Observación: Fotografía del tramo 8 antes antes de intervenir, se adjuntara una memoria con el registro fotografico antes de intervenir del tramo

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022

DURANTE INTERVENCIÓN

TRAMO 8: SINCÉ-GRANADA-BUENAVISTA



Trabajos de rocería en tramo 8: Sincé-Granada-Buenavista entre el PR18

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-IP-209
		Versión: 03
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Febrero 2022



Limpieza de obras de arte PR09 a PR13	
Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades. Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas. En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto. Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)	
Nombre:	ANDREA GONZALEZ FERRER
Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Entidad:	INGENORTE S.A.S
<i>Andrea González Ferrer</i>	

ANEXO 3.

Copia de la Bitácora.

Martes 19 de agosto del 2025.

Clima: Soleado.


Personal: Residente de Obra, Residente Interventoria, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, Herramientas menores.

- Proceso en tramos de Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de obras de arte en Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de Cunetas en los tramos Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.


Res. de Obra


Residente Interv.

Miércoles 20 de agosto del 2025.

Clima: Soleado


Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Obreros.


Maquinaria y Equipos: Guadalupe, Herramientas menores.

- Proceso en tramos de Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de Obras de artes en Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de Cunetas en los tramos de Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.


Resid. de Obra


Residente Interv.

Jueves 21 de agosto del 2025.

Clima: Soleado


Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Obreros.


Maquinaria y Equipos: Guadalupe, Herramientas menores.

- Proceso en tramos de Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de Obras de artes en Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.

- Limpieza de Cunetas en los tramos de Sincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito.


Resid. de Obra


Residente Interv.

Viernes 22 de agosto de 2025

Clima: Lluvias en horas de la mañana, soleado por la tarde

Personal: Residente Obra, Residente Intermitente, Obreros

Maquinaria y Equipos: Gradora, Volqueta, Herramientas menores.

- Trabajos de recolección en los tramos de Ince - Betulia - Corozal, Sampaús - San Benito.

- Limpieza de Obras de arte en los tramos de Ince - Betulia - Corozal, Sampaús - San Benito.

- Limpieza de lincas en los tramos Ince - Betulia - Corozal, Sampaús - San Benito

- Remoción y retiro de material vegetal

[Signature] Andres Gonzalez -
Resid. de obra Residente Int.

Sábado 23 de agosto de 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente Intermitente, Obreros

Maquinaria y Equipos: Gradora, Volqueta, Herramientas menores.

- Trabajos de recolección en los tramos de Ince - Betulia - Corozal, Sampaús - San Benito.

- Limpieza de Obras de arte en los tramos de Ince - Betulia - Corozal, Sampaús - San Benito.

- Limpieza de lincas en los tramos de Ince - Betulia y Corozal, Sampaús - San Benito.

- Remoción y retiro de material vegetal

[Signature] Andres Gonzalez -
Resid. de obra Residente Int.

Domingo 24 de agosto de 2025.

Clima: Soleado

No se evidencian actividades.

Lunes 25 de agosto 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en los tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Obras de arte en Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Cunetas en tramos Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.

Resid. de obras.

Andrés Donques
Residente Interv.

Martes 26 de agosto de 2025.

Clima: Viento moderado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en los tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Cunetas en tramos Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.

Resid. de obras

Andrés Donques
Residente Interv.

Miércoles 27 de agosto de 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en los tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Cunetas en tramos de Lince - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda.

Jueves 28 de agosto 2025.

Clima: Soleado...

- Trabajos de roscía en los tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Limpieza de lunetas en los tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda

Personal: Residente de obra, Residente de Interventoría, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guaduaña, Herramientas menores

Resid. obras.

Andrés Jarama

Viernes 29 de agosto 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, Residente de Interventoría, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guaduaña, Volqueta, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en los tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda

Personal: Residente de obra, Residente de Interventoría, Obreros

- Remoción y retiro de material vegetal

Resid. de obras.

Andrés Jarama
Residente de obra

Sábado 30 de agosto 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, Residente de Interventoría, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guaduaña, Volqueta, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en los tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Limpieza de obras y de lunetas en los tramos de línea: Betulia - Corozal, Sumpués - San Benito, La Yee - Guaranda
- Remoción y retiro de material vegetal

Andrés Jarama

Domingo 31 de agosto 2025

Clima: Soleado

No se evidencian actividades

Lunes 1 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores

- Trabajos de poda en los framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Ant. Palmitos
- Limpieza de Obras de arte en framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmitos
- Limpieza de Casetas en framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmitos

Resid. de obras

Residente Int.

Martes 2 de Septiembre de 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores

- Trabajos de poda en los framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmitos
- Limpieza de Obras de arte en framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmitos
- Limpieza de Casetas en framos de Incaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Beuto, La Yce - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmitos

Resid. de obras

Residente Int.

Miércoles 3 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado


Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros


Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en tramos de Ince' - Betulia, - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de Obras de arte en tramos de Ince' - Betulia - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de lunetas en tramos de Ince' - Betulia - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.


Resd. de obras.


Residente interu.

Jueves 4 de Septiembre 2025.

Clima: Lluvias moderadas


Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros


Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en tramos de Ince' - Betulia - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de Obras de arte en tramos de Ince' - Betulia - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de lunetas en tramos de Ince' - Betulia - Corozal, Sampsués - San Benito, La Yca - Guaranda, Límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.


Resd. de obras.


Residente interu.

Viernes 5 de Septiembre de 2025

Clima: Lluvias moderadas

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadana, Herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de rousia en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Limpieza de Obras de arte en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Limpieza de Cunetas en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, La Yee - Guaranda, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Retención y retiro de material Vegetal.

Res. de obras.

Andrea Dora
Res. de Int.

Sábado 6 de Septiembre de 2025.

Clima: Lluvias moderadas

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadana, Herramientas menores, Volqueta.

- Trabajos de rousia en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Limpieza de Obras de arte en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Limpieza de Cunetas en tramos de Inca - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Cordoba - San Antonio de Palmiro.

- Retención y Retiro de material Vegetal.

Res. de obras.

Andrea Dora
Res. de Int.

Domingo 7 de Septiembre 2025.

Clima: Lluvias moderadas

No se evidencian Actividades.

Lunes 8 de Septiembre 2025

Clima: Soleado, Humid. moderada Maquinaria y Equipos: Guadalupe

Personal: Residente de Obra, Residente Intermitente, Obreros

- Trabajos de roquera en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, San Antonio de Palmito - límites de Córdoba
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Cunetas en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito

[Signature] *[Signature]*
 Rend. de Obra Residente Int.

Martes 9 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

Personal: Residente de Obra, Residente Intermitente, Obreros

- Trabajos de roquera en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Cunetas en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito

[Signature] *[Signature]*
 Rend. de Obra Residente Int.

Miércoles 10 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Intermitente, Obrero

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajos de roquera en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Obras de arte en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Cunetas en tramos de línea - Betulia - Corozal, Sumpuís - San Bauto, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito

[Signature] *[Signature]*

Jueves 11 de Septiembre 2025.



Clima: lluvia moderada

Personal: Residente de Obra, Residente Interventoria, Obrero.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores

Personal:

- Trabajos de roscía en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Limpieza de Cunetas en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.


Res. de Obras. 
Residente Int.



Viernes 12 de Septiembre 2025.

Clima: lluvia moderada.

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, obrero

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de roscía en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Limpieza de Cunetas en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Recolección y retiro de material vegetal


Res. de Obras. 
Residente Int.

Sábado 13 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, obrero

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de roscía en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Limpieza de Cunetas en tramos de Jincé - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de lanchas en los tramos de Sinaí - Betulia - Corozal, Sampués - San Benito, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.
- Rotación y retiro de material vegetal.

[Signature] *[Signature]*
 Rend. Obras Rend. Obras
 Rend. Obras Rend. Obras

Domingo 14 de septiembre 2025.

Clima: Soleado.

No se evidenciaron actividades.

[Signature] *[Signature]*
 Rend. Obras Rend. Obras

Lunes 15 de septiembre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, obrero.

Maquinaria y Equipo: Guadana, herramientas menores.

- Trabajos de roquera en los tramos de Sampués - San Benito, Sinaí - Betulia y Corozal, Lu Yee - Guaranda, límites de Córdoba - San Antonio P.
- Limpieza de Obras de arte en los tramos de Sampués - San Benito, Lu Yee - Guaranda, Sinaí - Betulia - Corozal, límites de Córdoba - S. An.
- Limpieza de lanchas en los tramos de Sampués - San Benito, Lu Yee - Guaranda, Sinaí - Betulia - Corozal, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

[Signature] *[Signature]*
 Rend. Obras Rend. Obras
 Rend. Obras Rend. Obras

Martes 16 de septiembre 2025

Clima: Vientos moderados.

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, obreros.

Maquinaria y Equipo: Guadana, herramientas menores.

- Trabajos de roquera en los tramos de Sampués - San Benito, Sinaí - Betulia, Lu Yee - Guaranda, l.m. de Córdoba - S. Antonio de P.

Sampues - San Benito, Corozal - Betulia, Sincé, La Yee -
Guaranda, límites de Córdoba - San Antonio de Palmito.

- Limpieza de Cunetas Sampues - San Benito, Sincé - Betulia -
Corozal, La Yee - Guaranda, límites de Córdoba - San Antonio de
Palmito.

[Signature]

Resid. Obra

[Signature]
Andra Conzues Resident

Miércoles 17 de septiembre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Residente de Obra, Residente Interautoría, obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajos de roscía en tramos Sampues - San Benito,
Sincé - Corozal - Betulia, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Sampues - San
Benito, Sincé - Betulia - Corozal, La Yee - Guaranda.
- Limpieza de Cunetas en Sampues - San Benito, Sincé - Betulia -
Corozal, La Yee - Guaranda.

[Signature]

Resid. Obras

[Signature]
Andra Conzues
Residente Interv.

Jueves 18 de septiembre 2025.

Clima: Lluvias moderadas.

Personal: Residente de Obra, Residente Interautoría, obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas Menores.

- Trabajos de roscía en tramos de Sampues - San Benito,
Sincé - Corozal - Betulia, La Yee - Guaranda, lim. de Córdoba, S. Antonio P
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Sampues - San Benito,
Sincé - Corozal - Betulia, La Yee - Guaranda, lim. de Córdoba - San Antonio.
- Limpieza de Cunetas en Sampues - San Benito, Sincé - Betulia -
Corozal, La Yee - Guaranda, límites de Córdoba - San Antonio de
Palmito.

[Signature]

Resid. Obra

[Signature]
Andra Conzues
Residente Interv.



Viernes 19 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Intendencia, Obrero.

Maquinaria y Equipos: Guadañas, Herramientas menores, Volquete

- Trabajos de roscía en tramos de San Benito - Jampuis,
- Sancti - Betulia - Corozal, La Yca - Guaranda, Lim de Cid - San Antonio
- Limpieza de Obras de arte en tramos de San Benito - Jampuis,
- Sancti - Betulia - Corozal, La Yca - Guaranda, Lim de Cid - San Antonio
- Limpieza de Lunetas en tramos de San Benito - Jampuis,
- Sancti - Betulia - Corozal, La Yca - Guaranda, Lim de Cid - San Antonio
- Revolución y repro de material Vegetal.

 
Residente de Obra Residente de Intendencia

Sábado 20 de Septiembre 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Intendencia, obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadañas, Herramientas menores,

- Trabajos de roscía en tramo de Jampuis - San Benito.
- Limpieza de Obras de arte de Jampuis - San Benito
- Limpieza de Lunetas en Jampuis - San Benito.



 
Residente de Obra Residente de Intendencia

Domingo 21 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: No Resi evidencia Personal en obra

No se evidencian actividades en obra.

Lunes 22 de Septiembre 2025

Clima: Nubias moderadas

Personal: Residente de Intendencia, Residente de Obra, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadañas, herramientas menores

- Trabajos de roca en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista
- Limpieza de obras de arte en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.
- Limpieza de lunetas en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.

[Signature]
 Rend de Obra / Residente Int.

Martes 23 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: R. de Obra, Residente Int., Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajo de roca en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.
- Limpieza de obras de arte en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.
- Limpieza de lunetas en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.

[Signature]
 Rend de Obra / Residente Int.

Miércoles 24 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente Int., Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, Herramientas menores.

- Trabajo de roca en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.
- Limpieza de obras de arte en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.
- Limpieza de lunetas en tramos de Sumpués - San Beuto, Sincé - Granada - Buenavista.

[Signature]
 Rend de Obra / Residente Int.

Jueves 25 de Septiembre 2025

Clima: Lluvia Intensa.

Personal: Residente de Intendencia, Residente de Obra, Obreros

Maquinaria y Equipo: Guadana, Herramientas menores.

- Trabajo de roscía en tramos de Inic'-Granada - Buenavista, San Benito - Tampués.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Inic'-Granada - Buenavista, San Benito - Tampués.
- Limpieza de curita en tramos de Inic'-Granada - Buenavista, San Benito - Tampués.

Resid. Obra Asesor Int

Viernes 26 de Septiembre 2025.

Clima: Lluvias moderadas.

Personal: Residente de Intendencia, Residente de Obra, Obreros.

Maquinaria y Equipo: Guadana, Herramientas menores, Volqueta

- Trabajo de roscía en tramos de Inic'-Granada; Buenavista, San Benito - Tampués.
- Limpieza de Obras de arte en tramos de Inic'-Granada - Buenavista, Buenavista, San Benito - Tampués.
- Limpieza de curitas en tramos Inic'-Granada - Buenavista, San Benito - Tampués.

- Recolección y retiro de material vegetal.

Resid. Obra Asesor Int

Sábado 27 de Septiembre 2025.

Clima: Lluvias Moderadas.

Maquinaria y Equipo: Guadana, Herramientas menores, Volqueta

Maquinaria y Equipo.

Personal: Residente de Intendencia, Residente de Obra, Obreros.

- Trabajo de roscía en tramos de Inic'-Granada - Buenavista, San Benito - Tampués.

- Limpieza de Obras de arte en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.
- Limpieza de lunetas en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.
- Remoción y retiro de material vegetal.

Quinn J. Jacobson
Resid. Obra / Residente int.

Domingo 28 de Septiembre 2025.

Clima: Soleado

Personal: No se evidencian Personal.

No se evidencian actividades en obra.

Quinn J.

Lunes 29 de Septiembre 2025

Clima: Lluvias moderada.

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Obreros

Plaguera y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajo de roquera en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.
- Limpieza de lunetas en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.
- Limpieza de Obras de arte de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.

Quinn J. Jacobson
Resid. Obra. / Residente int.

Martes 30 de Septiembre 2025.

Clima:

Personal: Residente de Obra, Residente Interventoría, Obreros.

Plaguera y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajo de roquera en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.
- Limpieza de lunetas en tramos de Inu' - Granada - Buenavista, Sampués - San Benito.

-Limpieza de obras de arte en barrios de Inca-Granada-
Buenos Aires, Lampari- San Basilio.

Prima Y. Indira Dwar
Kend. Obra - Puran Li In

Viernes 1 de Octubre 2025.

clima: húmedo.

Persona: Residente de Ingresos, Residente de Obra, Obreros.

Plaguinawa y Equipos: Guadalupe, Hiramietas menores.

- Trabajos de malla en tramos de:

Sinai - Granata - Baumista: 2 HA

Sample's - San Benito - 3HA

límites de Córdoba - San Antonio $\approx$ Polmito $\approx$ 2 HA.

Palmiro - Finca San Antonio: 1,5 HA

Chumaleto - Aguacate - Cangua: 2,5 HA

Азидна-А/Вина: 3/4А

- Limpieza de lunetas en framos

Sincé - Grandda - Buwawista : 500 mt.

Sampurs - San Buets : 400 m

Límites de Córdoba - Palmira : 400 m²

Chumilto - Aguacate - Craig: 285m

A/barna - Betulia : 450 m

- lempieza de Obras de arte

Sampues - San Bauto: 10 alcantualas.

- Límites de Córdoba - Palmito: 5 portones.

- Line' - Granada - Buenavista 204 Puentes

- Palmito - San Antonio: 4 Puntos.

- *Behuria - Albicaria* = 2 Portunus

- Chruschts - Agaveate Caipue : 6 Alcantaulas

Andrew Cornu Cr.

Almudena

Junio 2 de Octubre 2025

Clima: Soleado.

Personal: Presidente de Interventoría, Presidente de Obra, Obreros

Maquinaria y Equipo: Guadoná, Herramientas menores.

- Trabajos de Roca en tramo.

Sampues - San Bauto: 4 HA.

Limites de Cordoba - San Antonio de Palmito: 2 HA.

Palmito - Limites de Cordoba:

Ingenio - Granada - Buenavista: 3 HA.

Palmito - Finca San Antonio: 2 HA.

Albarrín - Betulia: 3 HA.

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 4 HA.

- Limpieza de Cuesta en tramos:

Sampues - San Bauto: 400 metros.

Limites de Cordoba - Palmito: 400 metros.

Granada - Buenavista: 600 metros.

Palmito - Finca San Antonio: 300 mt.

Albarrín - Betulia: 300 metros.

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 300 mt.

- Limpieza de Obras de arte.

Sampues - San Bauto: 10 Alcantuillas.

Ingenio - Granada - Buenavista: 2 puentes y 3 portones.

Palmito - Finca San Antonio: 0.

Betulia - Albarrín: 4 alcantuillos.

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 6 alcantuillos.

Andrés Gómez
Presidente. Interv.

Diego
Pres. Obra

Viernes 3 de Octubre 2025

Lima: Lima.

Personal: Rend. de Obra, Rend. Literaria, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadana, Herramientas menores, Valqueta

- Roca en tramos:

Sampur - San Benito: 5 HA.

Lima - Palmiro: 1 HA.

Lima - Granada - Buena Vista: 4,2 HA.

Palmiro - Finca San Antonio: 4,20 HA.

Betulia - Alhara: 3,8 HA.

- Limpieza de Cuartos en tramos:

Sampur - San Benito: 400 mt.

Lima - Palmiro: 0

Lima - Granada - Buena Vista: 600 mt.

Palmiro - Finca San Antonio: 400 mt.

Betulia - Alhara: 300 mt.

Chiridito - Aguacate - Cuzco: 300 mt.

- Limpieza de Obras de arte.

Sampur - San Benito: 15 alcantallas.

Lima - Granada - Buena Vista: 7 portones.

Betulia - Alhara: 4 alcantallas.

Chiridito - Aguacate - Cuzco: 6 alcantallas.

- Retiro de material en tramos de

Alhara - Betulia

Lima - Granada - Buena Vista

Rend. Obra

Andina Gormier
Residente mtr.

Sábado 4 de Octubre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Residente de Obra, Residente Intendencia, Obreros.

Equipo y Equipos: Gradora, Herramientas menores, Volqueta.

- Trabajos de obra en tramos

Sampur - San Benito: 2 HA

Ena - Granada - Buenavista: 1 HA

Palmito - Finca San Antonio: 2 HA.

Betulia - Albarría: 0

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 2 HA

- Limpieza de linderos en tramos.

Sampur - San Benito: 200 metros

Palmito - Finca San Antonio: 100 mt

Albarría - Betulia: 100 mt

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 200 mt

- Limpieza de obras de arte:


Sampur - San Benito: 6 alcantallas

Albarría - Betulia: 2 alcantallas

Chiriquito - Aguacate - Cacique: 3 alcantallas

- Retiro de material en tramos:

- Sampur - San Benito.


Andres Coronado

Andres Coronado
Residente INT.

Domingo 5 de Octubre 2025.

Clima: Soleado.

No se evidenciaron actividades en obra

Andrea Gonzalez
Presidente

Presidente
Pres. obra

Lunes 6 de Octubre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, Persevente Intendencia, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadua, Herramientas menores,

- Trabajos en Rocera en tramos

Sampur - San Benito: 4 HA

Palmiro - San Antonio de Palmiro: 0,5 HA

Chimulco - Aguacate - Cacique: 2 HA

Ynci - Granada - Buenavista: 3 HA

- Limpieza de lumbas en tramos:

Sampur - San Benito: 400mt 129mt

Ynci - Granada - Buenavista: 400mt

Palmiro - Finca San Antonio: 200mt

Chimulco - Aguacate - Cacique: 200mt

Betulca - Albania: 200 mt.

- Limpieza obras de arte en tramos:

Sampur - San Benito: 10 (M. cantonillas 5 - P. bocas 5)

Chimulco - Aguacate - Cacique: 4 alcatrillas.

Andrea Gonzalez
Presidente obra

Pres. obra

Viernes 7 de Octubre 2025

Clima: Soleado.

Personal: Residente de Obra, Residente Int, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadana, Herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de Roca en ramos:

Sampues - San Benito: 3HA.

Palmito - Finca San Antonio: 1HA

Chimulco - Aguacate - Cacique: 1HA.

Inci - Granada - Buenavista: 2HA.

- Limpieza de lunetas en ramos.

Inci - Granada - Buenavista: 400mt

Palmito - Finca San Antonio: 100mt.

Chimulco - Aguacate - Cacique: 200mt

Albunia - Betulia: 100mt.

- Limpieza de obras de arte en ramos.

Sampues - San Benito: 2 Portones

- Retiro de Material en ramo Palmito - Finca San Antonio.

Andrea Corrales

Residente Int

Residente Obra

Sábado 8 de Octubre 2025

Clima: Lluvia.

Personal: Residente de Obra, Residente Int, Obreros.

Maquinaria y Equipo: Guadana, herramientas menores.

- Trabajos de Roca en ramos:

Sampues - San Benito: 4HA

Chimulco - Aguacate - Cacique: 2HA

Inci - Granada - Buenavista: 1HA.

- Limpieza de lunetas en ramos:

Sampues - San Benito: 500mt

Palmito - Finca San Antonio: 100mt

Residente Obra

Andrea Corrales
Residente

- Limpieza de obras de arte.

Sampuis - San Benito: 2 portones.

Chinulito - Coique - Aguacate: 2 alcantallas.

Andrés Corcos
Durante Int.

Paul Olvera

Juven 9 de Octubre 2025.

Clima: Lluvias.

Personal: Residente de obra, Residente local, Obreros.

Maquinaria y Equipo: Guadua, herramientas menores, Valqueta

- Trabajos de Roca en tramos:

Sampuis - San Benito: 3HA

Chinulito - Aguacate - Coique: 2HA

Sini - Granada - Buenavista: 2HA.

- Trabajo de limpieza de Cunetas en tramos:

Sini - Granada - Buenavista: 350 mt.

Palmito - San Antonio: 150 mt.

Chinulito - Aguacate - Coique: 400 mt

- Trabajo de Limpieza de Obras de arte:

Sampuis - San Benito: 3 portones.

- Chinulito - Aguacate - Coique: 2 alcantallas.

- Retiro de material en tramo Chinulito - Aguacate - Coique.

Andrés Corcos
Durante Int.

Paul Olvera

Viernes 10 de Octubre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Presidente Intercomunal, Presidente Obra, Obreros

Maquinaria y Equipo: Guaduaña, herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de Roceria en tramos:

Lompais - San Benito: 5HA.

Palmito - Finca San Antonio de Finca: 0

Chunulito - Aguacate - Cacique: 1,3HA.

Sinca - Granada - Buenavista: 2HA.

- Trabajo de limpieza de lunetas en tramo:

Sinca - Granada - Buenavista: 400mt

Palmito - Finca San Antonio: 50mt

Chunulito - Aguacate y Cacique: 400mt

Betulia - Albania: 0

- Limpieza obra de arte en tramo:

Lompais - San Benito: 2 Puentes

- Retiro de material en tramo de Palmito - Finca San Antonio.

Andrés Gómez

Presidente Inte.

Andrés Gómez

Presidente Obra

Sábado 11 de Octubre 2025.

Clima: Lluvioso.

Personal: Presidente de Obra, Presidente Inte, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guaduaña, herramientas menores, Volqueta.

- Trabajo de Roceria en tramos:

Lompais - San Benito: 5HA.

Sinca - Granada - Buenavista: 2HA

- Limpieza de lunetas en tramo

Sinca - Granada - Buenavista: 600mt

Chunulito - Aguacate - Cacique: 400mt.

- Limpieza obras de arte en tramo

Lompais - San Benito: 4 Puentes

Andrés Gómez

Presidente

Andrés Gómez

Presidente Obra

12 de Octubre 2025, Domingo

Clima: Lluvia

No se evidencian actividades en obra

Andrea Corrales
Presidente Int

Presidencia

13 de Octubre 2025, Lunes

Clima: Soleado

Personal: Presidente de Obra, Presidente Int, Obreros,

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores,

- Trabajos de Rocios en hamos:

Lampis - San Bauto: 4HA

Lami - Granada - Buenavista: 2HA

- Trabajo de limpieza de Lunetas

Lami - Granada - Buenavista: 1500mt

Chinulito - Aguacate - Cacique: 1000mt

- Trabajo Limpieza de Obras de arte

Lampis - San Bauto: 2puentes

Andrea Corrales
Presidente Int

Presidencia

14 de Octubre 2025, Martes

Clima: Lluvia

Personal: Presidente de Obra, Presidente Int, Obreros, Volante

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores

- Trabajo de Rocios en hamos:

Lampis - San Bauto: 5HA

Lami - Granada - Buenavista: 2HA

- Trabajo de Limpieza de Lunetas

Presidencia

- Trabajo de limpieza obras de arte en ramo:

Sampuis - San Benito: 2 puentes

Rehro de material en ramo Sampuis - San Benito

Andrés Coronel
Residente Int.

Rudolfo

Miércoles 15 de Octubre 2025

Clima: Nublado

Personal: Residente de Obra, Residente Int., Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, herramientas menores.

- Trabajo de roscía en ramo:

Sampuis - San Benito: 2 HA

Inca - Granada - Buenavista: 1,7 HA.

- Trabajo limpieza de lunitas en ramo:

Sampuis - San Benito: 0

Inca - Granada - Buenavista: 1000 mt

Chunulito - Aguacate - Cauque: 1600 mt

Andrés Coronel
Residente Int.

Rudolfo

Jueves 16 de Octubre 2025.

Clima: Nublado

Personal: R. de Obra, R. de Intero, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de roscía en

Sampuis - San Benito: 4 HA

- Limpieza de lunitas.

Inca - Granada - Buenavista: 3000 mt

Chunulito - Aguacate - Cauque: 0

Rehro de material en ramos

- Chunulito - Cauque - Aguacate.

Andrés Coronel
Residente Int.

Viernes 17 de Octubre

Clima: Soleado

Personal: Pezidente de Obra, Pezidente, Intenutora, Obiero, Volqueta

Maquinaria y Equipo: Guadana, herramientas menores

- Trabajo de roca en:

Sampais - San Bauto: SHA.

- Limpieza de Cuetas.

Encl - Granada - Buenavista: 3000 mt.

Retro de material en tramo Sampais - San Bauto

Josue Gomez
Residente mt.

Raul Ochoa

Sabado 18 de Octubre

Clima: Soleado.

Personal: Pezidente de Obra, Pezidente, Int, Obieros.

Maquinaria y Equipo: Guadana, herramientas menores.

- Trabajo de Roca

Sampais - San Bauto: 2 HA.

- Limpieza de Cuetas en:

Encl - Granada - Buenavista: 100 mt.

Josue Gomez
Residente mt.

Raul Ochoa

Domingo 19 de Octubre 2025

Clima: Lluvia

No se evidenciaron actividades en obra.

Josue Gomez
Residente mt.

Raul Ochoa

Lunes 20 de Octubre 2025

Clima: Lluvias.

Personal: Pezidente de Obra, Pezidente Intendente, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajo de Rocios en:

Limpieza - San Benito: 2 HA

- Limpieza de lentes: 100 mt (Inu' - Granada - Buenavista)

Andrés González
Residente Int.

Andrés
Residente

Martes 21 de Octubre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Pezidente de Obra, Pezidente Int., Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajo de Rocios en:

Limpieza - San Benito: 1 HA

- Limpieza de lentes

Inu' - Granada - Buenavista = 100 mt

Andrés
Residente

Andrés González
Residente Int.

Miércoles 22 de Octubre 2025.

Clima: Soleado.

Personal: Pezidente de Obra, Pezidente Int., Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadalupe, herramientas menores.

- Trabajo de Rocios en:

Limpieza - San Benito: 1.5 HA

- Limpieza de lentes

Inu' - Granada - Buenavista: 100 mt.

Andrés
Residente

Jueves 23 de Octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente Intendencia, Obreros.

Limpieza de lomas en Inca - Granada - Buenavista: 100 mt

Andrea Gonzalez
Residente Inten

Rudolph

Viernes 24 de Octubre 2025

Clima: Lluvias

Personal: Residente de Obra, Residente Inten, Obreros

Herramientas y Equipos: Guadua, herramientas menores.

Limpieza de obras de arte y lomas Inca - Granada - Buenavista: 100 mt.

Andrea Gonzalez
Residente Inten.

Rudolph

Sabado 25 de Octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente Intendencia, Obrero.

Herramientas y Equipos: Guadua, herramientas menores, Volquete

Repro de material en:

Lomas - San Benito
Inca - Granada - Buenavista

Rudolph

Andrea Gonzalez
Residente Inten.

Domingo 26 de Octubre 2025

Clima: Lluvias

Rudolph

Andrea

Juvis 27 de Octubre 2025

Clima: Soleado.

Personal: Residente de obra, Residente Interv, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, herramientas menores.

- Limpieza de lunitas en Inú - Granada - Buenavista de 100 mt.

Andrés González
Residente Interv

Andrés
Residente obra

Martes 28 de Octubre 2025.

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, R. Interventoría, Obreros.

Maquinaria y Equipos: Guadaña, herramientas menores, Volqueta

- Limpieza de lunitas en Inú - Granada - Buenavista 74 mt.

- Retiro de material en Inú - Granada - Buenavista

Andrés González
Residente Interv.

Andrés
Residente obra

Miércoles 29 de Octubre 2025

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra, Residente Interv, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadaña, herramientas menores, Volqueta

- Trabajos de limpieza en humo:

La Yee - Guayaquil: 0,8 HA.

Inú - Granada - Buenavista: 0,4 HA.

- Limpieza de lunitas

Palmito - Finca San Antonio: 2936 mt.

- Limpieza obra de arte

Inú - Granada - Buenavista: 10 portales, 1 Alcantarilla.

Palmito - Finca San Antonio: 7 Puercos.

Albuja - Behulio: 1 Portón, 1 Puente.

Retiro de material en:

Inú - Granada - Buenavista

Andrés González
Residente

Andrés
Residente obra

Jueves 30 de Octubre 2025

Clima: Lluvia

Personal: Residente de Obra, R. Intenitorial, Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadadora, herramientas menores, Volquete

- Limpieza Obras de arte

Bunawista - Granada - Sino - 12 pilones

- Retiro de material en hna - Granada - Bunawista

Andrés González
Residente Int.

Andrés
Res. Obra

Viernes 31 de Octubre 2025

Clima: Lluvia

Personal: Residente de Obra, Residente Intenitorial y Obreros

Maquinaria y Equipos: Guadadora, herramientas menores, mme cargador

- Limpieza de Boma con maquina

La Yee - Guarandá: 287 m³

Sampais - San Benito: 205,02 m³

- Retiro de material en la Yee - Guarandá

Andrés González
Residente Int.

Andrés
Res. Obra

Sábado 1 de Noviembre 2025

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipos: Mm cargador, Volquete

Personal: Obreros, R. Intenitorial, R. de Obra

- Limpieza de Boma con maquina en

Sampais - San Benito: 240 m³

- Retiro de material Sampais - San Benito

Andrés González
Residente Int.

Andrés
Res. Obra

Domingo 2 de Noviembre 2025.

Personal: Ruidete de Obra, Ruidete Lutr, Oburos.

Formada de Ordu y Asco en obra.

Tramo: Pampú - San Bauto.

Clima: Soleado

(Quinn)
Rud ohu

Andru Gonzales
Residente Inter.

Lunes 3 de Noviembre 2025

Clima: Lluva

No se evidencian actividades en obra.

(Quinn)
Rud ohu.

Andru Gonzales
Residente Inter.

ANEXO 4.

Informe de Gestión de Interventoría FSI-800-003.

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO: FSI-800-003
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA	VERSION: 01
		FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03/11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	
		OTROS(Especifique)		RECURSOS PROPIOS	

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$55.892.215,67)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
OBJETO PROYECTO:	EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL PROYECTO:	SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO CINCO(\$624.963.567,50)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	INGENORTE S.A.S
CORREO ELECTRONICO:	interroceria@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE AGOSTO DEL 2025
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	DOS MESES Y MEDIO
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Meses	Días

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. AVANCE EJECUTADO Y ACUMULADO DE LA INTERVENTORIA

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO: FSI-800-003
			VERSION 01
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 19/08/2025 AL 31/08/2025

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE						
PRESUPUESTO INTERVENTORIA						
CANT	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DURACIÓN	PARTICIPACIÓN TOTAL (h - mes)	VALOR PARCIAL (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)
1,0	PERSONAL PROFESIONAL					
1,1	Director de obra	\$ 5.200.000	2,5	40%	\$ 5.200.000,00	\$ 832.000
1,2	Residente en obra Ingeniero Civil	\$ 3.680.403	2,5	100%	\$ 9.201.007,50	\$ 1.472.161
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 14.401.007,50	\$ 2.304.161,20
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)					\$ 1,87	\$ 1,87
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 26.993.248,46	\$ 4.318.919,75
OTROS COSTOS DIRECTOS						
CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO(\$)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR PARCIAL (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)
2	OTROS COSTOS					
2,1	Alquiler de Vehiculo (incluye conductor)	un	\$ 6.000.000	2,5	\$ 15.000.000,00	\$ 2.400.000
2,2	Gastos generales (Insumos y papeleria)	un	\$ 1.990.000	2,5	\$ 4.975.000,00	\$ 796.000
SUBTOTAL COSTOS					\$ 19.975.000,00	\$ 3.196.000
COSTOS BASICOS					\$ 46.968.248,46	\$ 7.514.919,75
IVA 19%					\$ 8.923.967,21	\$ 1.427.834,75
COSTO TOTAL = BASICO + IVA MENSUAL					\$ 55.892.215,67	\$ 8.942.754,51
POCENTAJE (%)					100%	16,00%

Avance físico programado 16% y avance físico ejecutado 16%.

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO: FSI-800-003
			VERSION: 01
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 1/09/2025 AL 30/09/2025

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE						
PRESUPUESTO INTERVENTORIA						
C A N T	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DURACIÓN	PARTICIPACIÓ N TOTAL (h - mes)	VALOR PARCIAL (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)
1, 0	PERSONAL PROFESIONAL					
1, 1	Director de obra	\$ 5.200.000	2,5	40%	\$ 5.200.000,00	\$ 2.912.000
1, 2	Residente en obra Ingeniero Civil	\$ 3.680.403	2,5	100%	\$ 9.201.007,50	\$ 5.152.564
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 14.401.007,50	\$ 8.064.564,20
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)					\$ 1,87	\$ 1,87
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 26.993.248,46	\$ 15.116.219,14
OTROS COSTOS DIRECTOS						
C A N T	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO(\$)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR PARCIAL (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)
2	OTROS COSTOS					
2, 1	Alquiler de Vehículo (incluye conductor)	un	\$ 6.000.000	2,5	\$ 15.000.000,00	\$ 8.400.000
2, 2	Gastos generales (Insumos y papelería)	un	\$ 1.990.000	2,5	\$ 4.975.000,00	\$ 2.786.000
SUBTOTAL COSTOS					\$ 19.975.000,00	\$ 11.186.000
COSTOS BASICOS					\$ 46.968.248,46	\$ 26.302.219,14
IVA 19%					\$ 8.923.967,21	\$ 4.997.421,64
COSTO TOTAL = BASICO + IVA MENSUAL					\$ 55.892.215,67	\$ 31.299.640,77
POCENTAJE (%)					100%	56,00%

Avance físico programado 56% y avance físico ejecutado 56%.

 GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO: FSI-800-003
			VERSION: 01
			FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 1/10/2025 AL 3/11/2025
PRESUPUESTO INTERVENTORIA

CAN T	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DURACIÓN	PARTICIPACIÓN TOTAL (h - mes)	VALOR PARCIAL (\$)	DURACIÓN AVANCE	VALOR AVANCE (\$)
COSTOS DE PERSONAL							
1,0	PERSONAL PROFESIONAL						
1,1	Director de obra	\$ 5.200.000	2,5	40%	\$ 5.200.000,00	2,5	\$ 5.200.000,00
1,2	Residente en obra Ingeniero Civil	\$ 3.680.430	2,5	100%	\$ 9.201.075,00	2,5	\$ 9.201.075,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 14.401.075,00		\$ 14.401.075,00
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)					\$ 1,87		\$ 1,87
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 26.993.248,46		\$ 26.993.248,46

OTROS COSTOS DIRECTOS							
CAN T	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO(\$)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL	VALOR PARCIAL (\$)	DURACIÓN AVANCE	VALOR PARCIAL (\$)
2	OTROS COSTOS						
2,1	Alquiler de Vehículo (incluye conductor)	un	\$ 6.000.000	2,5	\$ 15.000.000,00	2,5	\$ 15.000.000,00
2,2	Gastos generales (Insumos y papelería)	un	\$ 1.990.000	2,5	\$ 4.975.000,00	2,5	\$ 4.975.000,00
	SUBTOTAL COSTOS				\$ 19.975.000,00		\$ 19.975.000,00
	COSTOS BASICOS				\$ 46.968.248,46		\$ 46.968.248,46
	IVA 19%				\$ 8.923.967,21		\$ 8.923.967,21
	COSTO TOTAL = BASICO + IVA MENSUAL				\$ 55.892.215,67		\$ 55.892.215,67

 GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO:	FSI-800-003
			VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

	100%
--	------

Avance físico programado 100% y avance físico ejecutado 100%.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	16%	\$ 8.942.754,51	16%	\$ 8.942.754,51	16%	\$ 8.942.754,51	16%	\$ 8.942.754,51
Periodo 2	40%	\$ 22.356.886,27	56%	\$ 31.299.640,77	40%	\$ 22.356.886,27	56%	\$ 31.299.640,77
Periodo 3	44%	\$ 24.592.574,89	100%	\$ 55.892.215,67	44%	\$ 24.592.574,89	100%	\$ 55.892.215,67

3. FORMA DE PAGO

El Departamento de Sucre pagará al contratista mediante Pagos parciales mensuales hasta completar el (95%) del valor total del contrato, previa aprobación por parte del supervisor, respectiva cuenta de cobro y/o factura con los soportes que acrediten estar al día con las obligaciones de seguridad social vigentes. El último pago por el valor del (5%) restante del valor total del contrato que se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor, acta de recibo de la veeduría, previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) conforme los requerimientos de ley, cuando haya lugar. Su desembolso se dará previo trámite de solicitud de pago y el derecho a turno asignado para la respectiva cuenta legalizada; el Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora en el desembolso al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Nota 1. Para el pago **EL CONTRATISTA** deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003.

En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

Nota 2. SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligada la Gobernación se realizarán según disponibilidad del PAC posterior al recibo de la factura

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO:	FSI-800-003
			VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega del bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos de la Gobernación.

Nota 3. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA afirma que entiende que la Gobernación, es un agente de retención, y por ello, a través de la Tesorería del Departamento, efectuará las deducciones por concepto de los gravámenes a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. Para todos los efectos de manejos financieros, contables y otros administrativos, técnicos, ambientales jurídicos, contractuales, legales, el oferente deberá presentar el programa de suministro que contenga el plan de aplicación de diagnóstico, mantenimiento, optimización y puesta a punto, así como el plan de compras, adquisiciones, suministro y procesos de manufactura dentro del término establecido como plazo de ejecución contractual, junto con el flujo de caja. De ese plan se establecerá la forma de los pagos parciales factibles. No se podrá ejecutar financiación de productos o servicios adicionales sin la autorización expresa de la supervisión de la Gobernación, o incluir actividades en el programa de trabajo sin contar con el visto bueno de la entidad, toda vez que estas pueden generar sobre costos que deben ser analizados y aprobados

. A este proceso le son aplicables los siguientes gravámenes:

RETENCIÓN EN LA FUENTE	6.0%
RETENCIÓN DEL IVA	15%
RETEICA	10X1000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,9%
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	1.4%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	1.5%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN	0.45%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL	1.75%

Y todos los demás que la ley y código de rentas indique

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 9 y 10 del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Se entregaron todas las hojas de vida del personal mínimo requerido según lo establecido en el Contrato de Interventoría y los documentos técnicos del proceso con el fin de llevar a

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO: FSI-800-003
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA	VERSION: 01
		FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

	cabo la ejecución del Contrato con plena autonomía técnica y administrativa que se amerita
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)	Se realizó la entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la matriz de cargo; así mismo se desarrollaron charlas y/o capacitaciones del uso adecuado de los EPPs.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnización a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Se realizó la afiliación de todo el personal mínimo requerido al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría.
Incorporar como mínimo el 95% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato	El 100% del personal incorporado en la ejecución del Contrato es Colombiano.

5. GESTIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENTORIA:

En esta sección se describe la gestión técnica a cargo del contratista:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
JOSE DAVID PASTRANA MEDINA Director de interventoría	Garantizar la correcta ejecución del proyecto, cumpliendo con las normativas, plazos, presupuestos y estándares de calidad establecidos.
ANDREA MARCELA GONZALES FERRER Residente de interventoría	Supervisar y controlar la ejecución de la obra para asegurar que cumpla con especificaciones técnicas, normativas y condiciones contractuales establecidas.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 19/08/2025 AL 31/08/2025

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	RECIBE
17/7/2025	INORTE-001-2025	PRESENTACIÓN CORREO ELECTRICO	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. sucre - Consorcio HAI
16/7/2025	INORTE-002-2025	PAGO ESTAMPILLA CONTRATO	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. Sucre

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO:	FSI-800-003
			VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

18/7/2025	INORTE-003-2025	PAGO DE POLIZAS INICIALES	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. Sucre
23/7/2025	INORTE-004-2025	APROBACIÓN HV PERSONAL DE OBRA	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. sucre - Consorcio HAI
14/8/2025	INORTE-005-2025	ENTREGA HOJAS DE VIDA	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. Sucre
25/8/2025	INORTE-006-2025	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. Sucre

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 1/09/2025 AL 30/09/2025

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	RECIBE
03/09/2025	INORTE-007-2025	POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA CON ACTA DE INICIO	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob. sucre
22/09/2025	OFICIO	RADICADO SOLICITUD ITEMS NO PREVISTOS	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.sucre
25/09/2025	INORTE-008-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°1	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.sucre
25/09/2025	INORTE-009-2025	RADICADO INFORME MENSUAL N°1	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.sucre
30/09/2025	INORTE-010-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°2	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 1/10/2025 AL 3/11/2025

FECHA	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	RECIBE
08/10/2025	INORTE-011-2025	RADICADO INFORME QUINCENAL N°3	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
08/10/2025	INORTE-012-2025	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°2	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
10/10/2025	INORTE-013-2025	RADICADO ACTA N°1 INTERVENTORIA	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
22/10/2025	INORTE-015-2025	TRASLADO MODIFICATORIA N°1	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
28/10/2025	INORTE-014-2025	RADICADO QUINCENAL N°4	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO:	FSI-800-003
			VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

31/10/2025	INORTE-016-2025	RADICADO FACTURACIÓN N°2 INTERVENTORIA	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
12/11/2025	INORTE-017-2025	POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA FINAL	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
3/11/2025	INORTE-018-2025	RADICADO QUINCENAL N°5	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
3/11/2025	INORTE-019-2025	RADICADO MENSUAL N°3	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre
25/11/2025	INORTE-020-2025	RADICADO FACTURA N°3	OSCAR LUIS HERAZO SEBA	Gob.Sucre

7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago Agosto N°: 7985465635

Se presenta planilla de septiembre pago N°: 7986767041

Se presenta planilla de octubre pago N°: 7989729025

Se presenta planilla de noviembre pago N°: 7993898631

Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

8. GESTIÓN SOCIAL

8.1 EMPLEOS GENERADOS

EMPLEO	OBRA	INTERVENTORI A
Total empleos generados:	15	3
Empleos directos generados:	15	3
Empleos indirectos generados:	16	1

8.2 CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO: FSI-800-003
			VERSION 01
			FECHA: 01/01/2024
INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA			

INFORME No.	FINAL	FECHA	03/11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

CLASIFICACIÓN	DETALLE	OBRA	INTERVENTORIA
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	30	4
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0	0
Género	Masculino	15	3
Género	Femenino	16	1
Población Vulnerable	Desplazados	0	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0	0
Población Vulnerable	Víctimas	0	0
Total		31	4

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO (\$)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CRC – 100025719
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO:	FSI-800-003
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03/11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26 DE AGOSTO DEL 2025
COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2025	3/09/2026	\$5.589.221,60
PAGO DE SALARIOS	19/08/2025	3/11/2028	\$2.794.610,80
CALIDAD DE SERVICIO	3/11/2025	3/11/2030	\$5.589.221,60
C. INFORME FINANCIERO			

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	1	10/10/2025	40%	\$ 22.356.886,26	N/A	N/A	\$ 22.356.886,26
2	2	31/10/2025	40%	\$ 22.356.886,26	N/A	N/A	\$44.713.772,534
3	3	25/11/2025	20%	PENDIENTE DE PAGO	N/A	N/A	\$55.892.215,667
TOTAL			100%	\$55.892.215,67			\$55.892.215,67

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL BARRIO ALTOS DEL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DEL SINCELEJO, SUCRE	EJECUTADO ACUMULADO
		100 %

INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA

INFORME No.	FINAL	FECHA	03/11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			



Figure 1. Ejecución informes quincenales y mensuales, oficinas de Interventoría.

 GOVERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		CODIGO:	FSI-800-003
			VERSION	01
			FECHA:	01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			



Figure 2. Ejecución informes quincenales y mensuales, oficinas de Interventoría.

En cumplimiento de las funciones como Interventoria el equipo de trabajo Residente de Interventoria y Director de Intervnetoria, se realiza la gestion documental y elaboracion de informes de Interventoria mensuales y quincenales.

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO: FSI-800-003
			VERSION 01
			FECHA: 01/01/2024
INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA			

INFORME No.	FINAL	FECHA	03/11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			



Figure 3. Recorrido de obra por parte de equipo de interventoría

En cumplimiento de las funciones como Interventoria el equipo de realiza recorridos en obra con el fin de verificar la correcta ejecución de las actividades.

OBSERVACIONES

Se evidencia al equipo de trabajo realizando la supervisión en obra para dar cumplimiento a los aspectos técnicos, así como en reuniones de trabajo enfocadas en garantizar la interventoría administrativa, financiera, legal y ambiental del proyecto.

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CODIGO: FSI-800-003
	INFORME DE GESTION DE INTERVENTORIA		VERSION 01
			FECHA: 01/01/2024

INFORME No.	FINAL	FECHA	03//11/2025	PERIODO	19 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO N°	MC-019 - 2025	CODIGO BPIN PROYECTO			2024002700126
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO	RECURSOS PROPIOS
		OTROS(Especifique)			

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el presente periodo se realizó el seguimiento y control de las diferentes actividades realizadas por el contratista, desarrollándose también recorridos de obra en conjunto para dar soluciones optimas a las situaciones presentadas en la ejecución del contrato.

F. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 26 días del mes noviembre de 2025.

Firma



Nombre: JOSÉ PASTRANA MEDINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma



Nombre: ANDREA GONZALES FERRER
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 5.

Equipo y vehículos Contrato de Interventoría FSI-
800-018.

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	3	PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATO No.	AMC - 022- 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO HAI
CONTRATO INTERVENTORIA No.	MC - 019 - 2025	INTERVENTORIA:	INGENORTE S.A S

MAQUINARIA Y EQUIPO				1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2025																																	
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
CAMIONETA	NISSAN NP300	5 PASAJEROS	OBRA-ADMON	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	

CONVENCIONES: ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I, DÍA FESTIVO=X.

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): INACTIVO POR DIAS FERIADOS

NOTAS:

- NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran **EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I**.
 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

Firma: 
Nombre: OSCAR LUIS HERAZO SEBA
Director de Obra

Firma: *Andrea González Ferrer*

Nombre: ANDREA GONZALEZ FERRER
Residente de Interventoría



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10027897149

PLACA

IIM113

MARCA

NISSAN

LÍNEA

NP300 FRONTIER

MODELO

2019

CILINDRADA CC

2.488

COLOR

BLANCO

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO

CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA

DOBLE CABINA

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ

5

NÚMERO DE MOTOR

YD25-660307P

REG

N

VIN

3N6CD33B7ZK390940

NÚMERO DE SERIE

3N6CD33B7ZK390940

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

3N6CD33B7ZK390940

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MORALES JOSE JESUS

IDENTIFICACIÓN

C.C. 16546811

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482018000195853

VE

FECHA IMPORT.

I

10/03/2018

PUERTAS

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

15/06/2018


FECHA EXP. LIC. TTO.

06/12/2022

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO



LT07002164226



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 172709692

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LUIS CARLOS GALAN

NIT: 901307538

No. de Certificado de
Acreditación: 20-CDA-083

Fecha de expedición: 2024/04/01

Fecha de vencimiento: 2025/04/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IIM113

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2019

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2488

NRO. MOTOR: YD25-680307P

NRO. CHASIS: 3N6CD33B7ZK390940

VIN: 3N6CD33B7ZK390940


LÍNEA: NP300 FRONTIER

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE J. MORALES

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ENRIQUE MORENO DAZA



[Consulta Automotores](#)

[Realizar otra consulta](#)

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

IIM113

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10027897149

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

NISSAN

LÍNEA:

NP300 FRONTIER

MODELO:

2019

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

3N6CD33B7ZK390940

NÚMERO DE MOTOR:

YD25-680307P

NÚMERO DE CHASIS:

3N6CD33B7ZK390940

NÚMERO DE VIN:

3N6CD33B7ZK390940

CILINDRAJE:

2488

TIPO DE CARROCERÍA:

DOBLE CABINA

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **15/06/2018**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

694

PESO BRUTO VEHICULAR:

2910

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

0

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

5

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
40381869	 05/11/2024	 06/11/2024	 05/11/2025	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	 VIGENTE
4308004429608000	 19/09/2023	 20/09/2023	 19/09/2024	221	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	 NO VIGENTE
100011329480100	 02/08/2022	 11/08/2022	 10/08/2023	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	 NO VIGENTE
100011038470100	 05/08/2021	 11/08/2021	 10/08/2022	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	 NO VIGENTE

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
100010819390100	 10/08/2020	 11/08/2020	 10/08/2021	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	⊗ NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	 31/03/2025	 31/03/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LUIS CARLOS GALAN	SI	180522135	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 01/04/2024	 01/04/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LUIS CARLOS GALAN	NO	172709692	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

ANEXO 6.

Control Aportes Legales y Seguridad Social
Contrato de Interventoría FSI-800-019.



GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUC-

CÓDIGO	FSI-800-019
VERSIÓN	1
FECHA	1/01/2024

19 DE AGOSTO - 31 DE AGOSTO 2025

7985465635	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:
------------	----------------------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día



OBSERVACIONES:
Se generó un adicional de \$4,800 de mora por retraso en el pago, para un total pagado de \$895,000.

[illegible]

[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	MC - 019 - 2025
------------------------------	-----------------

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

[illegible]

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

Firma: 
Nombre: OSCAR LUIS HERAZO SEBA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

[illegible]

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A SALUD										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	AFORTES	VALOR						
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 22,800	\$ 0	\$ 2,200	\$ 0	\$ 22,800	\$ 200	\$ 0	\$ 0	\$ 23,000			
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 0		\$ 0			\$ 0	\$ 92,200	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 92,200	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 92,700			
SUBTOTAL:																	\$ 115,000	\$ 700	\$ 0	\$ 115,700

[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	
CCF-41	CCF-41	CCF DEL SUJERO	
		NA. COTIZANTES	3
		APORTES	\$ 115.000
		MORA	\$ 8.000
		TOTAL	\$ 123.000
		VALOR PAGADO	\$ 115.000
		TOTAL	\$ 8.000
		TOTAL	\$ 123.000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 895.000
---------------	------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RACION SOCIAL: CUENTA REGISTRO: DIRECCIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: SINCELEJO DEPARTAMENTO: CR 5 N° 10 TELÉFONO: 9-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: ACTIVO O INACTIVO: FORMA DE REPRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	MES septiembre AÑO 2025 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2025-10-03 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	MES octubre AÑO 2025 E-EMPL-LEADOS 1835174037
NÚMERO PLANILLA: 7986767041 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2025-10-03 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	MORA
23001	23001-PROTECCIÓN		1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	23001-PROTECCIÓN		2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.177.800

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA
23001	23001-PROTECCIÓN		1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	23001-PROTECCIÓN		2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.177.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA
23001	23001-PROTECCIÓN		1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	23001-PROTECCIÓN		2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.177.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA
23001	23001-PROTECCIÓN		1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	23001-PROTECCIÓN		2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.177.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	MORA
23001	23001-PROTECCIÓN		1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	23001-PROTECCIÓN		2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.177.800

TOTAL PAGADO: \$ 2.224.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NIT: 90129114		NÚMERO PLANILLA: 7985728025	
INGENIERO CONSTRUCCIÓN SUCRE		TIPO DE PLANILLA: 2025	
SINCELEJO DEPARTAMENTO: SINCELEJO		PERIODO COTIZACIÓN: 2025	
CR: 5 N° 10		MES: octubre	
01-EMPLEADOR		AÑO: 2025	
CLASE APORTANTE: BAJOS DE 200 COTIZANTES		MES: noviembre	
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL DEPENDENCIA		AÑO: 2025	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20251107	
FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd)		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		SOLIDARIDAD		SUBSISTENCIA		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN
23001	PROTECCIÓN	1	\$ 588.900	1	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23001	PROTECCIÓN	2	\$ 588.900	2	\$ 588.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:						\$ 1.177.800	\$ 0	\$ 1.177.800	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LÍCENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	VALOR	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
EP5037	EP5037-ANUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP5037	EP5037-ANUEVA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LÍCENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	VALOR	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LÍCENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NO. COTIZANTES	VALOR	VALOR	PLANILLA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR
CCF-41	CCF-41-CCF DEL SUCRE	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSIÓN									
NOVEDADES									
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE SALARIO	NOVEDAD	INDICADOR	VALOR	VALOR
1	CC 1102794333-ARONA JOSE DAVID	REPELIDO	REPELIDO	\$ 2.080.000	FIJO	23001-PROTECCIÓN	ADMINISTRADOR	\$ 588.900	\$ 588.900
2	CC 1102803560-ARONA MARCELA	REPELIDO	REPELIDO	\$ 2.080.000	FIJO	23001-PROTECCIÓN	ADMINISTRADOR	\$ 588.900	\$ 588.900
3	CC 1103114425-ARONA ROSA LUIS	REPELIDO	REPELIDO	\$ 1.423.500	FIJO	23001-PROTECCIÓN	ADMINISTRADOR	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500

TOTAL PAGADO: \$ 2.226.300

ON SALUD.	MES	ANO	EJEMPLOS
CIÓN:	dicembre	2005	1912100812

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	TOTALES		
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
EC-41			3	\$ 28.000	\$ 0	\$ 28.000
SUB-TOTALES:				\$ 28.000	\$ 0	\$ 28.000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 223.000
---------------	------------

ANEXO 7.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de
Interventoría FSI-800-020.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	3221	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE BPIN 2024002700126	-	Propios	Contrato Principal	\$ 55.892.216 \$	-
			TOTAL			\$ 55.892.216 \$	-

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	55.892.216
-------------------------------	----	------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTA: A la fecha no se han presentado actas de cobro

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	\$	\$	\$

NOT AS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma _____
Nombre: JOSÉ PASTRANA MEDINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2220218

ANEXO 8.

Programación de obra

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE



NIT: 901.948.621-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR TRAMOS	GRUPO	MES															
		MES 1					MES 2					MES 3					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
ETAPA PRECONTRACTUAL																	
ETAPA EJECUCION																	
Sampués - San Benito	Grupo #1																
Corozal - San Juan de Betulia - Since																	
Limites de Cordoba - San Antonio de Palmito																	
Palmito - Finca San Antonio																	
Via Since - Granada - Buenavista	Grupo #2																
La Yee - Guaranda																	
Via Chinulito - Aguacate - Cacique																	
San Juan de Betulia - Albania																	
PGIO																	
TOTAL PROYECTO																	
	TOTAL FLUJO MENSUAL	\$	214.758.378,83		\$	230.235.049,00		\$	179.980.139,67								
	%FINANCIERO MENSUAL		34,36%			36,84%			28,80%								
	TOTAL FLUJO DE INVERSION	\$															
									</								

CONSORCIO HAI
REP. LEGAL OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO

ANEXO 9.

Seguimiento Garantías Contrato Interventoría
FSI-800-021.

 Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura	GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	FSI-800-021
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA	2 DE SEPTIEMBRE 2025																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	MC - 019- 2025																																																			
	INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S																																																			
OBJETO DEL CONTRATO:																																																				
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																																				
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DEL 2025 PLAZO INICIAL: DOS MESES Y MEDIO FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 55.892,215,67 VALOR ACUMULADO: \$ - (Incluye adiciones)																																																				
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ROMERO ROMERO																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.598.211,60</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.794.610,80</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.598.211,60</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80	Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2026</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2028</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2030</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			19	8	2025	3	5	2026	19	8	2025	3	11	2028	3	11	2025	3	11	2030									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80																																																		
Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
19	8	2025	3	5	2026																																															
19	8	2025	3	11	2028																																															
3	11	2025	3	11	2030																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: CRC - 100025719 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE POR APROBACIÓN																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																				
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	N/A	N/A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	N/A	N/A																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A																																																		
Calidad del servicio	N/A	N/A																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A Certificado de modificación o anexo No.: N/A (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: N/A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A																																																				
OBSERVACIONES:																																																				
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).  Firma Nombre: JOSE DAVID PASTRANA MEDINA Director de Interventoría																																																				

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO FSI-800-021 VERSIÓN 1 FECHA 1/01/2024																																																								
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2025																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: MC - 019- 2025 INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S																																																										
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																																										
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DEL 2025 PLAZO INICIAL: DOS MESES Y MEDIO FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 55.892.215,67 VALOR ACUMULADO: \$ (Incluye adiciones)																																																										
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ROMERO ROMERO																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 5.598.211,60</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>10%</td><td>\$ 2.794.610,80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>10%</td><td>\$ 5.598.211,60</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80	Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>5</td><td>2026</td></tr><tr><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2028</td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2030</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			19	8	2025	3	5	2026	19	8	2025	3	11	2028	3	11	2025	3	11	2030															
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80																																																								
Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60																																																								
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
19	8	2025	3	5	2026																																																					
19	8	2025	3	11	2028																																																					
3	11	2025	3	11	2030																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100025719 Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																										
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	N/A	N/A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento	N/A	N/A																																																								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A																																																								
Calidad del servicio	N/A	N/A																																																								
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A Certificado de modificación o anexo No.: N/A (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto) Razón Social Compañía Aseguradora: N/A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A																																																										
OBSERVACIONES:																																																										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																										
Firma Nombre: JOSE DAVID PASTRANA MEDINA Director de Interventoría																																																										

 GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA <tr><td> CÓDIGO FSI-800-021 </td><td> VERSIÓN 1 </td></tr> <tr><td> FECHA 1/01/2024 </td></tr>	CÓDIGO FSI-800-021	VERSIÓN 1	FECHA 1/01/2024																																																	
CÓDIGO FSI-800-021	VERSIÓN 1																																																			
FECHA 1/01/2024																																																				
FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2025	3 DE NOVIEMBRE DE 2025																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: MC - 019- 2025	INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S																																																			
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																																				
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DEL 2025	PLAZO INICIAL: DOS MESES Y MEDIO																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025	(Incluye prórrogas y suspensiones)																																																			
VALOR INICIAL: \$ 55.892.215,67	VALOR ACUMULADO: \$ -																																																			
(Incluye ediciones)																																																				
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ROMERO ROMERO																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 5.598.211,60</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>10%</td><td>\$ 2.794.610,80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>10%</td><td>\$ 5.598.211,60</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80	Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>5</td><td>2026</td></tr><tr><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2028</td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2030</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			19	8	2025	3	5	2026	19	8	2025	3	11	2028	3	11	2025	3	11	2030									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 5.598.211,60																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 2.794.610,80																																																		
Calidad del servicio	10%	\$ 5.598.211,60																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
19	8	2025	3	5	2026																																															
19	8	2025	3	11	2028																																															
3	11	2025	3	11	2030																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC - 100025719																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: 3																																																				
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																				
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/11/2025																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																				
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	N/A	N/A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	N/A	N/A																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A																																																		
Calidad del servicio	N/A	N/A																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: N/A																																																				
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																				
Razón Social Compañía Aseguradora: N/A																																																				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A																																																				
OBSERVACIONES:																																																				
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																				
Firma 																																																				
Nombre: JOSE DAVID PASTRANA MEDINA Director de Interventoría																																																				

No. PÓLIZA	CRC-100025719	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	350058592	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	20/06/2025	24:00 Horas Del	04/09/2030	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 01800111935"



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CRC-100025719 y endoso, 3 cuyo afianzado es: **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **GOBERNACION DE SUCRE / GOBERNACION DE SUCRE**, expedida por la Compañía en 11/11/2025, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los 11 días del mes **NOVIEMBRE** del año 2025.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	CRC-100025719	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350058593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	19/08/2025	24:00 Horas Del	03/11/2030	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CRC-100025719 y endoso, 2 cuyo afianzado es: **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **GOBERNACION DE SUCRE / GOBERNACION DE SUCRE**, expedida por la Compañía en **26/08/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **26** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

350058593

Fecha de Facturación

26/08/2025

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

CRC-100025719

Periodo Facturado

19/08/2025

03/11/2030

Fecha Límite de Pago

25/09/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

127.610,00

IVA

24.246,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

151.856,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

CRA 4 CALLE 3 70 BARRIO MOCHILA

901752114

Intermediario

JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
ESPACIO PARA EL TIMBRE
Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **25/09/2025** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de este (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No.

350058593

Fecha de Facturación

26/08/2025

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Póliza No.

CRC-100025719

Periodo Facturado

19/08/2025

03/11/2030

Fecha Límite de Pago

25/09/2025

Prima (incluye gastos de expedición)

127.610,00

IVA

24.246,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

151.856,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente
Nombre / Razón Social


INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

CRA 4 CALLE 3 70 BARRIO MOCHILA

901752114

Intermediario

JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque
Banco
No Cuenta
No Cheque
Valor Cheque
TOTAL
Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000350058593(3900)000000151856(96)20250925

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990350058593(3900)000000151856(96)20250925

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES	
--	--

OPCIÓN 2

 BANCOS	
--	---

 CORRESPONSALES	
--	--

Tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jPxQmtdLc50+qMVNGJFdjQ==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-000T

No. PÓLIZA		CRC-100025719		No. ANEXO		3		No. CERTIFICADO		350062968		No. RIESGO							
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN		11/11/2025		SUC. EXPEDIDORA		CEN REGION CARIBE					
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					
00:00 Horas Del				19/08/2025				24:00 Horas Del				03/11/2030				N/A			
																N/A			
TOMADOR		INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS										No. DOC. IDENTIDAD		901.752.114-6					
DIRECCIÓN		CRA 4 CALLE 3 70 BARRIO MOCHILA										TELÉFONO		3114893115					
ASEGURADO		GOBERNACION DE SUCRE										No. DOC. IDENTIDAD		892.280.021-1					
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS SINCELEJO										TELÉFONO		3203509703					
BENEFICIARIO		GOBERNACION DE SUCRE										No. DOC. IDENTIDAD		892.280.021-1					
DIRECCIÓN		CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS SINCELEJO										TELÉFONO		3203509703					

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATO AFIANZADO EN LA POLIZA ARRIBA CITADA CELEBRO ACTA DE RECIBO FINAL, DE FECHA 03/11/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL SIN MODIFICACION.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MC-019-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/08/2025	24:00 Horas Del 03/05/2026	5.589.221,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/08/2025	24:00 Horas Del 03/11/2028	2.794.610,80	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 03/11/2025	24:00 Horas Del 03/11/2030	5.589.221,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 13.973.054,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 0,00
					GASTOS EXP.	\$ 0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2025	TOTAL A PAGAR	\$ 0,00
------------------	---	---------------	---------

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

DE SEGUROS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVOLUTIVA Y DE LOS VASTOS GASTOS EXCEPTO POR LA EXPIRACIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

27
TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CRC-100025719	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	350062968	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	19/08/2025	24:00 Horas Del	03/11/2030	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



ANEXO 10.

Resumen Mensual de Estado de Obra
FSI-800-023.

PE AGOSTO

FECHA: 19/08/2025 AL 31/08/2025

VERSIÓN 1

FECHA 22/11/2024

CONTRATO DE OBRA No.AMC - 022 - 2024

OB MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CO CONSORCIO HAI

INTERVENIOR: INGENORTE S.A.S

PLAZO INICIAL: 2.5 MESES 19/08/2025 VALOR INICIAL (Incluido IVA) : \$ 624.963.567.50

PLAZO DE INICIO: N/A VALOR ADICIONALES (Incluido IVA): N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 624.963.567.50

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): \$ 624.963.567.50

PLAZO DE TÉRMINO: 31/11/2025 ANTICIPO CONCEDIDO: N/A

PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO ABORTADO: N/A

ALCANCE FÍSICO Y FINANCIERO										
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES										
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES		VALORES		% DE AVANCE ACUMULADO
						ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	
1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO)	HA	304.02	\$ 761.980,77	\$ 231.657.393,46		70.00	\$ 0.00	\$ 53.338.653,85	23.02%
2	LIMPIEZA MANUAL CUENTAS ZANJAS DESCOLES (INCLUYE RETIRO)	ML	54.670,00	\$ 3.942,31	\$ 215.525.961,54		4200.00	\$ 0.00	\$ 16.557.692,31	7.68%
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES (INCLUYE RETIRO)	UND	209,00	\$ 132.003,08	\$ 27.588.643,08		47.00	\$ 0.00	\$ 6.204.144,62	22.46%
COSTOS DIRECTOS						\$ 474.771.998,08		\$ -	\$ 76.100.496,77	
AUI (30%)						\$ 142.431.599,42		\$ -	\$ 22.830.147,23	
PGIO						\$ 7.759.970,00		\$ -	\$ 6.420.070,00	
COSTO TOTAL						\$ 624.963.567,50		\$ -	\$ 105.350.708,00	
									\$ 76.100.496,77	16.86%

[illegible]


Firma
Nombre: JOSE DAVID PASTRIANA MEDINA
Director de Intervención
22202187541C.DR

ANEXO 11.

Informes Quincenales FSI-800-002.

Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura		GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME QUINCENAL		CÓDIGO	FSI-800-002
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
				FECHA	20/09/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

PERIODO No.:1del19/08/2025al31/08/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:Mejorar las condiciones físicas de la malla vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento quincenal de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son: limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, limpieza obras de arte y/o mayores.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTORealización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:CONSORCIO HAI				INTERVENTOR:INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS			
INTEGRANTES:OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO				INTEGRANTES:OSCAR LUIS HERRAZO SEBA			
CONTRATO No:AMC-022-2024				CONTRATO No:MC-019-2025			
FECHA DE INICIO:19/08/2025				FECHA DE INICIO:19/08/2025			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:03 DE NOVIEMBRE 2025				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:03 DE NOVIEMBRE 2025			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:NA				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:NA			
VALOR INICIAL:\$624.973.567,50				VALOR INICIAL:\$55.892.215,67			
VALOR ADICIONES:\$-				VALOR ADICIONES:\$-			
VALOR ACUMULADO:\$624.973.567,50				VALOR ACUMULADO:\$55.892.215,67			
VALOR ANTICIPO:\$-				VALOR ANTICIPO:\$-			
VALOR AMORTIZADO:\$-				VALOR AMORTIZADO:\$-			
SALDO POR AMORTIZAR:\$-				SALDO POR AMORTIZAR:\$-			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$624.973.567,50
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$105.350.708,00
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$55.892.215,67
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$6.942.755,19

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

OBRA				INTERVENTORIA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	624.973.567,50	100,00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	8.942.754,51	16,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	82.275.797,83	13,16%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	8.942.754,51	16,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	105.350.708,00	16,86%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	\$	4.471.377,25	8,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN ESTE PERIODO:	\$	105.350.708,00	16,86%		\$	4.471.377,25	8,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN ESTE PERIODO:	\$	82.275.797,83	13,16%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	23.074.910,17	3,69%				

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Se tenía programado para la primera quincena iniciar

INDICADOR IC:

En el mes:+

Acumulado:-

ANTICIPOS		ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A	Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A	Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A	Saldo \$	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %13,16%

Meta Física Ejecutada %16,86%

Avance o Atraso Físico %3,69%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	ZONAS DE DEPOSITO: SI	
UBICACIÓN:	LICENCIA AMBIENTAL: SI	LICENCIA AMBIENTAL: SI	
		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	
		CONCESIÓN DE AGUAS: SI	
		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI	
		VERTIENTES: SI	
		EMISIONES: SI	
		OTROS (Especificar cual): SI	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:9

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

Para el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:

META FÍSICA ACUMULADA						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CANT EJECUTADA	ZONA DE TRABAJO	% AVANCE ACOM
OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Rocera (Incluye retiro)	Ha	304,02	70,00	1, 2, 3, 4	23,02%
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas descoles (Incluye retiro)	m	54.870,00	4200,00	1, 2, 3, 4	7,68%
1.3	Desmonte de puertas en Limpieza obras de arte menores y/o mayores (Incluye retiro) estado PISO	unidades	209,00	47,00	1, 2, 3, 4	22,48%
			\$ 7.759.970,00	\$ 6.420.070,00	1, 2, 3, 4	82,73%

LEYENDA

San Nicolás - San Benito Abad	1
General - Betulia - Sincé	2
Límites Córdoba - San Antonio de Palmito	3
La Yee - Guaranda	4

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el presente periodo el contratista tiene programado la ejecución de las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD
1.1	Rocera (Incluye retiro)
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas descoles (Incluye retiro)
1.3	Desmonte de puertas en Limpieza obras de arte menores y/o mayores (Incluye retiro) estado

FECHA	15/09/2025
-------	------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

PERICOD No.	2	del	1/09/2025	al	15/09/2025
-------------	---	-----	-----------	----	------------

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:	Mejorar las condiciones físicas de la malla vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento rutinario de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son rocería
	limpieza manual de cunetas, zanjas y drenajes, limpieza obras de arte y muros.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado.

CONTRATO DE OBRA:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO IAI				INTERVENIOR:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS			
INTEGRANTES:	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO				INTEGRANTES:	OSCAR LUIS HERRAZO SEBA			
CONTRATO No.	AMC-022-2024	VALOR INICIAL:	\$	624.973.567,50	CONTRATO No.	MC-019-2025	VALOR INICIAL:	\$	55.892.215,67
FECHA DE INICIO:	19/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	19/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025	VALOR ACUMULADO:	\$	624.973.567,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025	VALOR ACUMULADO:	\$	55.892.215,67
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	NA		\$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	NA	VALOR ANTICIPO:	\$	-
			\$	-			VALOR AMORTIZADO:	\$	-
			\$	-			SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	13,16%	16,86%	4,90%
Durante el periodo	21,20%	10,60%	
Acumulado actual	34,36%	27,46%	



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se evidencian actividad de rocería, limpieza de obras de arte y cuenta en los tramos de Sínce - Betulia - Corozal, Sampues - San Benito, La Yee - Guaranda y Palmitos - Límites de Córdoba.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interviniente.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para esta primera quincena, se evidencian en las actividades ejecutadas, un porcentaje de avance de un 27,46%, frente a un programado del 34,36% dando un atraso del 6,9% con relación a lo programado.

FIRMA: 
NOMBRE: ELIAS VASQUEZ GALLARDO
Matricula Profesional No.:

On 11

FECHA

30/09/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE,

PERIODO No.:

3

del

16/09/2025

al

30/09/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO CONTRATO DE OBRA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE,

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

Mejorar las condiciones físicas de la malla vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento rutinario de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son rocería,

limpieza manual de cunetas, zanjas y descoles, limpieza obras de arte y/o mayores,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado,

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO HAI

INTEGRANTES:

OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO

CONTRATO No.:

AMC-022-2024

FECHA DE INICIO:

19/08/2025

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

03 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

NA

VALOR INICIAL:

\$ 624.973.567,50

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 624.973.567,50

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

INTEGRANTES:

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

CONTRATO No.:

MC-019-2025

FECHA DE INICIO:

19/08/2025

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

03 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

NA

VALOR INICIAL:

\$ 55.892.215,60

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 55.892.215,60

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 624.973.567,50
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 241.793.735,00
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 383.179.832,50
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 55.892.216
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 31.299.641
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 24.592.575

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A)	\$ 624.973.567,50	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 363.544.366,50	58,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	\$ 241.793.735,00	38,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN ESTE PERIODO:	\$ 70.180.644,30	11,23%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN ESTE PERIODO:	\$ 148.785.987,67	23,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (121.750.631,50)	-19,48%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

SI

NO

X

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se tenía programado para la primera quincena iniciar

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 31.299.640,77	56,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 31.299.640,77	56,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 7.824.910,19	14,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 7.824.910,19	14,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

SI

NO

X

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

INDICADOR VC	
En el mes:	-
Acumulado:	-

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

23,81%

Avance o Atraso Físico %

-12,58%

Meta Física Ejecutada %

11,23%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	DISPONIBLE	NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	SI	NO	N/A	X
ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

35

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

9

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

Para el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:

META FÍSICA ACUMULADA						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	CANT EJECUTADA	ZONA DE TRABAJO	% AVANCE ACOM
1.	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Roceria (incluye retiro)	Ha	304,02	211,02	1,2,3,4,5	69,41%
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas descoles (incluye retiro)	ml	54.670,00	24652	1,2,3,4,5	45,09%
1.3	Desmonte de puertas en Limpieza obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) estado	und	209,00	137,00	1,2,3,4,5	65,55%
PGIO		qib	\$ 7.759.970,00	\$ 6.420.070,00	1,2,3,4,5	82,73%

LEYENDA	
Sampues - San Benito Albad	1
Corozal - Betulia - Since	2
Limites Cordoba - San Antonio de Palmiro	3
La Yee - Guaranda	4
Since - Granada - Buenavista	5

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el presente periodo el contratista tiene programado la ejecución de las siguientes actividades

ITEM	ACTIVIDAD
1.1	Roceria (incluye retiro)
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas descoles (incluye retiro)
1.3	Desmonte de puertas en Limpieza obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) estado

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

1


MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE,

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborescencia paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO HAI			INTERVENIOR:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS		
INTEGRANTES:	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO			INTEGRANTES:	OSCAR LUIS HERAZO SEBA		
CONTRATO No.	AMC-022-2024	VALOR INICIAL:	\$ 624.973.567,50	CONTRATO No.	MC-019-2025.	VALOR INICIAL:	\$ 55.892.215,6
FECHA DE INICIO:	19/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	19/08/2025	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 624.973.567,50	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 55.892.215,6
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	N/A	VALOR ANTICIPO:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	N/A	VALOR ANTICIPO:	\$ -
			\$ -			VALOR AMORTIZADO:	\$ -
			\$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34,36%	27,46%	
Durante el periodo	23,81%	11,23%	-19,48%
Acumulado actual	58,17%	38,69%	



20/09/2025 7:34:02 a.m.
20 de septiembre 2025
9°20'23.814"N 75°32'54.942"W
Palmilla-Llanitas de Córdoba

24/09/2025 7:39:33 a.m.
9°16'16.41"N 75°6'49.392"W
via since granada

29/09/2025 8:09:29 a.m.
9°16'27.744"N 75°6'5.762"W
via since granada

20/09/2025 7:34:02 a.m.
20 de septiembre 2025
9°20'23.814"N 75°32'54.942"W
Palmilla-Llanitas de Córdoba

24/09/2025 7:39:33 a.m.
9°16'16.41"N 75°6'49.392"W
via since granada

29/09/2025 8:09:29 a.m.
9°16'27.744"N 75°6'5.762"W
via since granada

Se evidencian actividad de rocería, limpieza de obras de arte y cuenta en los tramos de Sampues - San Benito, Sincé-Granada-Buenavista

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Para esta primera quincena, se evidencian en las actividades ejecutadas, un porcentaje de avance de un 38,69%, frente a un programado del 58,17% dando un atraso del 19,48% con relación a lo programado.

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: ELIAS VASQUEZ GALLARDO
Matricula Profesional No.: _____

Original: Informe mensual de Interventoría.

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PERIODO No: 4 del 1/10/2025 al 15/10/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : Mejorar las condiciones físicas de la malla vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento rutinario de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son:

limpieza manual de cunetas, zanjas y descoques, limpieza obras de arte y/o mayores.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad. Las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del manto que se ha presentado.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 624.973.567,50
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	403.022.808
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 221.950.760,00
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 55.892.216
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	42.478.084
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 13.414.132

(Ejecutado de la vigencia correspondiente al valor total ejecutado acumulado)

	SI	NO
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:	☐	☒
PERÍODO FACTURADO:		
VALOR FACTURA:	\$ _____	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se tenía programado para la primera quincena iniciar

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

INDICADOR U	
En el mes:	-
Acumulado:	-

INTERVENTORIA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 42,478,083.91	76.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 42,478,083.91	76.00%
	\$ 5,589,221.57	10.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 5,589,221.57	10.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR	SI	NO
		X
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____		
PERIODO FACTURADO: _____		
VALOR FACTURA:	\$ _____	_____
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones:		

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N/A
Amortizado \$	N/A
Saldo \$	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	13.03%	Avance o Atraso Físico %	12.77%
Meta Física Ejecutada %	25.80%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES					DISPONIBLE					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X	ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	NO	N/A	X				
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X				
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X				
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X				
						OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X				
						VERTIENTES:	SI	NO	N/A					
						EMISIONES:	SI	NO	N/A	X				
						OTROS (Especificar cual):	SI	NO	N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)														
ESTADO: N/A						OBSERVACIONES:								

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	16	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	35	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

Para el presente periodo el contratista ejecutó las siguientes actividades:

ITEM			ACTIVIDAD	UNO	CANT	CANT EJECUTADA	ZONA DE TRABAJO	% AVANCE ACOM
META FISICA ACUMULADA								
OBRAS PRELIMINARES								
1.1	Reforma (incluye retiro)			Ha	304.02	224.22	1.5,6.7	73.75%
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas desocles (incluye retiro)			m ²	54.670.00	27887	1.5,6.7	51.01%
1.3	Desmonte de puertas en Limpieza obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) estado			und.	209.00	184.00	1.5,6.7	88.04%
TOTAL				\$	7.759.926.00	\$ 6.420.070.00	1.5,6.7	82.73%

LEYENDA	
Sampedra - San Benito Abad	1
Corral - Berdulia - Sincé	2
Limites Córdoba - San Antonio de Palmito	3
La Yec - Guaranda	4
Sincé - Granada - Buenavista	5
San Antonio de Palmito - Finca San Antonio	6
Chimultá - Curipao - Asunción	7


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Para el presente periodo el contratista Tiene programado la ejecución de las siguientes actividades

ITEM	ACTIVIDAD
1.1	Receita (incluye retro)
1.2	Limpieza manual cunetas zanjas descosiles (incluye retro)
1.3	Desmontaje de puentes en 1. limpieza obras de auto limpieza con dispositivos (incluye retro) estado

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	58.17%	38.65%	
Durante el periodo	13.03%	25.80%	4,72%
Acumulado actual	71.20%	64.45%	



L INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PERIODO No.: 4 del 1/10/2025 al 15/10/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : Mejorar las condiciones físicas de la red vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento rutinario de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son:

Impieza manual de cunetas, zanjas y descoles, limpieza obras de arte y/o mayores.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arboleda paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad. las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del invierno que se ha presentado.

CONTRATO DE OBRA	
------------------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTAS:	CONSORCIO HNAI	INTERVENTOR:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
INTEGRANTES:	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO	INTEGRANTES:	OSCAR LUIS HERRAZO SEBA
CONTRATO No.	AMC-02-2024	CONTRATO No.	MC-019-2025
FECHA DE INICIO:	19/08/2025	FECHA DE INICIO:	19/08/2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	03 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	NA	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	NA
		VALOR INICIAL:	\$
		VALOR ADICIONALES:	\$
		VALOR ACUMULADO:	\$
		VALOR ANTICIPO:	\$
		VALOR AMORTIZADO:	\$
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$

```

graph LR
    A[Acumulado anterior] --> B[Durante el periodo]
    B --> C[Acumulado actual]
  
```

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se evidencian actividad de rocería, limpieza de obras de arte y cuenta en los tramos de Sampues - San Benito, Sincé-Granada-Buenavista, San Antonio de Palmito - Finca San Antonio, Chinulito - Aguacate - Cacique

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Para esta primera quincena, se evidencian en las actividades ejecutadas, un porcentaje de avance de un 64,49%, frente a un programado del 71,20% dando un atraso del 6,72% con relación a lo programado.

FIRMA:
NOMBRE: ELIAS VASQUEZ GALLARDO

[Informe mensual de Interventoria.]

Gobernación de Sucre Secretaría de Infraestructura GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INFORME QUINCENAL		CÓDIGO FSI-800-002 VERSIÓN 1 PÁGINA
		FECHA 3/11/2025
I. INFORMACIÓN GENERAL		
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
PERIODO No.: 5 del 15/10/2025 al 3/11/2025		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Mejorar las condiciones físicas de la malla vial del departamento, en cuanto a las actividades mantenimiento rutinario de la vía, de 8 tramos distribuidos en el departamento, las actividades a realizar a son: rocería, limpieza manual de cunetas, zanjas y descotes, limpieza obras de arte y/o mayores.		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Realización del mantenimiento rutinario en cuanto a limpieza, pues la arborización paralela a la calzada por su crecimiento natural interfiere y afecta la visibilidad, las zonas anexas a la vía presentan arbustos también propios de la falta de mantenimiento y del mismo que se ha presentado.		
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: CONSORCIO HAI OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO CONTRATO No. AMC-022-2024 FECHA DE INICIO: 19/08/2025 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 03 DE NOVIEMBRE 2025 FF ENCIMIENTO VIGENTE: NA VALOR INICIAL: \$ 624.973.567,50 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 624.973.567,50 \$ - \$ - INTERVENTOR: INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS CONTRATO No. MC-019-2025 FECHA DE INICIO: 19/08/2025 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 03 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: NA VALOR INICIAL: \$ 55.892.215,67 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 55.892.215,67 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -		
Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO  30 oct. 2025 8:40:14 a. m. 9°15'53.19" N 75°14'18.51" W VIA Betulia Albania  23 oct. 2025 9:15:14 a. m. 9°19'22.74" N 75°0'39.72" W via granada buena vista  Chinilito-Aguacate-Cacique 20 de octubre de 2025 ABS K4+200  17 oct. 2025 12:49:32 p. m. 9°17'25.836" N 75°4'24.276" W via since granada  23 oct. 2025 12:19:31 p. m. 9°19'29.622" N 75°0'25.644" W via granada buena vista  17 de octubre de 2025 ABS K 6+600 La Yed-Guaranda  16 de octubre de 2025 ABS K 5+000 Limites de Córdoba - San Antonio de Palmito  17 de octubre 2025 ABS 22+000 Sampues Sucre - San Benito Abad Colombia		
Se evidencian actividad de rocería, limpieza de obras de arte y cuenta en los tramos de Sampues - San Benito, San Juan de Betulia-Albania, Corozal-Betulia-Sincé, Limites de Cordoba-San Antonio de Palmito, Sincé-Granada-Buenavista, San Antonio de Palmito - Finca San Antonio, Chinilito - Aguacate - Cacique		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Para esta primera quincena, se evidencian en las actividades ejecutadas, un porcentaje de avance ejecutado en un 100%		FRMA  NOMBRE ELIAS VASQUEZ GALLARDO
Original: Informe mensual de Interventoría.		

ANEXO 12.

Maquinaria y Equipo Contrato Obra FSI-800-006.

[illegible]



Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

GOBERNACIÓN DE SUCRE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

FSI-800-006

VERSIÓN

2

FECHA

1/01/2024

FECHA

30/09/2025

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. AMC - 022- 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO HAI

CONTRATO INTERVENTORIA No. MC - 018 - 2025

INTERVENTORIA: INGENORTE S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO			1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2025																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VOLQUETA	CHEVROLET / 2013	17000	Sincalejo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
																														</			

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES			No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			1	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			0	0%

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado); INACTIVO POR DIA FERIADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

Firma

Nombre: ORLANDO CAMACHO VERGARA

Residente de Obra

Firma

Nombre: OSCAR HERAZO SEBA

Director de Interventoría

IMAGEN DE LA MAQUINA



IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

CODIGO	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIAL
236B	MINICARGADOR	CATERPILLAR	2008	HEN08974

CARACTERISTICAS

PESO	3180KG		
COLOR	Amarillo		
CILINDRAJE	N/A		
CAPACIDAD DE CARGA	884KG		
NO. DE MOTOR	CAT 3.4-T		
CAPACIDAD DE BALDE	0,40M3		

MANTENIMIENTO

FECHA DE MANTENIMIENTO	Hr/Km ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO O ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO DE MANTENIMIENTO		REPUESTO O INSUMO	LUGAR DE MANTENIMIENTO
			PREVENTIVO	CORRECTIVO		
14/09/2023		Cambio de mangueras hidráulicas x 6 y acoples. Mantenimiento de módulos electrónicos.	X	X		PATIO TALLER/BODEGA
31/07/2023		Cambio de empaquetadura botellas de brazo de levante y frontales. Bujes y pasadores del brazo de levante.	X	X		PATIO TALLER/BODEGA
24/07/2023		Revisión eléctrica: Luces frontales y traseras, pito frontal, cambio pito de reversa. Pendiente nivel de combustible. Fabricación de vidrio	X			PATIO TALLER/BODEGA
21/07/2023		Cambio de piezas: Cambio de chapa Parte #223-4240, Cambio de guardapolvo Joysticks (Izq-Der) Part # 443-6024, Botón de Parking Parte # 142-9320, Cubierta Frontal de Panel Part # 158-6695, Tablero de	X			PATIO TALLER/BODEGA
19/07/2023		Tapa correa Parte # 218-0921, Tapas de Joystick (Izq-Der) Parte # 2186389-	X			PATIO TALLER/BODEGA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1104418498

NOMBRE

DUVIER DAVID MARTINEZ RAMOS

FECHA DE NACIMIENTO

06-09-1990

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELEJO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-07-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-07-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007060113

Servicios Integrales 60947.2.0-30 08/23

**GSP FULL SECURITY NIT.1007283365-3
CERTIFICA**

GPS FULL SECURITY con **NIT. 1007283365-3** suministra asistencia de monitoreo satelital a través de GPS en tiempo real, y certifica que el vehículo que se describe a continuación, se encuentra adscrito a nuestro programa de monitoreo bajo el contrato de modalidad Anual solicitud realizada por el señor (a) **DARLIS ELENA GONZÁLEZ PANTOJA** con identificación CC. **1.038.435.335** con Correo tali juli81@gmail.com.

DATOS DE VEHICULO

LÍNEA	AÑO	PLACA	No. SERIE CHASIS	COLOR	MARCA
FVS VOLQUETA	2013	TTN650	9GDFVZ346DB013387	BLANCO	CHEVROLET

DATOS DE GPS

FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE RENOVACIÓN	MARCA DISPOSITIVO	IMEI
29/07/2024	29/07/2025	BOXTRAKER	869731058968413

Página de acceso	https://digital.indesoft.xyz/login/298
USUARIO	tali juli81@gmail.com
CLAVE	12345678

A la solicitud del interesado, se expide en Ocaña, a los (29) días del mes de julio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Para la verificación de este certificado consultar:

Línea soporte: 311 5289399- 317698 5147

Cordialmente



YIMY MAURICIO PEÑARANDA
GERENTE
GPS FULL SECURITY



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10027089607

PLACA
TTN650

MARCA
CHEVROLET

LÍNEA
FVZ

MODELO
2013

CILINDRADA CC
7.790

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
VOLQUETA

TIPO CARROCERÍA
PLATON

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
17000

NÚMERO DE MOTOR
6HK1-620749

REG VIN
N 9GDFVZ346DB013387

NÚMERO DE SERIE
9GDFVZ346DB013387

REG NÚMERO DE CHASIS
N 9GDFVZ346DB013387

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MORALES VALENCIA NELSON ENRIQUE

IDENTIFICACIÓN
C.C. 71004302

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

DE

FECHA IMPORT.

PUEBTAS

32012000660998

1

11/05/2013

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.


FECHA VENCIMIENTO

25/10/2013

02/09/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LT07001888820

Plan Utilitarios Y Pesados

Hola, Darlis

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información, coberturas y beneficios particulares del compromiso que SURA adquiere contigo.

Esta es una imagen de referencia



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social
DARLIS ELENA GONZALEZ PANTOJA

Cédula
1038435335

Dirección
CL 20 # 25 139 APTO CA 14, SAN MARCOS, SUCRE

Teléfono
6043136058

Correo electrónico
talijuli81@gmail.com

003



INFORMACIÓN BÁSICA DE TU SEGURO

Número de la póliza	Valor sin IVA
900001209946	\$ 4,528,780
Oficina de radicación	Valor IVA
PROMOTORA MONTERIA	\$ 860,468
Forma de pago	Total a pagar anual
MENSUAL	\$ 5,389,248



VIGENCIA DE TU SEGURO

Desde	Hasta
30-JUL.-2024	30-JUL.-2025
Ciudad de expedición	Fecha de expedición
MONTERIA	31 de julio 2024

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
0%

ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

Nombre
DARLIS ELENA GONZALEZ PANTOJA

Cédula
1038435335

BENEFICIARIO

Nombre
DARLIS ELENA GONZALEZ PANTOJA

Cédula
1038435335

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU CARRO

	Placa	Modelo	Marca - tipo - características		Clase
	TTN650	2013	CHEVROLET - FVZ 700P FORWARD [LARGO] - MT 7800CC TD 6X4		CAMION PESADO
	Servicio PÚBLICO ESPECIAL	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
	01611126	6HK1620749	9GDFVZ346DB013387	SAN MARCOS	
	Valor de referencia		Valor total asegurado		
	\$ 260,000,000		\$ 260,000,000		

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Límite	10% - 3 SMLMV	\$ 2,040,000,000
	Deducible		
Accidentes	Accidentes al Conductor	\$ 0	\$ 50,000,000
Asistencia	Asistencia	\$ 0	Asistencia Pesados

Documento de: Póliza Nueva

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de tu póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió contigo, las encuentras en el clausulado.

Recuerda que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.



Este seguro se terminará:

- a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.

c) Cuando SURA te lo informe por escrito.

- d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado el seguro por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que tu carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de tu seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a tu forma de pago, recibirás tu recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

Las asistencias de la póliza serán prestadas por Operaciones Generales Suramericana S.A.S. en todo caso Seguros Generales Suramericana S.A. será responsable frente al consumidor financiero.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza

21-JUN.-2023

Tipo y número de entidad

13-18

Tipo de documento

P

Ramo al cual pertenece

3

Identificación de la proforma

F-13-18-0040-243

DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

Código

19327

Nombre del asesor principal

HOYOS*VELASQUEZ**HERMINIA MARIA

Oficina

003

Compañía

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Andrés Gaviola

Firma Autorizada

CLIENTE

SORPRÉNDETE
Haz clic y descubre
por qué asegurarte de vivir, es para ti.



Con nuestra App Seguros SURA es cada vez más fácil y más rápido solicitar tus servicios de asistencia.

Descárgala ingresando a segurossura.com.co/app



SOAT

PRIMA DE PAGAR DE CADA VEICULO Y EL CANTO A LAS PERSONAS QUE ACCIDENTE DE TRAFICO

FECHA DE EXPIRACION	VIDEOR	FECHA
2024 11 23	2024 11 24	2025 11 23



seguros mundial
tu compañía siempre

Nº DE POLIZA 89869509 - 698738086	PLACA Nº TTN652	CLASE DE VEHICULO CARGA O MIXTOS	SECTOR PUBLICO	FECHA DE EMISION 7792	ANEXO 2013
MARCA CHEVROLET			CARACTERISTICA PLATON		
Nº MOTOR 8HK1820749		Nº CHASIS O N.º SERIE 8GDFVZ3460B013387		Nº VIN 90DFVZ3460B013387	
Nº DE MOTOR 8HK1820749		Nº CHASIS O N.º SERIE 8GDFVZ3460B013387		Nº VIN 90DFVZ3460B013387	
NOMBRE Y NOMBRE DEL TITULAR DARIS GONZALEZ PANTOJA		TELEFONO DEL TITULAR 304877047	TIPO DE DOCUMENTO DEL TITULAR CC	Nº DE DOCUMENTO DEL TITULAR 1038435325	CUBO DE REGISTRO TITULAR CHOCONTA
CODIGO DE REGISTRO 1317	COD. VIDEOR EXPEDICION 14	COD. PRODUCTOR 13158	Nº DE REGISTRO 89869509	CODIGO DIRECCION 11001	
TARIFA 33	PRIMA SOAT \$ 1.162.400	CONTRIBUCION FONDA \$ 804.400	TASA \$ 2.100	GASTOS POR VITIMA	
TOTAL \$ 1.768.900				GASTOS POR VITIMA	
				A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACUTICOS Y HOSPITALARIOS	
				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	
				GASTO 263,13¹	
				GASTO 701,68²	
				GASTO 8,77	
				GASTO 180	
				GASTO 750	
				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)	
				SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

¿SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presenates un accidente de tránsito y ocasionas daños materiales a otros.

Consulta más información con el agente con quien adquiriste este SOAT o ingresa a: www.segurotercero.com

Señal que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- *Recordar pagar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- *Asegurarse de que su póliza está registrada en el RENT.
- *Este seguro es el seguro en que debe recurrir en póliza No tener SOAT responde acerca de los accidentes, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el resguardo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- *Adquirir su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- *Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por los víctimas.
- *Según prestación de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito de la Ley 175 Decreto Ley 661 de 1993. En caso contrario, denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- *Para los gastos médicos, al salir ante la aseguradora o al médico le debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de seguros

Con el fin de evitar duplicidad de seguros, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RENT, la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que comience a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RENT.

Notas de datos

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurotercero.com.co/legal. Dentro de la Política mencionará los derechos que le asisten como titular de sus datos y los números que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.


Topes de cobertura gastos médicos

* Para los siguientes límites: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000.
Decreto 1644 de 2022.
* Para los demás casos no dados en el presente.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
DN: cn=COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA, o=COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA, email=COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA@COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA.CO, c=CO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177384908

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE SUCRE

NIT: 900122353

No. de Certificado de
Acreditación: 09-OIN-044-004

Fecha de expedición: 2024/11/23

Fecha de vencimiento: 2025/11/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTN650

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7790

NRO. MOTOR: 6HK1-620749

NRO. CHASIS: 9GDFVZ346DB013387

VIN: 9GDFVZ346DB013387

LÍNEA: FVZ

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: DARLIS E. GONZALEZ P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

ANEXO 13.

Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato
de Obra FSI-800-007.

PERIODO DEL INFORME	1-oct	HASTA	3-nov
CONTRATO DE OBRA N°	AMC - 022 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA 003		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	MC - 019 - 2015		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		

NUMERO DE PLANILLA:		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:										a		31 de octubre 2025	
Nombre personal		Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales		I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
	ORLANDO CAMACHO VERGARA	RESIDENTE DE OBRA	9.039.503	\$ 1.423.500,00	30	SALUD TOTAL		\$ 57.000,00	COLPENSION	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	CRISTOBAL JULIO VERGARA ROSARIO	OBRAERO	11.040.293	\$ 1.423.500,00	30	NUEVA EPS		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	ELIAS SAMUEL VASQUEZ GALLARDO	DIRECTO DE OBRA	72.156.853	\$ 1.423.500,00	30	SANITAS		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	ANGEL ROBINSON MERCADO GALVAN	OBRAERO	92.089.427	\$ 1.423.500,00	30	CAJACOPI		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	EDINSON RAFAEL BADO	OBRAERO	92.276.345	\$ 1.423.500,00	30	SALUD TOTAL		\$ 57.000,00	COLPENSION	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	MALVIN YESID MONTERROZA SALZAS	OBRAERO	92.277.481	\$ 1.423.500,00	30	MUTUAL SER		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	EDISON JOSE CAMANO NARVAEZ	OBRAERO	92.485.003	\$ 1.423.500,00	30	SALUD TOTAL		\$ 57.000,00	COLPENSION	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	HUMBERTO RAMON NAVARRO PADILLA	OBRAERO	92.521.993	\$ 1.423.500,00	30	COOSALUD		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	JAVIER ANTONIO SOLAR CARMONA	OBRAERO	92.545.466	\$ 1.423.500,00	30	CAJACOPI		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO	REPRESENTANTE LEGAL	1.047.369.398	\$ 1.423.500,00	30	MUTUAL SER		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	KUSLMAN JOSE VERGARA POZO	OBRAERO	1.100.249.529	\$ 1.423.500,00	30	CAJACOPI		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	LUIS MIGUEL LASTRA HERNANDEZ	OBRAERO	1.100.542.147	\$ 1.423.500,00	30	FAMILIAR DE COLOMBIA		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	NEIVER DAVID MARTINEZ RIVERO	VIGILANTE	1.102.887.661	\$ 1.423.500,00	30	COOSALUD		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	DUIVER DAVID MARTINEZ RIVERO	OBRAERO	1.104.418.498	\$ 1.423.500,00	30	COOSALUD		\$ 57.000,00	COLPENSION	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
	JOHNATTAN MAURICIO DIAZ RONDON	OBRAERO	1.110.525.537	\$ 1.423.500,00	30	COOSALUD		\$ 57.000,00	PORVENIR	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00			\$ 57.000,00	\$ 440.900,00
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-
														\$	-

PERIODO DEL INFORME	1-oct	HASTA	3-nov
CONTRATO DE OBRA N°	AMC - 022 - 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA 003		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	MC - 019 - 2015		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		

NUMERO DE PLANILLA:		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:										1 de noviembre 2025		a		3 de noviembre 2025	
Nombre personal		Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		VALOR	PENSION	VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar		
	ORLANDO CAMACHO VERGARA	RESIDENTE DE OBRA	9.039.503	\$ 1.423.500,00	3	SALUD TOTAL	\$ 5.700,00	COLPENSION	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	CRISTOBAL JULIO VERGARA ROSARIO	OBRAERO	11.040.293	\$ 1.423.500,00	3	NUEVA EPS	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	ELIAS SAMUEL VASQUEZ GALLARDO	DIRECTO DE OBRA	72.156.853	\$ 1.423.500,00	3	SANITAS	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	ANGEL ROBINSON MERCADO GALVAN	OBRAERO	92.099.427	\$ 1.423.500,00	3	CAJACOPI	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	EDINSON RAFAEL BADO	OBRAERO	92.276.345	\$ 1.423.500,00	3	SALUD TOTAL	\$ 5.700,00	COLPENSION	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	MALVIN YESID MONTERROZA SALZAS	OBRAERO	92.277.481	\$ 1.423.500,00	3	MUTUAL SER	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	EDISON JOSE CAMANO NARVAEZ	OBRAERO	92.485.003	\$ 1.423.500,00	3	SALUD TOTAL	\$ 5.700,00	COLPENSION	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	HUMBERTO RAMON NAVARRO PADILLA	OBRAERO	92.521.993	\$ 1.423.500,00	3	COOSALUD	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	JAVIER ANTONIO SOLAR CARMONA	OBRAERO	92.545.466	\$ 1.423.500,00	3	CAJACOPI	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO	REPRESENTANTE LEGAL	1.047.369.398	\$ 1.423.500,00	3	MUTUAL SER	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	KUSIMAN JOSE VERGARA POZO	OBRAERO	1.100.249.529	\$ 1.423.500,00	3	CAJACOPI	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	LUIS MIGUEL LASTRA HERNANDEZ	OBRAERO	1.100.542.147	\$ 1.423.500,00	3	FAMILIAR DE COLOMBIA	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	NEIVER DAVID MARTINEZ RIVERO	VIGILANTE	1.102.887.661	\$ 1.423.500,00	3	COOSALUD	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	DUIVER DAVID MARTINEZ RIVERO	OBRAERO	1.104.418.498	\$ 1.423.500,00	3	COOSALUD	\$ 5.700,00	COLPENSION	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
	JOHNATTAN MAURICIO DIAZ RONDON	OBRAERO	1.110.525.537	\$ 1.423.500,00	3	COOSALUD	\$ 5.700,00	PORVENIR	\$ 22.800,00	\$ 10.000,00	\$			\$ 5.700,00	\$ 44.200,00		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		
														\$	\$		

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801948621	1	CONSORCIO IWM		B	0	ARL SURTA - 14-11	ÚNICA	7111	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN				TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1		CR 28 SA 54				3003428559	CONSORCIOVASO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	34697707	E	2025-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.660.300	12.600	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO		ESTADO PLANILLA						
		34697707	2025-09-04	Pagada						
15										

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N 901948621	1	CONSORCIO IM	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7111	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
70-1		CR 28 SA 54	300342989		CONSORCIOVASOC@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECALDO
2025-08	2025-09	34697707	E	2025-09-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.660.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
15	34697707	2025-09-04	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	8.541.000	IBC SALUD	8.541.000
		IBC RIESGOS	8.541.000
		IBC CAJAS	8.541.000
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				15	1.368.000	0	6.200	0	1.374.200
PORVENIR	230301	800224808	8	11	1.003.200	0	4.500	0	1.007.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	364.800	0	1.700	0	366.500
EPS(Administradoras: 8)				15	342.000	0	2.300	0	344.300
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	22.800	0	200	0	23.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	68.400	0	400	0	68.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	68.400	0	400	0	68.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	45.600	0	300	0	45.900
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	22.800	0	200	0	23.000
NUOVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	22.800	0	200	0	23.000
EPS CAJACOPÍ	CCFC55	901543211	6	3	68.400	0	400	0	68.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	22.800	0	200	0	23.000
ARP(Administradoras: 1)				15	595.500	0	2.700	0	598.200
ARL SURA	14-11	89903790	5	15	595.500	0	2.700	0	598.200
CCF(Administradoras: 1)				15	342.000	0	1.600	0	343.600
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	15	342.000	0	1.600	0	343.600
Gran Total					2.647.500	0	12.800	0	2.660.300

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN
NI 001348621	1	CONSORCIO HAJ	B	0	ARL BUENA - 14-11	ÚNICA
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO	EMAIL
70-1		CR 26 SA 54			3003429689	CONSORCIOVASOE@GMAIL.COM
						TIPO DE EMPRESA
						Jurídica
						EXENTO DE PARAFISCALES
						S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34870062	E	2025-10-06		TODOS	TODOS	6.813.500	0	BANCO DE BOGOTÁ
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	34870062	2025-10-06	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 901948621	1	CONSORCIO MW	B	0	ARL SUR - 14-11	UNICA	7111	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
70-1	CR 28 SA 54		3003428989		CONSORCIOVASOE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2025-09	2025-10	34870662	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.613.500	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
15	34870662	2025-10-06	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	21.352.500	IBC SALUD	21.352.500
		IBC RIESGOS	21.352.500
		IBC CAJAS	21.352.500
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				15	3.417.000	0	0	0	3.417.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	911.200	0	0	0	911.200
PORVENIR	230301	800224808	8	11	2.505.800	0	0	0	2.505.800
EPS(Administradoras: 8)				15	855.000	0	0	0	855.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS CAJACOPÍ	CCFC55	901543211	6	3	171.000	0	0	0	171.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	114.000	0	0	0	114.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	171.000	0	0	0	171.000
ARP(Administradoras: 1)				15	1.486.500	0	0	0	1.486.500
ARL SUR	14-11	890903790	5	15	1.486.500	0	0	0	1.486.500
CCF(Administradoras: 1)				15	855.000	0	0	0	855.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	15	855.000	0	0	0	855.000
Gran Total					6.613.500	0	0	0	6.613.500

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
B	0	ARL SURTA - 14-11	UNICA	7111	Jurídica
		TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
		3003428689	CONSORDIASOE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

CD	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.613.500	0	BANCO DE BOGOTA

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 901948621	1	CONSORCIO HN	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7111	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
70-1		CR 28 SA 54	3003428889		CONSORCIOVASOE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-10	2025-11	35256882	E	2025-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.613.500	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
15	35256882	2025-11-07	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	21.352.500	IBC SALUD	21.352.500
		IBC RIESGOS	21.352.500
		IBC CAJAS	21.352.500
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				15	3.417.000	0	0	0	3.417.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	911.200	0	0	0	911.200
PORVENIR	230301	800224808	8	11	2.505.800	0	0	0	2.505.800
EPS(Administradoras: 8)				15	855.000	0	0	0	855.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	171.000	0	0	0	171.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	171.000	0	0	0	171.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	114.000	0	0	0	114.000
EPS CAJACOPÍ	CGFC55	901543211	6	3	171.000	0	0	0	171.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	57.000	0	0	0	57.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	57.000	0	0	0	57.000
ARF(Administradoras: 1)				15	1.486.500	0	0	0	1.486.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	15	1.486.500	0	0	0	1.486.500
CCF(Administradoras: 1)				15	855.000	0	0	0	855.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	15	855.000	0	0	0	855.000
Gran Total					6.613.500	0	0	0	6.613.500

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTISTA									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	I. F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801945621	1	CONSORCIO HN	B	0	ARL SUKA - 14-11	UNICA		7111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
70-1	CR 28 SA 54		3003429869		CONSORCIOVASOE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	352564330	E	2025-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	663,000	0	BANCO DE BIOGOTA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
			Pagada							
15	352568330	2025-12-04	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 901946821	1	CONSORCIO HAI	B	0	ARL SUR - 14-11	ÚNICA	7111	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
70-1		CR 28 SA 54	3003428989		CONSORCIOVIASDE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35258330	E	2025-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	663.000	BANCO DE BOGOTÁ
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
15	35258330	2025-12-04	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	2.135.250	IBC SALUD	2.135.250
		IBC RIESGOS	2.135.250
		IBC CAJAS	2.135.250
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				15	342.000	0	0	0	342.000
COLPENSIONES	25-14	9003336004	7	4	91.200	0	0	0	91.200
PORVENIR	230301	800224808	8	11	250.800	0	0	0	250.800
EPS(Administradoras: 8)				15	85.500	0	0	0	85.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	17.100	0	0	0	17.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	5.700	0	0	0	5.700
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	11.400	0	0	0	11.400
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	5.700	0	0	0	5.700
EPS CAJACOIPI	CCFC35	901543211	6	3	17.100	0	0	0	17.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	17.100	0	0	0	17.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	5.700	0	0	0	5.700
NUOVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	5.700	0	0	0	5.700
ARF(Administradoras: 1)				15	150.000	0	0	0	150.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	15	150.000	0	0	0	150.000
CCF(Administradoras: 1)				15	85.500	0	0	0	85.500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	15	85.500	0	0	0	85.500
Gran Total					663.000	0	0	0	663.000

ANEXO 14.

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
FSI-800-010.



Gobernación de Sucre

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GOBERNACIÓN DE SUCRE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

FSI-800-010

VERSIÓN

1

FECHA

1/01/2024

FECHA

2/09/2025

CONTRATO DE OBRA No.: AMC - 022 - 2024

MES INFORME MENSUAL: 19/08/2025 - 31/09/2025

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: MC - 019 - 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO HAI

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INTERVENCIÓN: INGENORTE S.A. S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1284	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	--	Propios	AMC - 022 - 2024	\$ 624.963.568	\$ -
TOTAL							\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 624.963.567,50

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
													SI NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL		

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma

Nombre

Director de Obra

Matrícula Profesional No.

ELIAS VAZQUEZ GALLARDO

0820257128 ATL

Firma

Nombre

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.

JOSE DAVID PASTRANA MEDINA

22202187541COR



Gobernación de Sucre

Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

FSI-800-010

VERSIÓN

1

FECHA

1/01/2024

FECHA

30/09/2025

CONTRATO DE OBRA No:

AMC - 022 - 2024

MES INFORME MENSUAL:

SEPTIEMBRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

MC - 019 - 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO HAI

PROYECTO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

INTERVENTOR:

INGENORTE S.A.S

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1294	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	Propios	AMC - 022 -2024	\$ 624.963.568	\$ -
TOTAL							\$ 624.963.568

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 624.963.567,50

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones	
														SI	NO
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO		IVA	TOTAL
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Firma

Nombre:

Director de Obra

Matrícula Profesional No.:



ELIAS VAZQUEZ GALLARDO

062025128 ATL

Firma

Nombre:

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:



JOSE DAVID PASTRANA MEDINA

2220218754-TCOR

ANEXO 15.

Estado General del Tiempo FSI-800-008.

 Gobernación de Sucre	GOBERNACIÓN DE SUCRE		CÓDIGO	FSI-800-008
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN	1
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		PÁGINA	

	FECHA	2/09/2025
--	-------	-----------

CONTRATO DE OBRA No: AMC - 022 - 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO HAI

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: MC - 019 - 2025 INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES 19 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025																																Total	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																					
Seco	24	24	24	22	24	24	24	22	24	24	24	24	24																					308
Lluvias moderadas				2				2																										4
Lluvias intensas																																		0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma  Nombre: ORLANDO CAMACHO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 13202 - 36978	Firma  Nombre: ANDREA GONZALEZ FERRER Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 2220221897 - COR
---	--

 Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGOFISI-800-008 VERSIÓN1 PÁGINA																																																																																																																																																														
FECHA30/09/2025																																																																																																																																																																
CONTRATO DE OBRA No:AMC - 022 - 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO HAI																																																																																																																																																																
MES INFORME MENSUAL:SEPTIEMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																																																																																																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:MC - 019 - 2025 INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S																																																																																																																																																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																																																																																																																																																
DÍAS DEL MES 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 <table><thead><tr><th>Clase de tiempo</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Seco</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>22</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>22</td><td>24</td><td>22</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>22</td><td>24</td><td>24</td><td>20</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>22</td><td>24</td><td>691</td></tr><tr><td>Lluvias moderadas</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>29</td></tr><tr><td>Lluvias intensas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Total horas</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td></tr></tbody></table> EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.			Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	Seco	24	24	24	22	22	22	22	22	24	24	24	22	24	24	24	22	24	22	24	24	24	22	24	24	20	22	23	24	22	24	691	Lluvias moderadas				2	2	2	2	2			2	2			2			2				2			4	2	1		2		29	Lluvias intensas																														0	Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total																																																																																																																																	
Seco	24	24	24	22	22	22	22	22	24	24	24	22	24	24	24	22	24	22	24	24	24	22	24	24	20	22	23	24	22	24	691																																																																																																																																	
Lluvias moderadas				2	2	2	2	2			2	2			2			2				2			4	2	1		2		29																																																																																																																																	
Lluvias intensas																														0																																																																																																																																		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																																																																																																																																		
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																																																																																																																																																
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																
 Firma Nombre: ORLANDO CAMACHO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 13202 - 36978																																																																																																																																																																
 Firma Nombre: ANDREA GONZALEZ FERRER Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 2220221897 - COR																																																																																																																																																																

 Gobernación de Sucre	 Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO FSI-800-008																															
		VERSIÓN 1																																	
		PÁGINA																																	
		FECHA		3/11/2025																															
CONTRATO DE OBRA No: AMC - 022 - 2024 OCTUBRE- NOVIEMBRE																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO HAI																																			
MES INFORME MENSUAL:																																			
PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: MC - 019 - 2025																																			
INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S																																			
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
DÍAS DEL MES 1 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2025																																			
Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	Total
Seco	22	24	20	24	24	24	24	23	22	24	20	22	24	21	17	21	24	24	15	21	24	24	24	23	24	24	23	24	24	24	22	24	24	22	769
Lluvias moderadas	2	0	4	0	0	0	0	1	2	0	4	2	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	31
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																			
OBSERVACIONES:																																			
Firma Nombre: ORLANDO CAMACHO Residente de Obra Matrícula Profesional No 13202 - 36978																																			
Firma Nombre: ANDREA GONZALEZ FERRER Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 2220221897 - COR																																			

ANEXO 16.

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de
Obra FSI-800-011.

 GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA <tr><td> CÓDIGO FSI-800-011 </td><td> VERSIÓN 1 </td></tr> <tr><td> PÁGINA </td><td></td></tr>	CÓDIGO FSI-800-011	VERSIÓN 1	PÁGINA	
CÓDIGO FSI-800-011	VERSIÓN 1			
PÁGINA				
FECHA 2 SEPTIEMBRE 2025				

CONTRATO DE OBRA No.

AMC - 022 - 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO HAI

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA DE INICIO:

19 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO INICIAL:

DOS MESES Y MEDIO

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

3 DE NOVIEMBRE 2025

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 624.963.567,50

VALOR ACUMULADO:

\$ -

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

MC - 019 - 2025

INTERVENTOR: INGENORTE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 62.497.356,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 62.497.356,80
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 124.994.713,60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	8	2025	5	3	2026
19	8	2025	3	11	2028
3	11	2025	6	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

B - 100064629

Certificado de modificación o anexo No.:

2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

26 DE AGOSTO 2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	8	2025	3	11	2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

B - 100064629

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:


SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

26 DE AGOSTO 2025

 	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-011		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	2	SEPTIEMBRE	2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____		MODIFICACIÓN No.: _____		SUSPENSIÓN No.: _____	
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
			Desde	Hasta	
Cumplimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					
Estabilidad y/o Calidad de Obra					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____					
Certificado de modificación o anexo No.: _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora: _____					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.: 1		SUSPENSIÓN No.: _____	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
			Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ OTRAS PÓLIZAS No. _____					
Certificado de modificación o anexo No. _____ (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora: _____					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____					
OBSERVACIONES:					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
					
Firma					
Nombre: OSCAR LUIS HERAZO SEBA					
Director de Interventoría					

 	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO	FSI-800-011																																												
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN	1																																												
			PÁGINA																																													
			FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025																																										
CONTRATO DE OBRA No. <u>AMC - 022 - 2024</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HAI</u>																																																
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																																
FECHA DE INICIO: <u>19 DE AGOSTO DE 2025</u>																																																
PLAZO INICIAL: <u>DOS MESES Y MEDIO</u>																																																
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>3 DE NOVIEMBRE 2025</u> (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																
VALOR INICIAL: \$ <u>624.963.567,50</u>																																																
VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u> (Incluye adiciones)																																																
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: <u>N/A</u>																																																
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: <u>N/A</u>																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>MC - 019 - 2025</u> INTERVENTOR: <u>INGENORTE S.A.S</u>																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 62.497.356,80</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>5</td><td>3</td><td>2026</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>10%</td><td>\$ 62.497.356,80</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>10%</td><td>\$ 124.994.713,60</td><td>3</td><td>11</td><td>2025</td><td>6</td><td>5</td><td>2026</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	5	3	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	3	11	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 124.994.713,60	3	11	2025	6	5	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																													
			Desde			Hasta																																										
Cumplimiento	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	5	3	2026																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	3	11	2028																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 124.994.713,60	3	11	2025	6	5	2026																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>B - 100064629</u>																																																
Certificado de modificación o anexo No.: <u>2</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS MUNDIAL</u>																																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: <u>26 DE AGOSTO 2025</u>																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 284.700.000,00</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00	19	8	2025	3	11	2025																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																													
			Desde			Hasta																																										
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00	19	8	2025	3	11	2025																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>B - 100064629</u> OTRAS PÓLIZAS No. <u></u>																																																
Certificado de modificación o anexo No.: <u>2</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS MUNDIAL</u>																																																
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: <u>26 DE AGOSTO 2025</u>																																																

 Gobernación de Sucre	 Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	FSI-800-011			
		SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
			FECHA	30	SEPTIEMBRE	2025	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
				Desde			Hasta
Cumplimiento							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones							
Estabilidad y/o Calidad de Obra							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.:							
Certificado de modificación o anexo No.:							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)							
Razón Social Compañía Aseguradora:							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
		1		1			
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
				Desde			Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.:							
OTRAS PÓLIZAS No.:							
Certificado de modificación o anexo No.:							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)							
Razón Social Compañía Aseguradora:							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:							
OBSERVACIONES:							
NOTAS:							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).							
							
Firma							
Nombre: OSCAR LUIS HERAZO SEBA							
Director de Interventoría							

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	FSI-800-011																																												
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	3	NOVIEMBRE	2025																																										
CONTRATO DE OBRA No. <u>AMC - 022 - 2024</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HAI</u>																																															
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE																																															
FECHA DE INICIO: <u>19 DE AGOSTO DE 2025</u>																																															
PLAZO INICIAL: <u>DOS MESES Y MEDIO</u>																																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>3 DE NOVIEMBRE 2025</u> (Incluye prórrogas y suspensiones)																																															
VALOR INICIAL: \$ <u>624.963.567,50</u>																																															
VALOR ACUMULADO: \$ <u>-</u> (Incluye adiciones)																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: <u>N/A</u>																																															
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: <u>N/A</u>																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>MC - 019 - 2025</u> INTERVENTOR: <u>INGENORTE S.A.S</u>																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 62.497.356,80</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>5</td><td>3</td><td>2026</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>10%</td><td>\$ 62.497.356,80</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>10%</td><td>\$ 124.994.713,60</td><td>3</td><td>11</td><td>2025</td><td>6</td><td>5</td><td>2026</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	5	3	2026	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	3	11	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 124.994.713,60	3	11	2025	6	5	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	5	3	2026																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 62.497.356,80	19	8	2025	3	11	2028																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 124.994.713,60	3	11	2025	6	5	2026																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>B - 100064629</u>																																															
Certificado de modificación o anexo No.: <u>3</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS MUNDIAL</u>																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: <u>18 DE OCTUBRE 2025</u>																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 284.700.000,00</td><td>19</td><td>8</td><td>2025</td><td>3</td><td>11</td><td>2025</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00	19	8	2025	3	11	2025																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 284.700.000,00	19	8	2025	3	11	2025																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>B - 100064629</u> OTRAS PÓLIZAS No. <u></u>																																															
Certificado de modificación o anexo No.: <u>3</u> (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS MUNDIAL</u>																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: <u>18 DE OCTUBRE 2025</u>																																															

 Gobernación de Sucre	 Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	FSI-800-011			
		SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	VERSIÓN	1			
			PÁGINA				
			FECHA	3	NOVIEMBRE	2025	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
				Desde	Hasta		
Cumplimiento							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones							
Estabilidad y/o Calidad de Obra							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.:							
Certificado de modificación o anexo No.:							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)							
Razón Social Compañía Aseguradora:							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
		1		1			
Seguro		% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
				Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.:							
OTRAS PÓLIZAS No.:							
Certificado de modificación o anexo No.:							
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)							
Razón Social Compañía Aseguradora:							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:							
OBSERVACIONES:							
NOTAS:							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados.							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).							
							
Firma							
Nombre: OSCAR LUIS HERAZO SEBA							
Director de Interventoría							



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100064629	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	22280416	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/06/2025	24:00 Horas Del	26/08/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901059331 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901488330 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO HAI)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza B-100064629 y endoso, 1 cuyo afianzado es: **CONSORCIO HAI** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE SUCRE / DEPARTAMENTO DE SUCRE**, expedida por la Compañía en 22/08/2025, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los 25 días del mes **AGOSTO** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	B-100064629	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22280420	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	22/08/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/08/2025	24:00 Horas Del	03/11/2028	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901059331 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901488330 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO HAI)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

