



INFORME DE SUPERVISIÓN No 001

Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Fecha de Presentación: 10 de octubre del 2025

Fecha de corte: 19 de agosto de 2025 al 18 de septiembre de 2025

INTRODUCCIÓN:

El proyecto está definido como el **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, en este informe se describen las actividades realizadas, con el fin tener presente el desarrollo general del contrato, desde su inicio, tanto en sus aspectos técnicos, financieros, administrativos, jurídicos, social, seguridad salud en el trabajo y ambiental, el cual comprende la intervención de varios tramos de la red secundaria y terciaria.

El proyecto comprende la ejecución de los siguientes tramos:

1. TRAMO SAMPUES – SAN BENITO (49,5 Km)
2. TRAMO SAN JUAN DE BETULIA – ALBANIA (4,90 Km)
3. TRAMO COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA – SINCÉ (18,70 Km)
4. TRAMO LIMITES CON CORDOBA – SAN ANTONIO DE PALMITO (6.96 Km)
5. TRAMO PALMITO - FINCA SAN ANTONIO (5,60 Km)
6. TRAMO LA YEE – GUARANDA (11,10 Km)
7. TRAMO VIA CHINULITO - AGUACATE – CACIQUE (7,90 Km)
8. TRAMO VIA SINCÉ - GRANADA - BUENAVISTA (22,60 km)

El alcance contempla 304,02 hectáreas de rocería, 54,67 metros lineales de limpieza de cunetas y zanjas y limpieza de 209 obras de artes en diferentes tramos de vías.

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO:


**AMC-022-2024: EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**MC-019-2025: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE**



LOCALIZACIÓN:

La localización del proyecto del mantenimiento rutinario de la malla vial, se localiza en el departamento de Sucre, en los siguientes tramos de vías, TRAMO (1) SAMPUES – SAN BENITO, TRAMO (2) SAN JUAN DE BETULIA – ALBANIA, TRAMO (3) COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA – SINCÉ, TRAMO (4) LIMITES CON CORDOBA – SAN ANTONIO DE PALMITO, TRAMO (5) PALMITO - FINCA SAN ANTONIO, TRAMO (6) LA YEE – GUARANDA, TRAMO (7) VIA CHINULITO - AGUACATE – CACIQUE, TRAMO (8) VIA SINCÉ - GRANADA – BUENAVISTA.

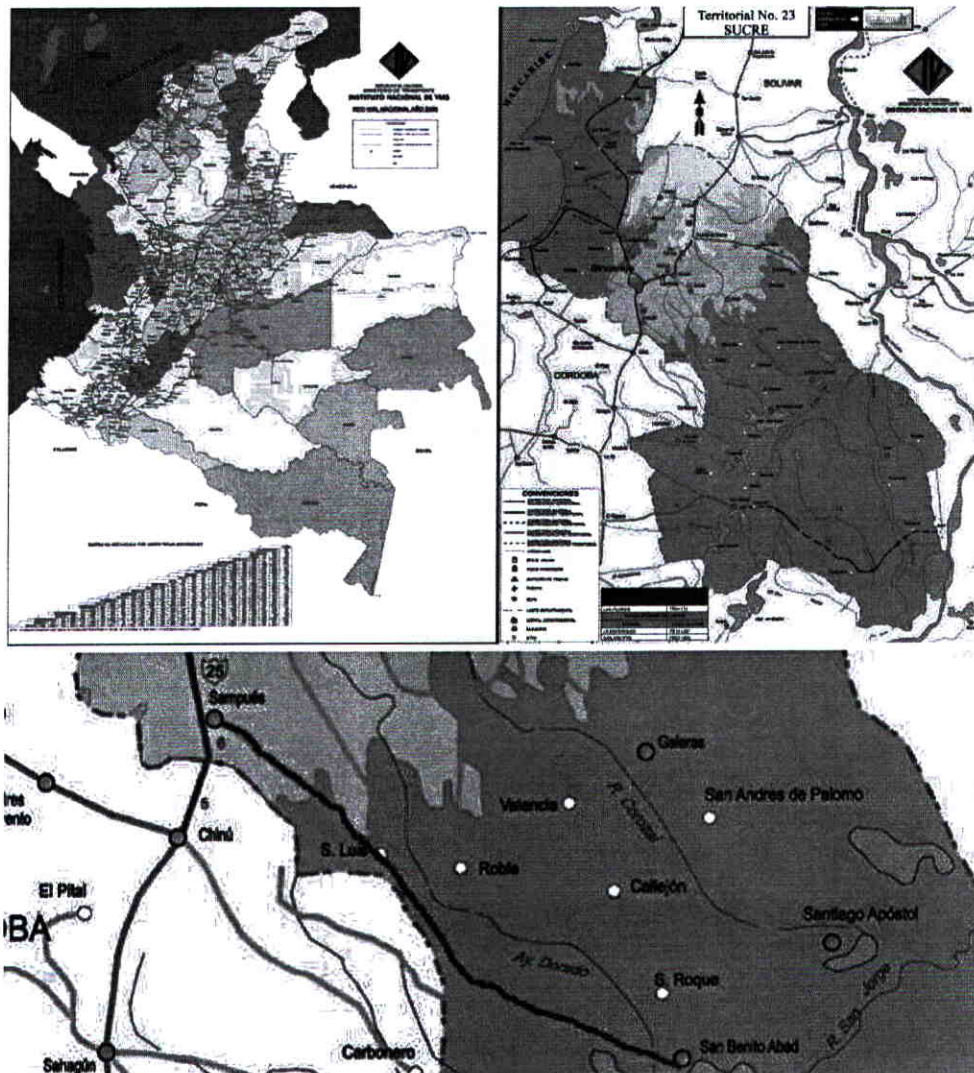

TRAMO (1) SAMPUES – SAN BENITO




Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

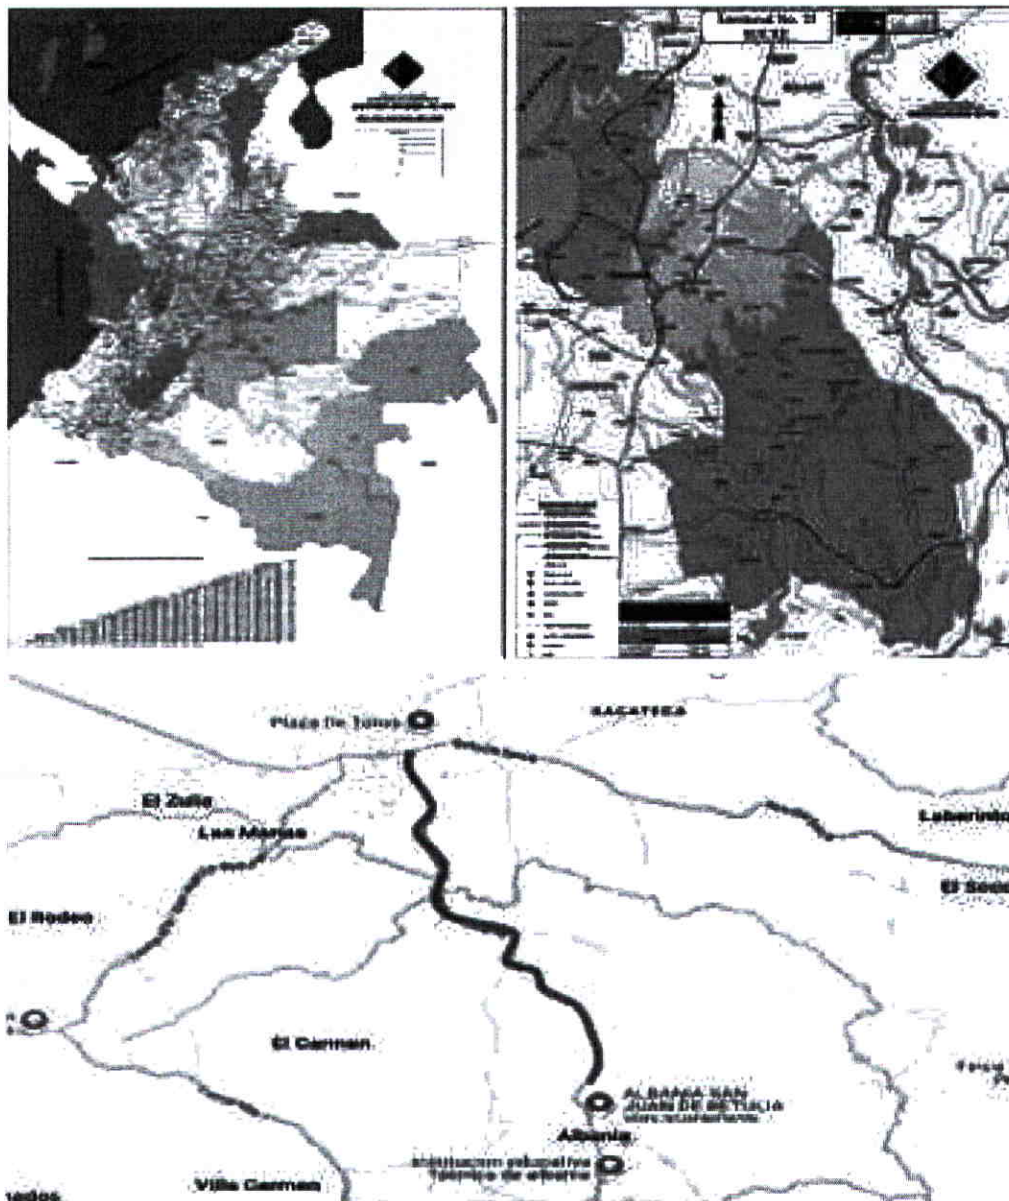

TRAMO (2) SAN JUAN DE BETULIA – ALBANIA






Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

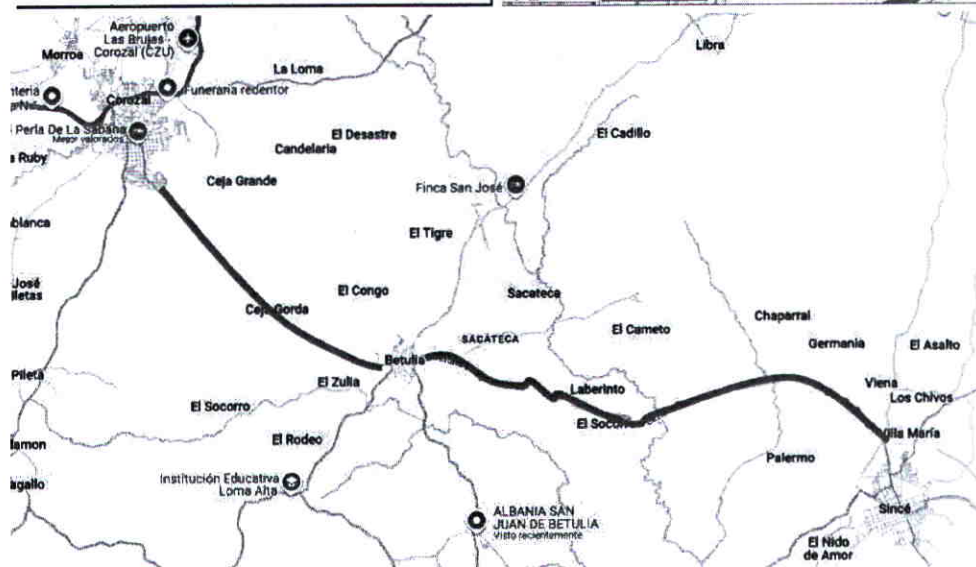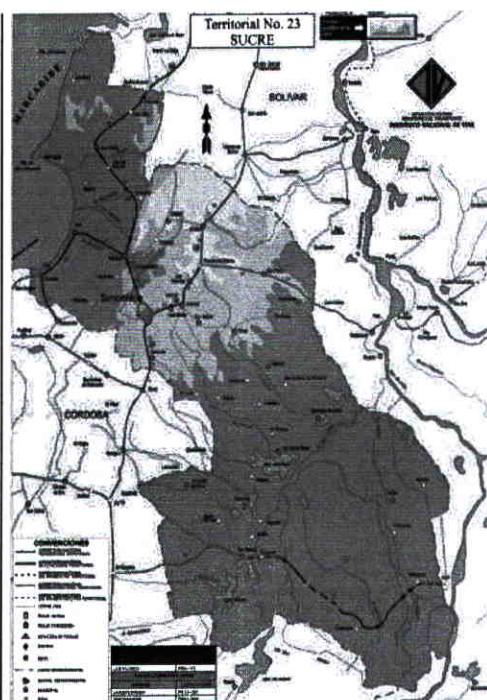

TRAMO (3) COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA – SINCÉ




Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

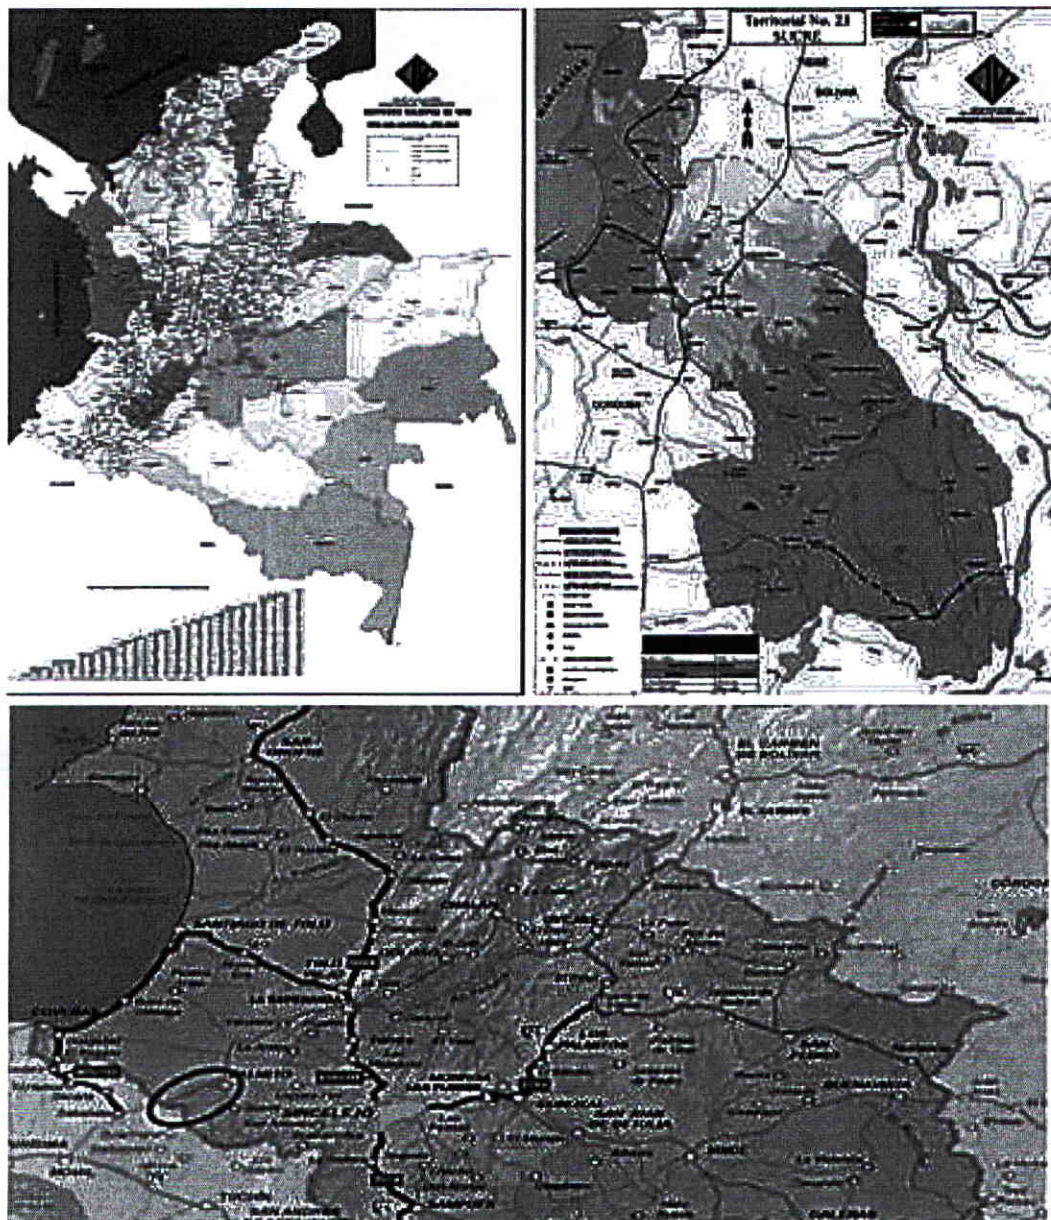

TRAMO (4) LIMITES CON CORDOBA – SAN ANTONIO DE PALMITO





Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

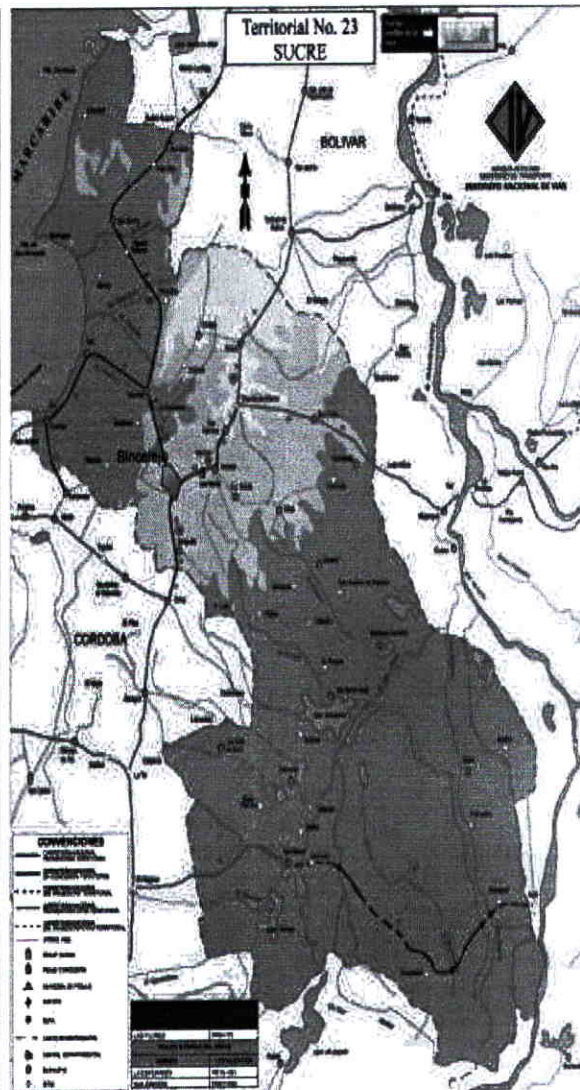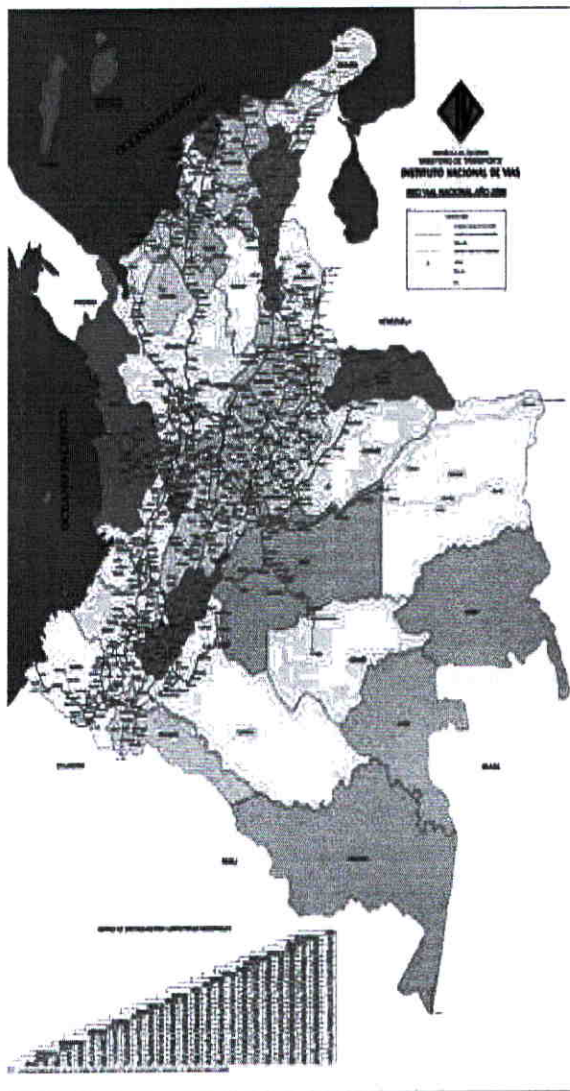

TRAMO (5) PALMITO - FINCA SAN ANTONIO, TRAMO




Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

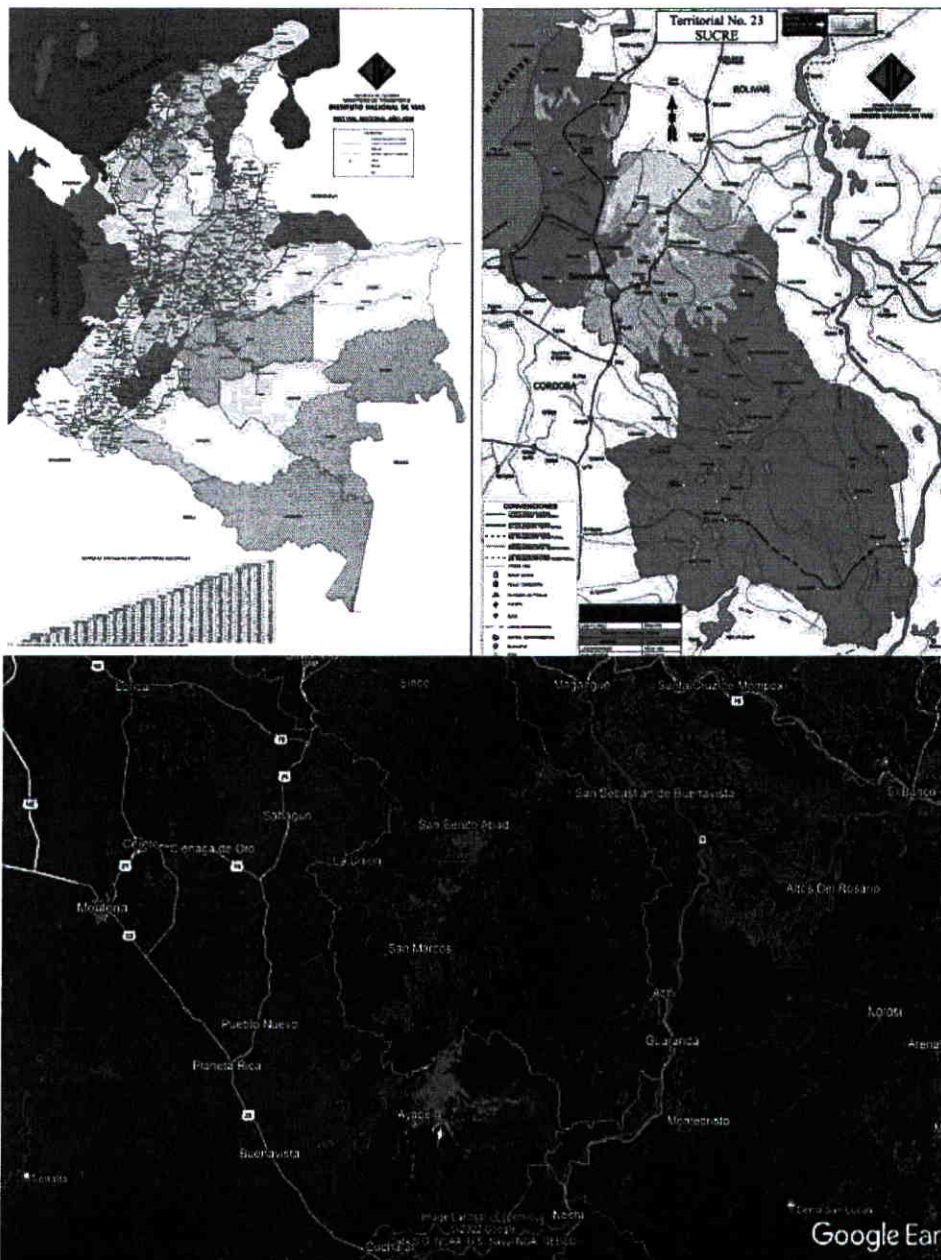

TRAMO (6) LA YEE – GUARANDA




Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

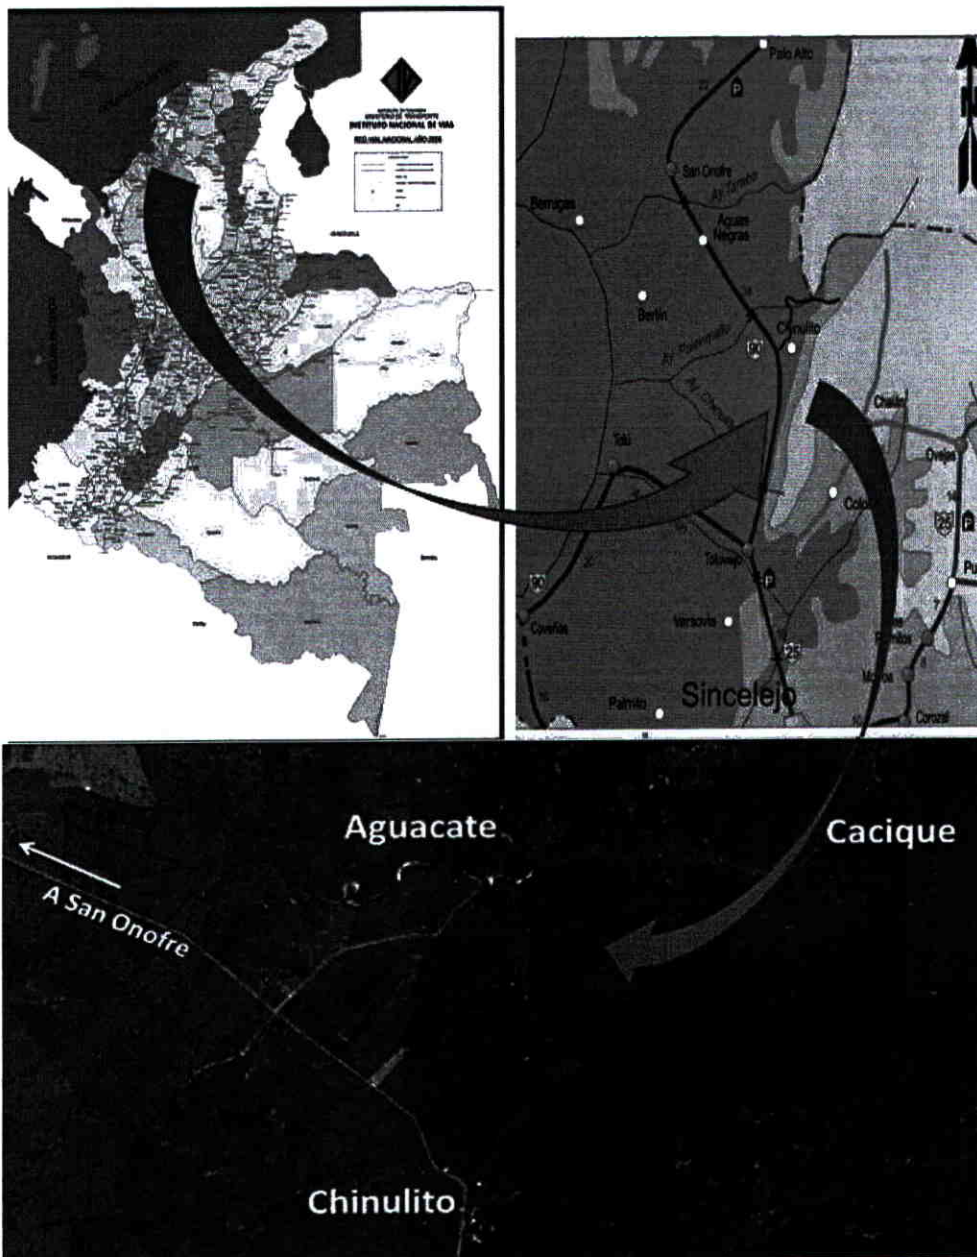

TRAMO (7) VIA CHINULITO - AGUACATE – CACIQUE




Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

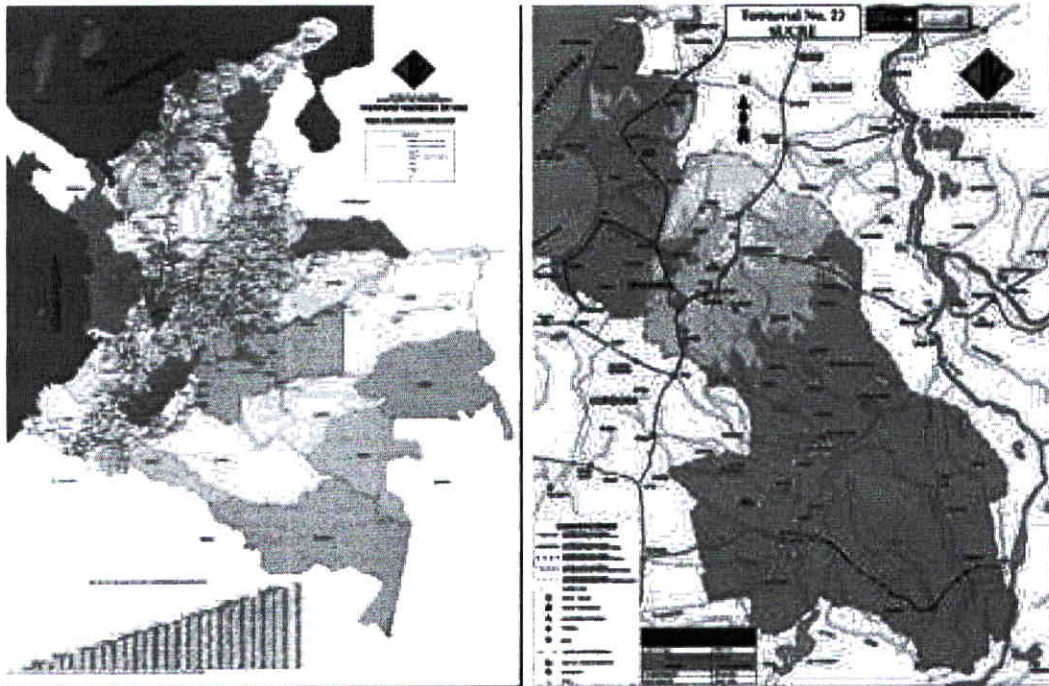

TRAMO (8) VIA SINCÉ - GRANADA – BUENAVISTA



Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584



Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1



www.sucre.gov.co
infraestructura@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DEL CONTRATO	AMC-022-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
PLAZO INICIAL:	2,5 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$624.963.567,50
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HAI
REP. LEGAL:	OSWALDO ENRIQUE PACHECO MORELO
CONTRATISTA INTERVENTORÍA: DE	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
META FISICA	TRAMO (1) SAMPUES – SAN BENITO (49,5 Km) TRAMO (2) SAN JUAN DE BETULIA – ALBANIA (4,90 Km) TRAMO (3) COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA – SINCÉ (18,70 Km) TRAMO (4) LIMITES CON CORDOBA – SAN ANTONIO DE PALMITO (6.96 Km) TRAMO (5) PALMITO - FINCA SAN ANTONIO (5,60 Km) TRAMO (6) LA YEE – GUARANDA (11,10 Km) TRAMO (7) VIA CHINULITO - AGUACATE – CACIQUE (7,90 Km) TRAMO (8) VIA SINCÉ - GRANADA - BUENAVISTA (22,60 km)
FECHA ORDEN DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	3 DE NOVIEMBRE DE 2035
ESTADO	EN EJECUCIÓN
% DE EJECUCION FISICA	36.33%

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DEL CONTRATO	MC-019-2025
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
PLAZO INICIAL:	2,5 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$55.892.215,66
CONTRATISTA INTERVENTORÍA: DE	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
REP. LEGAL:	OSCAR LUIS HERAZO SEBA
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
FECHA ORDEN DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	3 DE NOVIEMBRE DE 2035
ESTADO	EN EJECUCIÓN



FUNCIONARIOS QUE REALIZAN SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

A. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

A.1 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Recursos desembolsados a la fecha.

ACTAS	VALOR ACTA	PERIODO	OBSERVACIONES
ACTA PARCIAL N° 1	\$22.356.886,26	AGOSTO 19 A SEPTIEMBRE 18 DEL 2025	EN PROCESO DE PAGO

A.2 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Recursos desembolsados a la fecha.

ACTAS	VALOR ACTA	PERIODO	OBSERVACIONES
ACTA PARCIAL N° 1	\$230.639.475,00	AGOSTO 19 A SEPTIEMBRE 18 DEL 2025	EN PROCESO DE PAGO

B. RELACIÓN DE PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICION	POLIZA N° CUMPLIMIENTO	RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	22/08/2025	N° 100064629	Cumplimiento	62.497.356,80	19/08/2025	5/03/2026
			Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	62.497.356,80	19/08/2025	3/11/2028
			Estabilidad y calidad de la obra	124.994.713,60	3/11/2025	6/05/2026

C. CONCLUSIONES

A la fecha, las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra No. AMC-022-2024, corresponden principalmente a los tramos intervenidos de vías.



TRAMO (1) SAMPUES - SAN BENITO VIA TERCIARIA, donde se ejecuta rocería con una cantidad de 57 Ha, lo que corresponde a un porcentaje del 38% de esta actividad, Se viene Realizando limpieza de obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) con una cantidad de 25, correspondiendo al 24%, y limpieza manual de cunetas, zanjas, descoles (incluye retiro), con una cantidad de 1500 ml, correspondiente a un 10% de avance.

TRAMO (3) COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA - SINCÉ, se ejecutó rocería con una cantidad de 37,4 Ha, lo que corresponde a un porcentaje del 100% de esta actividad, Se viene Realizando limpieza de obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) con una cantidad de 45, correspondiendo al 375%, se presentaron más obras de artes que las dispuestas en estado de colmatación, y limpieza manual de cunetas, zanjas, descoles (incluye retiro), con una cantidad de 4890 ml, correspondiente a un 87% de avance.

TRAMO (6) LA YEE - GUARANDA, Se ejecuto rocería con una cantidad de 22.2 Ha, lo que corresponde a un porcentaje del 100% de esta actividad, Se viene Realizando limpieza de obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) con una cantidad de 46, correspondiendo al 375%, se presentaron más obras de artes que las dispuestas en estado de colmatación y limpieza manual de cunetas, zanjas, descoles (incluye retiro), con una cantidad de 0 ml, correspondiente a un 0% de avance.

TRAMO (4) SAN ANTONIO DE PALMITO - LIMITES CON CORDOBA, se ejecutó rocería con una cantidad de 13,92 Ha, lo que corresponde a un porcentaje del 100% de esta actividad, Se viene Realizando limpieza de obras de arte menores y/o mayores (incluye retiro) con una cantidad de 13, correspondiendo al 87%, y limpieza manual de cunetas, zanjas, descoles (incluye retiro), con una cantidad de 1872 ml, correspondiente a un 80% de avance.

Durante el desarrollo de este periodo las actividades presentan un avance físico del 32,03%, contra un programado del 37,76%, indicando que hay un atraso en su ejecución del 5,73%, con la posibilidad de cumplir con los objetivos del desarrollo del proyecto de mantenimiento rutinario de la malla vial del departamento de sucre.

Atentamente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Zamara García Martínez	Profesional de Apoyo – Secretaría de Infraestructura	
Elaboró:	Aleth Sofia Salcedo Barón	Asesor externo Secretaría de Infraestructura	
Revisó:	Jorge Domínguez Cabeza	Profesional Universitario-Secretaría de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

