

4/8

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	31/01/2026	SECO	CUMPLE
DIA:	sábado	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	CUMPLE
			SI
			NO
SEÑALIZACIÓN		ESCOMBROS	CUMPLE
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017144470	Alvaro Lombardi	71775731
William Chavarria	98681775		
Anyelo Gomez	1152187124		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
Cr 66B x calle 30	N	NS	94
			196
			219
			171
Cr 66B x calle 30	SC	NS	94
			196
			219
			171
Cr 66B x calle 30	S	SN	94
			196
			219
Cr 65 x calle 25	W	WE	94
			196
			219
			171
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, Armas, Slinga, H. Mueya			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

518

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	31-01-2026	SECO	CUMPLE
DIA:	31-01-2026	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	CUMPLE
		SEÑALIZACIÓN	SI
		ESCOMBROS	NO
			CUMPLE
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017144470	Alvaro Londono	7177737
Willian Chavarria	98681775		
Anyelo Gomez	1152187124		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Cr 65 x calle 25	F	FW	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 388
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
Cr 70 x calle 24	N	NS	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 389
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
Cr 70 x calle 24	W	WE	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 390
Cr 70 x calle 24	S	SN	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 391
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, Slinga, Arnes, H. Menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

618

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED. SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	31/01/2026	SECO	CUMPLE
DIA:	sábado	LLUVIOSO	SI ☒
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
		SI ☒	SI ☒
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017144470	Alvaro Londo	31335731
William Chavarria	98681775		
Anyelo Gomez	1152187124		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Cr 70 x calle 19	S	SN	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 416
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
Cr 70 x calle 14	N	NS	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 417
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
Cr 70 x calle 14	S	SN	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 418
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
Cr 70 x calle 9	N	NS	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 419
			Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. 1 unidad
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma, Armo, Slinga / H. Muro			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

7/8

		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1		ED: SEP 2025	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	31/01/2026	SECO		CUMPLE	
DÍA:	Sábado	LLUVIOSO		SI ☒	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		NO ☐	
TIEMPO		UNIFORMES		SEÑALIZACIÓN	
				SI ☒	
				NO ☐	
				ESCOMBROS	
				SI ☒	
				NO ☐	
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Diaz	1017144470			Alvaro Londoño	2177577
Willian Chavarria	98681775				
Anyelo Gomez	1152187124				
TRABAJOS REALIZADOS					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO		HORA INICIO	HORA FINAL
Cr 70 x calle 9	S	SN	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad		
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad		
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 420		
Cr 52 x calle 9 SUR	W	WE	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad		
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad		
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 421		
Av 80 x calle 50	E	EW	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad		
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad		
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 422		
Av 80 x calle 50	E	SN	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad		
			Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad		
			Instalación de lámpara vehicular a ménsula. 1 unidades stiker numero 423		
EQUIPO EN OBRA:					
Plataforma, Arme, Slinga, H. Mano					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA		
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ		
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Jenny Patricia Barreneche		
FIRMA:	FIRMA:		FIRMA:		
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría		



1/3


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	31/01/2026	SECO	CUMPLE
DIA:	Sábado	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
UNIFORMES		SEÑALIZACIÓN	SI
			NO
ESCOMBROS			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Díaz	1017144470		
William Chavarria	98681775		
Anyelo Gomez	1152187124		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
Cr 53 x calle 70			94
			195
			218
EQUIPO EN OBRA:			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

2/3		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
UNION TEMPORAL ET MEDELLIN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
CONSORCIO IET FABOL MED 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	31-01-2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DÍA:	sábado		LLUVIOSO		SI	SI	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO	NO	SI
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
Carlos Alberto Díaz	1017144470						
William Chavarria	98681775						
Anyelo Gomez	1152187124						
TRABAJOS REALIZADOS							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO		HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Cr 52 x calle 70			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 366			218	
Cr 52 x calle 70			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 367			218	
Cr 52 x calle 70			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 368			218	
Cr 52 x calle 68			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 369			218	
Cr 52 x calle 68			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 370			218	
Cr 52 x calle 68			Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad			94	
			Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad			195	
			Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 371			218	
EQUIPO EN OBRA:							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA		FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

313

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	31/01/2026	SECO	CUMPLE
DIA:	Sábado	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
TIEMPO		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
			CUMPLE
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Alberto Díaz	1017144470		
William Chavarria	98681775		
Anyelo Gomez	1152187124		
DIRECCIÓN			
COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	ITEM
Cr 52 x calle 68		Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad	94
		Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad	195
		Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 372	218
Cr 52 x calle 64		Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad	94
		Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad	195
		Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 373	218
Cr 52 x calle 64		Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos . 1 unidad	94
		Retiro de lámpara vehicular a poste . Incluye transporte a su disposición final. 1 unidad	195
		Instalación de lámpara vehicular a poste. 1 unidades stiker numero 374	218
EQUIPO EN OBRA:			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>Queny Patricia Barreneche</i>	FIRMA: <i>Carlos Alberto Díaz</i>	FIRMA:	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001													
 CONSORCIO RT, E, A, T, M, D, 2025		 RIV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1													
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025													
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																					
FECHA: 9 Enero 2026		DÍA: viernes		VEHÍCULOS: WL2 049		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES		CUMPLE SI ☒ NO		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE SI ☒ NO		ESCOMBROS		CUMPLE SI ☒ NO	
PERSONAL EN OBRA																					
CONTRATISTA										INTERVENTORÍA											
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA			
Wils Fernando Guerrero		1.070.809.034										Alvaro L. de		71777731							
Emis Torres		1.028.020.497																			
Yan Carlos Usuga		1.214.729.941																			
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADO		HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM									
Carretera S2		E		S-N		Suministro e instalación de 1220 metros de cable UTP		9:00				110									
Entre calles						Construcción de empalme en cable UTP 04und.						94									
9 Sur y 2 Sur						Suministro e instalación de placa de identificación de semáforo. 10 unidades.				20:00		98									
EQUIPO EN OBRA:										Revisión A. Mesa.											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA																					
VERIFICACIÓN																					
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA																
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ																
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 																
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría																

	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	9 Enero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI	SI	SI	SI	SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO	NO	NO	NO	NO

PERSONAL EN OBRA


CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Elberto Cardozo	13.461.111			Alonso Londo	71775771
Leon Oquendo	15.435.477				
Jose Perez	PPT 5.240.599				
Leonar Riera	PPT 4.350.715				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 41x	N-W	N-S	Construcción de base de Contralobos Local.	8:10		33
Calle 58			Demolicion de tapa de inspeccion de 50x50			1
			limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
	N-W	E-W	demolicion de tapa de cana de inspeccion de 50x50			1
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50			187
			limpieza de cana de inspeccion 02 unidades.			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo 02 unidades.		16:00	13

EQUIPO EN OBRA: Planta, Derivados, H. Mina

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN CONSORCIO INT. EARC. MED 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---


FECHA:	9 Enero 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897					NO		NO		NO



PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Arantes	71.480.695			Alvaro Lugo	7177577
Luis Fernando Usuga	71.708.197			Elvis Bernal	4306857
Alex Carías	1.036.651.089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 52 x calle 14	Separador Central	S-N	Revisión de Grupo Vehicular que se encuentra apagado, el cable de control se encuentra en mal estado se debe cambiar.	9:00		
			Nota: las cajas se encuentran concretadas se deben cambiar los herrajes para poder cambiar el cable			261
				12:00		
* Carrera 76 x Calle 20A	S-W	E-W	Retiro de semáforo peatonal.	12:20		172
			" de semáforo ciclista.			172
			" de 10 metros de cable de control.			173
			" de poste de enterramiento.			168
			instalación de poste de enterramiento nuevo.			206
			Reinstalación de semáforo peatonal.			208
			" de semáforo ciclista.			208
" de 10 metros de cable de control			215			
			construcción de 2 empalmes eléctricos.	14:00		94

EQUIPO EN OBRA:	Herramienta Man, Escalera
-----------------	---------------------------

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	
--------------------------------	--

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	9/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	VIERNES					SI		SI			
VEHÍCULOS:						NO		NO			
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470				Alonso Buitrago		71773327			
JAIME CIFUENTES		71480675									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CARRERA 43 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,77 OHMIOS						248		
CARRERA 43 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.FUERA DE MEDIDA						248		
CARRERA 42 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.0,38 OHMIOS						248		
CARRERA 36 X CALLE 54			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.14,71 OHMIOS						248		
CARRERA 38 Y 39 X CALLE 51,52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.11,35 OHMIOS						248		
CARRERA 45 X CALLE 55 Y 56			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 7,38 OHMIOS						248		
CARRERA 43 X CALLE 55 Y 56			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.8,44 OHMIOS						248		
CARRERA 40 X CALLE 55			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.13,18 OHMIOS						248		
CARRERA 39 X CALLE 55 Y 56			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.10,67 OHMIOS						248		
CARRERA 39 X CALLE 58			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 26,31 OHMIOS						248		
CARRERA 37 X CALLE 58			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.16,91 OHMIOS						248		
CARRERA 41 X CALLE 57 Y 58			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.8,15 OHMIOS						248		
CARRERA 43 Y 45 X CALLE 58			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.24,19 OHMIOS						248		
CARRERA 43 Y 45 X CALLE 57			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.FUERA DE MEDIDA						248		
CARRERA 47 Y 48 X CALLE 57			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.34,3 OHMIOS						248		
CARRERA 46 X CALLE 53			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.2205 OHMIOS						248		
CARRERA 43 X CALLE 54 Y 55			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,78 OHMIOS						248		
CARRERA 45 X CALLE 53 Y 54			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.1,89 OHMIOS						248		
EQUIPO EN OBRA:											
Teloneros, A. Muro.											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría						

 <p>Alcaldía de Medellín Secretaría de Planeación</p>  <p>UNIÓN TEMPORAL SIT MEDÉLLIN</p>  <p>CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025</p>  <p>P+V</p>	<p align="center">PLAN DE CALIDAD</p>		<p>SIT-SGC-F-001</p>
	<p align="center">REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO</p> <p align="center">Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025</p>		<p>VERSIÓN 1</p>
			<p>ED: SEP 2025</p>

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	9/01/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	VIERNES		LLUVIOSO			SI		SI		
VEHICULOS:			DURACIÓN			NO		NO		

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
CARLOS ALBERTO DIAZ	1017144470			Alfonso Llanos	9777731
JAIME CIFUENTES	71480675				

[illegible]

EQUIPO EN OBRA:

TELEFONIA, H. MENS


VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Openy Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONSORCIO INT. PAROL MED 2025		 UNION TEMPORAL BY MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 10 Enero		DÍA: Sábado		TIEMPO		SECO		LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		UNIFORMES		SEÑALIZACIÓN	
						CUMPLE		CUMPLE	
						SI		SI	
						NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
Eberto Cardenas		13.461.111						Alm. J. J. J.	
Leon Aguendo		15.495.477							
Jose Perez		PPT 5.240.599							
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO	
Calle 44x		S-W		W-E		Retiro de herraje metalico con tapa de concreto		8:00	
Calle 29						de 50x50 02 unidades.			
						Limpieza de caja de inspeccion 02 unidades.			
						instalacion de herraje de seguridad nuevo			
						02 unidades de 50x50			
								13	
		separacion		W-E		Retiro de herraje metalico con tapa de concreto		18:00	
						de 50x50 02 unidades.			
						Limpieza de caja de inspeccion 02 unidades.			
						instalacion de herraje de seguridad nuevo de			
						50x50 02 unidades.			
								54	
								13	
		S-E		W-E		Retiro de herraje metalico con tapa de concreto		18:00	
						de 50x50			
						Limpieza de caja de inspeccion			
						instalacion de herraje de seguridad nuevo			
						de 50x50			
								54	
								13	
EQUIPO EN OBRA:									
Revolvidor, P. Electricidad, H. Mec.									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: DÍA: 10 ENERO VEHÍCULOS: Sabado	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE SI ☒ NO ☐	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI ☒ NO ☐
ESCOMBROS SI ☒ NO ☐			
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cidricco	13.461.111	Alvaro Lumbi	9177733
Leon Oquendo	15.485.477		
Jose Perez	1475240599		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
Carretera 44x Calle 29	Señalización	W-E	187-
			54-
			13-
		N-E	187-
			54-
			13-
		N-W	187-
			54-
			13-
EQUIPO EN OBRA:			
Roberto, P. Latorre, H. Muro			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Jenny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 				PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
CONSORCIO INT. ECOL. MED. 2025		UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
		RNV		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	10 Enero	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sábado					SI		SI		SI
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Eberto Cuchiarzo		13.461.1M				Alonso Lugo		71775737		
Leon Oquendo		15.495.477								
Jose Perez		PPT 5.240.549								
TRABAJOS REALIZADOS										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Calle 436 x Calle 29.	N	E-W	Retiro de heliche metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades. limpieza de caja de inspeccion 02 unidades. Instalacion de heliche de seguridad nuevo de 50x50 02 unidades.					10:00	187 54 13	
EQUIPO EN OBRA:										
Diosdado, P. Elefraz, A. Muz										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Quany Patricia Barreneche			
FIRMA			FIRMA				FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría			

  CONSORCIO INT. FAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
-----------------------------	---

FECHA: 11 Enero DIA: Domingo VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE SI ☒ NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI ☒ NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI ☒ NO
---	--------	------------------------------	-----------	--	--------------	--	-----------	--

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA		NOMBRE	CÉDULA	
Eberto Cordero	13.461.111		Alina Lopez	7177533	
Leon Ayendo	15.495.477		Day Baul	4306850	
Jose Perez	PPT 5.240.599				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 436 x calle 29	N-E	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50	9:00		187
			limpieza de cana inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
Separador	W-E	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50			187
			limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
S-W	W-E	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades.			187
			limpieza de cana de inspeccion 2 unidades.			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50 02 unidades.			13

EQUIPO EN OBRA:
Revólver, P. Elctronica, A. Mors.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Dayn Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	11 Enero	TIEMPO	SECO
DÍA:	Domingo		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
			SI
			NO
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadizco	13.461.111	Alvaro Londo	21775777
Leon Oquendo	15.495.477		
Jose Perez	PPT 5.240.599		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carretera 436	S-E	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto
x calle 29			de 50x50 02 unidades
			limpieza de cana de inspeccion 02 unidades.
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de
			50x50 02 unidades.
	S-E	E-W	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto
			de 50x50
			limpieza de cana de inspeccion
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de
			50x50
Carretera 39 x	N-W	W-E	Remolicion de tapa de cana de inspeccion de
calle 58			50x50 02 unidades.
			limpieza de cana de inspeccion 02 unidades.
			instalacion de herraje de seguridad nuevo
			de 50x50 02 unidades.
EQUIPO EN OBRA:			
Derechos, P. Chetrim, A. Muro			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MED 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1	
				ED: SEP 2025	

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
---	--	--	--	--	--

FECHA:	11 ENERO	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA		NOMBRE	CÉDULA	
Elberto Cachoza	13.461.1M				
Leon Oquendo	15.485.477				
Jose Perez.	PPT 5240.509				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carretera 39x	S-W	W-E	Demolicion de tapa de cana de inspeccion de 50x50			1
calle 58			Limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
	S-E	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50			187
			Limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50.			13
	N-E	S-N	Demolicion de tapa de cana de inspeccion de 50x50			1
			Limpieza de cana de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50		14:00	13

EQUIPO EN OBRA: Plantas Electricas, Diodos, H.Mercurio	
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Celeny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN GOBIERNO MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL / APOYO MED 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---


FECHA:	11.01.2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	domingo		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA		NOMBRE	CÉDULA	
DAIME CIFUENTES	71480675		Alvaro Lulu	7177571	
CAMILA RESTrepo	71.295.492				
MIGUEL ANGEL	1013.229.962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cra 46x47	OC	OCOR	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236
cra 46x47	OR	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236
cra 46x48	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236
cra 46x48	OR	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236
cra 46x48	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236
cra 46x46	OR	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			229-230 235-234 231-236

EQUIPO EN OBRA:	Plataformas, H. Muro
-----------------	----------------------

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	
--------------------------------	--

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Oney Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	11.01.2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	domingo		LLUVIOSO		SI		SI		SI		
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO		
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORIA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Jaime Cifuentes		71480675-				Alvaro Lugo		31775701			
Camilo Restrepo		71.295.492									
Miguel Angel		1.013.229.962									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
cra 46x52	OC	N.S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
cra 46x52	OR	S.N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
cra 46x52	OR	OS-OC	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
cra 46x50	OC	N.S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
cra 46x50	OC	S.N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
cra 46x47	OC	NOS	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula 1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco						229-230		
									235-234		
									231-236		
EQUIPO EN OBRA:											
Plataforma, H. Mano											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORIA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Gueny Patricia Barreneche					
FIRMA:		FIRMA:				FIRMA:					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoria					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 12-01-2026	SECO	CUMPLE	CUMPLE
DÍA: 10/15	LLUVIOSO	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:	DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SI
		NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JAIIME CIFUENTES	71480675	Alm. L. L. L.	71777777
camilo restrepo	71.205.492		
miguel angel	1.019.229.962		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
AV BOLIVARIANA	OS	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
X circular 1			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
AV BOLIVARIANA	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
X UCCENTIO NORTE			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
AV BOLIVARIANA	OS	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
UCCENTIO NORTE			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
AV BOLIVARIANA	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
UCCENTIO SUR			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 ciclista 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
AV BOLIVARIANA	OS	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
UCCENTIO SUR			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
CSA 65X38	OC	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula
			1 semaforo vehicular 2 semaforo peatonales 1 disco
			229-230
			235-234
			231-236
EQUIPO EN OBRA:			
Plataforma H. Muro			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Ceny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria	

  <p>UNION TEMPORAL SIT-MED-EL-UN</p> <p>CONSEJO INTERMUNICIPAL DE TRÁNSITO</p>	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	12-01-2026	SECO		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA:	lunes	LLUVIOSO		SI	✓	SEÑALIZACIÓN	SI	✓	ESCOMBROS
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		NO			NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
------------------	--	--	--	--	--



CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA		NOMBRE	CÉDULA	
Jaime CIPUCENTES	71480675		Alonso Londo	7175770	
Rafael RESTrepo	71295492				
Miguel ANGEL	7098229962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV Bolivariana	OC	S-N	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
X 65			1 semaforo vehicular 1 semaforo peatonal 1 disco			235-234
						231-236
AV Bolivariana	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
X 65			1 semaforo vehicular 1 disco			235-234
						236
AV Bolivariana						
X 65	N-O	O-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
			1 semaforo vehicular 1 disco			234-236
						235
AV Bolivariana						
X 65	S-O	O-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
			1 semaforo vehicular 1 disco			234-236
						235
AV Bolivariana	OC	N-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
X Circular 1			1 semaforo vehicular 1 disco			235-234
						236
AV Bolivariana	OC	O-S	lavado de 1 manzula completa 1 semaforo de manzula			229-230
X Circular 1			1 semaforo vehicular 1 disco 1 semaforo peatonal			235-234
						236-231

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

Photofix, L. Muna

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	13.01.2028	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Martes		LLUVIOSO		SI	SI	SI	SI	
VEHÍCULOS:	MTN 507		DURACIÓN		NO	NO	NO	NO	
			3 horas						
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791906	Jeniffer Altamiranda	165292270	Alonso Londoño	31777737				
William Echavarría	98685775								
Luis Quijano	91452701								
TRABAJOS REALIZADOS									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
* Carrera 27			Reparación de acometida en Falla			08:00		94	
Calle 10			construcción de Empalme a poste Energético						
			Se cambia Punto de conexión por línea suspendida						
* Carrera 30			Reparación de acometida en Falla apagada					94	
Calle 10			construcción de Empalme a poste Energético						
			Se cambia Punto de conexión por línea suspendida				12:30		
* Av 80			Revisión de acometida en catas de			1:30			
Calle 30A			paso para cambio de punto de						
			conexión pendiente cambio				4:30 pm	261	
			pendiente cable en cambio de Tupon						
			60x60 en mal estado.						
EQUIPO EN OBRA:									
Escoba H. Muro									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PERÚ CONTRATO Nº 4600105595 DE 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1
			ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	13/11/2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Montes		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHICULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Burbano	1984 966 785			Alvaro Luján	7172731
Juan Roa	1000 537 976				
Jose Andrade	77-222 857				

[illegible]



EQUIPO EN OBRA:

Resub. P. Electronics H. Man

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA: DÍA: VEHÍCULOS:	13/07/26 MARTES	SECO LLUVIOSO DURACIÓN				
TIEMPO	X K	CUMPLE SI NO				
UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO				
ESCOMBROS	SI NO	CUMPLE SI NO				
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Carlos Gonzalez	1049894058	Alvaro Londoño	71775737			
Felipe Galeano	1039597832					
Jhoselyn Ramirez	1015186405					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C152-C113	W	N-S	Retiro de marco y tapa de 50 x 50. Suministro e instalación de Herraje Apolo.	10:40		187
			Suministro e instalación de refuerzo en varilla 3/8 en total 4 unidades de 40 cm cada una.			13
	Corril Central	S-N	Retiro de marco y tapa de 50 x 50. Suministro e instalación de herraje Apolo.			187
			Suministro e instalación de refuerzo en Varilla 3/8 en total 4 unidades de 40 cm cada una		16:00	13
EQUIPO EN OBRA:						
Desoldado, P. El Alcazar, H. Moscoso						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Geny Patricia Barreneche				
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]				
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría				

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	13-01-2026	TIEMPO	SECO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIA:	Marzo		LLUVIOSO	X	SI	SI	SI
VEHÍCULOS:	LKN 741		DURACIÓN	3 horas	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
Cesar Senter	1038806300			Alvaro Irujo	7177577		
Santiago Mesa	1000533792						
Miguel Wilcys	1018229762						
Ernie Torres	1028030487						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL
CR 47 CL 54			Al Negro al sitio de trabajo están 11 personas y personal de EPM están programados para la apertura de carriles de energía pero no llegaron. Se reprograman actividades			8-00	10-00
CR 25 CL 5 Sur			Suministro e instalación de 470m de cable fibra óptica ordenada de 24 hilos consecutivos (1543-1073)			11-50	Pendiente
CR 29 ACL 5 Sur			Suministro e instalación de 14 placas de identificación de cables			16-50	
EQUIPO EN OBRA:							
Reson, H. Muro							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA					
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 					
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría					

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONSORCIO INE FABOL MED 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA: 13-01-2025 DIA: Martes VEHÍCULOS: WL2049	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES SI ☒ NO ☐	CUMPLE SI ☒ NO ☐	SEÑALIZACIÓN SI ☒ NO ☐	ESCOMBROS SI ☒ NO ☐
---	--	--	---	---	--

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Daima Cifuentes	71480675			Alvaro Lulu	71777731
Alex Colinas	71708197				
Luis Fernando	11036651089				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 64	Separa	e-w	Se enderezaron un semáforo vehicular	15:20		258
x cl 67			Se enderezaron dos semáforos			258
carabineros			peatonales			
glorieta						
interior						
	Separa	s-n	Se enderezaron cuatro semáforos			258
			peatonales			
	sur	s-n	Se enderezaron un semáforo peatonal			258
			Se enderezaron un semáforo ciclista		16:00	258
			Nota: se encuentran 3 condeletas			
			reventadas			

EQUIPO EN OBRA:

Echeno, H. Mayor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango FIRMA: 	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz FIRMA: 	NOMBRE: Guen Patricia Barreneche FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
CONSORCIO INT. PAROJ. MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		13 de Enero		SECO		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA:		Martes		LLUVIOSO		SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Eberto Cardozo		13.461.111		Leonar Riera		PPT 4.350.715		Alma Lina		9177577	
Jose Perez		PPT 5.240.599									
Leon Acendo		15.435.477									
Jorge Rodriguez		PPT 1.137.342									
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS		HORA INICIO		HORA FINAL	
Calle 25 x		S-W		S-N		Construcción de canalización en zona verde con		12:00			
Calle 5 Sur						2 tubos PVC 2" 2,70 metros.				25	
TV 50 x Cl 5 Sur		S-E		S-N		Rebio de herraje metálico de seguridad soldado				187	
						limpieza de arq de inspeccion				54	
						instalacion de herraje de seguridad nuevo de				13	
						50x50		14:40			
EQUIPO EN OBRA:											
Deslizador, P. Electricos, A. Muro											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche							
FIRMA		FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

 	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	19/1/2025	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO



PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa				Alvaro Lugo	71775771
José Andrés					
Simón Vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* C-52 x C-1100	W	NS	Se retira disco direccional (↑)	8:00		179
			Se instala disco direccional (↑)			83
			Se retira contraste			199
	E	SN	Se instala contraste			199
			Se ajusta semáforo peatonal a manutela		9:10	260
* C-52 x C-182	W	NS	Se instala disco direccional (↑)	9:30	9:50	83
* C-52 x C-159	E	NS	Se retira disco direccional (↑)	10:00		179
			Se instala disco direccional (↑)			83
			Se retira contraste			199
	EW		Se retira 2 contrastes		10:30	199
* C-52 x C-158		NS	Se retira 2 contrastes	10:35		199
		SN	Se retira 2 contrastes			199
	EW		Se retira 1 contraste			199
	WE		Se retira 2 contrastes		11:05	199

EQUIPO EN OBRA:	Equipo H. Muro
-----------------	----------------

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Guayn Patricia Barreneche
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105553 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	19 de junio	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles		LLUVIOSO		SI	SI	SI		
VEHÍCULOS:	MIN 502		DURACIÓN		NO	NO	NO		
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
William Chavarría	98681775			Alfonso Londo	377753				
Juan José Roa Silva	1000537476								
Franklin Barbosa	16791906								
Luis Zambono	91452201								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 80 - CALLE 30A	SUR	E - W	Suministro e instalación de acometida aérea 2 x 10 (45 metros)			8 am	1 pm	80	
CARRERA 70 - CALLE 53	OCCIDENTE	N - S	Instalación de controlador nuevo			2 pm	3 pm	216	
Diagonal 74A - CIRCULAR 1			Instalación de controlador nuevo			3:30 pm	5 pm	216	
EQUIPO EN OBRA:									
Escaras A. Muro									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA	FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	14-01-2026	TIEMPO	SECO
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:	LKD061		DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
		ESCOMBROS	CUMPLE
		SI	✓
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002800113	Jose Cortes	1098727137
Martin Gonzales	1123409521	Jonathan Rendon	1036962270
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
Cra 65	separador	S-N	Lavado de poste recto
Av Bolivariana			Lavado de semaforo vehicular (con 4 aspectos)
			Lavado de disco direccional
Cra 65	separador	N-S	Lavado de poste recto
Av Bolivariana			Lavado de semaforo "peatonal" (ciclista)
Cra 65	separador	N-S	Lavado de poste recto
Av Bolivariana			Lavado de semaforo vehicular
			Observacion; no tiene disco direccional
Circular 1	separador	N-S	Lavado de poste recto
Av Bolivariana			Lavado de semaforo vehicular
			Lavado de semaforo ciclista
			Lavado de disco direccional
Circular 1	separador	N-S	Lavado de poste recto; Lavado de semaforo vehicular
Av Bolivariana			Lavado de disco direccional
EQUIPO EN OBRA:			
Escalera, Arnes, Estinga			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
Se verifica señalización, EPP.			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Qheny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

[illegible]

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	14/07/26	TIEMPO	SECO	K	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO			SI		SI		NO
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA					
Carlos Gonzalez	1049894058			José Carlos	1090227131					
José Ramírez	105186405			José Ramírez	1036902270					
Yerson Galeano	1039597832									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
C152-C111230	5	W-E	Retiro de marco y tapa de 50x50. Suministro e instalación de herraje Apolo. Suministro e instalación de 4 varillas 3/8- de 40 CM Cada una.			08:30		187- 13-		
	5	W-E	Retiro de marco y tapa de 50x50. Suministro e instalación de herraje Apolo. Suministro e instalación de 4 varillas 3/8- de 40 cm Cada una.					187- 13-		
	W	S-N	Retiro de marco y tapa de 50x50. Suministro e instalación de herraje Apolo. Suministro e instalación de varilla 3/8 de 40 cm Cada una.				16:20	187- 13-		
EQUIPO EN OBRA:										
Planta eléctrica, pulidora, rotaváltillo, herramientas manuales										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
Se verifica cumplimiento señalización, app, suscripción organizacional, poste con pligrafo rojo, cambio de luces y de luces de neón.										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Quen y Patricia Barreneche							
FIRMA	FIRMA		FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

  	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	14.01.2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miércoles				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JORGE CIFUENTES	21480675			Alvaro Blandin	7177777
LUIS USUGA	21708197			Diego Mancera	4306850
ALEX CAÑAS	1036651089				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 76x30	or		SE ORGANIZÓ POSTE FLOJO DEMOLICION NIVELADA	7. AM	10. AM	
	separado	N: N	Y concretada de 1 POSTE			—
Cra 76x30			instalacion de 1 semaforo peatonal se hizo 1	10.30 A	4. PM	208
			HUECO con taladro y broca sierra para instalacion			247
			de semaforo instalacion de 25 mts de cable			215
			de control nuevo.			
			Retiro de 1 semaforo peatonal para poder sacar			172
			con el cable la pieza porque esta obstruida la			
			tuberia de la caja ala menzula en			
			instalacion de 1 semaforo peatonal			208
			se hicieron 3 empalmes electricos			94
Cra 76x30A			se hizo sembrando en poste	4. PM	5. PM	
			no se avia echo por lluvia			

EQUIPO EN OBRA:	Desarrollo, P. Elvira, H. Meno
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: DÍA: VEHÍCULOS:	14 Enero 2026 Miércoles	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	CUMPLE SI ☒ NO ☐ SEÑALIZACIÓN SI ☒ NO ☐ ESCOMBROS SI ☒ NO ☐
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cardozo	13.461.111	Jorge Rodríguez	PPT 1.737.342
José Pérez	PPT 5.240.599		
Leonar Riera	PPT 4.350.715		
Leon Guerrero	15.435.477		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* Calles 29 x Calle 5 Sur Linares.	S-W	N-S	Construcción de canalización en zona pura con 2 tubos de 2" 4/10 metros. Retiro de herraje metálico de tapa de concreto de 50x50 Limpieza de tapa de inspección Instalación de herraje de seguridad nuevo de 50x50
			HORA INICIO: 9:00 HORA FINAL: 15:30
			ITEM: 22 - 187 - 54 - 13 -
	N-W	N-S	Retiro de herraje metálico de tapa de concreto de 50x50 05 unidades. Limpieza de tapa de inspección 05 unids. Instalación de herraje de seguridad nuevo de 50x50 05 unidades.
			ITEM: 187 - 54 - 13 -
	N-E	N-S	Retiro de herraje metálico de tapa de concreto de 50x50 02 unidades. Limpieza de tapa de inspección 02 unidades. Instalación de herraje de seguridad nuevo 50x50 02 unidades.
			ITEM: 187 - 54 - 13 -
EQUIPO EN OBRA: Planta Electric, Densado, H. Mera			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Guany Patricia Barreneche	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1			
						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	15 01 2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO		SI		SI		
VEHÍCULOS:	MTN SUR		DURACIÓN		NO		NO		
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
Franklin Barbosa		16791906					Alvaro Lugo		9177533
Luis Lozano		94452201					Qui Bui		430 08500
TRABAJOS REALIZADOS									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrer. 51	SO.	N-S	Adorno de Poste				8 am	11:30	197
Calle 12 sur									
Carrer 52	E	N-S	Retiro de Semáforo Peatonal.				12		172
Calle 12 sur			Retiro de cableado 4x18 y metros						173
			Retiro de Poste en mal estado.						168
			Instalación de Poste recto nuevo						206
			Reinstalación de cableado 4x18 y metros.						215
			Pendiente instalación de Semáforo Peatonal.				5 pm		-
EQUIPO EN OBRA:									
Escalas, Duplicados, P. Eléctricas, A. Menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barroneche							
FIRMA	FIRMA	FIRMA							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría							

 	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---



FECHA:	15-01-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	061				NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	100250113			Jose Cortes	1098727137
Martin Gonzalez	1123409521				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 80 x cl 80	Sesela	E-W	Lavado de poste recto	7:46 am		230
			Lavado de semaforo vehicular			234
			Lavado de semaforo peatonal			231
			Lavado de disco direccional			236
Cra 80 x cl 80	N-E	E-W	Lavado poste recto	9:02 am		230
			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
Cra 80 x cl 786	Sesela	N-S	Lavado poste recto	10:16 am		230
			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Lavado disco de boton peatonal			236
			Lavado pulsador			232

EQUIPO EN OBRA:	Escalera, Aracos, Estinga
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	15-07-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	067				NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
Moises Reyes		1002500113					Alina Londoño		9177073
Martin Gonzalez		1123409521							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 80 x c/le 786	N-W	S-N	Lavado poste recto				11:03 am		230
			Lavado semáforo vehicular						234
			Lavado semáforo peatonal						231
			Lavado disco direccional						236
			Lavado pulsador de botón						232
			Lavado disco de pulsador					11:38 am	236
Cra 80 x c/le 78	N-P	S-N	Lavado de poste recto				1:12 pm		230
			Lavado semáforo vehicular						234
			Lavado semáforo peatonal						231
			Lavado disco direccional						236
			Lavado disco de botón pulsador						236
			Lavado botón pulsador					1:45 pm	232
Cra 80 x c/le 78	S-P	N-S	Lavado poste recto				1:47 pm		230
			Lavado semáforo vehicular, Lavado semáforo peatonal						234-231
			Lavado disco direccional, Lavado disco botón pulsador						236
			Lavado pulsador de botón					2:24 pm	232
EQUIPO EN OBRA:									
Escriben, H. Mena									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quenya Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	15-01-2026		SECO	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO	SI ✓		SI ✓	
VEHÍCULOS:	061		DURACIÓN	NO		NO	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
Moses Reyes	1002500173			Alvaro Gaudin	717757m		
Martin Gonzales	1123409521						
EQUIPO EN OBRA:							
Erickson, H. Maso							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBO					
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]					
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría					

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001						
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1						
						ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN												
FECHA:	15/07/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	JUEVES		LLUVIOSO	X		SI		✓		SI	✓	
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO				NO		
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA								
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA				
Carlos Gonzalez		7049894058	Jonifer Altamirano		705019227	Jose Cortes		409872713				
Yelson Galeano		1039597832										
Jhojan Ramirez		1015186405										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
CR52-C111354	E	S-N	Retiro de marco y tapa de 50x50				08:30		187			
			Suministro e instalación de herraje A Polo						13			
			Suministro:									
			Suministro e instalación de 4 varillas de refuerzo									
			3/8 de 40 CM cada una.									
	S	W-E	Retiro de marco y tapa de 50x50						187			
			Suministro e instalación de herraje A Polo						13			
			Suministro e instalación de 4 varillas									
			de refuerzo, 3/8 de 40 CM cada una.									
	W	N-S	Retiro de marco y tapa de 50x50						187			
			Suministro e instalación de herraje 50x50						13			
			nuevo (herraje, normal)									
			limpieza de caja de 50x50					16:00	54			
EQUIPO EN OBRA:												
Planta eléctrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA												
Se verifica Señalización, EPP.												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ								
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quhy Patricia Barreneche								
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 								
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría								

 	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	15 - Enero - 2025	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO


PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		

NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Ríos Silva	4000337936			Alonso Díaz	71777771
William Chavama	98651885				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Diagonal 74A - Transversal 33AA (Circular 1)	OCCIDENTE	N-S	* Retiro de 9 líneas de 4 metros de cable 4x18			173-
			* Retiro de 4 metros de cable de acometida			173-
			* Retiro de 4 metros de cable de tierra			173-
			* Retiro de 8 metros de cable de fibra óptica			173-
			* Retiro de 4 metros de cable de comunicación			173-
			* Re-instalación de 4 líneas de 4 metros de cable 4x18			215-
			* Re-instalación de 4 metros de cable de acometida			215-
			* Re-instalación de 4 metros de cable de tierra			215-
			* Re-instalación de 8 metros de cable fibra óptica			215-
			* Re-instalación de 4 metros de cable de comunicación			215-
			* Retiro de controlador anterior			165-

EQUIPO EN OBRA:	
-----------------	--

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	
--------------------------------	--

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

 ALCALDÍA DE MEDELLÍN Oficina de Interventoría	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---



FECHA:	15/1/26	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO		X		SI		X	SI	X
VEHÍCULOS:	DXT978		DURACIÓN		2h		NO			NO	

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Yepes				Jonathan Pardo	1036962270
Simeon Vivas				Don Cortes	1098727131
Daniela Andrade				Alvaro Lombardi	71777771



DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Cr 66B x Cl 30	Separada	E W	Se retira semáforo pentonal	8:00		172	
			Se retira 4 metros de cable 4x18			173	
			Se retira poste de enterramiento			168	
			Se instala poste de enterramiento (nuevo)			206	
			Se reinstala 4 metros de cable 4x18			215	
			Se reinstala semáforo pentonal			208	
			Se realiza un empalme		10:30	94	
W	N S	Se retira semáforo ciclista	10:45		172		
		Se retira 4 metros de cable 4x18			173		
		Se retira poste de enterramiento			168		
		Se instala poste de enterramiento (nuevo)			206		
		Se reinstala 4 metros de cable 4x18			215		
		Se reinstala semáforo ciclista			208		
		Se realiza un empalme		1:15	94		

EQUIPO EN OBRA:
Escaleras, Herramienta Manual, Rotomartillo, Píldora, Planta Eléctrica


OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA
Postes Nuevos faltan tapones, Detalle Reforzados en el Poste Nuevo, están quedando con Rubato

VERIFICACIÓN		
ELABORÓ	RESPONSABLE CONTRATISTA	RESPONSABLE INTERVENTORÍA
	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Quany Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN						
FECHA:	15/11/26	TIEMPO	SECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DÍA:	Jueves		LLUVIOSO	SI X	SI A	SI A
VEHÍCULOS:	DXT929		DURACIÓN	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	
Christian Burbosa Yepes				Jonathan Luján	103692270	
Simón Uribe				José Carlos	109827131	
Pase Andrade				Alvaro Lozano	11275731	
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C 66 Bx C1 20	Segundo	W E	Se retira semáforo vehicular de 4 aspectos			172-
			Se retira semáforo peatonal			172-
			Se retira 16 metros de cable de 4X18			173-
			Se retira disco direccional			179-
			Se retira poste de entablamiento			168-
			Se instala poste de entablamiento (nuevo)			206-
			Se reinstala 16 metros de cable de 4X18			215-
			Se reinstala disco direccional			220-
			Se reinstala semáforo peatonal			208-
			Se reinstala semáforo vehicular de 4 aspectos			208-
			Se realiza 3 empalmes			94-
EQUIPO EN OBRA:						
Demador, Pulidora, Plancha, Cables, Herramientas Manuales						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA						
Por la Nueva Falta en Tránsito, Detalle posterior Poste quemado con Rubro, puede cortar el cable.						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALizó		APROBó			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Openy Patricia Barreneche			
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

   		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	15 Enero 2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	domes.				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Eberto Cardozo	13.461.111	Orlye Rodriguez	PPT 1.137.342	Alma Lina	2.177.731				
José Pérez	PPT 3.240.549								
Leonar Riera	PPT 4.350.715								
Leon Aguendo	15.425.477								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carrera 52x	N-W	N-S	Demolicion de tapa de cana de inspeccion de 50x50			9:00		1	
Calle 14			02 unidades.					54	
			limpieza de cana de inspeccion 02 unidades.					13	
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de						
			50x50 02 unidades						
	E-Sep	N-S	Demolicion de tapa de cana de inspeccion de 50x50					1	
			limpieza de cana de inspeccion					54	
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de					13	
			50x50						
	N-E	S-N	Retiro de herraje metalico de tapa de concreto de					187	
			50x50 02 unidades.					54	
			limpieza de cana de inspeccion 02 unidades.					13	
			instalacion de herraje de seguridad nuevo				14:30		
			50x50 02 unidades.						
EQUIPO EN OBRA:									
Derechos, P. Electricos, A. Muro									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria				

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA: 15.01.2026 DÍA: Jueves VEHÍCULOS:		TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	☒	UNIFORMES SI NO	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN SI ☒ NO	CUMPLE SI ☒ NO	ESCOMBROS SI ☒ NO
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORIA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
JUAN CARLOS		71486675			Alm. Luis		7177577	
ALEX CAÑAS		1036651089						
Luis USUGA		71708197						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
X Cra 80x74	OR	S.N	SE LEVISO CONTROLADOR CON PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN caída de voltaje SE HIZO EMPALME CON CONECTORES TIPO PIGTAIL SE CAMBIO DE FAXE Y SE ESTABILIZO EL VOLTAGE			8 AM	11 AM	
								94-240
X Cra 76x30A			demolición nivelada y concretada de 1 poste (aplome o nivelación) se enderezaron 2 semáforos peatonales y 1 semáforo para ciclistas golpeados suministro instalación de 2 zunchadas se hicieron 3 empalmes			12 PM	4:30 PM	197
								258
								258
								104
								94
EQUIPO EN OBRA:								
Rendón, P. Electrica, H. Moreno								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA		FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría				

 	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN


FECHA:	16/01/2025	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	viernes		LLUVIOSO		SI		✓		SI	✓
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN		NO				NO	

PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906	Jenifer Altamiranda	1052982220	Alvaro Londoño	7171511
Hernán Acosta	1001025750			Quay Paul	43008857
Luis Lozano	91542201				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	SE	SN	Retiro de Semáforo Vehicular a Poste	8 am		172
Calle 12 Sur			Retiro de Semáforo Peatonal a poste			172
			Retiro de Disco Direccional a poste			179
			Retiro de Cableado 4X18 8 metros			173
			Retiro de Poste recto en mal estado			168
			Instalación de Poste recto nuevo			206
			Reinstalación de Cableado 4X18 8 metros			215
			Reinstalación de Disco Direccional a poste			220
			Reinstalación de Semáforo Peatonal a poste			208
			Reinstalación de Semáforo Vehicular a poste			208
			Construcción de dos empalmes eléctricos.			94
			Retiro de Herraje y Tapa de concreto.			187
			limpieza de caja.			34
			Instalación de Herraje metálico y Tapa nueva 50x50.		3 pm	13

EQUIPO EN OBRA:
Pulidora, demolidor, Plancha, Escalera, Herramienta Manual

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA
Oro con los aceros en el cambio de Poste.


VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Openy Patricia Barreneche
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		16-01-2026		TIEMPO		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA:		Viernes				LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:						DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Juan José R		1000537476		Jennifer Alvarado		1052932270		Alvaro Lugo		31333331	
Wilfredo Chavarría		90691775									
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		HORA INICIO				HORA FINAL	
CALLE 80 - CALLE 37		SEPARADOR		E - V		8:00					
		CENTRAL									
										13	
										94	
										258	
CALLE 80 - CALLE 33		SUR		W - E							
										195	
CALLE 80 - CALLE 33		SEPARADOR		W - E							
		CENTRAL								218	
										94	
										4:00	
EQUIPO EN OBRA:											
Reserv. P. Elctrica, H. Menos											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quen Patricia Barreneche					
FIRMA			FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA: 16-01-2026 DIA: Viernes VEHÍCULOS: 061		TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES SI NO	CUMPLE ✓ NO	SEÑALIZACIÓN SI NO	CUMPLE ✓ NO	ESCOMBROS SI NO
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Moises Reyes		1002500713	Jennifer Alvarado		1052482770		Jose Cortes	
Martin Gonzalez		1123409521					1098727137	
TRABAJOS REALIZADOS								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cra 80	N-W	N-S	Lavado poste recto					230
Calle 7766			Lavado semáforo vehicular					234
			Lavado semáforo peatonal					231
			Lavado semáforo peatonal					231
			Lavado disco direccional					236
			Lavado disco boton pulsador					236
Cra 80	S-W	W-E	Lavado poste recto					230
Calle 76da			Lavado semáforo vehicular					234
			Lavado semáforo peatonal					231
			Lavado disco direccional					236
Cra 80	N-E	S-N	Lavado poste recto					230
Calle 76da			Lavado semáforo vehicular					234
			Lavado semáforo peatonal					231
			Lavado disco direccional					236
EQUIPO EN OBRA:								
Escala, Arco, Estinga								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	16-01-2025	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	Vie			SI ✓		SI ✓		NO	NO
VEHÍCULOS:	D61			NO		NO		NO	NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Martin Rojas	1007800013			Aldino Londoño	21275731				
Martin Gomez	113 409 521								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
cra 80	separado	N-S	Lavado poste recto			230			
calle 76 da			Lavado semaforo vehicular			234			
			Lavado semaforo peatonal			231			
			Lavado disco direccional			236			
cra 80	separado	N-S	Lavado poste recto			230			
calle 77 da			Lavado semaforo vehicular			234			
			Lavado semaforo peatonal			231			
			Lavado semaforo peatonal			231			
			Lavado semaforo peatonal			231			
			Lavado disco direccional			236			
EQUIPO EN OBRA:									
Escobedo, H. Mario,	OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria						

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	16/01/2026	SECO	X
DIA:	Viernes	LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:	2XT928	DURACIÓN	
UNIFORMES	SI	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN
	NO	SI	NO
ESCOMBROS	SI	CUMPLE	NO
	NO		
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Burbosa Yopá		Christian Burbosa	1036962270
José Andrade		José Cortés	1098727131
Simón Urdaz		Alvaro Urdaz	71775737
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
Galería 666 x C130	N	E W	172
			173
			168
			206
			215
			208
			94
	E	N S	172
			173
			168
			206
			215
			208
			94
EQUIPO EN OBRA:			
Rotomartillo, Placa eléctrica, Relés, Escalera, Herramienta Manual			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
Detalle Placa Poste, Falta tapas, detalle perforación Poste			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	16/11/25	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	Víenes		LLUVIOSO		SI	✓	SI	✓	SI	✓
VEHÍCULOS:	DX7428		DURACIÓN		NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Eduardo De la Hoz						Alfonso		31235737		
Jose Andrade										
Simón Urua										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
C. 698 x C. 130	E	NS	Se reja semáforo peatonal			7:00		172		
			Se retira 4 metros de cable					173		
			Se retira poste de antena					168		
			Se instala poste de antena (nueva)					206		
			Se reinstala 4 metros de cable					215		
			Se reinstala semáforo peatonal					208		
			Se instala empalme				4:00	94		
EQUIPO EN OBRA:										
Escalera H. Meno										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA				FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría				

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	16/09/2025	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Señal		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Carlos González	1049894058	Jenifer Altamiranda	105298227	Alvaro Londoño	7173737				
Jhossan Ramírez	101586405			Jonathan Pineda	1036962240				
Yeison Galeano	1039597832			Jon Cortez	1098322131				
TRABAJOS REALIZADOS									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
C-92-C1123-5	Caril	S-N	retiro de marco + tapa de 50 x 50			08:30		187	
	Central		Suministro e instalación de herraje Apolo					13	
			Suministro e instalación de 4 varillos						
			de refuerzo 3/8 de 40 cm cada una.						
	S	W-E	retiro de marco y tapa de 50 x 50					187	
			Suministro e instalación de herraje Apolo					13	
			Suministro e instalación de 4 varillos						
			de refuerzo 3/8 cada una (40 cm)			15:30			
EQUIPO EN OBRA:									
Planta Eléctrica, Amolador, Pulidora, Aserrador, Herramientas									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
Aplomar Poste Isleta se cubre S-N									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA		FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 17 01 2026 DIA: Sábado. VEHÍCULOS: MTN 502	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE SI ☒ NO ☐	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI ☒ NO ☐
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE Franklin Barbosa Luis Lozano	CÉDULA 16741906 91542201	NOMBRE Alvaro Buitrago	CÉDULA 71733722
DIRECCIÓN Carretera 43 Calle 50	COSTADO WN	SENTIDO WE	TRABAJOS REALIZADOS Concreción de Tapa 60x80 Instalación de tres líneas de cableado 4x18 de 4 metro - Construcción de Empalmes #6
			HORA INICIO 07am
			HORA FINAL 2pm
			ITEM 263 215 94
EQUIPO EN OBRA: H. Mensa			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ NOMBRE: María Victoria Durango FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Auxiliar de Residencia	REVISÓ/ACTUALIZÓ NOMBRE: Carlos Alberto Díaz FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Residente de Obra	APROBÓ NOMBRE: Queny Patricia Barreneche FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 19-01-2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO	CUMPLE
DIA: LUNES		DURACIÓN	SI
VEHÍCULOS: 3YW 772			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427	José Cortes	1098727137
willian chavarria	91688 775	Alvaro londoño	77775731
luis lozano	91452 201		
DIRECCIÓN			
COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO
S-W	W-E	traslado de controlador y cableado fibra optica y tierra	8:00AM
		retiro de 60 mts de cable 4x19 del controlador	
		retiro de 10 mts de cable de fibra optica del controlador	
		retiro de 3 mts de cable verde tierra #8 del controlador	
		retiro de 2 mts de cable de acometida del controlador	
		retiro de un gabinete anterior	
		instalación de 60 mts de cable 4x19 al controlador nuevo	
		instalación de 10 mts de cable fibra optica al controlador	
		instalación de 5 mts de cable fibra optica al controlador por	
		se encontraba en la casa	
		instalación de 3 mts de cable verde tierra #8 al controlador	
		suministro instalación de 4 mts de cable acometida 2x10 nuevo	
		construcción de un empalme electrico en cable de acometida	
		2x10 en la casa de 50x50	
		retiro de 3 cordones en tapa redonda telefonica	12:30pm
		de las cámaras	
EQUIPO EN OBRA:			
Herramienta menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
Jalar reserva de fibra			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Quany Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

[illegible]

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN						
FECHA: 19 - enero - 2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE			
DIA: Lunes		LLUVIOSO	SI			
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO			
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN			
		SI	SI			
		NO	NO			
		ESCOMBROS	CUMPLE			
		SI	SI			
		NO	NO			
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Francisco Barbosa	16291906	Alvaro Londo	71377731			
Juan José Roa Silva	1000537926					
Hernán Acosta	1001025320					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 65 - CAVE	OCCIDENTAL	N - S	Se encuentra cruz apagado por falta de cable de acometida	8:00		
96 y CAVE 97			Suministro e instalación de 40 metros de cable de acometida 2x12 (Nuevo) (Acero)			19
			Construcción de empalme, acero			
			Suministro e instalación de 6 metros de tubería galvanizada, 3/4"			42
			Suministro e instalación de 4 flanges de acero			
			Bundit en poste para tubería galvanizada			
			Long cruces grandes laterales			
			Construcción de empalme en semáforo vehicular			
			Pictos de 6 metros de tubería galvanizada anterior		7:30	192
EQUIPO EN OBRA:						
Escalera, A. Moreno						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA		FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	19/1/25	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE		
DÍA:	lunes		LLUVIOSO		X		SI		✓	SI	✓
VEHÍCULOS:	2 X 1 078		DURACIÓN		1h		NO			NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA						
Christian Barbosa Topa				Alonso Buitrago	31775731						
José Andrade											
Princeton Nuñez											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM			
CROSS x C130	E	NS	Se retira semáforo bicicleta			8:20		172			
			Se retira 4 metros de cable					173			
			Se retira poste de entroncamiento					168			
			Se instala poste de entroncamiento (nuevo)					206			
			Se reinstala 11 metros de cable					215			
			Se reinstala semáforo bicicleta					208			
			Se realiza empalme					94			
	W	NS	Se retira semáforo bicicleta					172			
			Se retira 8 metros de cable					173			
			Se retira poste de entroncamiento					168			
			Se instala poste de entroncamiento (nuevo)					206			
			Se reinstala 8 metros de cable					215			
			Se reinstala semáforo bicicleta					208			
			Se realiza empalme				1:00	94			
EQUIPO EN OBRA:											
Reserva, P. Eléctrica, H.Mos											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quenya Patricia Barreneche							
FIRMA: 	FIRMA: 			FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría							

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	19/1/25	TIEMPO	SECO	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Lunes		LLUVIOSO	SI	SI	SI	SI	SI
VEHÍCULOS:	DXT928		DURACIÓN	NO	NO	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Christian Burbosa Yepa				Alonso Londoño	91773731			
José Andrade								
Ricardo Vivas								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C.S.S x C.I. 30	S	WE	Se retira semáforo vehicular			7:00		172
			Se retira disco direccional					179
			Se retira 8 metros de cable					173
			Se retira poste de antenamiento					168
			Se instala poste de antenamiento					206
			Se reinstala 8 metros de cable					215
			Se reinstala disco direccional					220
			Se reinstala semáforo vehicular					208
			Se realiza empalme				4:00	94
EQUIPO EN OBRA:								
Dezados, P. Chetres, H. Moreno								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBO				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Quely Patricia Barreneche				
FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría				

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	19-01-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Martin Gonzalez		1123409521				Ana Lucia		31771937		
Moises Reyes		1002500113								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
+ Cr80-C1175	N-E	E-W	lavado de Poste recto				7:50 AM		230	
			lavado de un semáforo vehicular						234	
			lavado de un semáforo peatonal						231	
			lavado de disco direccional						236	
+ Cr80-C1175	separata	E-W	lavado de Poste recto						230	
			lavado de un semáforo vehicular						234	
			lavado de dos semáforos peatonal						231	
			lavado de disco direccional						236	
+ Cr80-C1175	separata	E-W	lavado de Poste recto						230	
			lavado de un semáforo vehicular						234	
			lavado de dos semáforos peatonal						231	
			lavado de un disco direccional						236	
+ Cr80-C1175	separata	N-S	lavado de Poste recto						230	
			lavado de un semáforo vehicular de 4 aspec						234	
			lavado de un disco direccional						236	
EQUIPO EN OBRA:										
Eunio, H. Moreno										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Odeny Patricia Barreneche				
FIRMA			FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	19-01-2026	SECO	
DÍA:	lunes	LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	
		UNIFORMES	
		CUMPLE	
		SEÑALIZACIÓN	
		CUMPLE	
		ESCOMBROS	
		CUMPLE	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Martin Gonzalez	1193409521	Alvaro Lopez	71771771
Moises Reyes	1002500113		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
CR 80 C 1175	SEB	S-N	lavado de poste recto
			lavado de un semaforo vehicular
			lavado de dos semaforos Peatonal
			lavado de disco direccional
CR 80 C 1175	SEB	N-S	lavado de poste recto
			lavado de dos semaforos vehicular
			lavado de dos discos direccionales
AVB con	5-E	W-E	lavado de poste recto
carrera 7ba			lavado de un semaforo Peatonal
			lavado de un disco pulsador (Peaton)
			lavado de un pulsador
AVB con carrera	N-E	W-E	lavado de poste recto
7ba			lavado de un semaforo Peatonal
			lavado de un disco pulsador (Peaton)
			lavado de un pulsador
EQUIPO EN OBRA:			
Escriba, H. Mero			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Odeny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001				
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1				
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN						
FECHA:	19/01/26					
DÍA:	Lunes					
VEHÍCULOS:						
SECO						
LLUVIOSO						
DURACIÓN	7h					
UNIFORMES	SI ✓ NO	CUMPLE SEÑALIZACIÓN SI ✓ NO				
ESCOMBROS	SI NO	CUMPLE CUMPLE				
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA				
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA			
Carlos Gonzalez	1049894059	Jose Cortes	1098727137			
Felipe Galeano	1039597832					
Jhojan Rariock	1015180405					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CV 51 - CI 125	N	E-W	reparo de mano y tapa de 50 x 50 suministro e instalacion de herraje A polo Suministro e instalacion de 4 varillas de refuerzo 3/8 de 40 CM cada una.	09:00		187. 13-
	N	E-W	reparo de mano y tapa de 50 x 50 suministro e instalacion de herraje A polo Suministro e instalacion de 4 varillas de refuerzo 3/8 de 40 cm cada una.		04:00	187. 13-
EQUIPO EN OBRA: Planta electrica, demolidor, pulidora, herramienta menor						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA Se verifica EPP, Permisos de trabajo						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBO				
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]				
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria				

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 19-01-2028 DIA: Lunes VEHÍCULOS: LKN 741	TIEMPO SECO ☒ LLUVIOSO ☐ DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE ☒ SI ☒ NO ☐	SEÑALIZACIÓN CUMPLE ☒ SI ☒ NO ☐
ESCOMBROS CUMPLE ☒ SI ☒ NO ☐			
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santos	1038806300	Alvaro Londo	2777777
Santiago Mena	1000533772		
Miguel Villela	1018229462		
Ernis Torp	1028030487		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
CR 79AA Calle 44.			Reposición de cableado eléctrico. Retiro de (914mts) de cable 4x18 con reintegro 919m Suministro e instalación de 1052 mts de cable 4x18 nuevos distribuidos en los siguientes grupos vehiculares y peatonales Grupo #1 = 44m + 27m = (1872-1916) y (1916-1943) Grupo #3 = 81m + 27m = (2110-2191) y (2183-2210) Grupo #4 = 9m + 22m = (1759-1768) y (1768-1790) Grupo #5 = 105m + 34m = (2191-2225) y (1973-2078) Grupo #5 = 96m = (2014-2110) Grupo #6 = 115m = (971-1086) Grupo #7 = 44m + 27m = (1943-1987) y (1987-2014) Grupo #8 = 62m + 30m = (2318-2380) y (2380-2410) Grupo #9 = 81m + 27m = (2210-2291) y (2291-2318) Grupo #10 = 92m + 29m = (1821-1843) y (1843-1872) Grupo #11 = 9m + 22m = (1790-1799) y (1799-1821) Grupo #12 = 105m + 34m = (2078-2183) y (2255-2259)
			HORA INICIO: 8-40 HORA FINAL: 20-00 ITEM: 173, 215
EQUIPO EN OBRA:			
Erasa, H. Mena			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

[illegible]

PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		18-01-2026		TIEMPO		SECO		12		CUMPLE	
DÍA:		Lun				LLUVIOSO				SI ☒	
VEHÍCULOS:		IKU 741				DURACIÓN				NO ☐	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Cesar Santor		1038806300						Alvaro Londo		71773771	
Santiago Mena		1000533292									
Miguel Villegas		1018229962									
Ermita Torres		1028030487									
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	
CR 79AA Calle		N-E		E-W		Construcción de 2 empalmes eléctricos				8-40	
AA						uno en semáforo peatonal y uno en semáforo vehicular.					
				E-W		Separador orizont					
						Retiro de 4 cordones de soldadura a 1				183	
						traza de 60x60				94	
						Construcción de 3 empalmes eléctricos					
						dos en semáforos peatonales y uno en					
						semáforo vehicular					
						se le aplican puntos de soldadura a traza de 60x60				183	
S-E		S-N				Retiro de 4 cordones de soldadura a 1					
						traza de 60x60				94	
						Construcción de 3 empalmes eléctricos					
						dos en semáforos peatonales y uno en					
						semáforo vehicular					
						se le aplican puntos de soldadura a 1				20-00	
						traza de 60x60					
EQUIPO EN OBRA:											
Polibon, P. Chetria, H. Muro											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria					

 CONSORCIO INT. FABOL MED 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---


FECHA:	19-01-2026	TIEMPO	SECO	2	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	11KA 341		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Santor	1038806300	Alvaro Londoño	71777737
Santiago Mena	1000533772		
Miguel Villegas	101822962		
Ernesto Torres	1028030487		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 79AA Calle 4A.		S-N.	Superador Central Sur. Punto de A cordones de soldadura al tubo de 60x60. Construcción de 3 empalmes eléctricos en semáforos vehicular y uno en semáforo peatonal. Se le adicion puntos de soldadura al tubo de 60x60.	8-40		183
		W-S.	Superador Central Sur. Construcción de 2 empalmes eléctricos uno en peatonal y uno en vehicular.			94
		S-W.	Construcción de 2 empalmes eléctricos uno en peatonal y uno en vehicular.			94
semáforo 970.		S-W.	Construcción de 1 empalme eléctrico en semá foro vehicular.		20-00	94

EQUIPO EN OBRA:	A. Mena
-----------------	---------

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA	
--------------------------------	--

VERIFICACIÓN		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Geny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

   CONSORCIO INT. PAROL. MED. 2025	PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---

FECHA:	16-19 Enero 2026	SECO		CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Lunes. - Viernes.	LLUVIOSO		SI	✓	SI	✓	SI	✓
VEHÍCULOS:		DURACIÓN		NO		NO		NO	

PERSONAL EN OBRA					
------------------	--	--	--	--	--

CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cardenas	13.461.111	Jorge Rodriguez	PPT 1.137.242	Alma Linder	7177777
José Pérez	PPT 5.240.599				
Leonar Riera	PPT 4.350.315				
Leon Guerrero	13.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Carrera 26 X	E	S-N	Construcción de Canalización en adoquin con 2 tubos			23 ✓
Calle 20a Sur y			Pvc de 2" 33,60 metros.			
Calle 20 Sur			Demolicion de Concreto de 0,20x0,06x33,60			1 *
TV Superior Loma			Retiro de heriche metalico con tapa de concreto			187 ✓
los muros.			Limpieza de cara de inspeccion			54 ✓
			instalacion de heriche de seguridad nuevo de			13 ✓
			50x50			
			Nota: Retiro del adoquin se encontraron 6cm de			*
			concreto que debian demolerse para llegar a la			
			tierra y poder instalar la tuberia.			

EQUIPO EN OBRA:

Derechos P. Electricos, H. Muro

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

--

--

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
-------------------------	--	---------------------------


ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
---------	------------------	--------

NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Geny Patricia Barreneche
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
---	---	---

CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

PLAN DE CALIDAD							
SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025							
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025							
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA: DIA: VEHÍCULOS:	72-sept-2025	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	CUMPLE SI NO	UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI NO	ESCOMBROS CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
				Aldo Lugo	7177J7?		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
			Suministro de 25 lámparas Ciclistas así = . 11 rojas modulos 14 Verdes modulos.			156	
EQUIPO EN OBRA:							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORI/A			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]			FIRMA [Firma]			
CARGO: Auxillar de Residencia	CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria			

  ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONSORCIO INT. PAROL. MED 2024 UNIÓN TEMPORAL DE MEDELLÍN	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO	VERSIÓN 1
	Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	ED: SEP 2025



NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN
----------------------	---



FECHA:	31 Diciembre	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Miércoles				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO


PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.430.675			Almendra	71777371
Luis fernando usuga	71.708.197			Rany Paul	43068310
Alex Carras	1.036.651.039				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* Camara 78x	Separado	E-W	Retiro de semáforo vehicular a poste	9:20		172
Calle 30	Control		" de 2 semáforos peatonales			172
			" de disco direccional			179
			" de 25 metros de cable de control			173
			" de poste de enterramiento			168
			Instalación de poste de enterramiento nuevo			206
			Reinstalación de semáforo vehicular a poste			208
			" de 2 semáforos peatonales			208
			" de disco direccional			220
			" de 25 metros de cable de control			215
			construcción de empalme 3 unidades		14:50	94


EQUIPO EN OBRA:	
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	

VERIFICACIÓN		
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Aueny Patricia Barreneche
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

 Alcalde de Medellín Municipalidad de Medellín		 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
 CONSORCIO INT. CAROL MED. 2025		 RMY		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
				Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	7/01/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
JHONFREDDY LONDOÑO		71785749					Jose cortes		1098727131	
JULIAN MONTOYA LONDOÑO		1021805927								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 89 X CALLE 65			Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación .130 MTS						200	
			Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 130 MTS						122	
			Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos ,NO incluye instalación de mufla con derivación. 2 UND							
			Retiro de empalmes de fusion existentes. 2 UND							
			Certificación de enlace optico 1 hilo. 8 unidades						117	
			Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica. 5UND						125	
			Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica. 4 UND						123	
			Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio						261	
EQUIPO EN OBRA:										
Pesca, Herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA 		FIRMA 		FIRMA 						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						

 Alcaldía de Medellín Municipalidad de Medellín		 UNION TEMPORAL BIT MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
 CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
								ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	14/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	MIÉRCOLES				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
JHONFREDDY LONDOÑO		71785749					Jose cortes		1098727131
JULIAN MONTOYA LONDOÑO		1021805927							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 52 X CL 14			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND						116
			Certificación de enlace óptico 1 hilo. 4 unidades						117
CARRERA 52 X CL 21			Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND						116
			Certificación de enlace óptico 1 hilo. 4 unidades						117
EQUIPO EN OBRA:									
Pesca, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quely Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

  		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		16/01/2026		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DIA:		VIERNES		LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE	
JHONFREDDY LONDOÑO		71785749						Jode Cortes	
JULIAN MONTOYA LONDOÑO		1021805927							
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADO		HORA INICIO	
CARRERA 80 X CALLE 75A						Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 200 MTS			
						Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufia con derivación. 3 UND			
						Suministro, transporte e Instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica. 8 UND			
						Suministro, transporte e Instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica. 8 UND			
						Certificacion de enlace optico 1 hilo. 12 unidades			
						Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación .150 MTS			
						Diagnóstico, verificación y reparacón de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio			
AV NUT. X CIRCULAR 1						Desmorte de caja ob, instalacion de caja ob suministro e instalacion de Pigtails SC/UPC. 2 UNIDADES			
						Certificacion de enlace optico 1 hilo. 8 unidades			
EQUIPO EN OBRA:									
Pesca, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:		17/01/2026		SECO		CUMPLE		CUMPLE	
DÍA:		SABADO		LLUVIOSO		SI		SI	
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		CÉDULA	
JHONFREDDY LONDOÑO		71785749				Jose Cortes		1098727137	
JULIAN MONTOYA LONDOÑO		1021805927							
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADO		HORA INICIO	
CR 65 X CL 91 e						Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, 150 MTS			
						Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación. 1 UND			
						Certificación de enlace optico 1 hilo. 8 unidades			
						Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación .150 MTS			
CR 65 X CL 89						Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio			
CR 65 X CL 89						Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio			
CR 70 X CL 55						Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. 1 UND			
						Certificación de enlace optico 1 hilo. 4 unidades			
EQUIPO EN OBRA:									
Pescas, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	20-01-2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:			LLUVIOSO		SÍ		SÍ		
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
				José Cortes	1098727134				
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
C/O S			Suministro de Lámpara Led Peatonal Rojo (20)					155	
			Suministro de Lámpara Led Peatonal Verde (20)					155	
			Suministro de Lámpara Led Ciclista Roja (20)					156	
			Suministro de Lámpara Led Ciclista Verde (20)					156	
EQUIPO EN OBRA:									
Escalera, arcos, estinga, herramienta menor									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría					

		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	20-01-2026	SECO	51	CUMPLE	CUMPLE
DÍA:	MARTES	LLUVIOSO		SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN
VEHÍCULOS:	LEO 061	DURACIÓN		ESCOMBROS	ESCOMBROS
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin sanjosé	1038810422			jose cortés	1098727137
willan chararín					
TRABAJOS REALIZADOS					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL
CRV 70 x cd. 55			cambio de lamparas pentonales verdes por fallas en el controlador	10:20am	
	S-W	W-E	retiro de lampara verde pentonal a poste		195
			instalación de lampara verde pentonal de segunda a poste		218
			construcción de un empalme electrico a poste		94
			retiro de placa de contraste en semaforo vehicular a poste		199
	N-W	W-E	retiro de lampara verde pentonal de contra reverso a poste		195
			instalación de lampara verde pentonal de segunda a poste		218
			construcción de un empalme electrico a poste		94
			retiro de placa de contraste en semaforo vehicular a poste		199
	N-E	W-E	retiro de lampara verde pentonal de contra reverso a poste		195
			instalación de lampara verde pentonal de segunda a poste		218
			construcción de un empalme electrico a poste		94
EQUIPO EN OBRA:					
Escala, arnes, estinga, herramienta menor					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA		
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ		
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche		
FIRMA	FIRMA		FIRMA		
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría		


		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		VERSIÓN 1	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	20-01-2026	TIEMPO	SECO	SI	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO		SI
VEHÍCULOS:	LK0061		DURACIÓN		NO
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810422			jose cortes	1098727131
wilian chavarria					
TRABAJOS REALIZADOS					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL
CVR 48 x Cll 70			se encuentran semaforos peatonal y ciclista de	12:00pm	
	separador N-S		orientación de un semaforo peatonal a poste		258
	separador S-N		orientación de un semaforo ciclista a poste		12:20pm 258
A.V. autívaca	S-E	E-W	se hace la visita a la intersección en contrando poste	2:00pm	
x bulerías			recto sin semaforos y cables de potencia por dentro		
glorieta			del tubo muy corticos para empalmar se prosce ser		
			el cambio del cable de potencia pero al pasar el		
			cable de la casa al poste se encuentra obstruida la		
			curva por el poste y se para la actividad por		
			motivo que hay que retirar de nuevo el poste y		4:00pm
			programar nueva visita		
EQUIPO EN OBRA:					
Escala, arnes, eslinga, herramienta menor					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA		
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ		
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche		
FIRMA	FIRMA		FIRMA		
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría		



PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 20-01-2026 DÍA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Enrique J. Barbosa		José Cortés	1098727131
Juan José Ray Siles	1000531476		
José Andrés			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO
CAJERÍA 64- CALLE 57	OCCIDENTE	N- S	a. Se atiende punto por siniestro • Instalación de poste de mensula nuevo • Suministro e instalación de 10 metros de cable 4x18 (NUEVO) • Instalación de semáforo vehicular (NUEVO) con número de serie 20250013 Lámpara roja - Shicker 0003 - Señal 15754778 Lámpara amarilla - Shicker 0008 - Señal 15754891 Lámpara verde - Shicker 0009 - Señal 15755181 • Configuración de empulme en semáforo • Configuración de capulme en caja de henaje • Instalación de henaje 80x50 • Limpieza de caja (Pendiente retirar escombros)
			HORA INICIO 8:00 PM
			HORA FINAL
			ITEM
			215
			65
			94
			94
			13
			54
			7:00 PM
EQUIPO EN OBRA:			
Planta eléctrica, Pulidora, Martillo demoledor, herramienta menor, Escalera, arcos, estinga			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 20-01-2026 DIA: Martes VEHÍCULOS:	TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN CUMPLE SI NO
		ESCOMBROS CUMPLE SI NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Francisco Barbosa		Jode Cortes	1098727131
Juan José Roa Silva	1000532076		
Wilson Acosta			
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
* CARRETA 53 - CAVE 44			206
		• Instalación de poste de enterramiento directo	215
		• Suministro e instalación de 20 metros de cable 4x18 nuevo	94
		• Construcción de 2 empalmes en caja de paso	65
		• Suministro e instalación de semáforo vehicular nuevo con número de serie 20250018	
		Lampara roja - shincer 0013 - Señal 1678477A	
		Lampara amarilla - shincer 0014 - Señal 15754885	
		Lampara verde - shincer 0015 - Señal 15755178	
		• Suministro e instalación de semáforo peatonal nuevo con número de serie 20250023	70
		Lampara roja - shincer 0023 - Señal 1	
		Lampara verde - shincer 0024 - Señal 500-505	
		• Construcción de 2 empalmes en semáforo	94
* CARRETA 53 - CAVE 44		• Re-orientación de semáforo peatonal	258
		• Retiro de 2 usuarios de semáforo peatonal en mal estado	198
EQUIPO EN OBRA:			
Escalera, Planta electrica, Pulidora, Martillo demolidor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	2/1/26	TIEMPO	SECO	X	CUMPLE	CUMPLE
DÍA:	Vienes		LLUVIOSO		SI ✓	SI ✓
VEHÍCULOS:	PX7979		DURACIÓN		NO	NO
PERSONAL EN OBRA						
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	
Christian Barbosa Tapas		Jenifer Altamiranda	1082982270	Alvaro Londoño	21771731	
Wilken Chelavarría						
Juan Galeano						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C. 6S x C. SI	W	N S	Se realiza cambio de modulo rojo y verde peatonal	8:00		195-
			Se retira modulo rojo y verde peatonal			218-94
	E	S N	Se instala modulo rojo y verde peatonal + empalme			195-
			Se realiza cambio de modulo rojo y verde peatonal			218-94
	N	E W	Se retira modulo rojo peatonal y verde peatonal			195-
			Se instala modulo rojo y verde peatonal + empalme			218-94
	S	E W	Se realiza cambio de modulo rojo y verde peatonal			195-
			Se retira modulo rojo y verde peatonal			218-94
Separados	E W		Se instala modulo rojo y verde peatonal + empalme			195-
			Se realiza cambio de modulo rojo y verde peatonal			218-94
	N	E W	Se retira modulo rojo y verde peatonal + empalmo			195-
			Se instala modulo rojo y verde peatonal + empalme			218-94
			Se retiran 38 metros de cable del grupo 7 y se instalan 38	12:00		173-
			metros de cable 4x18 EQUIPO EN OBRA:			215-
Escriben , Herramienta Manual						
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA						
VERIFICACIÓN						
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quehy Patricia Barreneche			
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria			

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
  CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	2/01/2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	ANALIZADO	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	VIERNES		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470					Alvaro Londoño		71771731
JAIME CIFUENTES		71480675							
TRABAJOS REALIZADOS									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 26 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 14,14 OHMIOS						248
CARRERA 20 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.14,63 OHMIOS						248
CARRERA 17 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.28,42 OHMIOS						248
CARRERA 35 X CALLE 9 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.7,24 OHMIOS						248
CARRERA 35 X CALLE 5 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.49,2 OHMIOS						248
CARRERA 34 X CALLE 1 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.8,62 OHMIOS						248
CARRERA 34 Y 35 X CALLE 7			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 17,68 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 12 Y 12A			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.32,31 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 10			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.31,13 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 7			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.8,17 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 1 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.11,73 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 5 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.13,12 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 9 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.13,92 OHMIOS						248
CARRERA 32 X CALLE 16A SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.12,05 OHMIOS						248
CARRERA 27 X CALLE 20 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.14,28 OHMIOS						248
CR 20 Y 25 X CALLE 20A			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.17,76 OHMIOS						248
CARRERA 25 X CALLE 12 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.66,2 OHMIOS						248
CARRERA 22 X CALLE 12 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.12,30 OHMIOS						248
EQUIPO EN OBRA:									
Alvaro Londoño, Herminio Muro									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quany Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	2/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	VIERNES				SI		SI		
VEHÍCULOS:					NO		NO		
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470				Alvaro L. Díaz		977757	
JAIME CIFUENTES		71480675							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 25 X CALLE 5 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 21,31 OHMIOS					248	
CARRERA 29 X CALLE 5 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 27,14 OHMIOS					248	
CARRERA 25 X CALLE 2 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 16,09 OHMIOS					248	
CARRERA 25 X CALLE 3			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 34,78 OHMIOS					248	
CARRERA 25 X CALLE 10			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 46,8 OHMIOS					248	
CARRERA 37B X CALLE 1 SUR			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 23,02 OHMIOS					248	
CARRERA 43A X CALLE 29 Y 30			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 15,67 OHMIOS					248	
CARRERA 43GX CALLE 29			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 18,89 OHMIOS					248	
CARRERA 44 X CALLE 29			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 3,82 OHMIOS					248	
CARRERA 45 X CALLE 29			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. FUERA DE MEDIDA					248	
CARRERA 48 X CALLE 30			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 20,48 OHMIOS					248	
CARRERA 48 X CALLE 31			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 34,54 OHMIOS					248	
CARRERA 51 X CALLE 32			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 15,96 OHMIOS					248	
CARRERA 48,50,51 X CALLE 34			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 25,3 OHMIOS					248	
CARRERA 43A X CALLE 34			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 11,13 OHMIOS					248	
EQUIPO EN OBRA:									
Fibras, Herramientas Manuales									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 			
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría			


 Alcaldía de Medellín Municipio de Medellín		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
 UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1					
 CONSORCIO INT. EABOL MED. 2025		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	3/01/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA:	SÁBADO		LLUVIOSO			SI		✓		SI	✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO				NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470					Alvaro Londoño		71775777		
JAIME CIFUENTES		71480675									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CARRERA 37 X CALLE 45			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 5,36 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 41 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 8,53 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 43,44,45 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 8,12 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 45 Y 46 X CALLE 41			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 6,88 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 46 X CALLE 38			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 7,01 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 43A X CALLE 36 Y 37			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 8,98 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 43A X CALLE 31			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 10,01 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 43 X CALLE 31			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,32 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 48 Y 50 X CALLE 36			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 6,04 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 50 Y 51 X CALLE 35			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 152,7 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 51 Y 52 X CALLE 36			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 18,21 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 57 X CALLE 36 Y 37			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 88,9 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 51 Y 52 X CALLE 37			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 10,61 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 50 X CALLE 37			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 26,80 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 48 X CALLE 37			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 12,21 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 48 Y 50 X CALLE 38			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 11,18 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 48 Y 50 X CALLE 41			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 20,62 OHMIOS						248 ✓		
CARRERA 51 X CALLE 41			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 13,48 OHMIOS						248 ✓		
EQUIPO EN OBRA:											
Feltro, Herramienta Manual											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Quenya Patricia Barreneche					
FIRMA 			FIRMA 			FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

 Alcaldía de Medellín CONSORCIO INT. FABOL MED. 2025		PLAN DE CALIDAD					SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO							VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025							ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	3/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE		ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	SÁBADO				SI	✓		SI	✓		SI	✓
VEHÍCULOS:					NO			NO			NO	
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470						Diana Indaco		71735931		
JAIME CIFUENTES		71480675										
TRABAJOS REALIZADOS												
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
CARRERA 50 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 15,49 OHMIOS							248		
CARRERA 51 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,47 OHMIOS							248		
CARRERA 52 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 97,3 OHMIOS							248		
CARRERA 57 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 18,67 OHMIOS							248		
CARRERA 59 X CALLE 44			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 15,8 OHMIOS							248		
CARRERA 54 X CALLE 45			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 13,92 OHMIOS							248		
CARRERA 51 Y 52 X CALLE 45			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 12,23 OHMIOS							248		
CARRERA 49 X CALLE 45			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,8 OHMIOS							248		
CARRERA 45 X CALLE 45			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 30,26 OHMIOS							248		
CARRERA 43 X CALLE 46 Y 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 19,24 OHMIOS							248		
CARRERA 42 X CALLE 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 9,47 OHMIOS							248		
CARRERA 42 X CALLE 46			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 7,36 OHMIOS							248		
CARRERA 41 X CALLE 46			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 5,72 OHMIOS							248		
CARRERA 41 X CALLE 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 6,84 OHMIOS							248		
CARRERA 40 X CALLE 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 12,54 OHMIOS							248		
CARRERA 40 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 5,90 OHMIOS							248		
CARRERA 39 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 12,43 OHMIOS							248		
CARRERA 36A X CALLE 50 Y 51			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 5,51 OHMIOS							248		
EQUIPO EN OBRA:												
Herramientas, Herramientas Manuales												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ						
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz				NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA 		FIRMA 				FIRMA 						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría						

[illegible]

		PLAN DE CALIDAD					SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO							VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025							ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	4/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DIA:	DOMINGO				SI		SI		SI	
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO	
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470				Alvaro Londoño		91775737		
JAIME CIFUENTES		71480675								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CARRERA 51 Y 52 X CALLE 38			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 18,2,2 OHMIOS						248	
CARRERA 54 Y 55 X CALLE 46			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.FUERA DE MEDIDA						248	
CARRERA 57 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.FUERA DE MEDIDA						248	
CARRERA 55 X CALLE 48 Y 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.FUERA DE MEDIDA						248	
CARRERA 56 Y 56C X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.5,12 OHMIOS						248	
CARRERA 57 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. SIN TIERRA						248	
CARRERA 55 Y 50X CALLE 51			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.SIN TIERRA						248	
CARRERA 54 X CALLE 48 Y 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.11,97 OHMIOS						248	
CARRERA 53 X CALLE 50 Y 51			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.SIN TIERRAS						248	
CARRERA 53 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. FUERA DE MEDIDA						248	
CARRERA 52 Y 53 X CALLE 46			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.0,33 OHMIOS						248	
CARRERA 52 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.15,92 OHMIOS						248	
CARRERA 52 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.1,18 OHMIOS						248	
CARRERA 51 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.10,46 OHMIOS						248	
CARRERA 51 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.0,62 OHMIOS						248	
CARRERA 51 X CALLE 48 Y 46			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.28,15 OHMIOS						248	
CARRERA 50 X CALLE 48 Y 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.46,7 OHMIOS						248	
CARRERA 49 X CALLE 49			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.2,83 OHMIOS						248	
EQUIPO EN OBRA:										
Teléfono, Herramienta Manual										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Openy Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

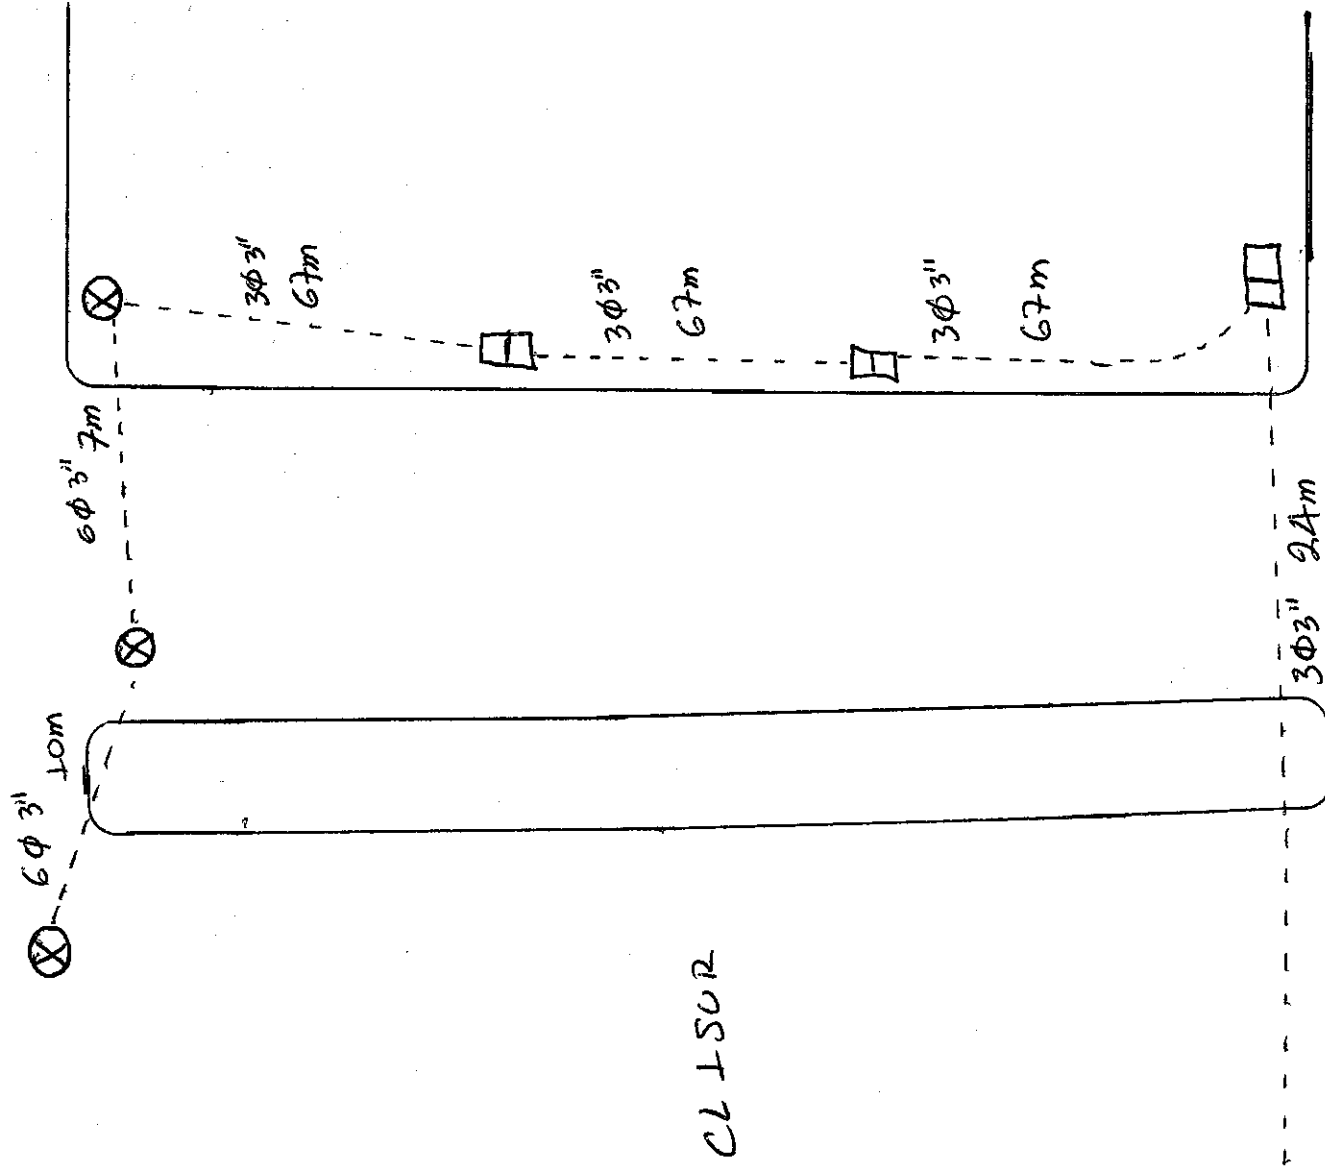

		PLAN DE CALIDAD					SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO							VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025							ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	4/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	DOMINGO				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
CARLOS ALBERTO DIAZ		1017144470				Alvaro Londo		71773731	
JAIME CIFUENTES		71480675							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 50 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 1,3 OHMIOS						248
CARRERA 54 Y 55 X CALLE 52A			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.SIN TIERRA						248
CARRERA 53 X CALLE 53			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.SIN TIERRA						248
CARRERA 53 Y 54 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.15,96 OHMIOS						248
CARRERA 52 X CALLE 53			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.10,44 OHMIOS						248
CARRERA 50 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.1,77 OHMIOS						248
CARRERA 49 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 0,27 OHMIOS						248
CARRERA 47 Y 49 X CALLE 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. 0,98 OHMIOS						248
CARRERA 47 X CALLE 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.1,99 OHMIOS						248
CARRERA 46 X CALLE 50 Y 52			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.93,4 OHMIOS						248
CARRERA 46 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.28,00 OHMIOS						248
CARRERA 46 X CALLE 46 Y 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.3,29 OHMIOS						248
CARRERA 45 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.20,53 OHMIOS						248
CARRERA 43 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.39,92 OHMIOS						248
CARRERA 42 X CALLE 48			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.25,49 OHMIOS						248
CR 39 Y40 X CALLE 42 Y 50			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.14,29 OHMIOS						248
CARRERA 45 X CALLE 47			Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.00,88 OHMIOS						248
EQUIPO EN OBRA:									
Observaciones de Interventoría									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	05/12/2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Lunes						SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
William Chaves Nino		98681775	Jenifer Altamiranda		105298227	Alvaro Londo		9177777			
Juan Jose Roa		1000537976									
Franklin Bolban P.		16791906									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM		
Carrera 76 Calle 14 y 16	NEW	NS	Grupo 1 línea verde en corto.				8am		173		
			Retiro de 50 metros de cable 4x16 mal estado.						215		
			Suministro Instalación de cable 4x16 nuevo 59 metros						94		
			Construcción de empalmes en semáforos Vehículos X2						183		
			Retiro de soldadura de 3 capas de 50 x 50						262		
			Soldadura en 3 capas de 50 x 50						199		
			Retiro de control en mal estado.						199		
			Retiro de control en mal estado.						Epa 199		
EQUIPO EN OBRA:											
Escalera, Herramientas, Muros											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quen Patricia Barreneche							
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1					
						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA: 05-01-2026		TIEMPO		SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE	
DÍA: Lunes				LLUVIOSO		SI		SI			
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO	✓	NO		✓	NO
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Nelson Galeano		1039547832		Jesifer Altamiranda		1032482220		Alvaro Lopez		91775731	
Johan Ramirez		1015186403									
Luis Lozano		91452201									
DIRECCIÓN		COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
C157#54-1456-A		3-N		Demolicion Retiro de herraje de 50x50 Instalacion de herraje de 50x50 Apolo Suministro e instalacion de resuelzo en Navilla 3/8 cantida de 4 de formeu				08:30	04:00pm	187 13	
EQUIPO EN OBRA:											
Demolider, Planta, Herramienta Nuevo											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA								
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Quen Patricia Barreneche					
FIRMA			FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA: 05-01-2025 DÍA: Lunes VEHÍCULOS: 1 KN 701		TIEMPO SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X 2 horas	UNIFORMES SI ☒ CUMPLE NO ☐	SEÑALIZACIÓN SI ☒ CUMPLE NO ☐	ESCOMBROS SI ☒ CUMPLE NO ☐	
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Cesar Santos		1038806300	Alvaro Londoño		31775751		
Santiago Mesa		1000533792	Dany Rando		43068520		
Miguel Villagor		1018229762					
Yelson Cordero		1035861703					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
CR43A-43C			Sondeo y levantamiento			8-00	23:11
Calle L Sur			Instalación y retiro de 235m de cable				
Sin embargo			Nota: Por este costado norte el				
Norte			centro peatonal de la Calle L Sur				
			no hay continuidad de tubería por el				
			motivo se retira la carga para				
			instalar por el otro costado				
CR43A-43C			Sondeo y levantamiento				23:11
Calle L Sur			Suministro e instalación de 272m de cable				
CR43C-43D			Sondeo y levantamiento				23:11
Calle L Sur			Suministro e instalación de 210m de cable				
			Nota: Programar canalización nueva en				
			la CR43D el L Sur costado N-W en				
			adoguen. Afirm			16-55	
EQUIPO EN OBRA:							
Para 20 metros, Escala, Herramientas, etc.							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

CR 43A




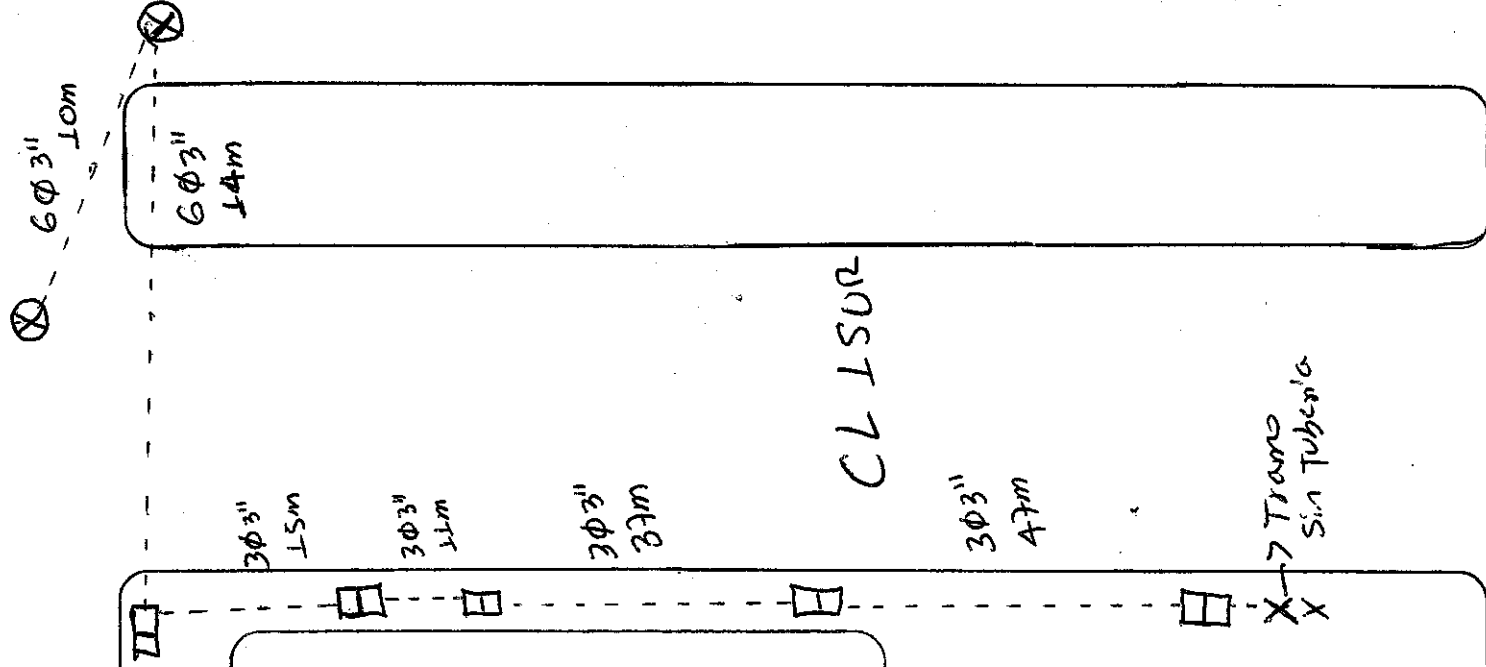
CR 43B

CR 43C

$3\phi 3"$ $10m$

CR 43A

CASINO



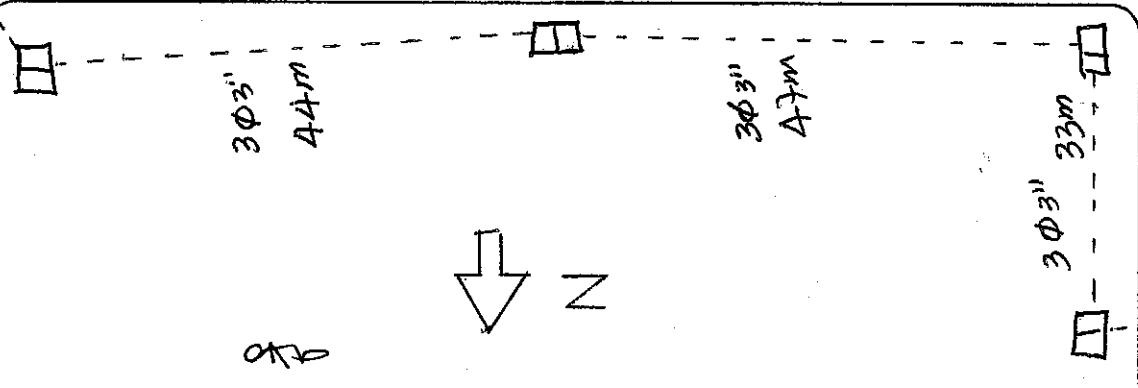
CR 43C

CL 150R

CR43C

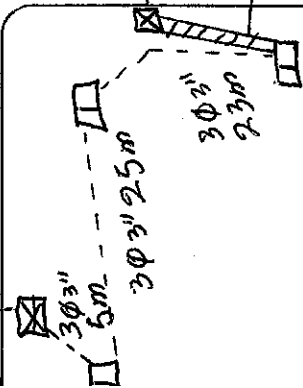




30 3" 7m



CR43D

30 3" 10m



PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001						
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1						
						ED: SEP 2025						
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN												
FECHA:	05/01/2026.	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE			
DIA:	Lunes		LLUVIOSO		X		SI		✓	SI	✓	
VEHÍCULOS:	W67 049.		DURACIÓN		1400-1700 H		NO			NO		
PERSONAL EN OBRA												
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA								
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA							
Juan Restrepo	71793497.			Alan Lugo	7177173							
Van Usga	1214729941			Amy Pantoja	43068550							
Jorge Rodriguez	PPT 1137342											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM				
CR 76 x C1130.	n.w.	e-w.	retiro de semáforo peatonal x 01 und.			0800.		172				
			retiro de cable 4x16 x 16 metros					173				
			instalación de cable existente 4x16 x 16 metros.					215				
			retiro de poste de enterramiento x 01 und.					168				
			Instalación de poste de enterramiento x 01 und.					206				
			Instalación de semáforo peatonal x 01 und.					208				
			Construcción de empalme x 01 und.					94				
	n.w.	s-u.	retiro de semáforo peatonal x 01 und					172				
			retiro de cable 4x16 x 08 metros.					173				
			instalación de cable existente 4x16 x 08 metros					215				
			retiro de poste de enterramiento x 01 und					168				
			Instalación de poste de enterramiento x 01 und.					206				
			Instalación de semáforo peatonal x 01 und.				1600	208				
			Construcción de empalme x 01 und.					94				
EQUIPO EN OBRA:												
Embarcadero, Planeta, Herramientas Manuales												
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA												
VERIFICACIÓN												
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA										
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALizó	APROBó										
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Guany Patricia Barreneche										
FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]	FIRMA [Firma]										
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria										

  		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
CONTRATO DE OBRA No. 4600105555 de 2025 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	08.01.2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	10/01/25				SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	WLY 897.				NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Jaime Cifuentes	71480675			Alvaro Londo	71777337				
Luis Usuga	71708197								
Alex Cañas	1036651089								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
ca 74x53	OC	OCOC	Retiro de 1 lámpara contadora mala de menzula instalación de 1 lámpara amarilla de 2da en menzula se hizo 1 empalmé			7 AM	10 AM	196 219 94	
ca 80x76		odos	Retiro de 120 mts de cable de fibra por daño en poste de energía instalación de 120 mts de cable de fibra quedaron recosidos en los postes para después ser instalados			12 AM	5 PM	173 215	
EQUIPO EN OBRA:									
Evaluación de elementos nuevos									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA						
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Queny Patricia Barreneche						
FIRMA	FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						

[illegible]

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001		
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:		6/01/2026		SECO		CUMPLE		
DIA:		Pleto		LLUVIOSO		SI		
VEHÍCULOS:		JYW772		DURACIÓN		NO		
PERSONAL EN OBRA								
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		
Christian Barbosa Yepes		1.151.966.785		Alvaro Londoño		91777777		
Juan Rog		1.000.537.976						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cx 73 x C147	N	E W	Se instala disco direccional (↑)			8:00		83
Cx 54 x C149	W	W E	Se direcciona semáforo vehicular			8:40	8:20	258
			Se direcciona semáforo peatonal				9:00	258
Cx 48 x C131	E	S N	Se retira modulo Amarillo chino 3			9:26		195
			Se instala modulo Amarillo Look y empalme				9:40	218
Cx 79aa x C144	N	W E	Se instala disco direccional (↑)			10:00	10:26	83
			Se retira disco direccional (↑)			10:25		179
Cx 78 x C144	S	W E	Se instala disco direccional (↑)				10:45	83
Cx 73 x C144	Separador	W E	Se instala disco direccional (↑)			11:00		83
	Separador	W E	Se instala disco direccional (↑)				11:30	83
Cx 65 x C144	Separador	W E	Se instala disco direccional (↑)					179
			Se instala disco direccional (↑)					83
EQUIPO EN OBRA:								
Observaciones, Herramientas, etc.								
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA								
VERIFICACIÓN								
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ		
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche		
FIRMA			FIRMA			FIRMA		
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria		


PLAN DE CALIDAD										SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO										VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025										ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA: 06-01-2026 DIA: Martes VEHÍCULOS:		TIEMPO SECO ☒ LLUVIOSO ☐ DURACIÓN		UNIFORMES SI ☒ NO ☐		CUMPLE SI ☒ NO ☐		SEÑALIZACIÓN SI ☒ NO ☐		CUMPLE SI ☒ NO ☐	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Yelson Galeano		1039597832						Alvaro Lozano		71775731	
Johan Ramirez		1015186405									
Luis Lozano		91452201									
TRABAJOS REALIZADOS											
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS						HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CL57#54-145	separador W	S-N	Demolicion						08:20	04:30	187
			Retiro de Herraje 50x50								
			Instalacion de Herraje 50x50 Apolo								
			SUMINISTRO Instalacion de Refuerza en Varilla 3/8 cantidad de 4 de 40cm 90								
			SUMINISTRO de Silicona 300ml								
CL57#54-145	W-E	S-N	DEMOLICION								187
			Retiro de Herraje 50x50								
			Instalacion de Herraje 50x50 Apolo								
			SUMINISTRO Instalacion de Refuerza en Varilla 3/8 cantidad de 4 de 40cm 90								
			SUMINISTRO de Silicona 300ml								
EQUIPO EN OBRA:											
Demolido, Plantas, Herramienta Menor											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA						RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ			REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango			NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Querly Patricia Barreneche					
FIRMA			FIRMA			FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia			CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

  		PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
RNV		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA: 06-01-2026		SECO		CUMPLE	
DÍA: Martes		LLUVIOSO		SI ✓	
VEHÍCULOS: 1 EA 701		DURACIÓN		NO	
TIEMPO		UNIFORMES		SEÑALIZACIÓN	
				SI ✓	
				NO	
				ESCOMBROS	
				SI ✓	
				NO	
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA		
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA
cesar santos		1038806300	Almir Lugo		91475331
Santiago Mena		1000533792			
Miguel Villegas		1018229962			
Yelson Cuervo		1035861703			
TRABAJOS REALIZADOS					
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	HORA INICIO		HORA FINAL
CR46CL32	S-W.		9-10		
Actividad Mantenimiento en acometida eléctrica					
Retiro de 8 cordones de soldadura a 2 toras			183		
de 60x80					
Retiro de 4 cordones de soldadura a 1 tora			183		
de cámara de energía de E.P.M.					
1cm 2.2cm en 1 caso de 60x80.			54		
Retiro de 12m cable encauchado 2x10			173		
sin ventosas en cables. Para reenfuego					
Suministro e instalación de 1cm de cable			80		
encauchado 2x10. para acometida eléctrica					
construcción de 1 empalme eléctrico en cámara			94		
de energía de E.P.M.					
Soldado de 4 cordones a 1 tora de cámara de			262		
energía de E.P.M.					
Soldado de 8 cordones a 2 toras de 60x80			13-00 262		
EQUIPO EN OBRA:					
Escaras, Herramientas Manos					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA	FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría			

[illegible]

CR430

CR45



1φ2"
32m



1φ2"
32m



1φ2"
32m



1φ2"
32m



1φ2"
32m



CL L5CR

26

CL L5CR
A3C-25


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	06 enero 2025	SECO	CUMPLE
DIA:	Martes	LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:	WL2049	DURACIÓN	NO
UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN	ESCOMBROS	CUMPLE
SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1244789941	Alonso Lugo	7177577
Fernando Torres	1028030487	Geny Barrio	4306850
Jorge Rodriguez	1137342		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
Carrera 7b	n-e	S-n	Retiro de semáforo peatonal
Calle 30			Retiro de poste de enterramiento
			Retiro de cable de control 06 metros
			Instalación de poste de enterramiento nuevo
			Reinstalación de semáforo peatonal
			Reinstalación de cable de control 06 metros
			Construcción de empalme eléctrico
	e-w	Depara	Retiro de semáforo peatonal 2 unids
			Retiro de semáforo vehicular a poste
			Retiro de disco direccional
			Retiro de poste de enterramiento
			Instalación de poste de enterramiento nuevo
			Retiro de cable de control 24 metros
			Reinstalación de semáforo peatonal 02 unids
EQUIPO EN OBRA:			
Escala, Deslizador, Placa, H. Mano			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Geny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

ACADEMIA DE MEDALLAS		UNION TEMPORAL BY MEDALLAS		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001		
CONSORCIO INT. E.A.R.O.L. MED 2025		REV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1		
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025								ED: SEP 2025		
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	06 enero 2025	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	W2049		DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		
Yan Carlos Usuga		1214729941				Alonso Linares		71775771		
Armas Forves		1028030487				Oney Paul		43008580		
Jorge Rodriguez		PPT 1137342								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Carretera Fbx	e-w	sepa	Reinstalación de semáforo vehicular						208	
calle 30			a poste							
			Reinstalación de disco direccional						220	
			Reinstalación de cable de control 24 metros						215	
			construcción de 3 empalmes eléctricos						94	
	w-e	s-e	Retiro de poste de enterramiento						168	
			Retiro de semáforo vehicular						172	
			Retiro de cable de control 105 metros						173	
			Nota: el cable queda en la caja de inspección					16:21		
			Debido a una fuga de agua en el momento de retirar el poste, no se puede instalar el nuevo, se hace el reporte a EPM							
EQUIPO EN OBRA:										
Escalera, H. Menos, Resaca, Planta										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ						
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Oney Patricia Barreneche						
FIRMA		FIRMA		FIRMA						
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría						

[illegible]

PLAN DE CALIDAD		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		SIT-SGC-T-001 VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4800105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4800105555 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	21-12-2025 al 06-01-2026	SECO		CUMPLE	
DÍA:		LLUVIOSO		SEÑALIZACIÓN	
VEHÍCULOS:	ESQ 669	DURACIÓN		ESCOMBROS	
PERSONAL EN OBRA					
CONTRATISTA			INTERVENTORIA		
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadizco.	13.461.111			Alvaro Lopez	27777771
Leon Oquendo	15.485.477			Ruy Paula	43068550
José Pérez	PPT 5.240.599				
Leonel Rivera.	PPT 4.350.315				
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO	HORA INICIO	HORA FINAL
CR 65 x C11 50	N-E	S-M	Retiro herraje 60x60cm		187
			Instalación herraje de tapa de 60x60cm nuevo.		13
			Remoción de Tapa en concreto 50x50cm.		1
			Retiro herraje sin Tapa.		188
			Limpieza de caja de 50x50cm.		54
			Instalación herraje de tapa de 50x50cm nuevo.		13
			Construcción de base de controlador.		33
			Construcción canalización en ariete 102" x 1,10m.		28
			Construcción canalización en ariete 203" x 2,30m.		
			Construcción canalización en ariete 303" x 1,20m.		
	W	N-S	Construcción de caja 60x60cm + 01 und.		35
			Construcción de canalización en ariete 102" x 1,80m.		28
			Construcción de canalización en ariete 203" x 1,50m.		
	W	S-M	Retiro de herraje de 60x60 cm.		187
			Instalación herraje de Tapa 60x60cm. nuevo.		13
			Limpieza de caja		54
	W	N-S	Instalación de herraje de 60x60		13
	W	E-W	Construcción de la caja 60x60cm + Instalación herraje 60x60		35-13
EQUIPO EN OBRA:					
Desvelador, Planta, H. Mano					
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA					
VERIFICACIÓN					
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA			
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Juan Patricia Barreneche			
FIRMA	FIRMA	FIRMA			
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría			


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	7/1/26	SECO	X
DIA:	Miércoles	LLUVIOSO	
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	
UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
	SI	SI	SI
	NO	NO	NO
ESCOMBROS	CUMPLE		
SI			
NO			
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Yape		Alvaro Londoño	31775731
Juan Roa		José Cortes	1090727131
Rosa Andrade		Jonathan Ronder	1036962270
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* 666B x C 20	Separada	E W	Se retira semáforo vehicular
			Se retira semáforo peatonal
			Se retira 8 metros de cable 4x18
			Se retira disco direccional
			Se retira poste de antenamiento
			Se instala poste de antenamiento (nuevo)
			Se reinstala cable 4x18 x 8 metros
			Se reinstala semáforo vehicular
			Se reinstala semáforo peatonal
			Se reinstala disco direccional
			Se realiza 2 empalmes
	E	S N	Se retira semáforo vehicular
			Se retira disco direccional
			Se retira 4 metros de cable 4x18
			Se retira retira poste de antenamiento
			Se instala poste de antenamiento (nuevo)
			Se reinstala cable 4x18 x 4 metros, semáforo vehicular y disco direccional
			Se realiza 1 empalme EQUIPO EN OBRA:
			Planta eléctrica, pulidora, motomartillo, herramienta menor
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
Se verifican app, señalización, cambiar Postes de Tapp Bornera o que no estén galvanizados!			
Favor Simular Cruzando no se tenga repetición.			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Quany Patricia Barreneche	
FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

<div><div>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</div><div>UNIDAD TRANSACCIONAL DE MANTENIMIENTO</div></div>		PLAN DE CALIDAD					SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025					VERSIÓN 1			
							ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA: 4-01-2026		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	☒	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA: MIÉRCOLES						SI		SI		SI
VEHÍCULOS:						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA						
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Nelson Galvano		1039597832					Jonathan Rindua		1038962270	
Luz Lozano		97452201					Joscelys		1090727131	
Jhain Romero		1015186405								
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
G46xCI47	N-S	W-E	Retiro de poste de sonorizador peatonal				08:00	09:30	168-	
G46xCI48	W-E	N-S	Retiro de poste de sonorizador peatonal						168-	
G46xCI48	N-S	W-E	Retiro de poste de sonorizador peatonal						168-	
G46xCI46	W-E	S-N	Retiro de poste de sonorizador						168-	
	N-S	W-E	Retiro de sonorizador peatonal						176-	
EQUIPO EN OBRA:										
Planta eléctrica, todos los materiales, pulido y mantenimiento menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
Se verificó el estado de la obra, se observó que la obra está bien ejecutada										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA			RESPONSABLE INTERVENTORÍA							
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ							
NOMBRE: María Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Oney Patricia Barreneche							
FIRMA: 	FIRMA: 		FIRMA: 							
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría							

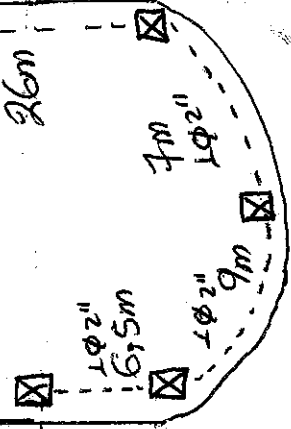
PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 07-01-2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: Miércoles		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS: 1511 241		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	CUMPLE
			SI
			NO
		SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
			SI
			NO
		ESCOMBROS	CUMPLE
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Senter	1039806300	Alfonso Lopera	71777777
Santiago Mena	1000533792	Any Paez	4306855
Miguel Villegas	1618229962		
Yelson Cañal	1035861703		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
			Calle Lsur #43C-281 y CR 48 CL Lsur
			Sondeo y levantamiento
			Suministro e instalación de 167m de
			Cable
			Nota: Programar la reposición de 3
			hormas de 5050 en la CR 48 CL Lsur
			en el semáforo central.
			10-50
			CR 34-35
			Sondeo y levantamiento.
			Suministro e instalación de 160m de
			Cable.
			Nota: Programar cancelación en zona verde
			y andén en la CR 34 TV inferior CL
			16A510 motivo en un tramo solo existe
			un tubo de 1" y por ese tubo no
			caben los 3 cables de fibra óptica
			que están programados para instalarse.
			16-55
EQUIPO EN OBRA:			
Pera 200 metros, H. Mena			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORIA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	



270



202" 10m



102" 26m

102" 30m



31m

102"



102"

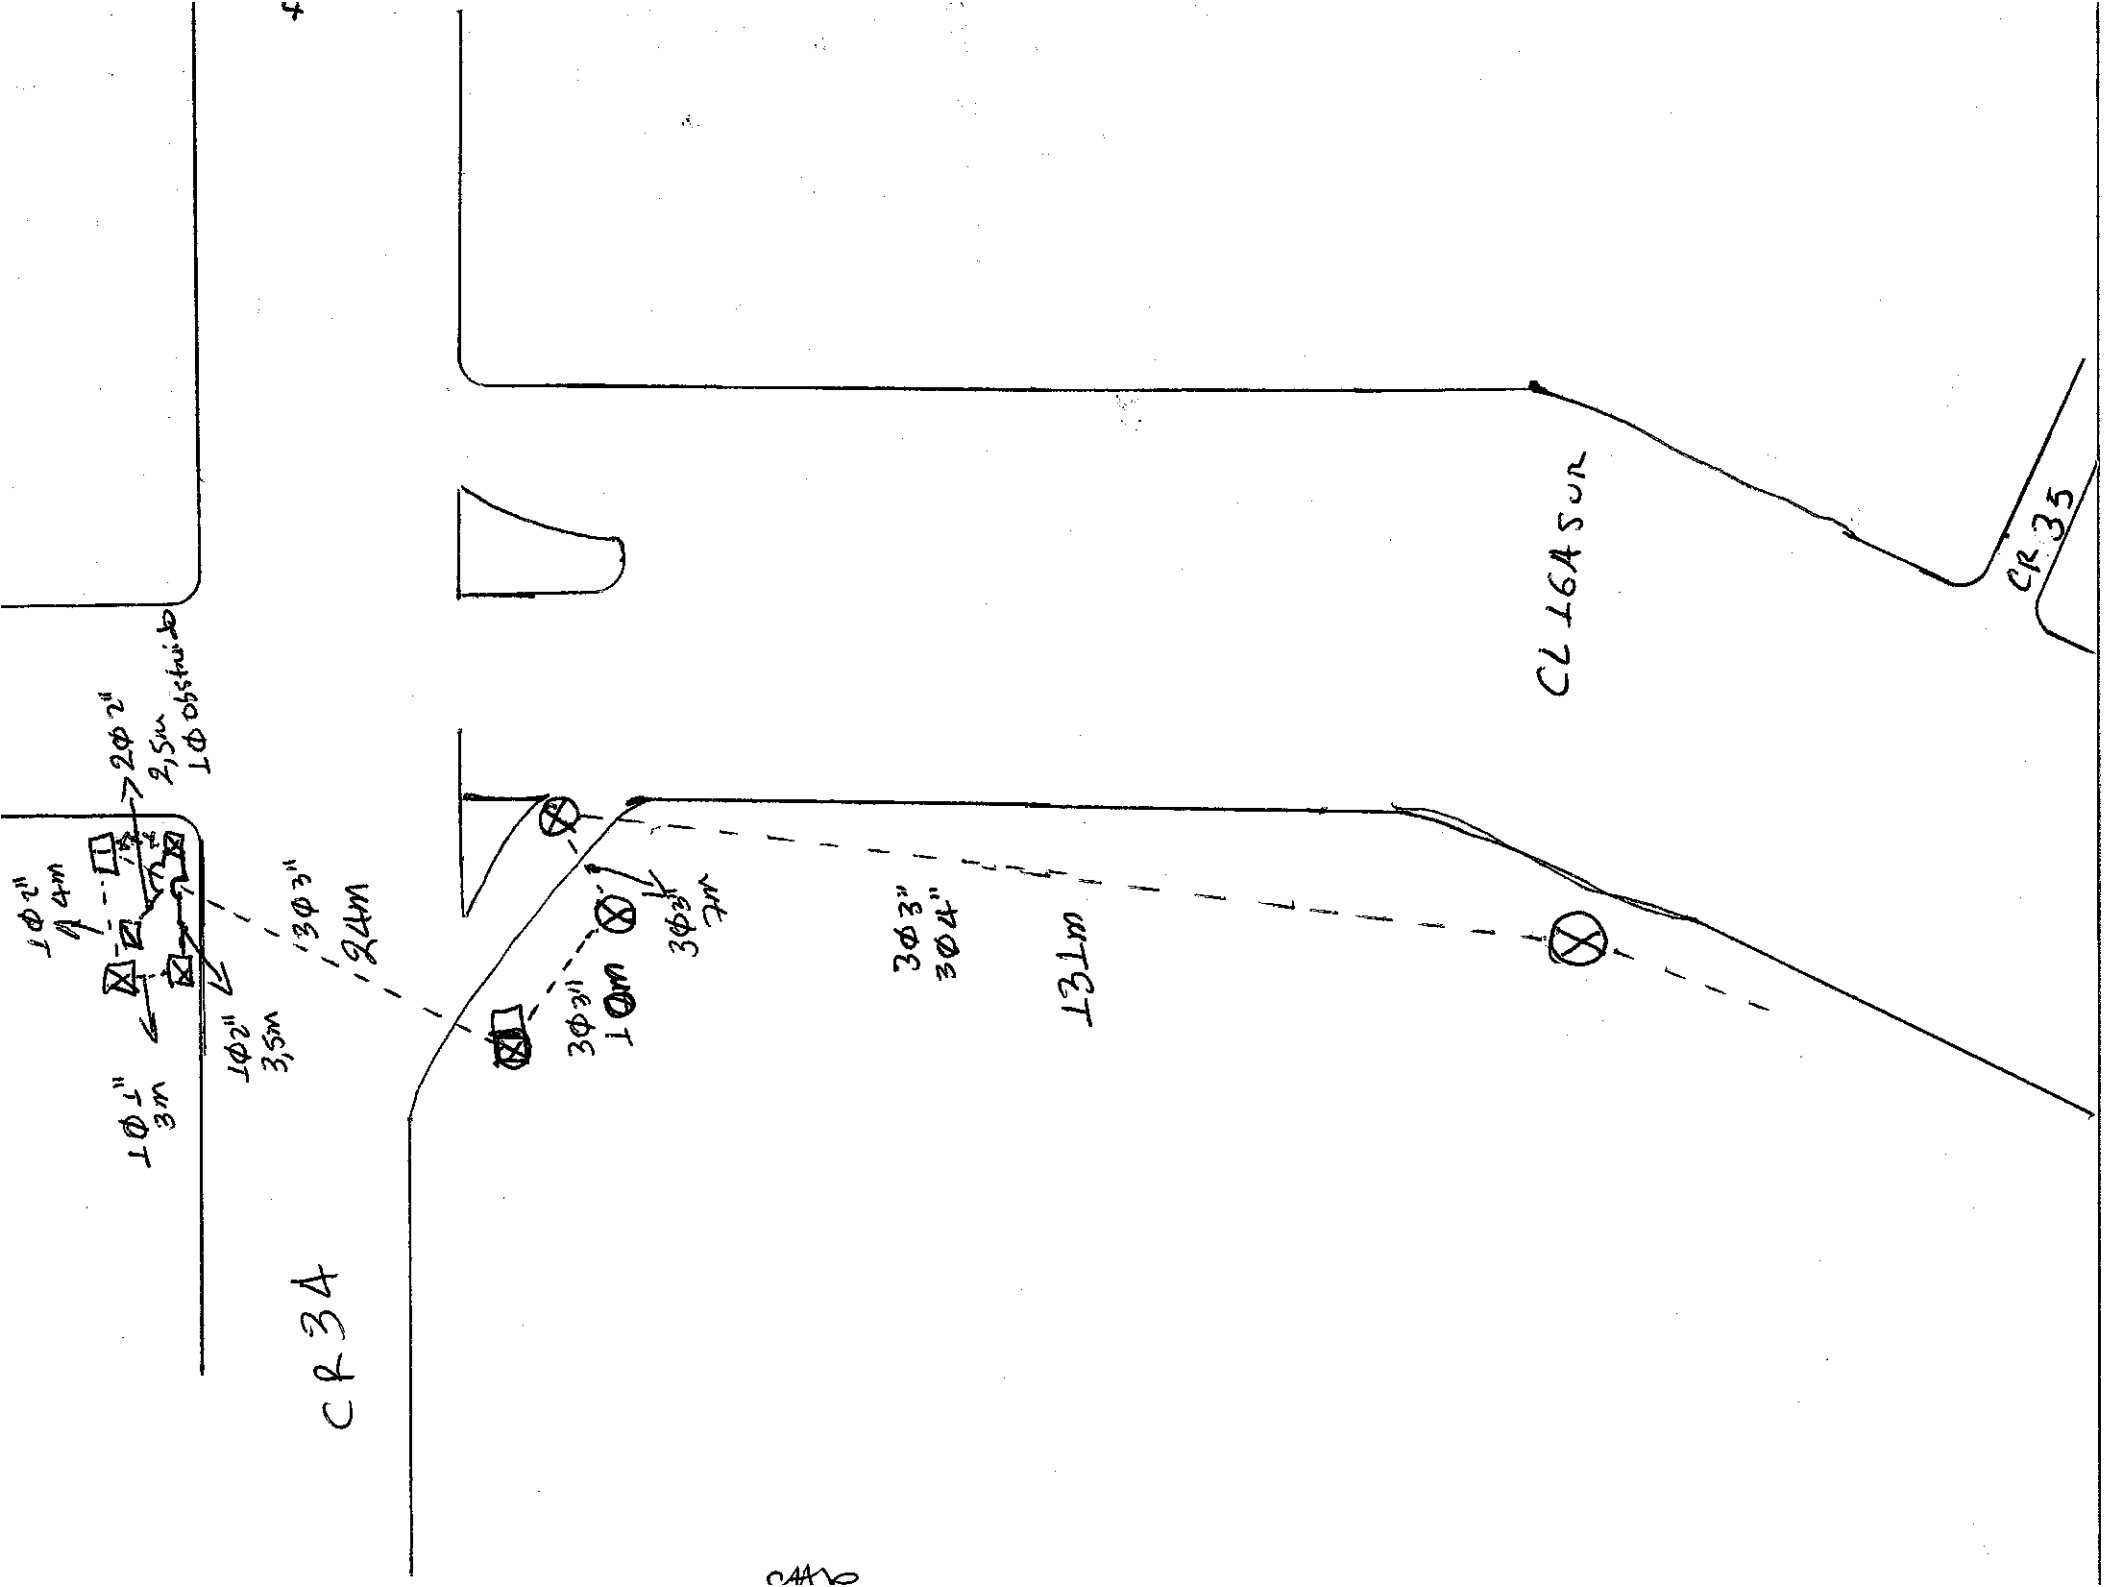
31m

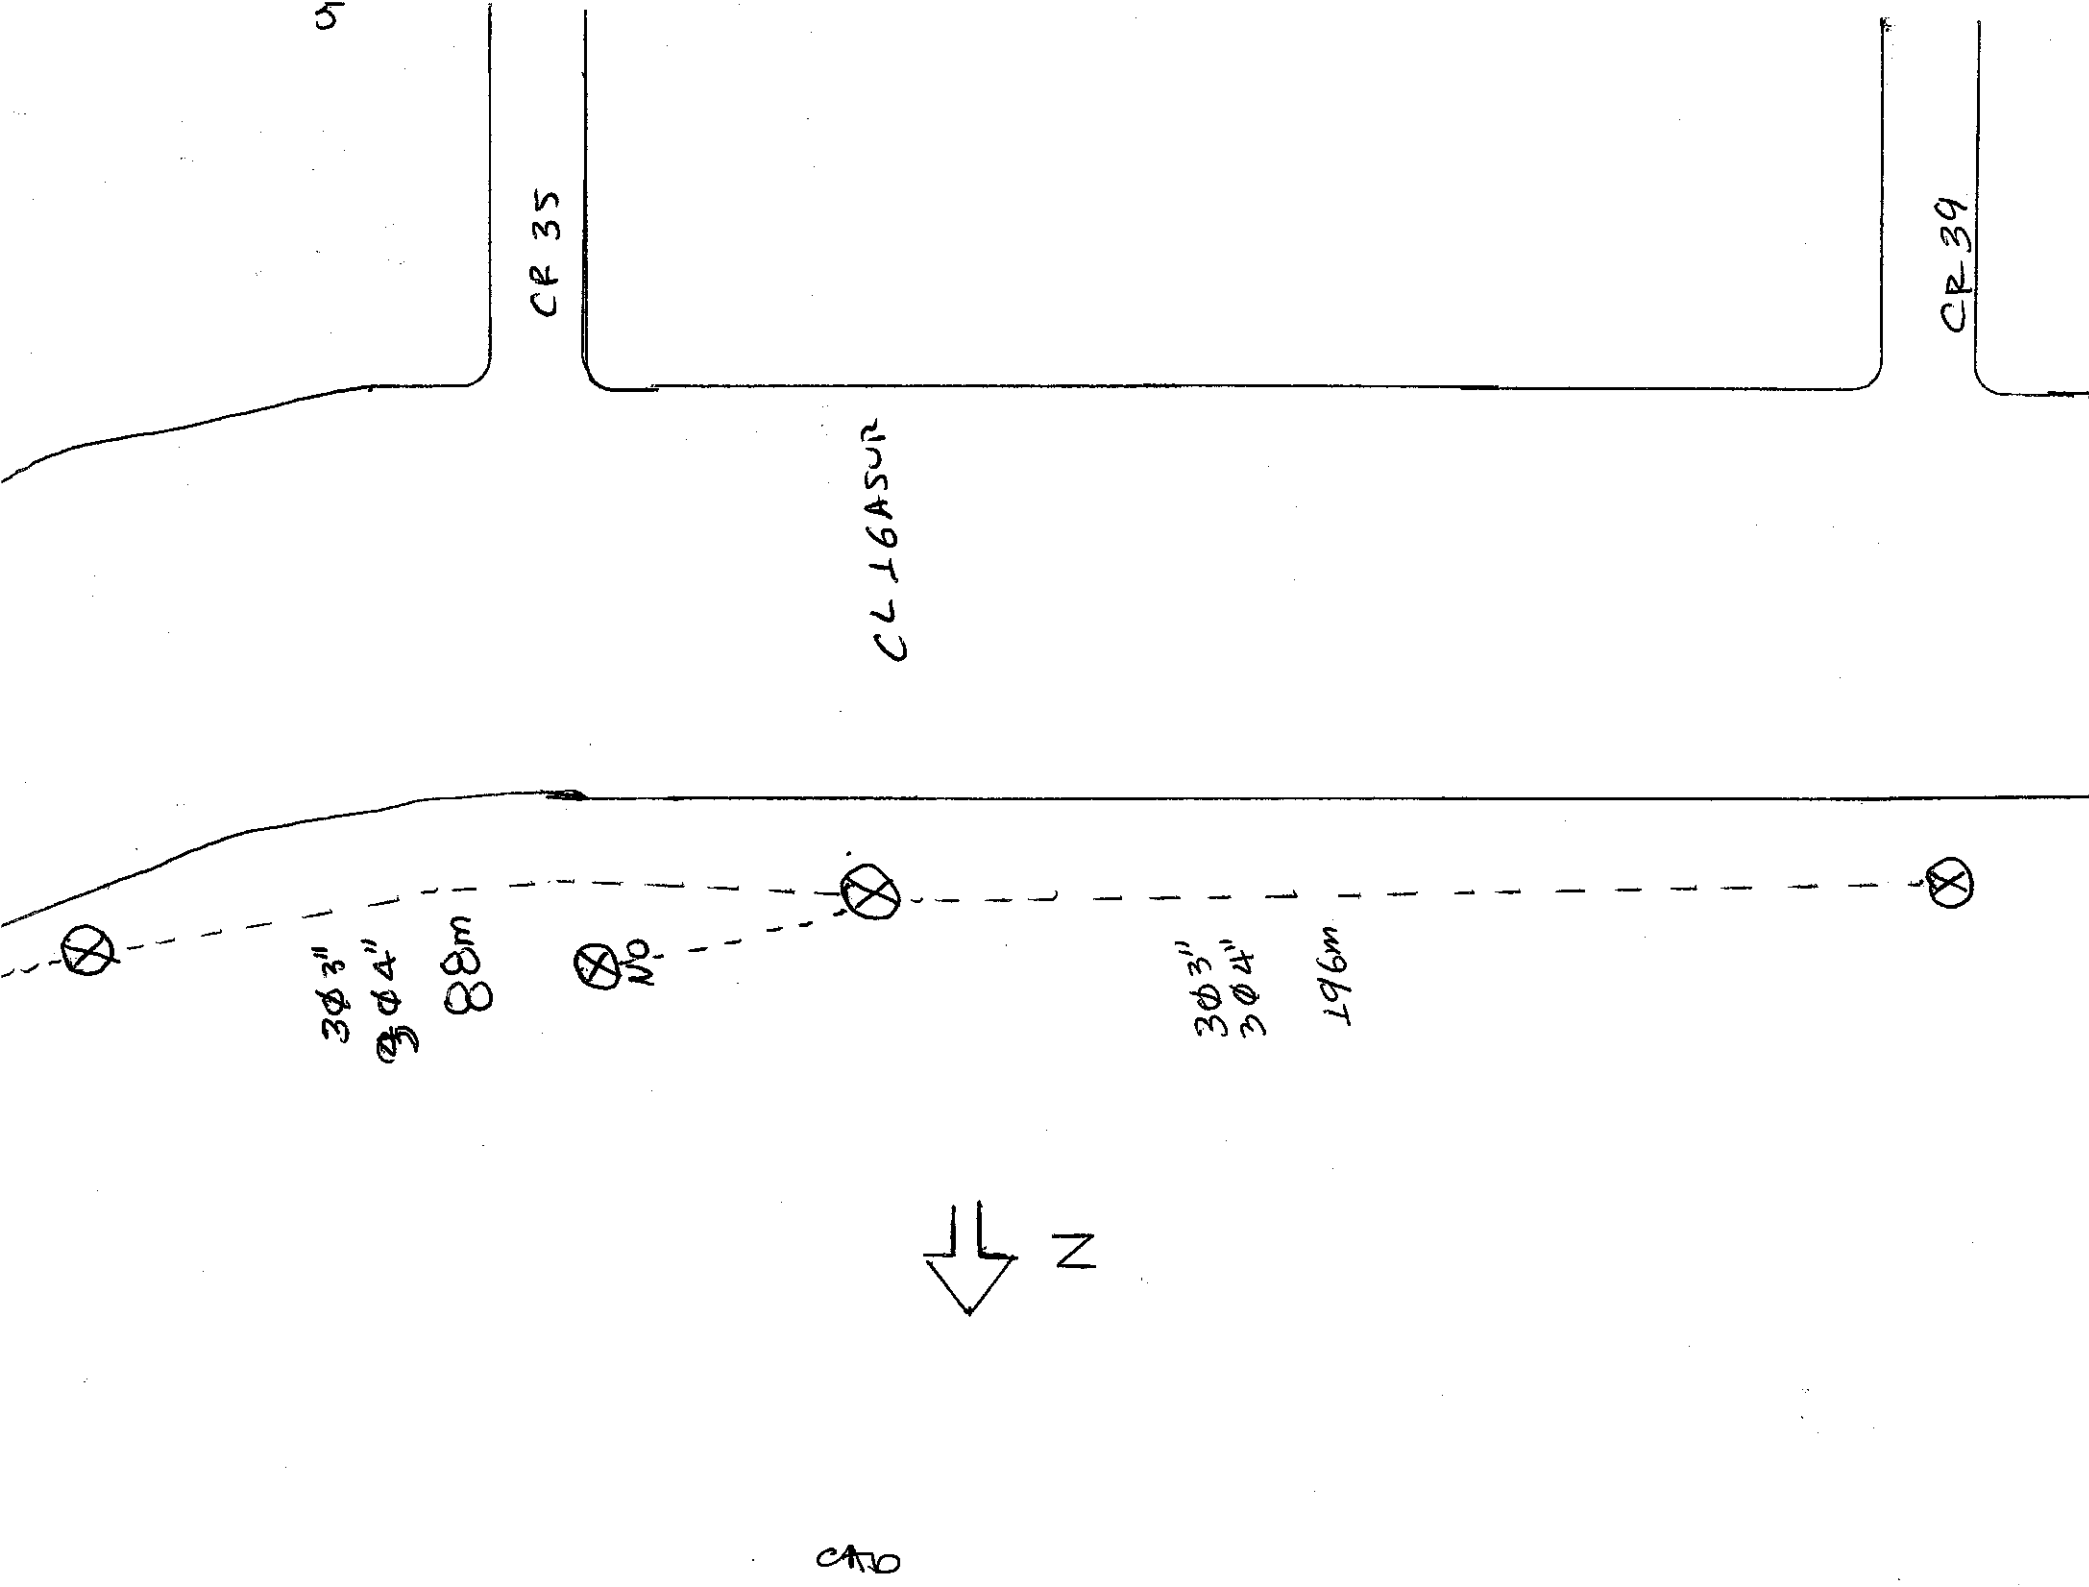



CL 1500

CL 1500
48C-200

CR 48







 CONSORCIO INEPAOL MED 2025		 UNION TEMPORAL CITY MEDELLIN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001																					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO								VERSIÓN 1																					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025								ED: SEP 2025																					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN																													
FECHA: 07/07/2026		DÍA: Miércoles		VEHÍCULOS:		TIEMPO		SECO LLUVIOSO DURACIÓN		✓		UNIFORMES		CUMPLE SI ✓ NO		SEÑALIZACIÓN		CUMPLE SI ✓ NO		ESCOMBROS		SI ✓ NO							
PERSONAL EN OBRA																													
CONTRATISTA												INTERVENTORÍA																	
NOMBRE						CÉDULA						NOMBRE						CÉDULA											
Luis Fernando G. A						7.070804034												Alvaro Lugo						3177777					
Juan Carlos Urrutia						12.74729947												Diego David						43068550					
Ernesto Torres						7028030487																							
DIRECCIÓN		COSTADO		SENTIDO		TRABAJO REALIZADO										HORA INICIO		HORA FINAL		ITEM									
CR 66 N. 5 LII						Suministro instalación de 422 mt de cable UTP.										9 AM				110									
3019.						Contratación de 2 her palm en cable utp y cable telefonico de 70 pares.														94									
						Suministro instalación de 70 pda puentes												5:40		98									
						Informativa semafórica.																							
EQUIPO EN OBRA:																													
Revis, H. Muro																													
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA																													
VERIFICACIÓN																													
RESPONSABLE CONTRATISTA												RESPONSABLE INTERVENTORIA																	
ELABORÓ						REVISÓ/ACTUALIZÓ						APROBÓ																	
NOMBRE: Maria Victoria Durango						NOMBRE: Carlos Alberto Diaz						NOMBRE: Queny Patricia Barreneche																	
FIRMA						FIRMA						FIRMA																	
CARGO: Auxiliar de Residencia						CARGO: Residente de Obra						CARGO: Residente de Interventoría																	

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						VERSIÓN 1					
						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:		07/01/2026.		TIEMPO		SECO X		UNIFORMES		CUMPLE SI ✓ NO	
DÍA:		miércoles								SEÑALIZACIÓN SI ✓ NO	
VEHÍCULOS:		ESQ 669.								ESCOMBROS SI ✓ NO	
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA						INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Eberto Cadizco.		13461111		Jorge Rodriguez		ppt. 1137 342.		Alvaro Hudson		71737431	
Leon Osando		15485477						Quey Bander		43068525	
Jose Perez		ppt 5240599									
Gustavo Riera		ppt 4350715.									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR 65A C/150	SE	S-U.	retiro herraje metalico 4 tornillos 50x50cm. limpieza de caja 50x50 instalacion herraje con tapa nuevo 50x50cm.					0800		187 54 13	
	E	N-S	Retiro herraje metalico 2 tornillos 50x50cm. limpieza de caja 50x50. Instalacion herraje con tapa nuevo 50x50cm.							187 54 13	
	U.	W-E	Retiro herraje en Tapa en concreto 60x60cm. limpieza de caja 60x60cm. Instalacion herraje con tapa nuevo 60x60cm							187 54 13	
			Se realizan Acabados y se botan Escombros.						1500.		
EQUIPO EN OBRA:											
Remolcado, Planta, H. Mano,											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA							
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALizó		APROBó							
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quey Patricia Barreneche							
FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]							
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria							

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	7 Enero 2026	TIEMPO	SECO
DIA:	Miércoles		LLUVIOSO
VEHÍCULOS:	WU 897		DURACIÓN
		UNIFORMES	CUMPLE
		SI	SEÑALIZACIÓN
		NO	CUMPLE
		SI	ESCOMBROS
		NO	CUMPLE
		SI	
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jaime Cifuentes	71.480.675	Alvaro Londoño	71.771.771
Alex Caras	1.036.651.039		
Luis Fernando Usuga	71.708.197		
TRABAJOS REALIZADOS			
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	ITEM
Carretera 76 x	Separación	W-E	172
calle 30	Central		172
			179
			173
			168
			206
			208
			208
			220
			215
			94
EQUIPO EN OBRA:			
Desplazados, Plantas, H. Menor			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Juan Patricia Barreneche	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	


PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA:	08 01 2026	SECO	
DIA:	Jueves	LLUVIOSO	x
VEHÍCULOS:	MTN 502	DURACIÓN	1 hora
UNIFORMES		CUMPLE	
		SI	✓
		NO	
SEÑALIZACIÓN		CUMPLE	
		SI	✓
		NO	
ESCOMBROS		CUMPLE	
		SI	✓
		NO	
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Babasa	16791906	Alfonso Londo	7177555
1013 10200	91452201	Quiro Bando	43068550
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
* Carrera 65	NW	NS	Revisión de lampara ciclista
Calle 50			Retiro de lampara roja en mal estado
			retiro de lampara verde en mal estado
			Instalacion de lampara roja nueva y suministro
			Instalacion de lampara verde nueva y suministro
			Construccion de empalmes x2
* Carrera 43A	SE	SN	Revisión de lamparas Peatonales
Calle 30			Retiro de lampara roja en mal estado Peatonal
			Instalacion de lampara roja nueva peatonal suministro
			Construccion de Empalme
	SE	SN	Retiro de Contraste en mal estado
	Separador	SN	Retiro de Contraste en mal estado
	Separador	NS	Retiro de Contraste en mal estado
	NW	NS	Retiro de Contraste en mal estado
EQUIPO EN OBRA:			
Eroslen, H. Muro			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Query Patricia Barreneche	
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

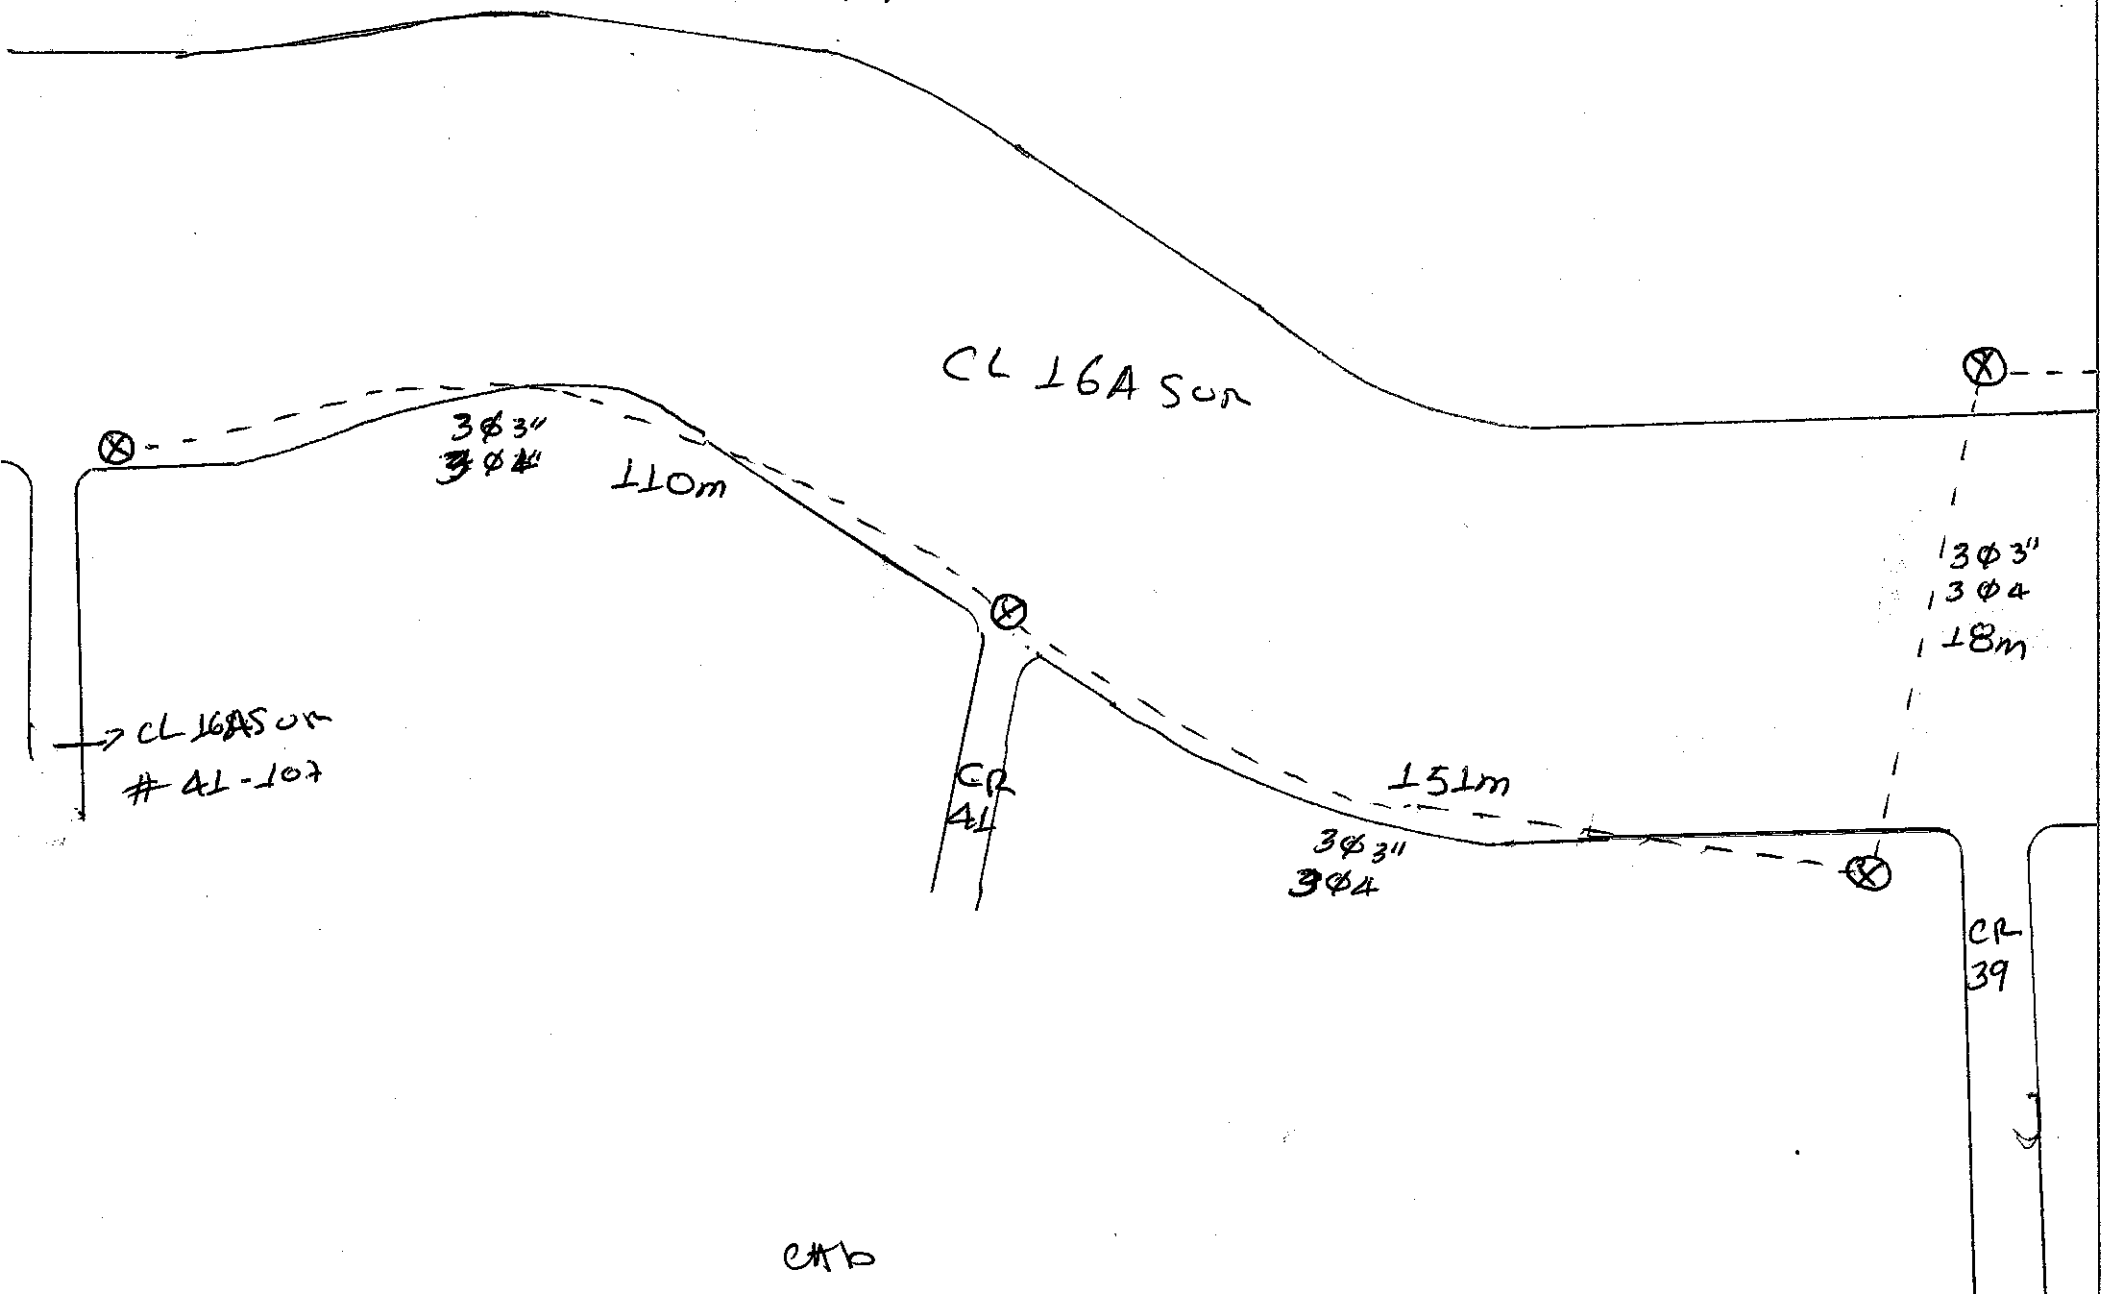
 MUNICIPIO DE MEDELLÍN		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN								
FECHA:	8/1/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	
Christian Burbules Yapas	1.151.966.785			Jose cortes	1098727131					
Juan Roa				Diego Paul	45068550					
Jose Andrade										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Cr 66Bx C130	N S	WE	Se retira semáforo peatonal						172	
			Se retira 8 metros de cable 4X18						173	
			Se retira poste de enterramiento						168	
			Se instala poste de enterramiento (nuevo)						206	
			Se reinstala 8 metros de cable 4X18						215	
			Se reinstala semáforo peatonal						208	
			Se realiza 1 empulme						94	
	W	NS	Se retira semáforo peatonal						172	
			Se retira semáforo ciclista						172	
			Se retira 10 metros de cable 4X18						173	
			Se retira poste de platina						169	
			Se instala poste de platina (nuevo)						205	
			Se reinstala 10 metros de cable 4X18						215	
			Se reinstala semáforo peatonal						208	
			Se reinstala semáforo ciclista						208	
			Se realizan 2 empulmes						94	
			Se instala 10 metros de cable 4X18 (nuevo)						215	
EQUIPO EN OBRA:										
Planta eléctrica, Martillo demolidor, pulidora, herramienta menor										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA										
Se verifica señalización, EPP.										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Jenny Patricia Barreneche					
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					


2

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001			
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1			
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA: 8/1/26		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA: Jueves	SI /				SI ✓				
VEHÍCULOS:	NO				NO				
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA				
Christian Burbosa Lopez				Shirley Londoño	71775777				
Juan Paez									
José Andrade									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CL 66B x CL 30	N	N S	Se realiza cambio de tapa de concreto por herrajes					1	
			Se instala tapa de concreto					54	
			Se realiza perforación y limpieza					13	
			Se instala herraje de 50x50					94	
			Se realiza concreto						
			Se realiza un enpulme						
	N	E W	Se realiza reposición de caja 50x50 de 10x70x10					18	
EQUIPO EN OBRA:									
Plata, Herrajes, H. Mano									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORIA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ					
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Quen Patricia Barreneche					
FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]		FIRMA [Firma]					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoria					

PLAN DE CALIDAD						SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN							
FECHA:	08-01-2026	TIEMPO	SECO		CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DÍA:	JUEVES		LLUVIOSO		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN		NO		NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Nelson Galeano	1039547832			Jose cortes	1048723131		
William Choverre	1015186405						
William Ramirez	1015186405						
William Choverre	18681775						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO			HORA INICIO	HORA FINAL
669BXC1130	S-N	E-W	Retiro de contraste				
			Retiro de semáforo Vehicular			08:15	03:30
			Retiro de disco direccional				
			Retiro de 3mts de cable semaforico				
			Retiro de poste recto de enterramiento				
			Instalación de poste recto de enterramiento				
			Reinstalación de 3mts de cable semaforico				
			Reinstalación de semáforo Vehicular				
			Reinstalación de disco direccional				
669BXC1130	N-S	W-E	Retiro de semáforo Vehicular				
			Retiro de contraste				
			Retiro de disco direccional				
			Retiro de cable semaforico 3mts				
			Retiro de poste de enterramiento (recto)				
			Instalación de poste de enterramiento				
			Reinstalación de 3mts de cable semaforico				
			Reinstalación de semáforo Vehicular				
			Reinstalación de disco direccional				
pulidora, planta electrica, martillo demolidor, herramienta menor							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz		NOMBRE: Deny Patricia Barreneche			
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	08-01-2026	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	JULIO		LLUVIOSO		SI	SI	SI		
VEHÍCULOS:	1 KN 700		DURACIÓN		NO	NO	NO		
			2 horas						
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA
Cesar Santos		1039806300					Alvaro Linares		31777771
Santiago Mesa		1000533292					César Paul		4306850
Miguel Villalaz		1018229962							
Yuliana Cortés		1035861703							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Carrera 39-CL 16A Sur y CL 16A Sur #41-107.				9-00		237
			Sondeo y levantamiento						
			Suministro e instalación de 292m de						
			Cableado					10-15	
			Calle 16A Sur #41-107 y CR 43A CL 16A Sur				10-20		237
			Sondeo y levantamiento						
			Suministro e instalación de 294m de						
			Cableado						
			Nota: Entre la CL 16A Sur #41-107 y						
			CR 42 CL 16A Sur						
			Se encuentran 4 tubos obstruidos tras						
			varios intentos por diferentes tubos						
			no es posible pasar la perla.						
			Entre CR 42-43A CL 16A Sur. Se encuentran						
			3 tubos obstruidos tras varios intentos						
			por pasar la perla de fibra fue posible					16-50	
			pasar e instalar la Cableado.						
EQUIPO EN OBRA:									
Perez, H. Mario									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz			NOMBRE: Query Patricia Barreneche				
FIRMA: 		FIRMA: 			FIRMA: 				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría				





CL 16A sum

3 ϕ 4
3 ϕ 3"

136m
3 ϕ Obstruider

6 ϕ 3"
11m

3 ϕ 2"
1m

2 ϕ 2"
3m

CR 43A


CR 42

3 ϕ 3"
3 ϕ 4" 135m
4 ϕ Obstruider


CL 16A sum #
AL-103


210

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001	
CONSORCIO INT. EABOL MED. 2025		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1	
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN					
FECHA:	08/01/2026	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE
DIA:	Jueves				SI		SI
VEHÍCULOS:					NO		NO
PERSONAL EN OBRA							
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA		
Luis Fernando G. A.	7.070804074			Alonso J. L.	71775271		
Yan Carlos Leizaola	7.214729947						
Ernesto Torres	7.028030487						
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS			HORA INICIO	HORA FINAL
* CRU3XC1155H		OCOR	Revisión de cableado de comunicación.			8 10	
La CRU7C1155	SUR		Se encuentra cortado y se				
			suministran 75 mt de cable UTP.				110
			Se hacen dos empalmes en cable UTP. en			8 30	94
			Cajón de 60x80.				
* CR52XC117			Revisión de cableado de comunicación.			8 55	
SUR hasta CR52			Suministro instalación de 770 mt de cable.				110
x C1172			UTP. desoldada de una caja de 50x50				183
			Construcción de dos empalmes telefónico.				94
			Desconstrucción de una caja de 50x50				1
			Construcción de una caja de 50x50.			4 45	263
EQUIPO EN OBRA:							
Pienso H. Muro							
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA							
VERIFICACIÓN							
RESPONSABLE CONTRATISTA				RESPONSABLE INTERVENTORÍA			
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ		APROBÓ			
NOMBRE: María Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Díaz		NOMBRE: Geny Patricia Barreneche			
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 			
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra		CARGO: Residente de Interventoría			

   		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001					
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO						VERSIÓN 1					
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025						ED: SEP 2025					
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN											
FECHA:	08/01/2026.		TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves.						SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	E36669.						NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA											
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA							
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA			
Eberto Cadizco.		13461.111				Alma Lina		7177777			
Leon Oquendo		15485.477									
Jorge Rodriguez		11137.342									
Jose Perez.		51240.549									
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS					HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
CR 39XC1158	E	J-M	Vaceado base controlador					0800		33	
			Retiro de 01 herraje con tapa concreto							187	
			Remoción de 01 Tapa 50x50cm.							1	
			Limpieza de caja x 01 und.							54	
			Instalación de 02 herrajes nuevos con tapa.							13	
			Construcción canalización 0,5m 3x3"						1700.		
EQUIPO EN OBRA:											
Derechos, Platos, A. Muebles											
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA											
VERIFICACIÓN											
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA									
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ				APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz				NOMBRE: Cheny Patricia Barreneche					
FIRMA		FIRMA				FIRMA					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra				CARGO: Residente de Interventoría					

PLAN DE CALIDAD		SIT-SGC-F-001	
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO		VERSIÓN 1	
Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025		ED: SEP 2025	
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN			
FECHA: 08-01-2026	TIEMPO	SECO	CUMPLE
DIA: JUEVES		LLUVIOSO	SI
VEHÍCULOS:		DURACIÓN	NO
		UNIFORMES	SEÑALIZACIÓN
			CUMPLE
			SI
			NO
			ESCOMBROS
			SI
			NO
PERSONAL EN OBRA			
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
JACME CIFUENTES	21480675	Alvaro L. L.	3177737
ALEX CAJAS	1.036.651.059	Emy Bando	43083580
LEONAR RIVERA	PPT 4.350.715		
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS
ca 76x30A	or	S-N	RETIRO DEL SEMAFORO PEATONAL 10 mts de cable de control 1 poste recto
			instalacion de 1 poste recto nuevo
			reinstalacion de 1 semaforo peatonal
			10 mts de cable de control galloso 1 empalme
			galloso cambiando en Adoquin 50x50
			el poste tenia 30x30x60 en concreto estaba muy duro de retirar demolicion con taladro demolidor
ca 76x30			SE RETIRARON 5 placas de contraste
ca 76x30A			SE RETIRARON 2 placas de contraste
ca 76x31			SE RETIRARON 4 placas de contraste
EQUIPO EN OBRA:			
Eusebio, H. Maso -			
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA			
VERIFICACIÓN			
RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA	
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ	
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría	

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001				
 		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1				
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025				
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN										
FECHA:	9/1/26		TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes			LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:				DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA										
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA					
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA		NOMBRE		CÉDULA	
Christian Burbosa							Alonso Lopera		21777771	
Juan Roa										
Franklin Burbosa										
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADO				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM	
Cr. 52 x C182	W	NS	Se instalan 2 discos peatonales (↑)				8:00		83	
	E	NS	Se instalan 2 discos peatonales (↑)						83	
			Se instala disco direccional (↑)						83	
	N	EW	Se instala disco direccional (↑)						83	
	S	EW	Se instala disco direccional (↑)					12:00	83	
	W	NS	Se retira modulo rojo y verde peatonal				1:00		195	
			Se instala modulo rojo y verde peatonal						218	
	E	NS	Se retira modulo amarillo y verde chinas 3						195	
			Se instala modulo amarillo y verde leotek						218	
	W	NS	Se retira modulo rojo, amarillo y verde chinas 3						195	
			Se instala modulo rojo, amarillo y verde leotek						218	
	E	NS	Se retira modulo rojo, amarillo y verde chinas 3						195	
			Se instala modulo rojo, amarillo y verde leotek						218	
			Se realiza 4 empalmes					4:00	94	
EQUIPO EN OBRA:										
Cronometro, H Mms,										
OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA										
VERIFICACIÓN										
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORÍA					
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ					
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche					
FIRMA 		FIRMA 			FIRMA 					
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoría					

 		PLAN DE CALIDAD				SIT-SGC-F-001			
CONSORCIO INT. FAROL MED 2025 RIV		REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO				VERSIÓN 1			
		Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025				ED: SEP 2025			
NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN									
FECHA:	09-01-2020	TIEMPO	SECO	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DÍA:	Viernes		LLUVIOSO		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	1 KUN 741		DURACIÓN		NO		NO		NO
PERSONAL EN OBRA									
CONTRATISTA					INTERVENTORÍA				
NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	NOMBRE		CÉDULA	
CaSov Santos		638806300				Alina Londo		7777777	
Santiago Mena		1000533782							
Miguel Villegas		1018227962							
Yelson Cordero		1035861703							
DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJO REALIZADOS				HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
* CR29A-29C			Sondeo y levantamiento				8-40		237
Calle SSUR			Suministro e instalación de 172m de cable						
CR29C-CLSSUR			Sondeo y levantamiento						237
CLSSUR#29d-55			Suministro e instalación de 170m de cable						
CLSSUR#29d-55			Sondeo y levantamiento						237
CR32CLSSUR			Suministro e instalación de 196m de cable				14-30		
EQUIPO EN OBRA:									
Hernan, A. Muro									
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA									
VERIFICACIÓN									
RESPONSABLE CONTRATISTA					RESPONSABLE INTERVENTORIA				
ELABORÓ		REVISÓ/ACTUALIZÓ			APROBÓ				
NOMBRE: Maria Victoria Durango		NOMBRE: Carlos Alberto Diaz			NOMBRE: Queny Patricia Barreneche				
FIRMA		FIRMA			FIRMA				
CARGO: Auxiliar de Residencia		CARGO: Residente de Obra			CARGO: Residente de Interventoria				

CR 29A

2 ϕ 2"
3m

2 ϕ 2"
10m

1 ϕ 2"
5m

2 ϕ 2"
7.5m

3 ϕ 3"
5m

1 ϕ 3"
5m

6 ϕ 3"
14m

CL 550R
50m

6 ϕ 3"

6 ϕ 3"
65m

CR 29C

CR 29

LSUC
#29D-55

CR29D

60 3"
54m

60 3"
106m


CR29E

CR29C

amb

CR 30

CR 32



CL 50R 6φ3"

97m

6φ3" 32m

CL 50R #
29D-55

6φ3" 35m

6φ3" 42m

16φ3" 10m

etc

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 13.

PERSONAL

LIQUIDADO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.049.894.058 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente

Carlos G.

CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.049.894.058



HUELLA INDICE DERECHO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, EDWIN DAVID SANTOS HERNANDEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.038.810.427 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente

Edwin Santos

EDWIN DAVID SANTOS HERNANDEZ
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.038.810.427



HUELLA INDICE DERECHO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA identificado (a) con cedula de ciudadanía No 77.182.422 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 77.182.422



HUELLA INDICE DERECHO


PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, HERNAN DARIO ACOSTA SIMANCA identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.001.025.750 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HERNAN DARIO ACOSTA SIMANCA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.001.025.750



HUELLA INDICE DERECHO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, MARTIN JOSÉ GONZÁLEZ BURGOS identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.123.409.521 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente

Martin G.

MARTIN JOSÉ GONZALES BURGOS
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.123.409.521



HUELLA INDICE DERECHO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, MOISES DAVID REYES AMAYA identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.002.500.113 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



MOISES DAVID REYES AMAYA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.002.500.113



HUELLA INDICE DERECHO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON identificado (a) con cedula de ciudadanía No 1.065.913.019 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente

Simeon Fernando Vivas

SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.065.913.019



HUELLA INDICE DERECHO

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 14.

CERTIFICADO DE

EMPRESA DE

MUJERES



Sergio Andrés Díaz Montañez

**Contador Público Especialista en Tributaria
& Revisoría Fiscal.**

☎ 310 205 1725

✉ sergio.andresdiaz@hotmail.com

📍 Trans. 49 # 10A - 01 Edificio Terzetto - oficina 406

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

REVISADO EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERVICIVIL SAS IDENTIFICADO CON NIT 800147909-3 DESDE EL DÍA 15 JUNIO DEL AÑO 2021 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE COMPOSICION ACCIONARIA, ADEMAS SE CERTIFICA QUE LOS ACCIONISTAS SON COLOMBIANOS.

CAPITAL AUTORIZADO	\$ 580.000.000.
No DE ACCIONES	1000
VALOR NOMINAL	\$ 580.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 580.000.000
No DE ACCIONES	1000
VALOR NOMINAL	\$580.000

ACCIONISTA	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C.	13893413
No DE ACCIONES	490
PARTICIPACIÓN	49%
VALOR TOTAL ACCIONES	\$ 284.200.000

ACCIONISTA	NELSY VANEGAS CALDERON
C.C.	63459480
PARTICIPACIÓN	51%
No DE ACCIONES	510
VALOR TOTAL ACCIONES	\$ 295.800.000

DADO EN BARRANCABÉRMEJA, A LOS 09 DIAS DE FEBRERO DE 2026

SERGIO ANDRÉS DÍAZ MONTAÑEZ

T.P 187097-T
CONTADOR PÚBLICO

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 15.

CAMARA DE

COMERCIO



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 800147909-3
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 21568
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1991
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : servicivil_ltdda@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6102194
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125486349

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : servicivil_ltdda@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2370 del 28 de octubre de 1991 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, con el No. 912486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIVIL LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de SERVICIVIL LIMITADA por SERVICIVIL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
 Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Por Acta No. 019 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita el 06 de noviembre de 2024 se reformo así: Artículo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de actividades tendientes a la realización de obras arquitectónicas, de urbanismo e ingeniería, bien sea civiles, eléctricas, electrónicas, mecánicas, ambientales, petroleras, energéticas, hidráulicas, de servicios públicos, saneamiento básico, mineras, de telecomunicaciones, agrícolas, rurales, de sistemas de información, vías y transportes, en todo lo relacionado con asesorías, ejecución, planeación, preparación, diseño, montaje y construcción de todo tipo de obras, estructuras, instalación de plantas de toda clase, mantenimiento y operación de las mismas, excavación de pozos profundos, suministros de materiales de construcción y de cantera, industria minera, economía minera, comercialización, exploración, explotación, trituración, beneficio y distribución de minerales comunes, exploración minera, geología minera, exploración y evaluación de reservas mineras,, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de minerales, manejo y transporte de minerales, metalurgia metales ferrosos y no ferrosos, exploración y explotación de minerales usuales (comodietis), cobre, zinc, plomo, níquel, mineral de hierro, bauxita, alúmina, aluminio, oro, plata, platino, fosfatos, magnesio, cromo, lignito, antracita, metales raros. La prestación de toda clase de servicios de consultoría, inventories técnicas y administrativas en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social según la legislación vigente, la promoción, compra, venta, arriendo y administración de inmuebles tanto urbanos como rurales, urbanización de terrenos y la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercializa con, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación, transformación de todo tipo de maquinaria pesada y equipos destinados a la construcción, a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación acuífera, en el área de servicios públicos, petrolífera y sus derivados, industria petroquímica, de biocombustibles, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercialización, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación transformación de vehículos de carga, vehículos de transporte de pasajeros, bien sea terrestres o fluviales, fabricación y comercialización de equipos y o dispositivos de control de tránsito con y sin registro gráficos de infracciones, (semáforos, equipos de control, botoneras peatonales, dispositivos sonoros, cámaras de seguridad, cámara de foto – detección, materiales eléctricos y electrónicos), suministros, instalación y programación de software para controladores de semáforos ,equipos de foto detección y en general para entidades de tránsito y transporte , en el desarrollo de todo lo anterior que comprende el objeto social de la empresa, se podrán constituir en territorio nacional o extranjero, sucursales o agencias, podrá promover y fundar establecimientos, almacenes de depósitos, fabricas; podrá además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir toda clase de derecho mineros, permisos o licencias, ejecutar o conformar asociaciones, aportes y/o concesiones, uniones temporales, para explorar y explotar minas o yacimientos, , explotar o registrar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal u objeto contractual que pueda desarrollarse, dentro de los parámetros del objeto social, girar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar, toda clase de títulos valores, bursátiles, de inversión, celebrar contratos de mutuo, seguro y transporte, agencia comercial, cuentas en participación y demas contratos comerciales, concurrir a licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias o financieras y concurrir a la formación de aportes a entidades de crédito como bancos, corporaciones financieras, dedicadas a la financiación de actividades comprendida dentro de los objetivos sociales, efectuar cualquier tipo de tramites tendiente a importar o exportar mercancías de productos en cumplimiento del objeto social. Parágrafos: en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad podrá: hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, todas las actividades o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03

Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

finances sociales. participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre' estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los fines sociales.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 580.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representante legal: Artículo 27. Se hace transformación según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente para sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Artículo 28. Se hace transformación según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieran reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018 con el No. 25347 del libro IX, se designó a:

CARGO**NOMBRE****IDENTIFICACION**

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO	C.C. No. 13.893.413
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VANEGAS CALDERON	C.C. No. 63.459.480

REVISORIA FISCAL TEXTUAL

** Revisor fiscal: ** Que por acta no. 0000003 De asamblea de accionistas del 2 de diciembre de 2016 , inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el numero 00022750 del libro ix , fue(ron) nombrado(s): Nombre identificacion revisor fiscal murillo villarreal pablo emilio c.C.13891253 Tarjeta profesional: 14953 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

*) E.P. No. 1122 del 10 de mayo de 1993 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3365 del 06 de abril de 1994 del libro IX
*) E.P. No. 2009 del 25 de julio de 1995 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3968 del 01 de agosto de 1995 del libro IX
*) E.P. No. 2076 del 12 de julio de 1996 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	4587 del 02 de septiembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 2499 del 21 de noviembre de 2007 de la Notaria Primera Barrancabermeja	11284 del 30 de noviembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1827 del 26 de julio de 2011 de la Notaria Primera Barrancabermeja	14715 del 28 de julio de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16185 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16188 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16189 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 746 del 21 de abril de 2014 de la Notaria Primera Barrancabermeja	18588 del 05 de mayo de 2014 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21205 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21206 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta De Socios	25347 del 17 de octubre de 2018 del libro IX
*) Acta No. 18 del 15 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	35939 del 23 de julio de 2024 del libro IX
*) Acta No. 19 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36444 del 06 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: E3900
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIVIL BCA
Matrícula No.: 62658
Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 62 NO 43 151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3.214.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio



CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 16.

CEDULAS

PERSONAL 100%

COLOMBIANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.151.966.785**

BARBOSA YEPES

APELLIDOS

CHRISTIAN

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

08-JUN-1998

**CALI
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+


G.S. RH

M

SEXO

17-JUN-2016 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-3100150-00838444-M-1151966785-20160702

0050330467A 1

45220169

CÉDULA DE CIUDADANÍA  REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.037.368.900

Apellidos
BEDOYA VALENCIA

Nombres
ANDRES FERLEY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 JUN 1990

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MACEO (ANTIOQUIA)


Fecha y lugar de expedición
11 DIC 2008, MACEO

Fecha de expiración
22 SEPT 2033

Firma
andres Bedoya



032536593



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL032536593601175<<<<<<<<<<
9006108M3309221COL1037368900<3
BEDOYA<VALENCIA<<ANDRES<FERLEY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.049.894.058

GONZALEZ MORA

APELLIDOS

CARLOS MARIO

NOMBRES

Carlos Mario

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-2001**

HATILLO DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

11-ABR-2019 HATILLO DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0300150-01300080-M-1049894058-20220602

0079538656A 1

8504797463

ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.076.817.116

MENA CORDOBA

APELLIDOS

CRISTIAN

NOMBRES

Cristian Mena Cordoba

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1991

CONDOTO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-AGO-2009 CONDOTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALIMDO VACHA



A-1701300-00844744-M-1076817116-20160824 0050726215A 1 45839510

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

04-AGO-1992

**MONTERIA
(CORDOBA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M


SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118

0024863480A 1

34994022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34994022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.096.218.904**
PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS
JAIME ESTIVEN

NOMBRES

Stiven

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1992**

MACEO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

AB+

G.S. RH

M

SEXO

15-DIC-2010 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00570561-M-1096218904-20140508

0038389502A 1

2862858412

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.982.270**

ALTAMIRANDA DIAZ

APELLIDOS

JENIFER DEL CARMEN

NOMBRES

Jenifer Altamiranda Diaz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1992**
MAGANGUE
(BOLIVAR)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-OCT-2010 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0502800-00279702-F-1052982270-20110201

0025674797A 1

35708396

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

24-DIC-2001

**DIBULLA
(LA GUAJIRA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109

0069589379A 1

53711091

IA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 0069589379A 1 53711091

CÉDULA DE
CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos

CHAVARRIA BUILES

NUIP 98.681.775

Nombres

WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad

COL

Estatura

1.83

Sexo

M

Fecha de nacimiento

03 SEPT 1977

G.S.

O+

Lugar de nacimiento

SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición

15 JUN 1996, SABANALARGA

Fecha de expiración

22 JUL 2034

Firma

W.A. - Ch.B.



08

050913923




REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL050913923601217<<<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE

NUIP 4.852.397

Nationalidad
COL

Estatura
1,75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
05 FEB 1964

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BAJO BAUDO (PIZARRO) (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
19 NOV 1983, BAHIA SOLANO

Firma

Alcides Moscoso

Fecha de expiración
18 MAR 2033

03

020198477



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL020198477417008<<<<<<<<<
6402053M3303182COL4852397<<<<0
RIASCO<REYES<<AGUEDO<ALCIDES<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.500.113**

REYES AMAYA

APELLIDOS

MOISES DAVID

NOMBRES

Moises Reyes A

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1999**
MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

B+

G.S. RH

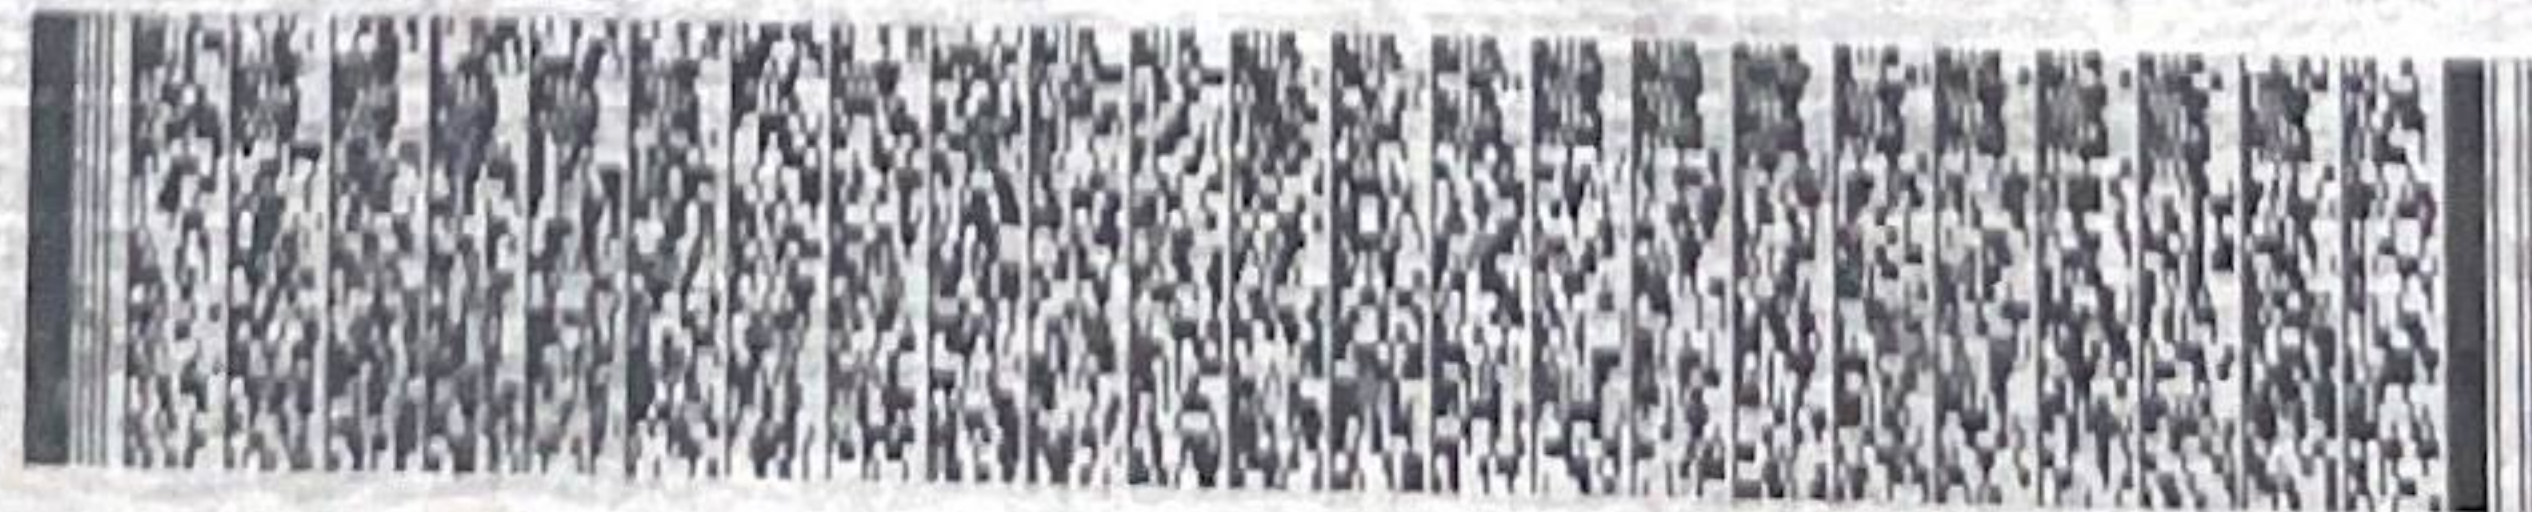
M

SEXO

05-ENE-2018 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0502800-00972751-M-1002500113-20180125

0059290273A 1

49259471

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.152.187.124

GOMEZ MEJIA

APELLIDOS

ANYELO DANIEL

NOMBRES

Anyelo Daniel Gómez M.



22-MAY-1990

REGIÓN DE MARCO MEDIO

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

UNIDAD DE MARCO MEDIO

1.81

A-

M

ESTADIA

G.S. RH

SECO

21-MAY-2001 MEDELLIN

REGIÓN PLURAL DE EXPEDICIÓN

Antonio José Martínez

INDUSTRIAL

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ TORRES



SP-0100159-0015507444-0152167124-20070425

000000/200000 1

2002-10-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.096.247.535

PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS

BRAYAN ESMID

NOMBRES

Brayan Palacio

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1998

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

05-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-2701900-01294488-M-1096247535-20220505

0079078024A 1

9918929745



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.017.144.470

DIAZ PEÑA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

Carlos Alberto Diaz P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

10-ENE-1987

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

10-FEB-2005 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso
REGISTRADORA NACIONAL
ALFONSO LOPEZ



P-0100100-14136885-M-101714470-20060103

0019906003H 01 197206634

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.537.976**

ROA SILVA

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. R. Silva', written over a horizontal line.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

21-ABR-2000

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

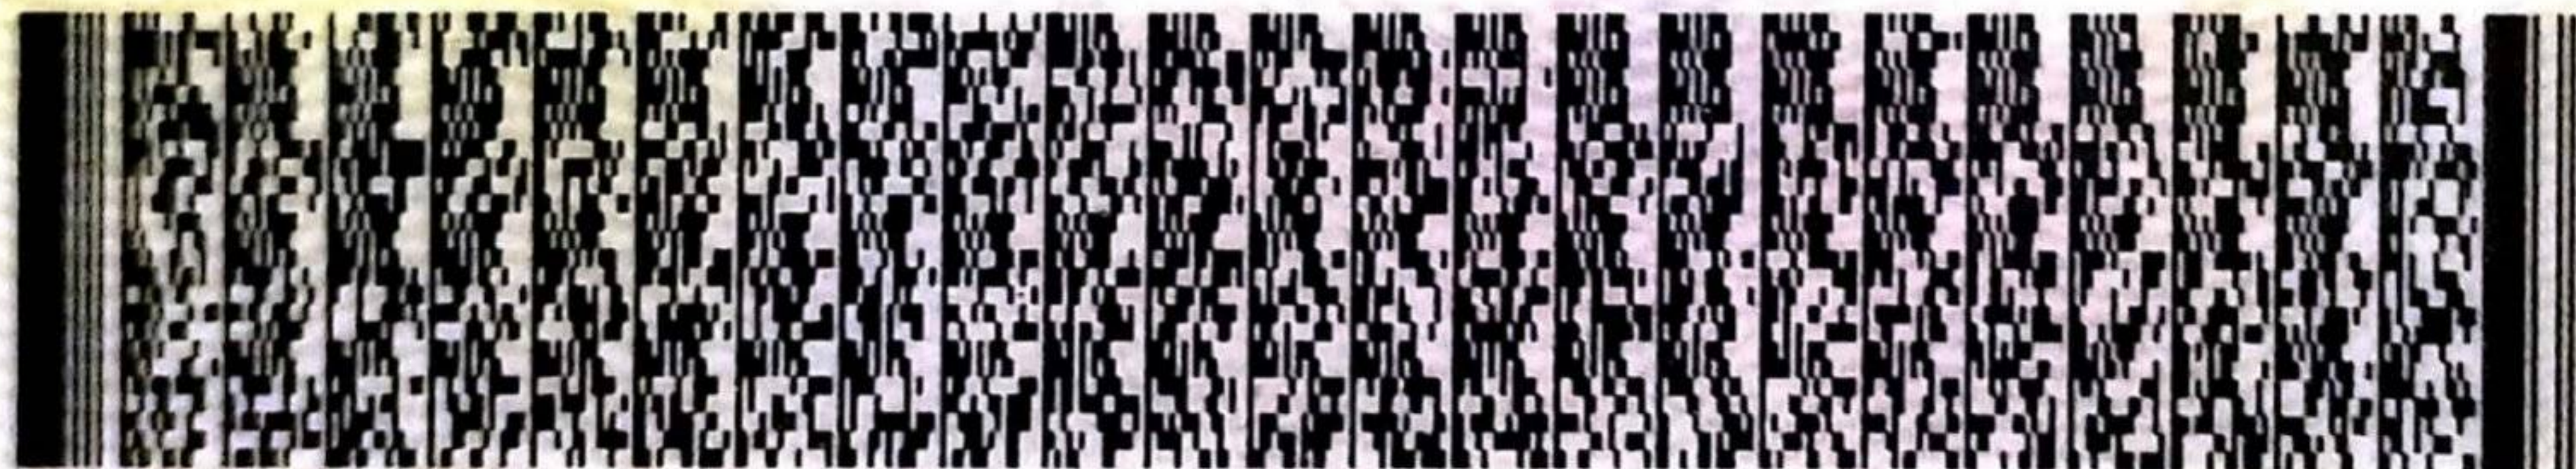
M.

SEXO

17-MAY-2018 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0100150-01015231-M-1000537976-20180618

0061569756A 1

50040024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.446.091**

NIEVES VALENCIA

APELLIDOS

RANCISCO JAVIER

NOMBRES



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RANCISCO JAVIER', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M


SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610

00444457306A 1

7013424191



FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1975

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

M


SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-P0713668-M-0091446191-20150610

0044457306A 1

7013424191

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.605.230

MORENO VALENCIA

APELLIDOS

JAIR ALONSO

NOMBRES

Jair Moreno

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1990

MACEO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATURA

O+

C.S. RH

M


SEXO

07-JUL-2008 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0104900-00488737-M-1037605230-20131007

0035334768A 1

2172573142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.571.457**

BELEÑO GALVIS

APELLIDOS

JHON DEIVIS

NOMBRES

Jhon Deivis Bo

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-2002**

AGUACHICA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

29-ENE-2020 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1207500-01131954-M-1007571457-20200213

0070082283A 1

52959355



NUIP 11.222.857



ANDRADE GARCIA

JOSE ALCIBIADES

Sexo

1.65

M

GS.

24 JUN 1977

B+

Lugar de nacimiento

BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición

19 MAR 1997, GIRARDOT

Firma

Fecha de expiración

17 MAR 2033

.CO

020217615



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020217615015109<<<<<<<<

• 7706242M3303171C0L11222857<<<8

ANDRADE<GARCIA<<JOSE<ALCIBIADE

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **32220126**

GIRALDO BOTERO
APELLIDOS

LINA MARIA
NOMBRES

Lina Giraldo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1982**

SANTUARIO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-ENE-2001 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0125600-14092643-F-0032220126-20010814 0090501194P 01 100861994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **42.683.289**

DURANGO ARENAS

APELLIDOS

MARIA VICTORIA

NOMBRES

Maria Victoria Durango

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

01-FEB-1967

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

14-DIC-1987 COPACABANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0110300-00903448-F-0042683289-20170509

0055312616A 2

9999877919

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.913.019

VIVAS MANDON

APELLIDOS

SIMEON FERNANDO

NOMBRES

Simeon F. VIVAS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1998**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

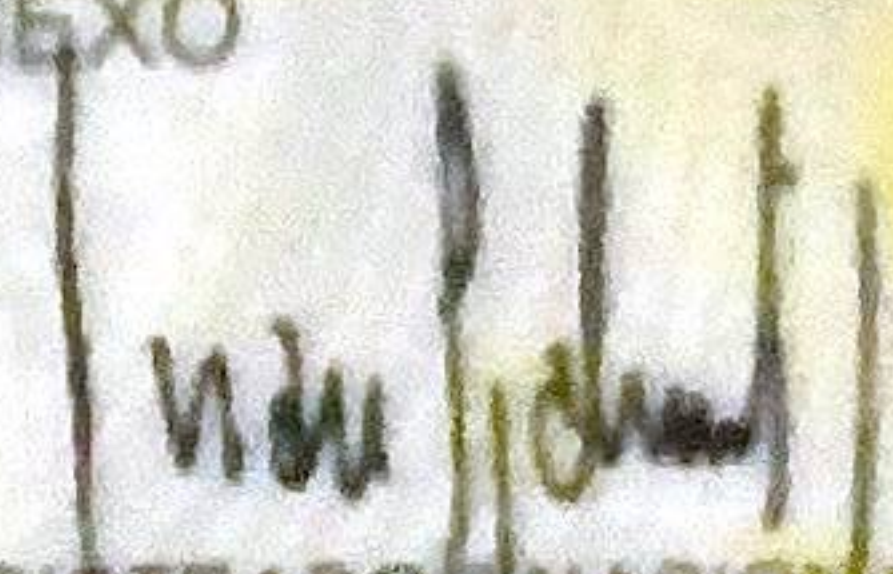
G.S. RH

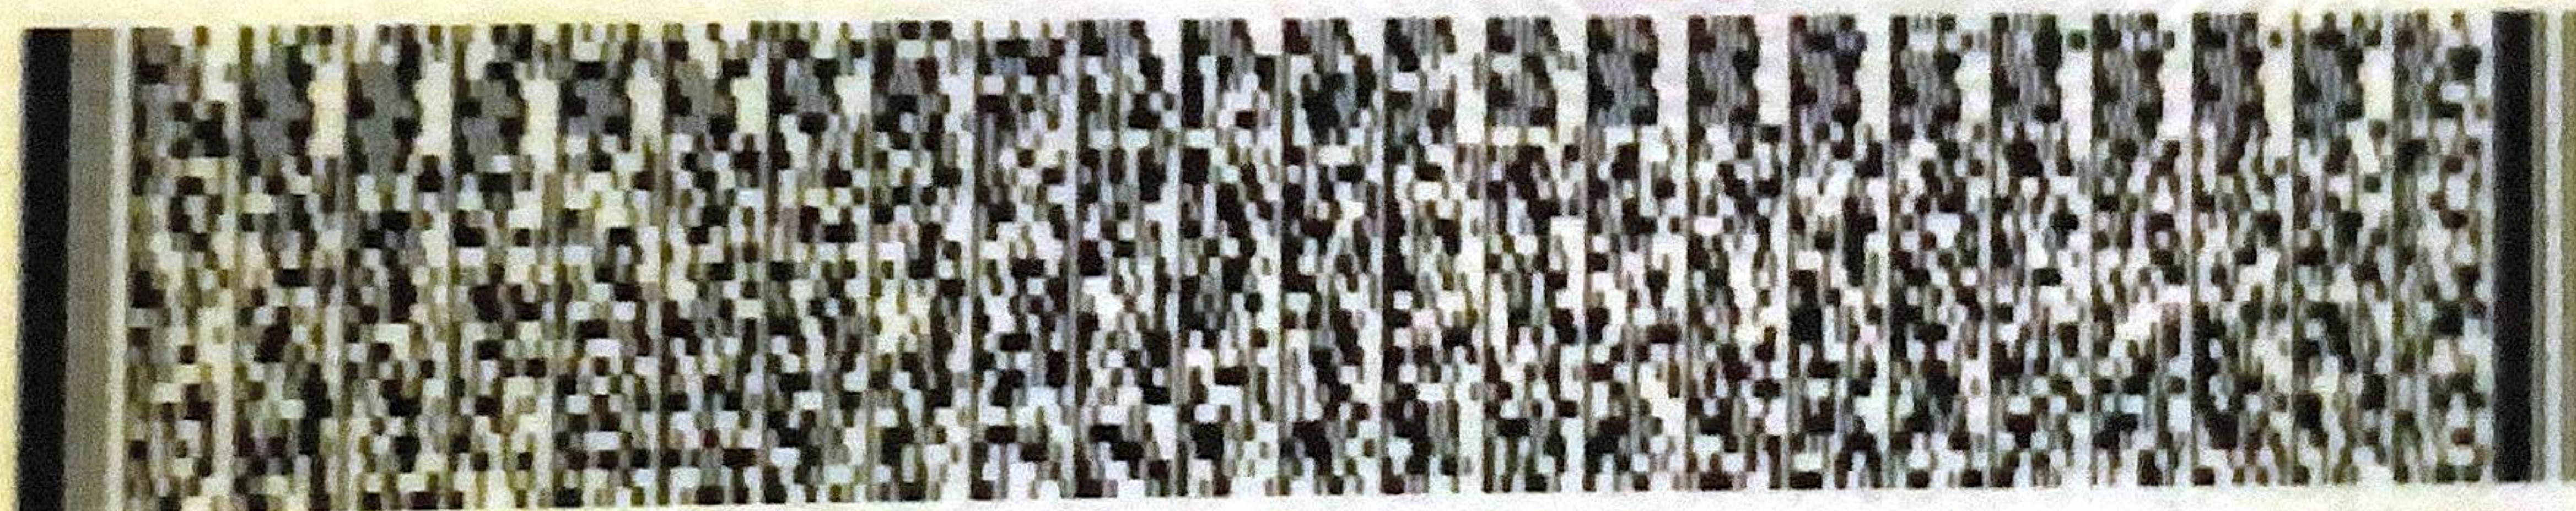
M

SEXO

16-FEB-2016 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1207500-00801034-M-1065913019-20160314

0048941810A 1

45800978



FECHA DE NACIMIENTO

31-DIC-1996

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O-

G.S. RH

M
SEXO

29-ENE-2016 HISPANIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACIA

INDICE DERECHO



P-0115000-00812631-M-1039597832-20160411

0049254415G 1

45539531

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.597.832

GALEANO PARRA

APELLIDOS

YEISON ALEJANDRO

NOMBRES

YEISON Alejandro Galeano P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
APARTADO
(ANTIOQUIA)

31-MAR-2000

LUGAR DE NACIMIENTO
1.85

O+

M


ESTATURA


G.S. RH

SEXO

11-ABR-2018 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0103500-01001737-M-1001025750-20180430

0060997701A 1

50027940

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.025.750**

ACOSTA SIMANCA

APELLIDOS

HERNAN DARIO

NOMBRES

H. Acosta

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.791.906**
BARBOSA PALOMINO

APELLIDOS
FRANKLIN

NOMBRES

Franklin Barbosa P.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00032442-M-0016791906-20080728

0001536733A 1

2020021788

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.015.186.405**

RAMIREZ LOPERA

APELLIDOS
JOHAN

NOMBRES

JOHAN Ramirez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-ABR-2002**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-2020 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0100160-01318059-M-1015186405-20220908 0084735526A 3 8505122346

CÉDULA DE
CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.66

Sexo
F

Fecha de nacimiento
29 JUL 1994

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma

Laura MPP

Fecha de expiración
18 ENE 2034




.CO

037809496



Hernan Penagos Giraldo
REGISTRADOR NACIONAL
Hernan Penagos Giraldo



ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91452201**

LOZANO ROJAS
APELLIDOS

LUIS DANOVER
NOMBRES

Luis Danover Lozano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1977**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-JUN-1996 ARATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0500100-30104581-M-0091452201-20030127

02482 03024A 01 129453752

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 17.

CERTIFICADO

PERSONAL 100%

COLOMBIANO

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL**

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Calle 44 # 52 165

Medellín, Antioquia

091 - 2026

El suscrito JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante el **período comprendido entre el 01 de Enero de 2026 y el 31 de Enero de 2026**, para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105555 de 2025, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y las obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **se destinó el cien por ciento (100 %) de empleados y/o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad colombiana para la ejecución del objeto contractual.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional y Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, correspondientes al Proceso de Contratación No. 0070007743.

En constancia, se firma en Medellín, Antioquia, a los Diez (10) días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NIÑO

C.C 13.893.413 de Barrancabermeja

R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

	INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y		Código: SIT-IF-TC-001
	DE EJECUCIÓN		Fecha: 30/09/25
	ENERO 2026		Versión: 01

ANEXO 18.

ACTA MES DE

ENERO

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>					CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO		5/09/2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5			
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES		N/A		31/1/2026			
								DURACIÓN		865 DÍAS					
								VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		01 A 31 DE ENERO 2025	
								ADICIONES		\$ -		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 494.085.925	
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240					
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			% EJECUTADO EN EL PERIODO		26,55%		% EJECUTADO ACUMULADO		26,55%						
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO				ACTA ACUMULADA						
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total					
	OBRA CIVIL														
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	\$ 48.280,35	\$ 48.280	22,27	\$ 1.075.203,00	69,92	\$ 3.375.841,00							
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	\$ 159.885,12	\$ 159.885	3,00	\$ 479.655,00	13,00	\$ 2.078.506,00							
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	\$ 148.052,75	\$ 148.053	0,00	\$ 0,00	20,90	\$ 3.094.302,00							
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	\$ 14.768,06	\$ 14.768	0,00	\$ 0,00	20,90	\$ 308.653,00							
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	\$ 147.880,78	\$ 147.881	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de vía. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	\$ 260.770,23	\$ 260.770	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	\$ 656.913,29	\$ 656.913,29	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
8	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 14.384,39	\$ 14.384	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
9	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	\$ 534.013,01	\$ 534.013	0,00	\$ 0,00	480,00	\$ 256.326.243,00							
10	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	\$ 626.289,74	\$ 626.289,74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
11	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	\$ 723.503,61	\$ 723.504	0,00	\$ 0,00	30,00	\$ 21.705.108,00							
12	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	\$ 56.494,94	\$ 56.495	1,00	\$ 56.495,00	1,00	\$ 56.495,00							
13	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa para empotramiento de elemento	Un	\$ 153.601,16	\$ 153.601,16	174,00	\$ 26.726.601,00	388,00	\$ 59.597.248,00							
14	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	\$ 103.385,12	\$ 103.385	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
15	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	\$ 29.166,91	\$ 29.167	0,00	\$ 0,00	1.020,00	\$ 29.750.246,00							
16	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	\$ 625.739,16	\$ 625.739,16	0,00	\$ 0,00	50,00	\$ 31.286.958,00							

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED										
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA			
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
17	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	\$ 776.380,06	\$ 776.380	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
18	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	\$ 743.426,30	\$ 743.426	0,78	\$ 579.129,00	2,19	\$ 1.624.907,00		
19	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	\$ 256.891,62	\$ 256.891,62	3,70	\$ 950.499,00	3,70	\$ 950.499,00		
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	\$ 308.636,56	\$ 308.637	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
21	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	\$ 125.098,27	\$ 125.098	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
22	Construcción Canalizacion en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rígido y la cimentación de la tubería, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	\$ 292.726,88	\$ 292.726,88	4,10	\$ 1.200.180,00	8,95	\$ 2.619.905,00		
23	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	\$ 156.992,77	\$ 156.993	71,50	\$ 11.224.983,00	85,10	\$ 13.360.085,00		
24	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	\$ 47.378,61	\$ 47.379	0,00	\$ 0,00	1,80	\$ 85.282,00		

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>		CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO		5/09/2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5			
		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES		N/A		31/1/2026			
					DURACIÓN		865 DÍAS					
					VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		01 A 31 DE ENERO 2025	
					ADICIONES		\$ -		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 494.085.925	
		CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240					
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			% EJECUTADO EN EL PERIODO		26,55%		% EJECUTADO ACUMULADO		26,55%			
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA				
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total				
25	Construcción Canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	\$ 113.987,72	\$ 113.987,72	14,60	\$ 1.664.221,00	22,70	\$ 2.587.521,00				
26	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	\$ 20.398,12	\$ 20.398	0,00	\$ 0,00	5,10	\$ 104.030,00				
27	Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	\$ 27.759,39	\$ 27.759	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
28	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	\$ 31.737,72	\$ 31.737,72	3,90	\$ 123.777,00	60,90	\$ 1.932.827,00				
29	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	\$ 321.236,99	\$ 321.237	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	\$ 107.746,39	\$ 107.746	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
31	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	\$ 189.633,67	\$ 189.633,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
32	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	\$ 161.859,10	\$ 161.859	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
33	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	\$ 827.665,46	\$ 827.665	16,00	\$ 13.242.647,00	35,00	\$ 28.968.291,00				
34	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	\$ 322.250,00	\$ 322.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
35	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	\$ 405.107,66	\$ 405.108	5,00	\$ 2.025.538,00	16,00	\$ 6.481.722,00				

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>			CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
			OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
					DURACIÓN	865 DÍAS		
					VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
					ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
			CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%			
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total
36	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	\$ 119.036,85	\$ 119.037	0,00	\$ 0,00	15,63	\$ 1.860.094,00
37	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	\$ 155.931,36	\$ 155.931,36	0,00	\$ 0,00	9,76	\$ 1.521.266,00
38	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	\$ 52.460,26	\$ 52.460	0,00	\$ 0,00	0,89	\$ 46.637,00
39	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	\$ 85.447,98	\$ 85.448	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
40	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará en su respectivo ítem.	m	\$ 91.307,80	\$ 91.307,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
41	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	\$ 73.690,03	\$ 73.690	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
42	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	\$ 387.565,75	\$ 387.566	1,00	\$ 387.566,00	5,00	\$ 1.937.830,00
43	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	\$ 371.480,49	\$ 371.480,49	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 2.971.844,00
44	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	\$ 32.606,94	\$ 32.607	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
45	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	\$ 443.993,50	\$ 443.993	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	\$ 76.588,87	\$ 76.588,87	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	\$ 72.986,99	\$ 72.987	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
48	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	\$ 54.609,83	\$ 54.610	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
49	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"" , incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	\$ 47.766,62	\$ 47.766,62	0,00	\$ 0,00	4,50	\$ 214.950,00

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED					
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
50	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"	m	\$ 10.610,55	\$ 10.611	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
51	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"	m	\$ 12.132,23	\$ 12.132	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
52	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"	m	\$ 23.641,62	\$ 23.641,62	0,00	\$ 0,00	22,20	\$ 524.844,00		
53	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o guía). Incluye subbase y arena	m2	\$ 56.160,40	\$ 56.160	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
54	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir mínimo el 50% del volumen de la caja.	Un	\$ 20.032,51	\$ 20.033	82,00	\$ 1.642.666,00	230,00	\$ 4.607.478,00		
55	Encamisado de tubería pvc en canalización existente hasta 50 cm.	Un	\$ 19.376,45	\$ 19.376,45	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 58.129,00		
56	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico. Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	\$ 106.271,68	\$ 106.272	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
57	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico. Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	\$ 136.627,17	\$ 136.627	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS										
58	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	\$ 3.931.291,18	\$ 3.931.291	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
59	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	\$ 3.862.146,68	\$ 3.862.147	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
60	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	\$ 1.557.489,16	\$ 1.557.489,16	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 4.672.467,00		
61	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	\$ 2.144.221,10	\$ 2.144.221	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
62	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	\$ 2.221.573,70	\$ 2.221.574	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>					CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO		5/09/2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5			
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES		N/A		31/1/2026			
								DURACIÓN		865 DÍAS					
								VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		01 A 31 DE ENERO 2025	
								ADICIONES		\$ -		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 494.085.925	
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240					
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			% EJECUTADO EN EL PERIODO		26,55%		% EJECUTADO ACUMULADO		26,55%						
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO				ACTA ACUMULADA						
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total							
63	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	\$ 787.505,06	\$ 787.505,06	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 1.481.575,14	\$ 1.481.575	1,00	\$ 1.481.575,00	1,00	\$ 1.481.575,00							
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 1.382.864,88	\$ 1.382.865	14,00	\$ 19.360.108,00	14,00	\$ 19.360.108,00							
66	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	\$ 1.788.942,92	\$ 1.788.942,92	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 2.165.691,47	\$ 2.165.691	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 1.658.256,50	\$ 1.658.257	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 13.266.052,00							
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 1.781.158,24	\$ 1.781.158,24	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
70	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	\$ 1.220.336,71	\$ 1.220.337	11,00	\$ 13.423.704,00	11,00	\$ 13.423.704,00							
71	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos de fijación.	Un	\$ 4.004.506,50	\$ 4.004.507	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
72	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	\$ 2.243.666,18	\$ 2.243.666,18	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
73	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	\$ 9.476.114,88	\$ 9.476.115	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							
74	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	\$ 3.511.437,14	\$ 3.511.437	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00							

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>			CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
			OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
					DURACIÓN	865 DÍAS		
					VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
					ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
			CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%			
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total
75	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	\$ 1.229.317,20	\$ 1.229.317,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
76	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, incluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	\$ 463.039,02	\$ 463.039	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
77	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	\$ 7.555,64	\$ 7.556	0,00	\$ 0,00	3.660,00	\$ 27.653.627,00
78	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	\$ 4.101,16	\$ 4.101,16	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
79	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	\$ 8.546,24	\$ 8.546	25,00	\$ 213.656,00	165,00	\$ 1.410.130,00
80	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	\$ 12.788,29	\$ 12.788	65,00	\$ 831.239,00	155,00	\$ 1.982.186,00
81	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	\$ 20.224,71	\$ 20.224,71	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
82	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	\$ 2.583,82	\$ 2.584	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
83	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	\$ 201.243,50	\$ 201.243	21,00	\$ 4.226.113,00	222,00	\$ 44.676.056,00
84	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	\$ 266.798,41	\$ 266.798,41	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
85	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	\$ 104.200,14	\$ 104.200	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
86	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalización vial vigente.	Un	\$ 287.344,65	\$ 287.345	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
87	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	\$ 940.859,83	\$ 940.859,83	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 6.586.019,00

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED					
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
88	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.	Un	\$ 1.026.702,31	\$ 1.026.702	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 6.160.214,00		
89	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	\$ 75.588,15	\$ 75.588	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 907.058,00		
90	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	\$ 3.668.547,69	\$ 3.668.547,69	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
91	Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección semafórica	Un	\$ 5.276.791,18	\$ 5.276.791	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
92	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	\$ 63.406,07	\$ 63.406	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
93	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	\$ 361.922,69	\$ 361.922,69	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
94	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	\$ 53.618,50	\$ 53.618	341,00	\$ 18.283.908,00	1.094,00	\$ 58.658.636,00		
95	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	\$ 356.627,89	\$ 356.628	12,00	\$ 4.279.535,00	22,00	\$ 7.845.815,00		
96	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	\$ 17.521,68	\$ 17.521,68	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
97	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	\$ 614.726,88	\$ 614.727	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 1.844.181,00		
98	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	\$ 8.781,07	\$ 8.781	56,00	\$ 491.740,00	72,00	\$ 632.237,00		
99	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	\$ 2.077,31	\$ 2.077,31	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
100	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	\$ 15.557,80	\$ 15.558	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
101	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	\$ 9.407,51	\$ 9.408	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
102	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	\$ 9.106,94	\$ 9.106,94	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
103	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	\$ 7.498,55	\$ 7.499	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
104	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	\$ 10.061,42	\$ 10.061	13,00	\$ 130.798,00	120,00	\$ 1.207.369,00		
105	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	\$ 92.570,09	\$ 92.570,09	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
106	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	\$ 122.433,53	\$ 122.434	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
107	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	\$ 7.762,28	\$ 7.762	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
108	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	\$ 12.966,76	\$ 12.966,76	0,00	\$ 0,00	282,00	\$ 3.656.627,00		
109	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	\$ 9.213,87	\$ 9.214	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
110	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	\$ 5.901,01	\$ 5.901	2.467,00	\$ 14.557.796,00	5.789,00	\$ 34.160.956,00		

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED					
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
111	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	\$ 6.374,28	\$ 6.374,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
112	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	\$ 113.049,86	\$ 113.050	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
RED DE COMUNICACIONES										
113	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	\$ 10.792,63	\$ 10.792,63	1.182,00	\$ 12.756.889,00	1.182,00	\$ 12.756.889,00		
114	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	\$ 431.593,21	\$ 431.593	4,00	\$ 1.726.373,00	5,00	\$ 2.157.966,00		
115	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	\$ 379.841,76	\$ 379.842	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
116	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	\$ 289.775,29	\$ 289.775,29	5,00	\$ 1.448.876,00	10,00	\$ 2.897.752,00		
117	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	\$ 14.471,10	\$ 14.471	68,00	\$ 984.035,00	256,00	\$ 3.704.603,00		
118	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	\$ 13.092,49	\$ 13.092	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
119	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	\$ 256.359,10	\$ 256.359,10	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
120	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	\$ 44.403,90	\$ 44.404	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
121	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	\$ 1.113,44	\$ 1.113	0,00	\$ 0,00	41.666,00	\$ 46.392.562,00		
122	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	\$ 11.098,99	\$ 11.098,99	480,00	\$ 5.327.514,00	480,00	\$ 5.327.514,00		
123	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	\$ 24.288,29	\$ 24.288	12,00	\$ 291.460,00	12,00	\$ 291.460,00		
124	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	\$ 25.260,84	\$ 25.261	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
125	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	\$ 18.085,98	\$ 18.085,98	13,00	\$ 235.118,00	13,00	\$ 235.118,00		
126	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	\$ 9.200,14	\$ 9.200	57,00	\$ 524.408,00	57,00	\$ 524.408,00		
127	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	\$ 1.229.450,14	\$ 1.229.450	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
128	Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit	Un	\$ 182.536,13	\$ 182.536,13	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 365.072,00		
129	Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula	Un	\$ 158.941,47	\$ 158.941	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 317.883,00		
130	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica	Un	\$ 1.039.940,03	\$ 1.039.940	14,00	\$ 14.559.160,00	14,00	\$ 14.559.160,00		
131	Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps	Un	\$ 106.516,62	\$ 106.516,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
132	Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm	Un	\$ 183.378,61	\$ 183.379	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>			CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
			OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
					DURACIÓN	865 DÍAS		
					VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
					ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
			CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED								
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total
133	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	\$ 243.494,94	\$ 243.495	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
134	Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	\$ 2.497.278,18	\$ 2.497.278,18	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
135	Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a tierra.	Un	\$ 30.678,47	\$ 30.678	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
136	Suministro e instalación de tubería embebida al interior de cámara de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	\$ 35.196,53	\$ 35.197	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS							
137	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	\$ 294.625,00	\$ 294.625	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 1.178.500,00
138	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	\$ 533.589,60	\$ 533.590	1,00	\$ 533.590,00	5,00	\$ 2.667.948,00
139	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	\$ 3.486.539,74	\$ 3.486.539,74	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 52.298.096,00
140	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	\$ 3.417.395,23	\$ 3.417.395	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
141	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	\$ 1.442.325,87	\$ 1.442.326	0,00	\$ 0,00	140,00	\$ 201.925.621,00
142	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	\$ 2.077.371,39	\$ 2.077.371,39	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
143	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	\$ 1.354.428,47	\$ 1.354.428	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
144	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	\$ 1.622.177,75	\$ 1.622.178	0,00	\$ 0,00	80,00	\$ 129.774.220,00
145	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	\$ 1.184.258,67	\$ 1.184.258,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
146	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	\$ 3.317.523,84	\$ 3.317.524	0,00	\$ 0,00	200,00	\$ 663.504.769,00
147	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	\$ 4.610.908,24	\$ 4.610.908	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 92.218.164,00
148	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	\$ 6.352,60	\$ 6.352,60	0,00	\$ 0,00	36.275,00	\$ 230.440.607,00

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
149	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación.	Un	\$ 967.895,23	\$ 967.895	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
150	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	\$ 106.507,23	\$ 106.507	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
151	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	\$ 107.728,32	\$ 107.728,32	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
152	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	\$ 62.691,47	\$ 62.691	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
153	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	\$ 181.246,39	\$ 181.246	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
154	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	\$ 335.932,80	\$ 335.932,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
155	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	\$ 336.446,53	\$ 336.447	40,00	\$ 13.457.861,00	40,00	\$ 13.457.861,00		
156	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	\$ 363.197,98	\$ 363.198	65,00	\$ 23.607.868,00	65,00	\$ 23.607.868,00		
157	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	\$ 373.427,75	\$ 373.427,75	100,00	\$ 37.342.775,00	200,00	\$ 74.685.550,00		
158	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	\$ 44.361,99	\$ 44.362	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
159	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	\$ 1.223,99	\$ 1.224	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
160	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	\$ 7.652,46	\$ 7.652,46	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
161	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	\$ 8.429,91	\$ 8.430	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
162	Suministro de Transformador (220-110)	Un	\$ 176.626,45	\$ 176.626	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
163	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	\$ 411.113,44	\$ 411.113,44	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
164	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	\$ 23.376,45	\$ 23.376	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO										
165	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 115.227,60	\$ 115.227,60	2,00	\$ 230.455,00	12,00	\$ 1.382.731,00		
166	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	\$ 224.375,00	\$ 224.375	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.346.250,00		
167	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	\$ 96.137,28	\$ 96.137	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
168	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	\$ 189.513,01	\$ 189.513,01	36,00	\$ 6.822.468,00	156,00	\$ 29.564.028,00		
169	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	\$ 83.338,15	\$ 83.338	1,00	\$ 83.338,00	1,00	\$ 83.338,00		
170	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	\$ 76.942,20	\$ 76.942	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 230.826,00		
171	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de contraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	\$ 258.473,99	\$ 258.473,99	22,00	\$ 5.686.428,00	31,00	\$ 8.012.694,00		
172	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	\$ 28.668,35	\$ 28.668	59,00	\$ 1.691.433,00	292,00	\$ 8.371.160,00		
173	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	\$ 526,73	\$ 527	3.014,00	\$ 1.587.577,00	11.263,90	\$ 5.933.080,00		

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
174	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 871,39	\$ 871,39	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
175	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	\$ 106.330,20	\$ 106.330	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
176	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 39.166,91	\$ 39.167	1,00	\$ 39.167,00	26,00	\$ 1.018.339,00		
177	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 39.166,91	\$ 39.166,91	0,00	\$ 0,00	21,00	\$ 822.505,00		
178	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	\$ 36.389,45	\$ 36.389	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
179	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 8.169,08	\$ 8.169	18,00	\$ 147.043,00	267,00	\$ 2.181.144,00		
180	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	\$ 36.389,45	\$ 36.389,45	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 72.778,00		
181	Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoría.	Un	\$ 19.311,42	\$ 19.311	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
182	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 6.954,48	\$ 6.954	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
183	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	\$ 8.303,47	\$ 8.303,47	35,00	\$ 290.621,00	167,00	\$ 1.386.679,00		
184	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	\$ 42.557,80	\$ 42.558	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
185	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	\$ 207.248,55	\$ 207.249	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
186	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 305.669,80	\$ 305.669,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
187	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	\$ 80.804,19	\$ 80.804	151,00	\$ 12.201.433,00	330,00	\$ 26.665.383,00		
188	Retiro de marco metálico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	\$ 80.804,19	\$ 80.804	1,00	\$ 80.804,00	11,00	\$ 888.846,00		
189	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 21.502,17	\$ 21.502,17	1,00	\$ 21.502,00	1,00	\$ 21.502,00		
190	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	\$ 69.656,07	\$ 69.656	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
191	Retiro de percha de electroporcelana	Un	\$ 41.445,09	\$ 41.445	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
192	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 22.320,09	\$ 22.320,09	1,00	\$ 22.320,00	1,00	\$ 22.320,00		
193	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	\$ 35.851,88	\$ 35.852	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
194	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 27.622,83	\$ 27.623	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		

<div></div> <div>Alcaldía de Medellín</div> <div>Distrito de</div> <div>Ciencia, Tecnología e Innovación</div>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA			
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
195	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 15.116,33	\$ 15.116,33	112,00	\$ 1.693.029,00	308,00	\$ 4.655.830,00		
196	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 27.184,25	\$ 27.184	36,00	\$ 978.633,00	46,00	\$ 1.250.475,00		
197	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	\$ 102.470,38	\$ 102.470	2,00	\$ 204.941,00	8,00	\$ 819.763,00		
198	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 10.426,30	\$ 10.426,30	3,00	\$ 31.279,00	4,00	\$ 41.705,00		
199	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	\$ 17.938,58	\$ 17.939	74,00	\$ 1.327.455,00	579,00	\$ 10.386.439,00		
200	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	\$ 723,27	\$ 723	463,00	\$ 334.872,00	463,00	\$ 334.872,00		
201	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	\$ 68.017,34	\$ 68.017,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240		
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED		% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
202	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	\$ 107.195,09	\$ 107.195	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO									
203	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	\$ 435.317,20	\$ 435.317,20	1,00	\$ 435.317,00	8,00	\$ 3.482.537,00		
204	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	\$ 159.062,86	\$ 159.063	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
205	Instalación de poste recto con platina	Un	\$ 76.854,77	\$ 76.855	1,00	\$ 76.855,00	1,00	\$ 76.855,00		
206	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	\$ 129.735,55	\$ 129.735,55	34,00	\$ 4.411.009,00	153,00	\$ 19.849.539,00		
207	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	\$ 112.610,55	\$ 112.611	1,00	\$ 112.611,00	4,00	\$ 450.443,00		
208	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	\$ 33.169,80	\$ 33.170	48,00	\$ 1.592.150,00	274,00	\$ 9.088.525,00		
209	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	\$ 63.098,27	\$ 63.098,27	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
210	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	\$ 15.825,87	\$ 15.826	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
211	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	\$ 4.084,54	\$ 4.085	2,00	\$ 8.169,00	4,00	\$ 16.338,00		
212	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	\$ 208.864,88	\$ 208.864,88	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
213	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	\$ 74.317,20	\$ 74.317	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 891.806,00		
214	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	\$ 84.078,76	\$ 84.079	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 1.008.945,00		
215	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	\$ 1.410,40	\$ 1.410,40	4.041,00	\$ 5.699.445,00	11.014,00	\$ 15.534.196,00		
216	Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y pulsadores.	Un	\$ 357.786,85	\$ 357.787	2,00	\$ 715.574,00	16,00	\$ 5.724.590,00		
217	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	\$ 4.291,18	\$ 4.291	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
218	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	\$ 17.984,10	\$ 17.984,10	112,00	\$ 2.014.220,00	312,00	\$ 5.611.041,00		
219	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	\$ 32.073,70	\$ 32.074	36,00	\$ 1.154.653,00	46,00	\$ 1.475.390,00		
220	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	\$ 18.598,27	\$ 18.598	12,00	\$ 223.179,00	76,00	\$ 1.413.468,00		
221	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	\$ 41.158,96	\$ 41.158,96	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
222	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	\$ 50.539,02	\$ 50.539	250,00	\$ 12.634.754,00	1.560,00	\$ 78.840.868,00		

<div><p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p></div>					CONTRATO 4600105555 DE 2025			FECHA DE INICIO		5/09/2025		FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5			
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.			AMPLIACIONES		N/A		31/1/2026			
								DURACIÓN		865 DÍAS					
								VALOR INICIAL		\$ 14.162.162.240		PERIODO		01 A 31 DE ENERO 2025	
								ADICIONES		\$ -					
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN			VALOR CON ADICIONES		\$ 14.162.162.240		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 494.085.925	
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED			% EJECUTADO EN EL PERIODO		26,55%		% EJECUTADO ACUMULADO		26,55%						
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO				ACTA ACUMULADA						
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total		Cant	Vr. Total						
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS														
223	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasqueteadada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	\$ 178.847,54	\$ 178.847,54	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
224	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteadada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	\$ 143.944,36	\$ 143.944	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
225	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteadada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	\$ 85.515,17	\$ 85.515	0,00	\$ 0,00		37,00	\$ 3.164.061,00						
226	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	\$ 144.020,23	\$ 144.020,23	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
227	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	\$ 60.705,20	\$ 60.705	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS														
228	Lavada de gabinete de controlador local	Un	\$ 32.665,46	\$ 32.665,46	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
229	Lavada de brazo de ménsula	Un	\$ 60.828,76	\$ 60.829	42,00	\$ 2.554.808,00		42,00	\$ 2.554.808,00						
230	Lavada de Poste recto	Un	\$ 23.213,87	\$ 23.214	128,00	\$ 2.971.376,00		155,00	\$ 3.598.151,00						
231	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	\$ 23.213,87	\$ 23.213,87	143,00	\$ 3.319.584,00		179,00	\$ 4.155.284,00						
232	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	\$ 13.890,90	\$ 13.891	37,00	\$ 513.963,00		42,00	\$ 583.417,00						
233	Lavada de avisos de motos	Un	\$ 23.090,32	\$ 23.090	2,00	\$ 46.181,00		2,00	\$ 46.181,00						
234	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	\$ 25.936,42	\$ 25.936,42	110,00	\$ 2.853.006,00		124,00	\$ 3.216.116,00						
235	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	\$ 60.828,76	\$ 60.829	42,00	\$ 2.554.808,00		42,00	\$ 2.554.808,00						
236	Lavada de disco direccional	Un	\$ 12.885,84	\$ 12.886	135,00	\$ 1.739.588,00		154,00	\$ 1.984.419,00						
	VARIOS														
237	Sondeo de canalizaciones, búsqueda de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	\$ 243.212,43	\$ 243.212	16,00	\$ 3.891.399,00		76,00	\$ 18.484.145,00						
238	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	\$ 85.481,21	\$ 85.481	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
239	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de ménsula existente.	Un	\$ 507.820,09	\$ 507.820,09	0,00	\$ 0,00		0,00	\$ 0,00						
240	Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador. Incluye dos conductores (F-F o F-N)	Un	\$ 134.829,48	\$ 134.829	4,00	\$ 539.318,00		8,00	\$ 1.078.636,00						
241	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	\$ 39.537,57	\$ 39.538	0,00	\$ 0,00		6,00	\$ 237.225,00						

 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>					CONTRATO 4600105555 DE 2025		FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
					OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.		AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
							DURACIÓN	865 DÍAS		
							VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
							ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
					CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN		VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
					INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED					
CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO			ACTA ACUMULADA		
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total		
242	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	\$ 491.690,03	\$ 491.690,03	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
243	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	\$ 347.436,42	\$ 347.436	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
244	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintura existente y pintura electrostática	Un	\$ 188.195,09	\$ 188.195	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
245	Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml.	Un	\$ 53.094,65	\$ 53.094,65	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
246	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	\$ 28.206,65	\$ 28.207	0,00	\$ 0,00	11,00	\$ 310.273,00		
247	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	\$ 69.848,99	\$ 69.849	1,00	\$ 69.849,00	1,00	\$ 69.849,00		
248	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	\$ 94.727,60	\$ 94.727,60	125,00	\$ 11.840.950,00	286,00	\$ 27.092.094,00		
249	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	\$ 100.202,31	\$ 100.202	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
250	Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers, borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas	Un	\$ 917.023,12	\$ 917.023	3,00	\$ 2.751.069,00	3,00	\$ 2.751.069,00		
251	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2" y llave.	Un	\$ 140.002,89	\$ 140.002,89	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
252	Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño.	Un	\$ 29.403,18	\$ 29.403	0,00	\$ 0,00	58,00	\$ 1.705.384,00		
253	Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	\$ 88.518,06	\$ 88.518	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
254	Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	\$ 352.728,32	\$ 352.728,32	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
255	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	\$ 50.285,40	\$ 50.285	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 150.855,00		
256	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	\$ 17.435,69	\$ 17.436	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 139.486,00		
257	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	\$ 66.533,24	\$ 66.533,24	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 199.599,00		
258	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	\$ 22.423,41	\$ 22.423	31,00	\$ 695.126,00	144,00	\$ 3.228.972,00		
259	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	\$ 42.580,92	\$ 42.581	1,00	\$ 42.581,00	8,00	\$ 340.648,00		
260	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	\$ 12.252,89	\$ 12.252,89	7,00	\$ 85.770,00	32,00	\$ 392.092,00		
261	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de personal y equipos.	Un	\$ 93.380,78	\$ 93.381	17,00	\$ 1.587.473,00	75,00	\$ 7.003.557,00		
262	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	\$ 66.601,16	\$ 66.601	61,00	\$ 4.062.671,00	281,50	\$ 18.748.227,00		



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	FECHA DE INICIO	5/09/2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO. 5	
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	AMPLIACIONES	N/A	31/1/2026	
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	\$ 14.162.162.240	PERIODO	01 A 31 DE ENERO 2025
	ADICIONES	\$ -	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 494.085.925
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	VALOR CON ADICIONES	\$ 14.162.162.240	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	% EJECUTADO EN EL PERIODO	26,55%	% EJECUTADO ACUMULADO	26,55%

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 5 ENERO		ACTA ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Valor Unitario	Vr. Parcial Total	Cant	Vr. Total	Cant	Vr. Total
263	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	\$ 51.085,98	\$ 51.085,98	6,00	\$ 306.516,00	33,00	\$ 1.685.838,00
264	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	\$ 47.237,72	\$ 47.238	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 661.328,00
COSTOS DIRECTOS				\$ 116.649.140,17	COSTO DIRECTO ACUM.	\$ 356.434.029,00		\$ 2.660.006.099,00
Administración			32,90%	\$ 38.377.567,00	32,90%	\$ 117.266.796,00		\$ 875.142.007,00
Imprevistos			0,50%	\$ 583.246,00	0,00%	\$ 0,00		\$ 0,00
Utilidad			5,00%	\$ 5.832.457,00	5,00%	\$ 17.821.701,00		\$ 133.000.304,00
Valor Total AIU			38,40%	\$ 44.793.270,00	37,90%	\$ 135.088.497,00		\$ 1.008.142.311,00
Pago Reajuste				\$ 100.000.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00
Guía Socioambiental				\$ 125.529.472,00		\$ 2.563.399,00		\$ 41.400.118,00
Pólizas				\$ 71.143.135,00		\$ 0,00		\$ 50.147.456,00
PRESUPUESTO TOTAL				\$ 458.115.017,00	VALOR TOTAL ACUM.	\$ 494.085.925,00	VALOR TOTAL ACUMULADO	\$ 3.759.695.984,00

Miguel Ángel Osorio Gómez
Director de Obra - UT SIT MEDELLIN

Marta Lucía Suárez Gómez
Director de Interventoría - CONSORCIO INT FAROL MED
