

(PERIODO JULIO DE 2020)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 167-GINRED1-2020	FECHA DEL INFORME: 05 DE AGOSTO DE 2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 10 DE JUNIO 2020

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** (EL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No 1 REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G) CON OCASIÓN A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 139-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA EN SUS UNIDADES UBICADAS EN EL COMPLEJO NAVAL EL MORRO-TUMACO NARIÑO)

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición y/o prorroga)	---	-----

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US\$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G) CON OCASIÓN A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 139-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA EN SUS UNIDADES UBICADAS EN EL COMPLEJO NAVAL EL MORRO-TUMACO NARIÑO	1	\$ 51.561.300	\$51.561.300
VALOR TOTAL				\$ 51.561.300

2. VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$51.561.300)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	\$ 51.561.300	\$ 51.561.300	\$ 51.561.300

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUE STAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2020	9620	2020-01-27	19220	2020-06-12	\$ 51.561.300
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS					\$ 51.561.300
GASTOS DE NACIONALI ZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. NV-100026110

Certificado No. 01

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de Aprobación: 12 DIAS DEL MES DE JUNIO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/06/2020	10/06/2021	10.312.260
Prestaciones Sociales	11/06/2020	10/12/2023	5.156.130
Calidad del Servicio	11/06/2020	10/06/2021	10.312.260

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato será hasta el **10 de diciembre de 2020**. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA A ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G) CON OCASIÓN A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 139-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN SUS UNIDADES UBICADAS EN EL COMPLEJO NAVAL EL MORRO-TUMACO NARIÑO	\$ 51.561.300					

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: (Para contratos de obra en éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G) CON OCASIÓN A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 139-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN SUS UNIDADES UBICADAS EN EL COMPLEJO NAVAL EL MORRO-TUMACO NARIÑO	10/JUN/2020	10/DIC/2020	0%
PROMEDIO PONDERADO			0%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al área de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302, 2014)

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Dentro de las actividades de supervisión se realizaron dos reuniones:

- El 17 de julio del presente en instalaciones de la Dimar se realizó una reunión en la que participaron FELIPE PULIDO y FABIO GARZON contratista de obra; JAVIER FELIPE CASAS, representante Legal de OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S contratista de Interventoría, y FABIO MEJIA director de la Interventoría. Por parte de la DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA; TN SERGIO FABIAN BARAJAS, subdirector CCCP; Ingeniero de apoyo ANDRES NARVAEZ adscrito a la DIMAR; S2 COTES SERGIO Logístico CP02 y S2 VILLAMIL EDWIN Logístico CCCP la cual tenía por objeto establecer los tiempos de ejecución de los respectivos contratos y realizar una visita de obra al contrato 165-GINRED1-2020 con el fin de realizar un recorrido al detalle de cada una de las actividades contratadas.

Registro Fotografico Visita de obra 17 de julio 2020



Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01



Se anexa a la reunión el acta en la que se establecen los compromisos por las partes:



Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1	
	"EL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.1 REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G) CON OCASION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCION ABBREVIADA DE MENOR CUANTIA NO.129-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL MARITIMA EN SUS UNIDADES".	CONTRATO No 167-GINRED1-2020
	ACTA DE REUNION N°	
	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL NO. 1 GINRED 1	
FORMATO COMUNICACION	FECHA	17-01-2020 REV:00259661

PARTICIPANTES: Ag. Fabian Castro, Juan Contreras, Dr. Los Rios
Coronel (Contreras), Dr. Juan Carlos Valenzuela, Sr. Sergio
Barajas (Sergio), Sr. Sergio, Sr. Juan Valenzuela, Dr. Andres
Nunes, Dr. Juan Contreras, Sr. Juan

OBJETO DE LA REUNION: Visita obra Contreras 165-61-2020
Recorrido Detallado de obra con la ex. autoridades Contreras

DESARROLLO: Se leen las Disposiciones Básicas detalladas de los Areas a intervenir por parte del Contratista, Interventoría, Funcionarios de Divesa y Capitanes de Puerto. Se Intervienen los siguientes Obisporos:

- 1) El Contratista e Interventoría, Solicitan a la Brigada Contratista los Planos Arquitectónicos y Eléctricos de los Areas de Centro de Inyección y Capitanía de Puerto, con el propósito de Entender y definir la ubicación en Antepuerto y acceso a Plataforma, disposición y ubicación, Determinar Areas de Espacio y Recorrido, y/o Se hace Abordaje que El Campesino Eléctrico hasta la Puerta grande descondicionamiento del

Carrera 10 No 18-44 Oficina 1101- Teléfono: 7041562
Mail: cubikosas20@hotmail.com



Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

1) Marcas de la Red. Pláticas y Suspenso de partes.
2) Contributo e Interventiva: Solicita a Entidad
Contribuyente, los planes de detalle de las Obras Pías
Para determinar, pendiente, disponer de los mismos.
3) Contributo e Interventiva: Solicita a la Entidad
Contribuyente El plan Integral de Conservación de
la parte de acceso de la parte del Auditorio
del Centro Cultural de Mexiquense.
4) Contributo e Interventiva: Recomendación Realiza
una Inspección Supervisora del Estado Integral
de las Obras.
5) Contributo e Interventiva: Solicita los Especificaciones
Revisas de Elementos Plásticos y Elementos de Acero.



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01

	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS NIT 900.923.533-1	
	"EL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.1 REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO (G), CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.139-GINRED1-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA EN SUS UNIDADES".	
	CONTRATO No	167-GINRED1-2020
	ACTA DE REUNIÓN N°	
FORMATO COMUNICACIÓN	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 1 INRED 1	
	FECHA	REV:00259661

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

La Entidad Contratante
Manifiesta que el día
Martes, mediante videconferencia
Dara información detallada
Alcance de Bases de
Dta informac

PLAZO DE ENTREGA

ASISTENTES

FABIO GARCIA DAZA
Jairo Fernando Bonnyal #f
TN Sergio Borraya
SE CAROL SERRA
SE Edna Villa
Eng. Andrés Arango
JUAN CARLOS VALDEZ
Tercer Hacer Rely. 22


FIRMA

Carrera 10 No 18-44 Oficina 1101- Teléfono: 7041562
Mail: cubikosas20@hotmail.com

- El día 22 de julio del presente se realizó una reunión virtual con personal de la DIMAR y contratistas de obra e Interventoría de los contratos en mención la cual tuvo como objetivo aclarar dudas que se presentaron en la visita técnica del día 17 de julio respecto a las actividades contratadas respecto a las adecuaciones del auditorio y la capitanía de Puerto en la cual se realizaron algunas aclaraciones respecto a los ítems contratados y se definieron aspectos importantes para su ejecución.

Dentro de la reunión los contratistas de obra solicitan los diseños estructurales, eléctricos y arquitectónicos para la ejecución de las obras, para lo cual la Dimar aclara que dentro del proceso precontractual los posibles oferentes no asistieron a la vista de obra establecida en los pliegos de condiciones en la cual dan por entendido que los posibles contratistas asumen las especificaciones técnicas del contrato.

Registro Fotografico Visita de obra 22 de julio 2020

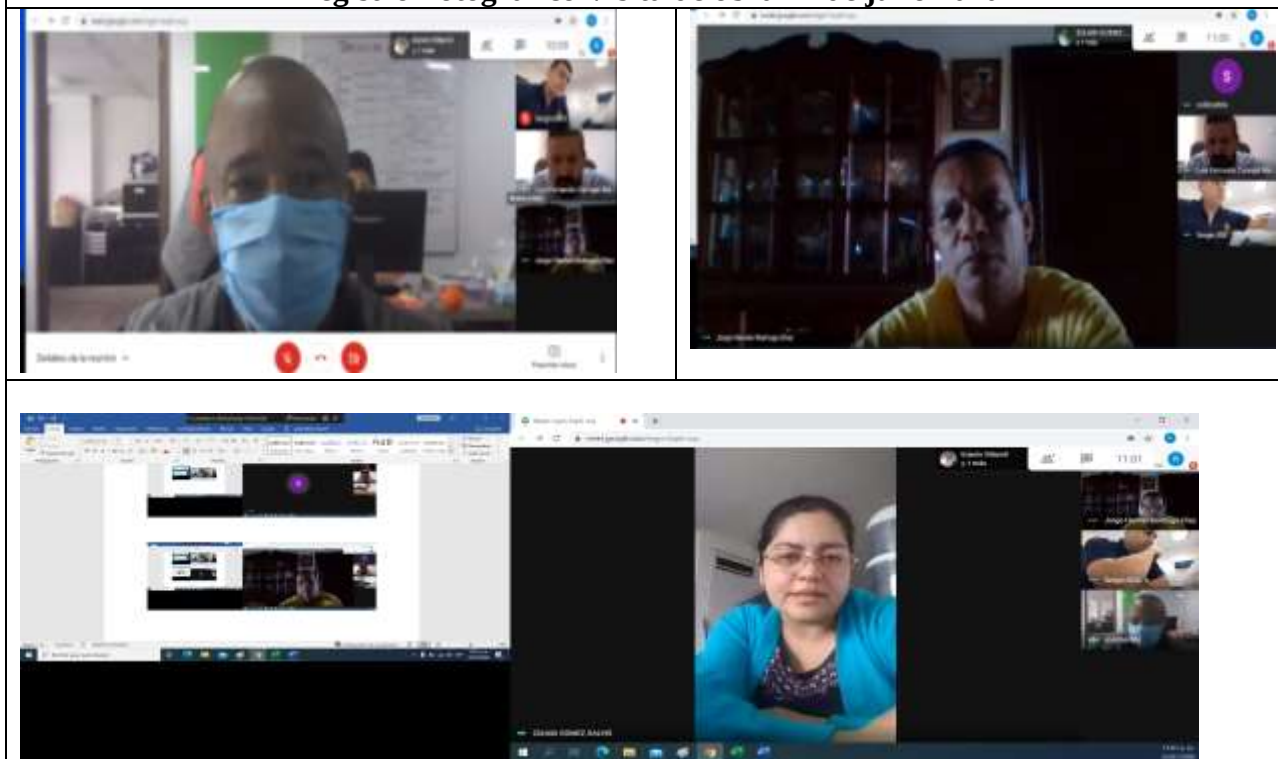

- El día 22 de julio se hace entrega por parte de la DIMAR a los contratistas de obra y de interventoría los planos del Auditorio y las especificaciones de la teja Termo Acústica como se había solicitado.
- El día 25 de julio la interventoría notifica a la DIMAR la aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo director de obra, Residente de obra, Ingeniero eléctrico, profesional SISO y Maestro de obra respecto al contrato de obra No 166-GINRED1-2020 y 167-GINRED1-2020

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 01



- El día 27 de julio se realizó la firma del acta de inicio del contrato de interventoría en la cual se le solicita al contratista actualizar la respectiva vigencia de las pólizas.
- Por parte de interventoría el día 02 de agosto hacen entrega del informe semanal de supervisión al contrato de obra No 166-GINRED1-2020 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio al 01 de agosto.

8. ANEXOS AL INFORME:

- Acta de Inicio del 27 de julio 2020
- Informe contrato de obra No 166-GINRED1-2020 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio al 01 de agosto 2020

Atentamente,



TN MANUEL ALEJANDRO GÚTIERREZ MORENO
Supervisor de contrato No. 167-GINRED1-2020
