

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 3	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4151.010.26.1.0271 de 2026	
Nombre completo del contratista: LUIS ALBEIRO VELASCO ÁLVAREZ	
Documento de identificación: 16842037	
Nombre del supervisor: SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del proyecto denominado BP-26005375 "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 14/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cesión: N/A				
Terminación anticipada: N/A				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (16.755.600)				
Adición:				
Prórroga:				
Información para Retención en la fuente:				
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:			SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.				X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.				X
Información:				
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	
\$ 16.755.600	\$ 2.792.600	\$ 5.585.200	\$ 8.377.800	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1079593826 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823789891 Operador: Simple S.A Fecha de Pago: 09/03/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2026
--	--

Observaciones al informe financiero y contable

5. INFORME TÉCNICO

Concepto del Supervisor:

1. Apoyó las actividades de mantenimiento principalmente en vías rurales, mediante el desmonte de vegetación o material acumulado en los bordes y cunetas en la vía principal en la vereda Pico de Águila, en el sector La Riverita y en la vía El Bofe - La Vorágine del corregimiento de Pance.
2. Brindó apoyo manual en las actividades de nivelación en la vía principal en la vereda Pico de Águila, en el sector La Riverita y en la vía El Bofe - La Vorágine del corregimiento de Pance con material granular que se adelantó en la cuadrilla a la cual se asignó la operación.
3. Contribuyó a la estabilización de zonas erosionadas con material adecuado en el corregimiento de Pance.
4. Realizó limpieza de cunetas para evitar acumulación de agua y erosión de tierras en la vía principal en la vereda Pico de Águila, en el sector La Riverita y en la vía El Bofe - La Vorágine del corregimiento de Pance.
5. Efectuó actividades de excavación manual, limpieza y mantenimiento de zanjas para mejorar la evacuación del agua en la vía principal en la vereda Pico de Águila, en el sector La Riverita y en la vía El Bofe - La Vorágine del corregimiento de Pance.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002. F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

6. Apoyó actividades de limpieza de alcantarillas y drenajes transversales en la vía principal en la vereda Pico de Águila, en el sector La Riverita y en la vía El Bofe - La VoráGINE del corregimiento de Pance.

7. Contribuyó en remoción de derrumbes y material deslizado que obstruya la vía, igualmente el despeje de escombros y residuos en la calzada y áreas laterales en el corregimiento de Pance.

8. Hizo uso adecuado de las herramientas asignadas para la ejecución de sus actividades.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

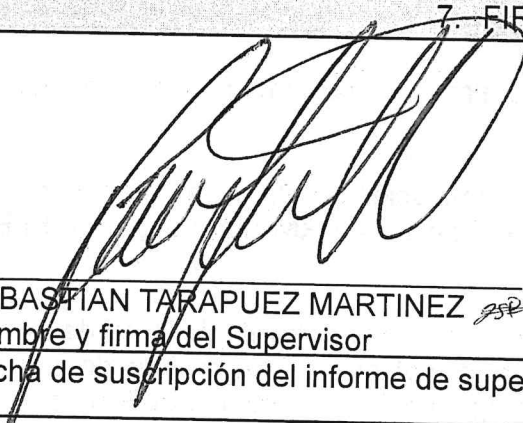

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ *ST*

Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24 de marzo de 2026.
