


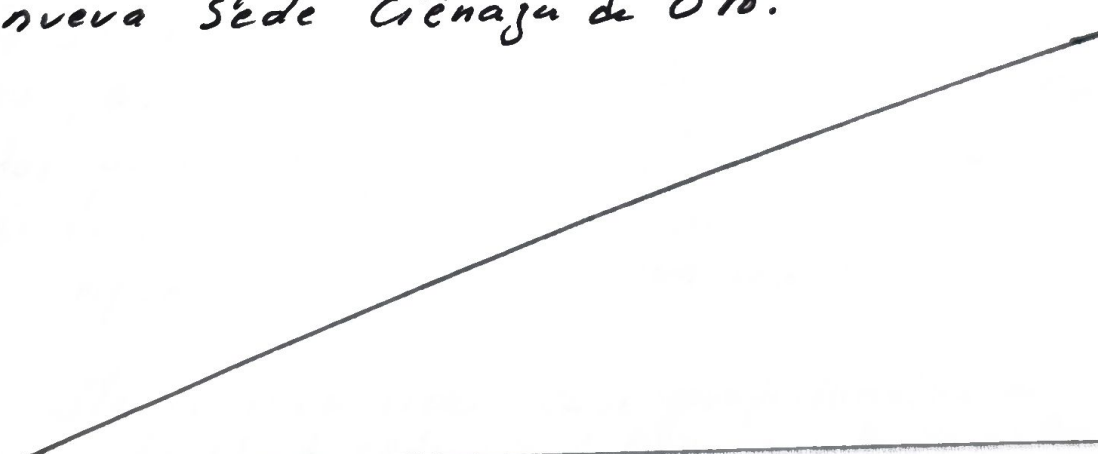

ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: VISITA CAMPO Y RECORRIDO CON SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA			
CIUDAD Y FECHA: Ciénaga de Oro - Córdoba, 29 Enero-26		HORA INICIO: 8:30 am	HORA FIN: 4:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Predio Ciénaga de Oro		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Córdoba Regional Córdoba.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Realizar recorrido en campo donde se ejecutara la obra de la nueva sede Ciénaga de Oro -Córdoba, 2. Socializar con actores externos del proyecto de la nueva sede Ciénaga de Oro Córdoba. 3. Evidenciar en sitio las obras y Equipos pre existentes en el predio de Ciénaga de Oro 4. Preliminares para inicio de actividades de obra en la nueva sede Ciénaga de Oro. 			

ipm

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar recorrido en Predio de nueva sede Ciénaga de Oro.
2. Evidenciar en sitio obras y equipos preexistentes
3. Evidenciar en sitio factores existentes que impactan el proyecto como temas ambientales
4. Socializar ante actores externos al SENA los encargados de gerenciar el proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza visita de Campo al predio donde se iniciarán actividades de la nueva sede Ciénaga de Oro en compañía de la Supervisión de DAF SENA, Apoyo Infraestructura DAF SENA, Gerente del proyecto y coordinador delegados por parte de la Sociedad Hotelera Tegundama. En sitio y durante el recorrido se muestran los linderos, zonas verdes, módulos existentes, accesos al predio temporales, Postes instalados para energización, Cuartos técnicos, Sub estación eléctrica y en general donde quedara ubicados los bloques de infraestructura de la nueva sede.
2. Se asiste a recorrido con profesionales de la Alcaldía Municipal, alcalde de Ciénaga de Oro, profesionales de la gobernación de Córdoba, Profesionales del SENA Córdoba

Profesionales del SENA DG, Representantes de la comunidad como organizaciones de las Haderas y Profesionales de la Sociedad Hotelera Tequendama, se informa que se encuentran en procesos administrativos de adjudicación de los contratistas derivados de obra e interventoría, se informa a los asistentes que las obras estarán independizadas del acceso a modulares y Finalmente se hace un recorrido por los Modulares, para evidenciar el estado actual y que ya se va a proceder con el inicio de la formación. Se recomienda al Alcalde y Asistentes socializar a la comunidad el inicio de obras para que se presente mano de obra operativa y técnica para esta etapa de ejecución de obras. Se estará informando al inicio de actividades, que será aproximadamente inicios Marzo.

3. Se realiza recorrido y se presenta a la Sociedad Tequendama las preexistencias como vía de acceso, tanques y cuartos técnicos de redes hidrosanitarios, subestación y cuartos técnicos eléctricos, casetas de vigilancia y de suma importancia toda la infraestructura de los Modulares, se informa que este proyecto debe ser integrado a la nueva sede y que deben asegurarse los servicios públicos de la nueva sede en un solo componente. Igualmente se informa que mientras la obra está en ejecución, en sitio se tendrá formación, por tanto, es necesario un seguimiento riguroso al cerramiento de obra y los accesos separados de aprendices y mano de obra y maquinaria.

4. Se informa a la Sociedad Tequendama que deben realizarse adecuaciones de acceso al predio de forma independiente al existente ya que los aprendices estarán en Formación y se tendrá transito constantemente. Debe garantizarse un Cerramiento seguro de obra y un Plan de Tráfico que permita una movilidad segura de maquinaria. Debe iniciarse trámite de Servicios públicos de la nueva sede.



CONCLUSIONES

1. Se realiza recorrido en el predio donde se construirá la nueva sede ciénaga de oro y se informa y socializa todos los componentes y preexistencias del predio.
2. Se socializa ante Alcaldía municipal y Comunidad el inicio de obras y el inicio de la Formación en los Modulares. Se solicita a la Alcaldía socializar ante el inicio de obras para que la comunidad presente hojas de vida para mano de obra operativa, técnica y profesional.
3. Se socializa a la Sociedad Teguendama las preexistencias de los Modulares, Equipos para energizar y Cuartos técnicos.
4. Bajo la Gerencia de la Sociedad Hotelera Teguendama se debe garantizar acceso al predio de forma diferente al existente por temas de seguridad de personas en tránsito.
Garantizar un cerramiento de obra seguro.
Garantizar un Plan de Movilidad Seguro por obras.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD / DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Contratación Derivados obra	hasta Finales de Febrero 2026	Sociedad Hotelera Teguendama	Asistencia presencial
Mensajes y publicaciones Mano obra comunidad	durante etapa inicio de obras	Alcaldía Municipal	_____
Preliminares, acceso a predio y P.M.T	durante inicio de obras	Sociedad Hotelera Teguendama	Asistencia presencial
_____	_____	_____	_____



OBJETIVO (S)

VISITA CAMPO CIENAGA DE ORO - (Sociedad Tegunduma - Mollares)									
		PLANTA		OTRO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO			

[illegible]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
