
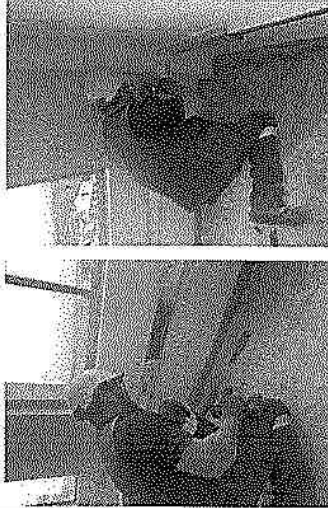




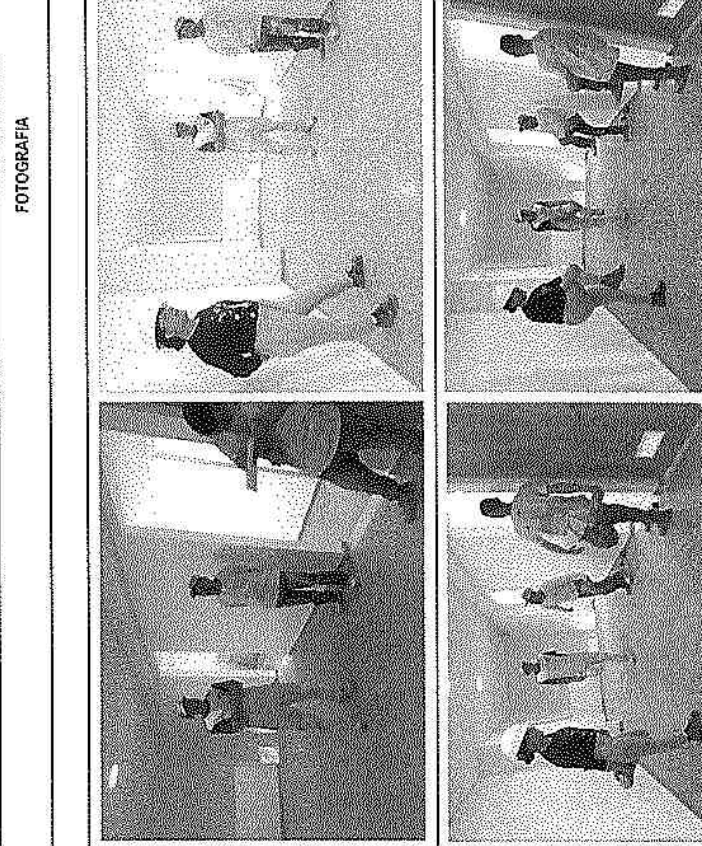
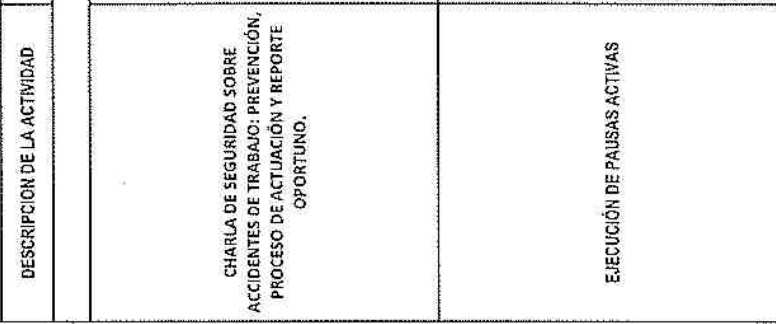

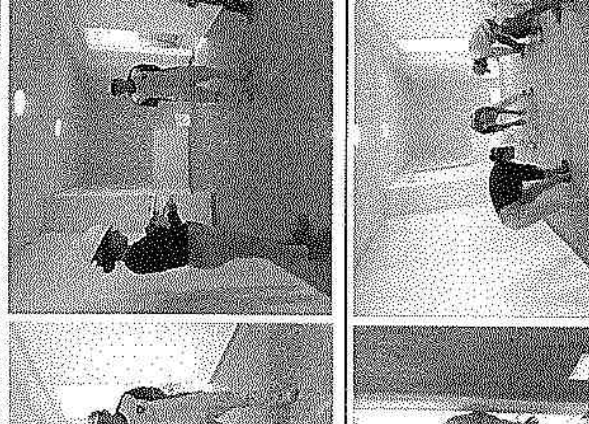
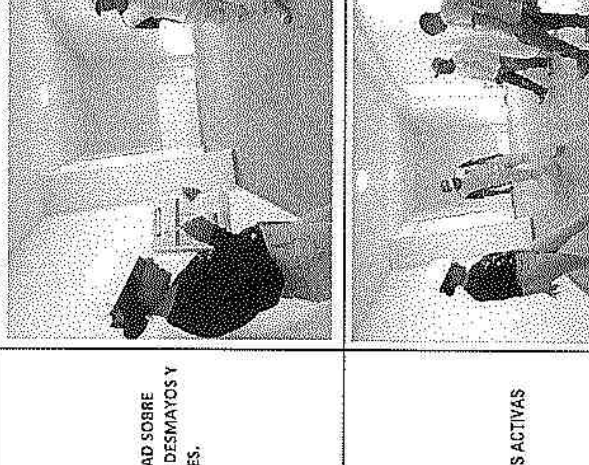

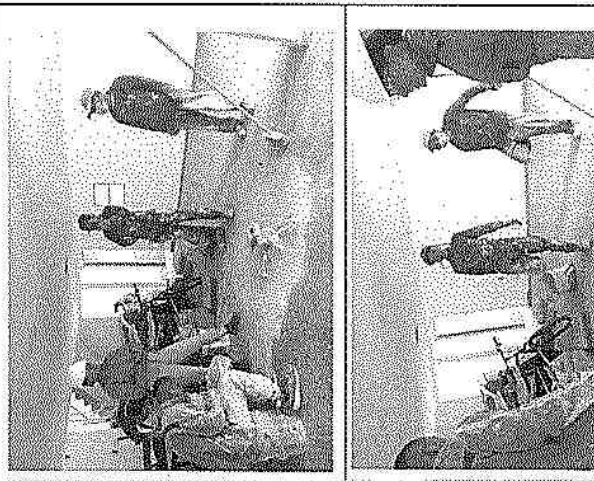


	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14 VERSIÓN: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA Y DALMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2026</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFÍA</p>	
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		
<p>ACOMPANAMIENTO DE SST</p>		

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CODIGO: FO-SST14</p> <p>VERSION: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>CHARLA DE SEGURIDAD SOBRE REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14 VERSION: 1</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2025</p>
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>CHARLA DE SEGURIDAD SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO: PREVENCIÓN, PROCESO DE ACTUACIÓN Y REPORTE OPORTUNO.</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14 VERSIÓN: 1</p>
<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2026</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>
<p>CHARLA DE SEGURIDAD SOBRE ATENCIÓN BÁSICA ANTE DESMAYOS Y CONVULSIONES.</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS</p>		

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>CODIGO: FO-SST 14 VERSIÓN: 1</p>
<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS EN OBRA</p>	<p>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.</p>	<p>AÑO REPORTADO: 2026</p>
<p>CENTRO DE TRABAJO / OBRA :</p>	<p>FOTOGRAFIA</p>	
<p>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</p>		
<p>CHARLA DE SEGURIDAD SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN OBRA DENTRO DEL PUESTO DE SALUD.</p>		
<p>EJECUCIÓN DE PALISAS ACTIVAS</p>		



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, FRANCISCO ARANDA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.408.849, y con Tarjeta Profesional No. 104452-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS., identificada con Nit. 830.018.803-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)


Dada en Bogotá D.C., a los (27) veintisiete días del mes de marzo de 2026.

FRANCISCO ARANDA
REVISOR FISCAL
DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO: 1.030.593.155
 PENALOZA CORDOBA

LEIDY PAOLA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242533-T

LEIDY PAOLA
 PENALOZA CORDOBA
 C.C. 1030593155

RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA DIRECTOR GENERAL

249588 258071

VALIDO PARA CONSTRUCCION
11/07/2020

FECHA DE NACIMIENTO: 11-JUN-1991
 LA MESA (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA: 1.63 O+ F SEXO

16-JUN-2009 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL



A-1500150-01044561-F-1030593155-20181106 0063103452A-T 9906326452

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C.

FINALE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO: **79.408.849**
ARANDA ORJUELA
 APELLIDOS: **FRANCISCO JAVIER**
 NOMBRES: *[Signature]*




FECHA DE NACIMIENTO: **09-FEB-1967**
ARMENIA
 (QUINDIO)
 LUGAR DE NACIMIENTO:
1.65 **O+** **M**
 ESTATURA: **63** **RS** **3240**
19-ABR-1985 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: *[Signature]*
 REGISTRO NACIONAL
 CANCELACION: 1985/04/19



Republica de Colombia
 Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104452-T
FRANCISCO JAVIER
ARANDA ORJUELA
C.C. 79408849
RESOLUCION INSCRIPCION 189
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 2004/09/16
 PRESIDENTE: *[Signature]*
MIRIAM TRUJILLO PERAZA
 113002




24277
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 47 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
 Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER ARANDA ORJUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79408849 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.335.672
CARVAJAL GOMEZ

APELLIDOS
CRISTIAN CIBEL

REPUBLICA DE COLOMBIA



Signature



FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1967

MEDINA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA O+ O.S. TIPO M SEXO

12-AGO-1985 VILAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EMISION

INSTRUMENTO NACIONAL
CUALQUIER OTRA DESCRIPCION



A-1806180-00132925-M-0017335672-20081202 09073375266A 1 1840010009

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489984(8020) 000014112401063 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 6 8 0 3

6. DV

8

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 19 A 79 18 OF 214

42. Correo electrónico

contabilidad@daimarconstrucciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 1 8 2 4 3 9

45. Teléfono 2

3 1 4 4 4 4 1 8 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código 4 3 3 0

47. Fecha inicio actividad 1 9 9 6 0 2 2 7

48. Código 4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad 1 9 9 6 0 2 2 7

50. Código 1 2 4 3 2 1 4 3 2 2

51. Código

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL GOMEZ CRISTIAN CIBEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489984(8020) 0000141124010632

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 8 8 0 3

6. DV

8

12. Dirección seccional (Impuestos de Bogotá)

13. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/> 2	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distritales	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/> 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	62. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	6 0 7	2	63. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 9 6 0 2 2 7	2 0 1 7 1 1 1 7	64. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	3 4		65. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	66. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 6 1 3	2 0 1 7 1 2 2 2	67. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 1 0 4 2 4	0 0 7 1 0 4 2 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 6 0 2 2 7		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632



(415)7707212489984(8020) 0000141124010632

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 8 8 0 3 | 8

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 6 0 6 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadani	1 3	101. Número de identificación 1 7 3 3 5 6 7 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CARVAJAL	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre CRISTIAN	107. Otros nombres CIBEL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 6 0 6 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 1 9 5 8 1 2 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido ACOSTA	106. Primer nombre DAISSY	107. Otros nombres ROCIO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632




(415)7707212489984(8020) 00014112401063 2

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 1 8 8 0 3 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 13. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 3 5 6 7 2		COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARVAJAL	GOMEZ	CRISTIAN	GIBEL
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	5 0	1 9 9 6 0 6 1 3	
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 9 5 8 1 2 5		COLOMBIA 1 6 9
GARCIA	ACOSTA	DAISSY	ROCIO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,000,000	5 0	1 9 9 6 0 6 1 3	
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124010632



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 8 8 0 3

6. DV

8

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

11. Buzón electrónico

8 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 4 0 8 8 4 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 0 4 4 5 2 T
	128. Primer apellido ARANDA	129. Segundo apellido ORJUELA	130. Primer nombre FRANCISCO	131. Otros nombres JAVIER
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 2 0 3			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 7 9 4 6 9 1 4 9	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 5 6 2 3 1 T
	140. Primer apellido MORALES	141. Segundo apellido GUACARY	142. Primer nombre EDWIN	143. Otros nombres GIOVANNI
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 2 0 3			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

COPIA CERTIFICADA SIN COSTO


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 8300188038 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta de Ahorros No. 014202840 desde el 05 de abril de 2006, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3



CONTRATO DE OBRA No: 076-2025



OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 086-2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR PARA SU SEDE SAN MATEO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.



CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CRUZARK S.A.S.

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779

	INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	076-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	086-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

CONTENIDO

1	<u>INTRODUCCIÓN</u>	3
2	<u>ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO.</u>	3
2.1	ANTECEDENTES	3
2.2	DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO	4
2.3	ALCANCE	5
3	<u>CAPÍTULO III: AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO</u>	5
3.1	AVANCE FINANCIERO	5
4	<u>REGISTRO FOTOGRAFICO</u>	9
5	<u>APROBACION DE PAGO</u>	18
6	<u>ANEXOS</u>	18

	INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	076-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	086-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se suscribe en el marco del Contrato de Interventoría No. 086-2025, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR PARA SU SEDE SAN MATEO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Este documento tiene como propósito fundamental certificar y documentar el avance ejecutado correspondiente al Acta de Corte Parcial No. 03. En cumplimiento de las condiciones contractuales de forma de pago, se presenta el soporte detallado de las actividades de mejoramiento, reparación y adecuación locativa realizadas en la sede.


Con la radicación de este corte, el proyecto alcanza un avance acumulado del 90% del valor total contratado, cumpliendo así con el valor máximo de pagos parciales permitidos antes de la etapa de cierre. Por tanto, se adjuntan la documentación necesaria para la facturación, dejando como saldo pendiente únicamente el 10% correspondiente al acta de liquidación final.

2 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO,

2.1 ANTECEDENTES

- Que el día 22 de septiembre de 2025, se suscribió el contrato de obra No. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS". cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025."
- Que en la cláusula cuarta el plazo de ejecución será de cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que en la cláusula tercera del valor total del contrato asciende a quinientos sesenta y ocho millones setecientos noventa mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte. (\$568.790.678,00) este valor incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tributos y demás gastos asociados.

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
 gestion@studiocruzark.com
 TEL: 3107667779

	INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	076-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoría No.	086-2025	
	Contratista:	CRUZARK S.A.S	

- Que el día 3 de octubre de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato de obra No. 076-2025 suscrito entre la ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS".
- Se suscribe prorroga No.1, por un mes más pactándose nueva fecha de terminación el día dos (2) de mayo de 2026
- Se suscribe prorroga No. 2, por quince (15) más pactándose nueva fecha de terminación el día dos (17) de mayo de 2026.
- Se suscribe prorroga No. 3, por siete (7) más pactándose nueva fecha de terminación el día dos (24) de mayo de 2026.
-

2.2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 076-2025
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025.
CONTRATISTA	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACION	830.018.803-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$568.790.678,00)
PRORROGA No.1	SE APLAZA EL CONTRATO POR UN MES MAS
PRORROGA No.2	SE APLAZA EL CONTRATO POR QUINCE DIAS MAS
PRORROGA No.3	SE APLAZA EL CONTRATO POR SIETE DIAS MAS
PLAZO	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	MARZO 24 DE 2026
INTERVENTORÍA EXTERNA:	CRUZARK SAS
SUPERVISIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779

	INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3		
	Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Contrato de Obra No.	076-2025	
	Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS	
	Contrato de interventoria No.	086-2025	
Contratista:	CRUZARK S.A.S		

2.3 ALCANCE

El contratista deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en cuanto a las adecuaciones de la infraestructura.

Las actividades por ejecutar incluyen por lo menos y sin limitarse a éstas, las siguientes, además de las que se desprendan de los documentos del Contrato, en todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones así:

- Preliminares
- Mampostería
- Pañetes, revoques y repellos
- Cubierta
- Carpintería en madera
- Carpintería metálica
- Instalaciones hidrosanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Pisos y bases
- Pisos acabados, enchapes y accesorios
- Cielo raso
- Aparatos sanitarios
- Pinturas

3 CAPÍTULO III: AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO

3.1 AVANCE FINANCIERO

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera – Valor y Forma de Pago del Contrato de obra No. 076-2025, se establece que el contratista está facultado para presentar actas de corte parcial una vez alcanzado un avance físico de obra mínimo del treinta por ciento (30%).

Al respecto, la Interventoría certifica que, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto ha superado satisfactoriamente los porcentajes de ejecución previstos. El avance de obra acumulado, ejecutado y debidamente validado corresponde al 90% del valor total contratado.

Bajo este escenario, se procede con el trámite del Acta de Corte Parcial No. 03, la cual representa el tope máximo de pagos parciales permitidos contractualmente (90%). De acuerdo con las reglas de pago establecidas, el 10% restante queda reservado exclusivamente para el pago final, sujeto a la entrega, revisión y aval del Acta de Liquidación Final por parte de la Interventoría y la Supervisión de la ESE Municipal de Soacha.

Este avance del 90% refleja el cumplimiento riguroso del cronograma de actividades de adecuación menor en la Sede San Mateo, garantizando que las intervenciones técnicas y las mejoras locativas

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



se ajustan a los requerimientos de la Resolución 0941 de 2025. Este avance corresponde a la ejecución de las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	EJECUTADO	
	UNID.	CANT.
PRELIMINARES		
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	279,36
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	146,94
DEMOLICIÓN PANETE MURO	M2	127,20
DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	5,10
DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	0,00
DESMONTE MUROS SECOS	M2	5,99
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	14,00
DESMONTE VENTANAS	M2	5,04
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	7,70
DEMOLICION SOBREPISO POCETAS	M2	0,86
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M (LINEAL)	ML	58,67
DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE	ML	70,16
DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTE	ML	188,58
CORTE DE MURO Y PISO CON PULIDORA Y DEMOLICION DE PAÑETE Y PISO PARA HACER CAJA PARA LA INSTALACION DE LA MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO.	ML	212,67
DEMOLICION DE POYO EXISTENTE EN LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS, ALTURA 20 CM	ML	1,03
DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO	ML	23,60
MAMPOSTERIA		
DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	18,00
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	46,86
ANCLAJE 3/8" LP30CM	UN	104,00
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		
FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	391,56
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, EP1.5 CM (LINEAL)	ML	215,50
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	267,46

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
 gestion@studiocruzark.com
 TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



PAÑETE LISO MUROS 1:4, EP1.5 CM (LINEAL)	ML	289,68
CUBIERTA		
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DP4"	ML	0,00
CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DSP30	ML	25,42
MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	0,00
TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	0,00
SOPORTE METALICO PARA ASENTAMIENTO TEJA TERMOACÚSTICA PLATINA ALUMINIO	ML	0,00
CARPINTERÍA EN MADERA		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BLANCO GRIS INCLUYE, HOJA ENTABLERADA EN LAMINA MELAMINA DE 6MM CON BASTIDOR PERIMETRAL Y ESTRUCTURA DE MARCO EN ALUMINIO , BISAGRA TRADICIONAL OMEGA CERRADURA DE MANIJA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y PERSIANA, DIMENSIONES 2,1 HASTA ANCHO 1,0 MTS.	UN	3,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA BLANCO HIELO INCLUYE, HOJA ENTABLERADA EN LAMINA DE TRIPLEX 0.76-1.0 M CON BASTIDOR PERIMETRAL Y RELLENO EN PINO, BISAGRA DE VAIVEN DE PISO , CERRADURA DE MANIJA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y VENTANA.	UN	0,80
CARPINTERÍA METÁLICA		
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	0,00
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00
DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO HP 1.8 M, EP6MM	M2	10,71
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE SECCION 60 CM CON POCETA Y ENTREPAÑO, SOPORTES CON TUBO DE 2" AUTONIVELANTES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, ESTRUCTURA NO DUCTIBLE, SEGUN NSR 10, Y ESTRUCTURA PARA EVITAR VIBRACIÓN	ML	4,73
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	205,40

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
 gestion@studiocruzark.com
 TEL: 3107667779


INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



ALIMENTADORES DE CIRCUITO PARA SALIDAS Y TOMACORRIENTE EN CABLE TRENZADO 3#12 AWG PE HEF FR LS CT SINTOX / THWN DESDE TABLEROS DE AUTOMÁTICOS POR DUCTO PORTACABLES HASTA LA PRIMERA SALIDA (COLOR AMARILLO-BLANCO-VERDE), SE INCLUYEN AMARRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS POR EL DUCTO EN CADA TRAMO RECTO.	ML	248,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION, INCLUYE CABLE CALIBRE 12 AWG/PE HEF FR LS CT Y TUBO SH-40 DE 3/4", CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION	UN	74,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60x60 60 W DE EMPOTRAR A 120-245V. FLUJO 3600 LM. CCT 6000K.	UN	37,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 8" 25 W, DRIVER 85-220V 40.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.	UN	13,00
PISOS BASES		
ALISTADO PISOS 1:3, EP0.04	M2	24,98
PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS		
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	24,98
GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	87,13
TAPA REGISTRO 20X20	UN	6,00
DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	150,00
MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	86,00
ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	1,46
CIELO RASO		
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	55,30
PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN DE BALAS DE ILUMINACIÓN	UN	35,00
PERFORACIÓN EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN DE LAMPARAS CUADRADAS DE 60X60, INCLUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y MARCO METALICO	UN	23,00
MEDIA CAÑA EN YESO Y/O PVC ENTRE MUROS - TECHOS, DESARROLLO HASTA 8 CM	ML	100,00
REJILLA DE VENTILACION PLASTICA DE 60X60 PARA BAÑOS Y CUARTOS CIEGOS	UN	0,00
PINTURAS		
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0,00
ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	0,00
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	0,00

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
 gestion@studiocruzark.com
 TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S




ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	0,00
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	0,00
PINTURA EPÓXICA	M2	0,00
PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	0,00
PINTURA VINILO TIPO KORAZA, INCLUYE PRIMERA MANO PARA SELLO TIPO III Y 2 MANOS DE KORAZA	M2	0,00

Para el presente informe el resumen del avance acumulado ejecutado y facturado es:

RESUMEN FINANCIERO	ESTADO DE PAGO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 568.790.678,00
ACTA PARCIAL No.1	\$ 183.131.439,34 PAGADA
ACTA PARCIAL No.2	\$ 171.624.023,45 PAGADA
ACTA PARCIAL No.3	\$ 157.156.147,43 EN TRAMITE
PENDIENTE POR FACTURAR	\$ 56.879.067,78

4 REGISTRO FOTOGRAFICO

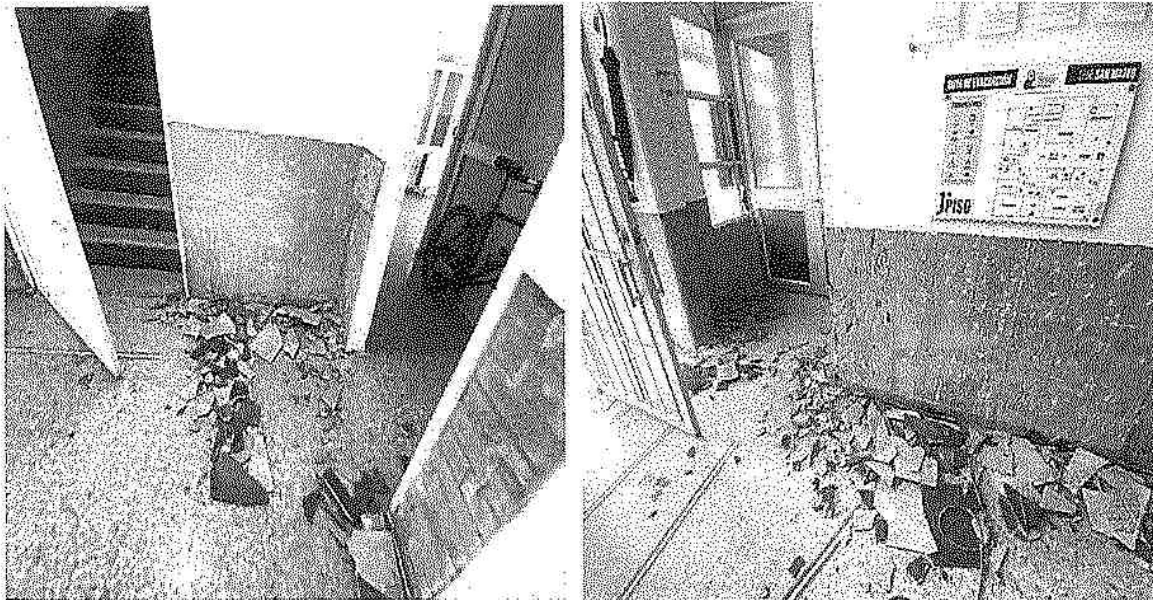

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S







Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S

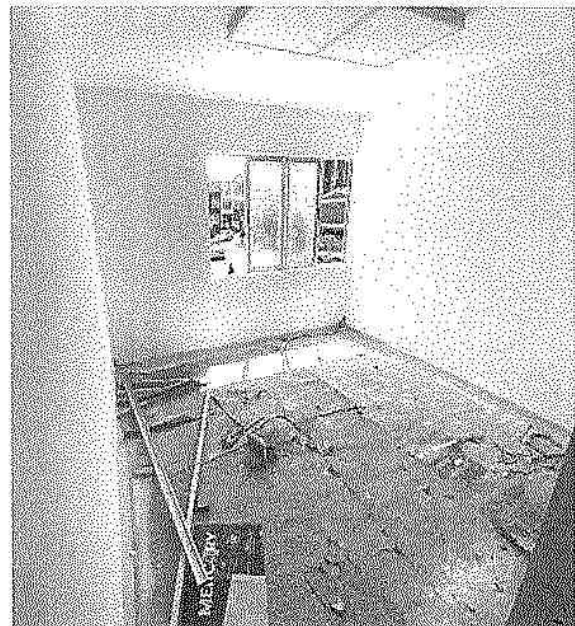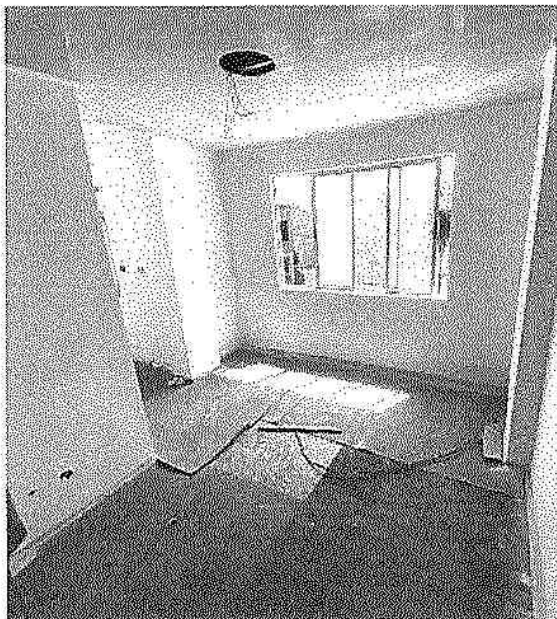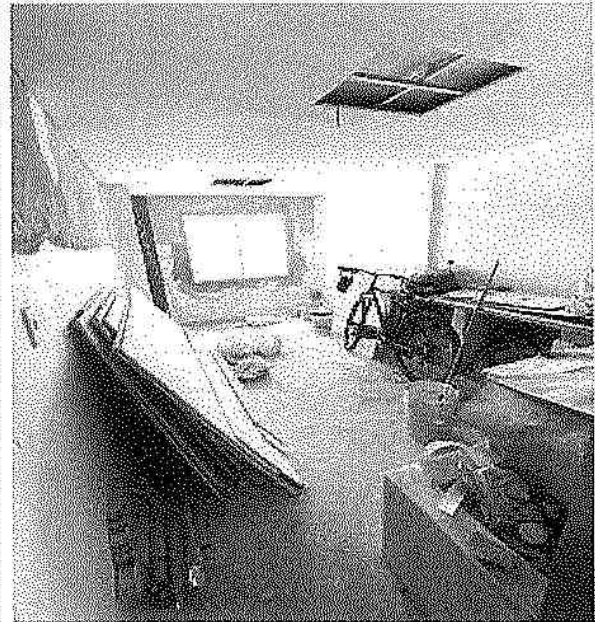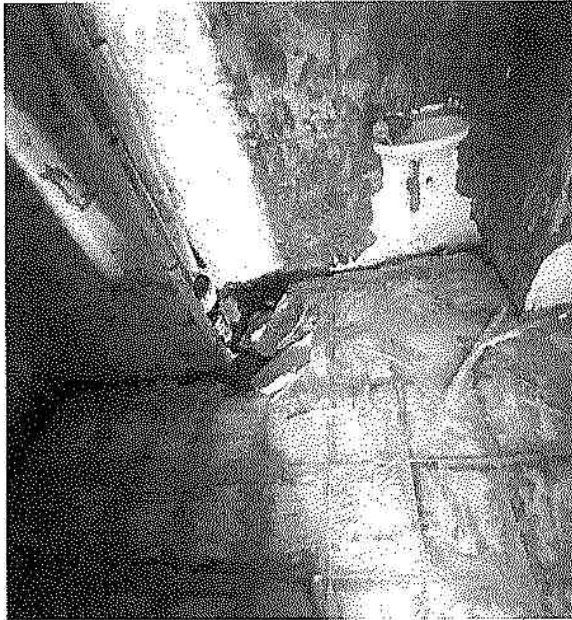

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 930261799



Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779






INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 900012247

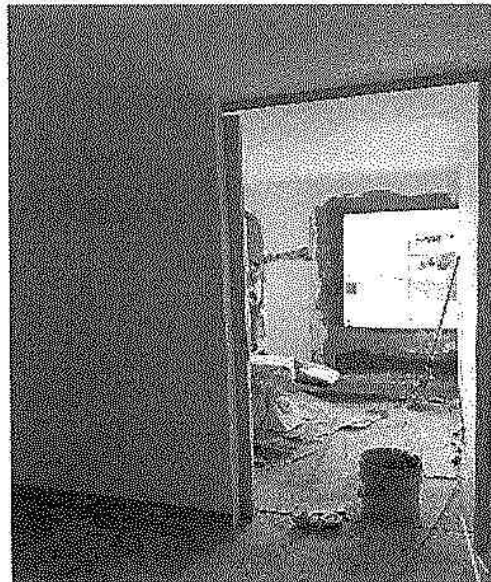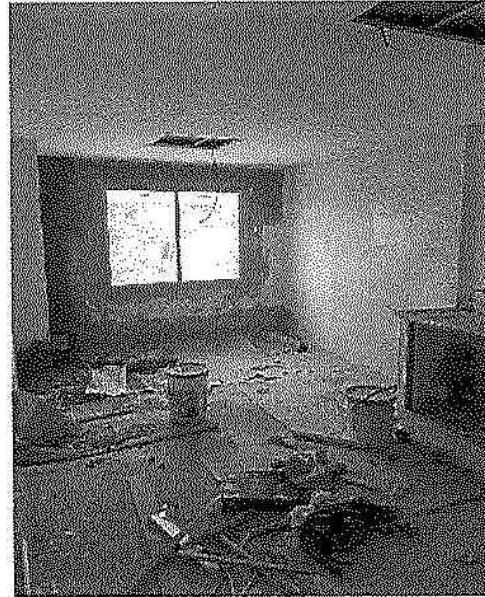

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779






INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
TEL: 512321734-5

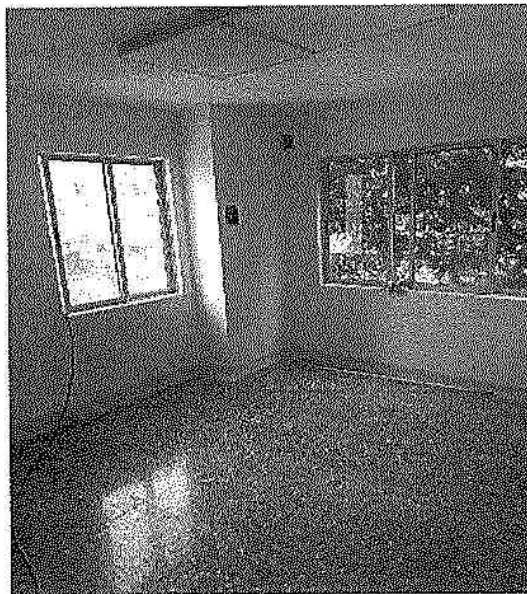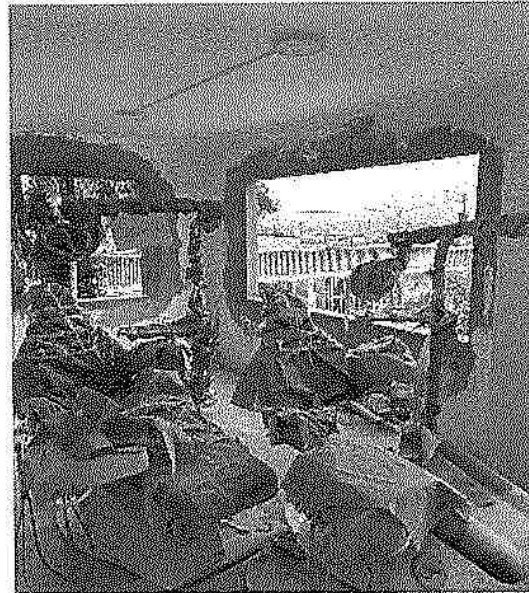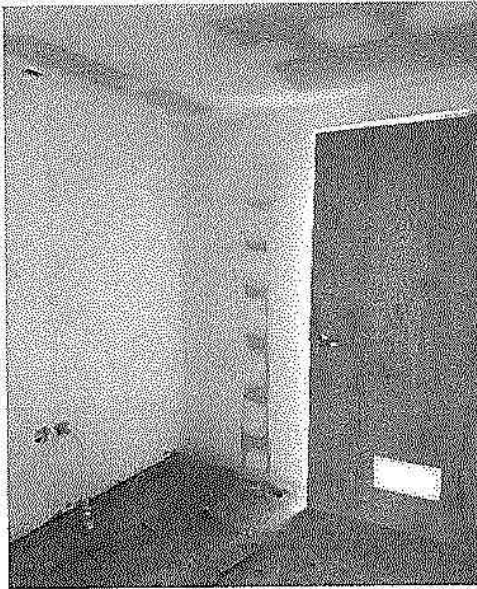

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779





INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoría No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S



E.S.E. Municipal de Soacha
INSTRUMENTO
Julio César Peñaloza
IDM 332941347

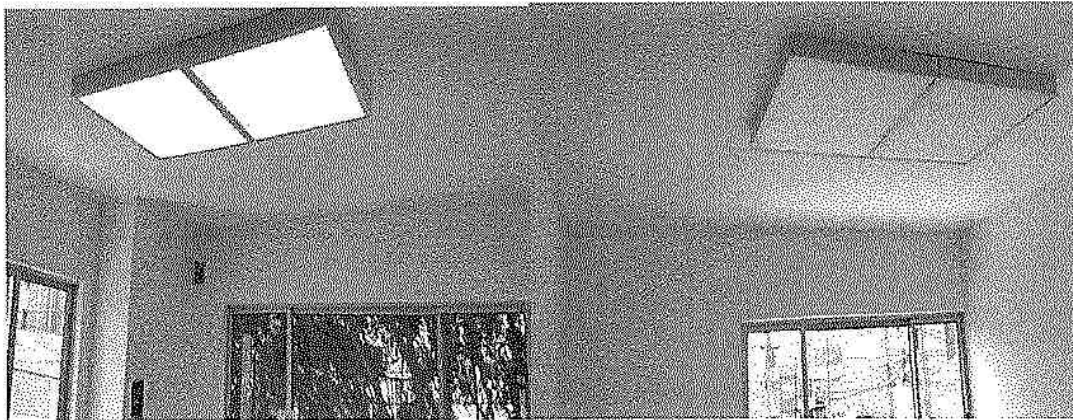
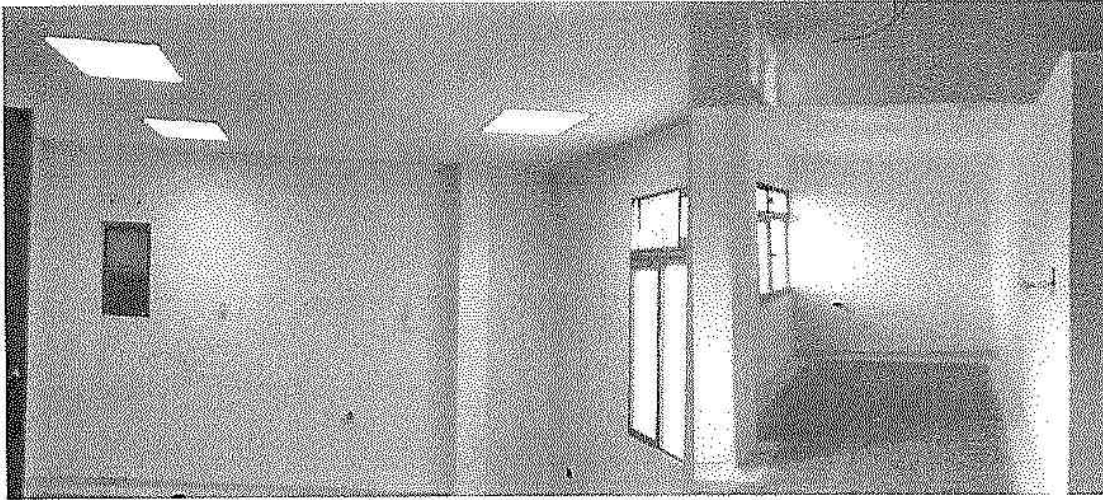


Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S

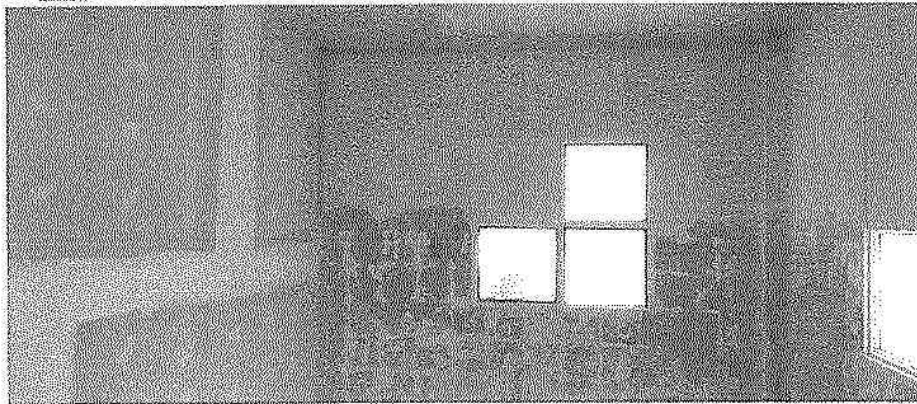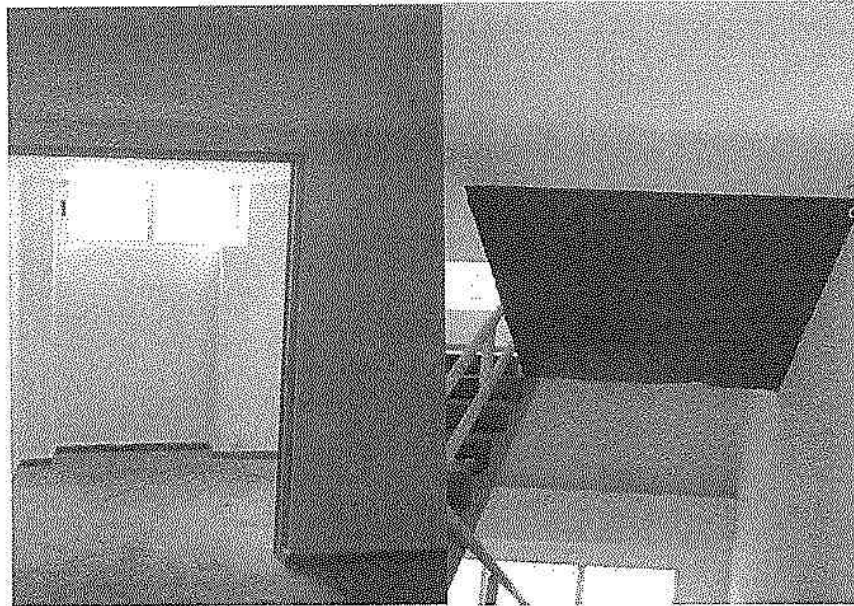


Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779



INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S

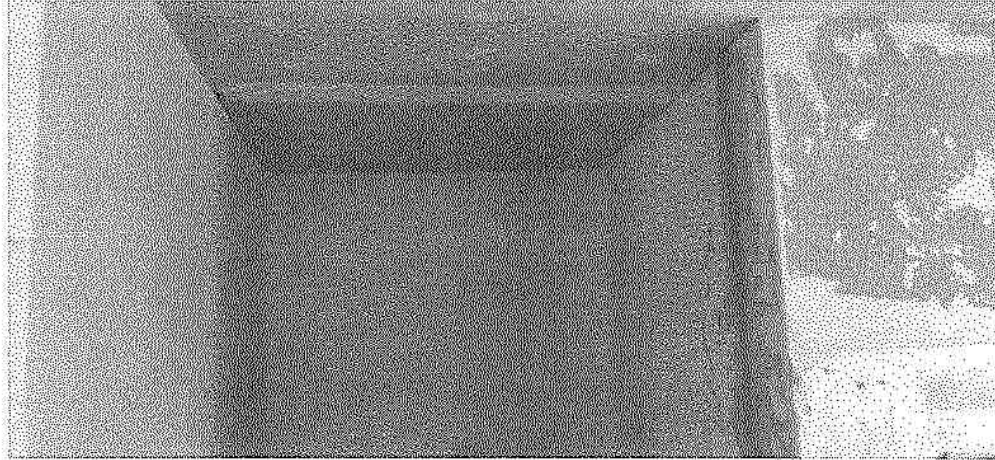

Calle 93 No. 18-28 Oficina 503
gestion@studiocruzark.com
TEL: 3107667779

**INFORME CANTIDADES CORTE PARCIAL No. 3**

Entidad contratante:	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Contrato de Obra No.	076-2025
Contratista:	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
Contrato de interventoria No.	086-2025
Contratista:	CRUZARK S.A.S




E.S.E. Municipal de Soacha
JUBO César Peñaloza
1603370017947

5 APROBACION DE PAGO

Mediante el presente informe **CRUZARK SAS** en calidad de interventor, después de verificada el acta de cantidades, memorias y demás documentación soporte para el cobro del acta de corte parcial No.3, avala la información mencionada y procede a dar traslado a la Entidad para aprobación y generación de pago de esta.

6 ANEXOS

- Acta Parcial de corte No.3 suscrita por las partes



ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CRUZARK S.A.S
