


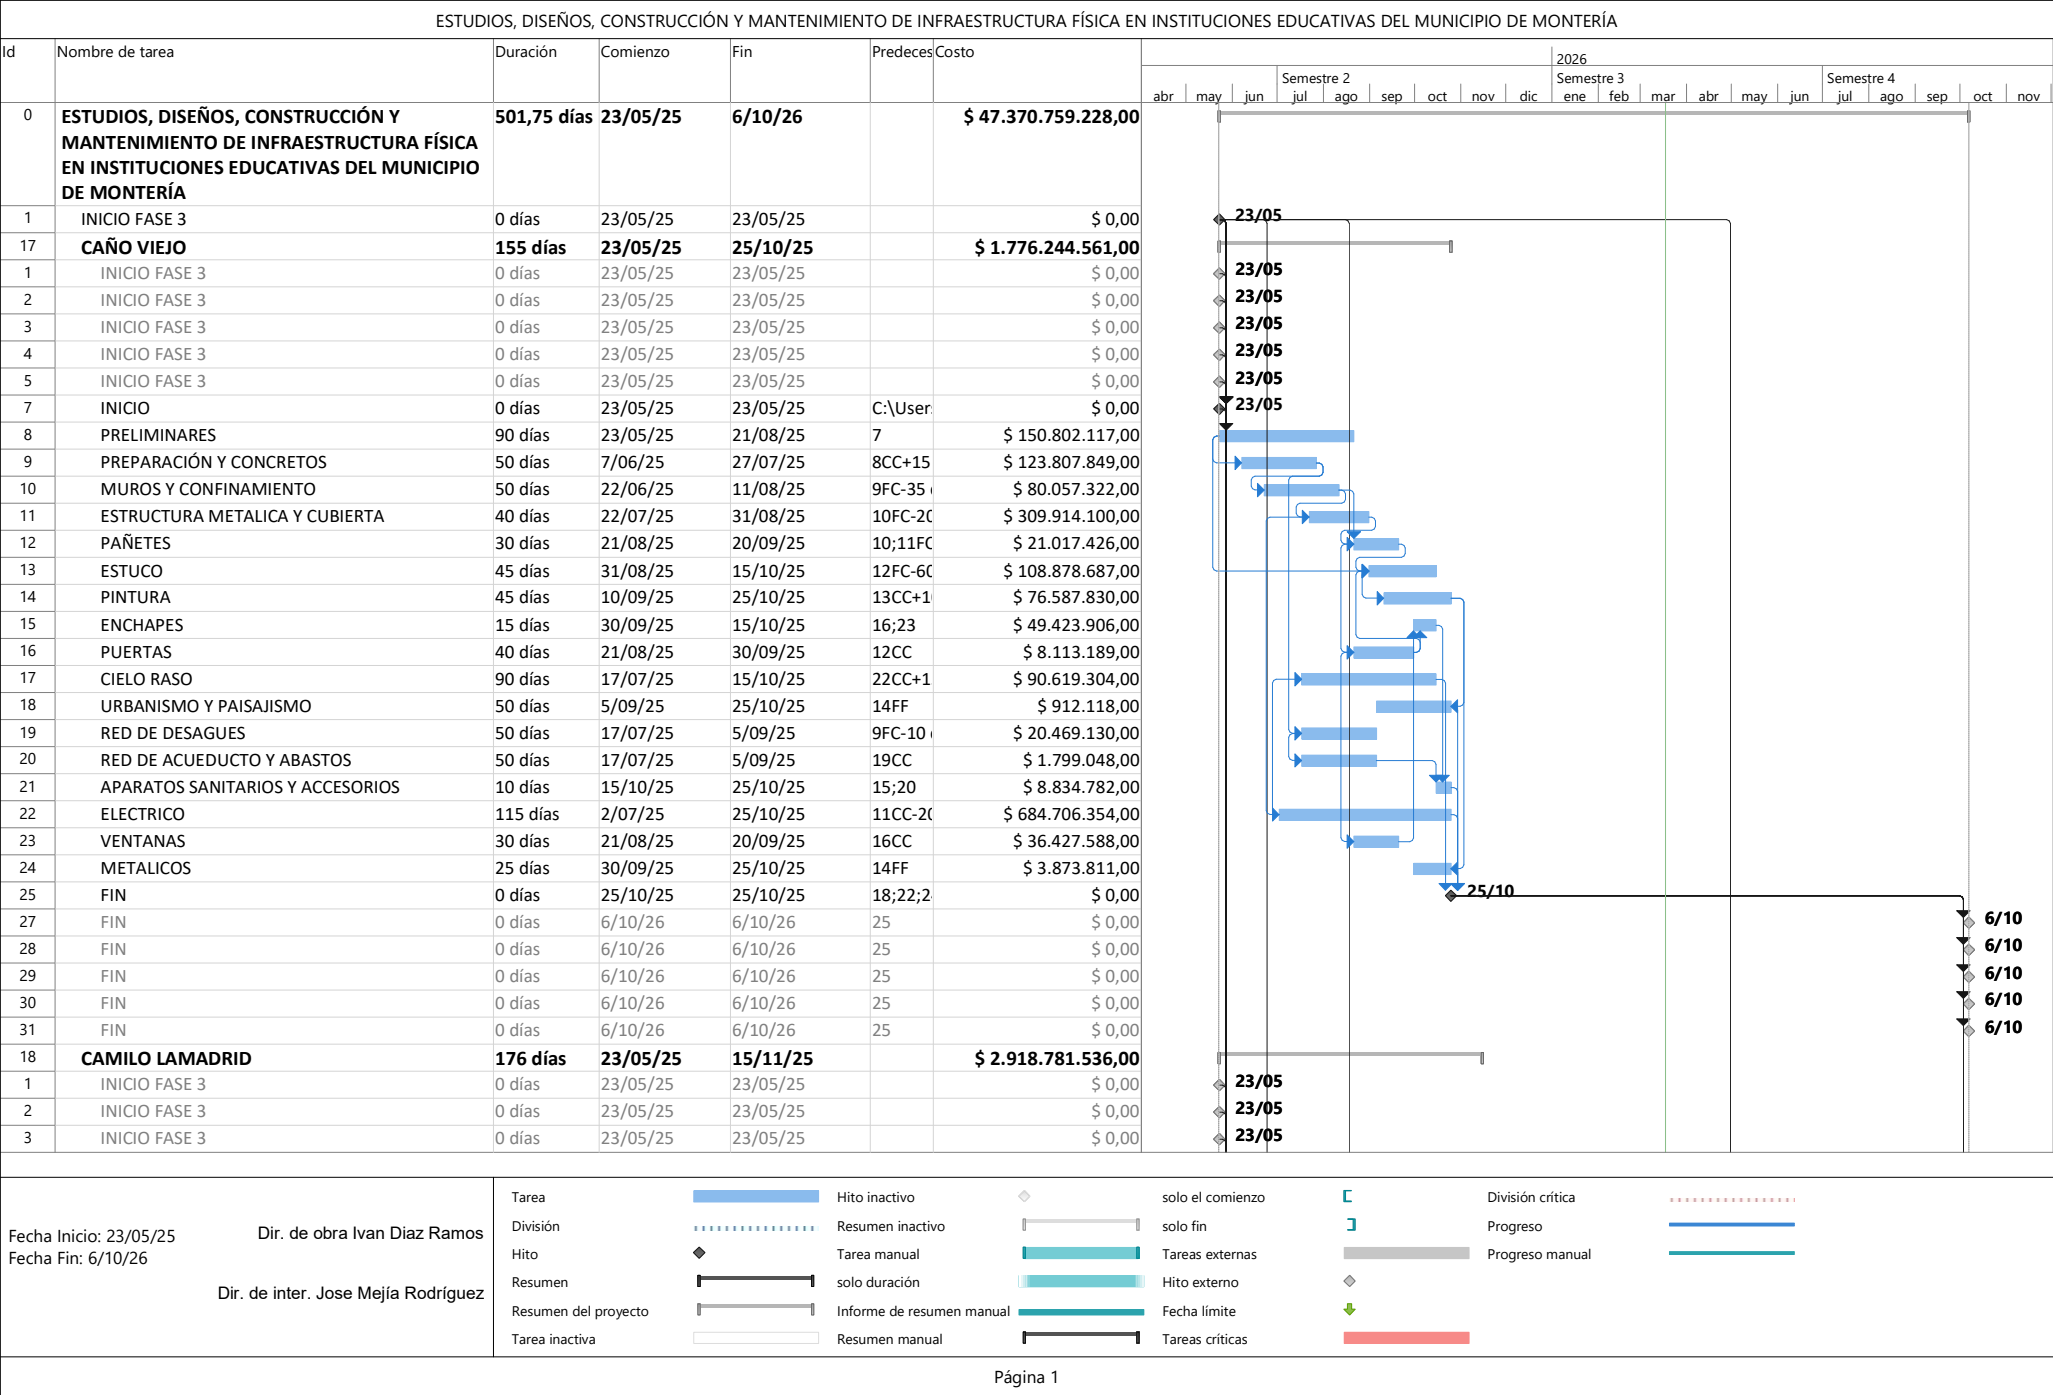

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRASTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA						
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesos	Costo
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
5	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
7	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User	\$ 0,00
8	PRELIMINARES	90 días	23/05/25	21/08/25	7	\$ 238.098.011,00
9	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	150 días	7/06/25	4/11/25	8CC+15	\$ 560.165.497,00
10	MUROS Y CONFINAMIENTO	50 días	17/07/25	5/09/25	9FC-11C	\$ 117.393.798,00
11	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	50 días	1/08/25	20/09/25	10FC-35	\$ 350.043.289,00
12	PAÑETES	40 días	1/08/25	10/09/25	10FC-35	\$ 25.440.314,00
13	ESTUCO	80 días	11/08/25	30/10/25	12FC-6C	\$ 103.059.623,00
14	PINTURA	80 días	21/08/25	9/11/25	13CC+1	\$ 80.145.824,00
15	ENCHAPES	35 días	30/09/25	4/11/25	16;22	\$ 208.293.487,00
16	PUERTAS	40 días	1/08/25	10/09/25	12CC	\$ 21.014.663,00
17	CIELO RASO	110 días	27/07/25	14/11/25	21CC+1	\$ 124.225.767,00
18	RED DE DESAGUES	50 días	27/07/25	15/09/25	9FC-10C	\$ 243.995.487,00
19	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS	50 días	27/07/25	15/09/25	18CC	\$ 1.044.151,00
20	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	10 días	4/11/25	14/11/25	15;19	\$ 93.817.363,00
21	ELECTRICO	126 días	12/07/25	15/11/25	11CC-2C	\$ 687.828.444,00
22	VENTANAS	60 días	1/08/25	30/09/25	16CC	\$ 64.215.818,00
23	FIN	0 días	15/11/25	15/11/25	21;17;2	\$ 0,00
25	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	23	\$ 0,00
26	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	23	\$ 0,00
27	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	23	\$ 0,00
28	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	23	\$ 0,00
29	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	23	\$ 0,00
19	EL RECUERDO	190 días	23/05/25	29/11/25		\$ 3.154.171.585,00
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
5	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00
7	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User	\$ 0,00
8	PRELIMINARES	41 días	23/05/25	3/07/25	7	\$ 205.982.785,00
9	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	100 días	23/07/25	31/10/25	10	\$ 2.173.531.848,00
10	ENCHAPES	50 días	3/06/25	23/07/25	8FC-30 v	\$ 431.377.818,00
11	ELECTRICO	29 días	31/10/25	29/11/25	9	\$ 343.279.134,00
12	FIN	0 días	29/11/25	29/11/25	11	\$ 0,00
14	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	12	\$ 0,00
15	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	12	\$ 0,00
16	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	12	\$ 0,00

Fecha Inicio: 23/05/25
Fecha Fin: 6/10/26

Dir. de obra Ivan Diaz Ramos

Dir. de inter. Jose Mejía Rodríguez

Tarea

Hito inactivo

División

Resumen inactivo

Hito

Tarea manual

Resumen

solo duración

Resumen del proyecto

Informe de resumen manual

Tarea inactiva

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

.....


Página 2

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																																		
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesos	Costo																												
							Semestre 2 abr may jun jul ago sep oct nov dic						Semestre 3 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov						Semestre 4 jul ago sep oct nov															
17	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	12	\$ 0,00																												
18	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	12	\$ 0,00																												
20	SANTA ROSA DE LIMA	204 días	23/05/25	13/12/25		\$ 2.015.126.170,00																												
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
5	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
7	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User\	\$ 0,00																												
8	PRELIMINARES	150 días	23/05/25	20/10/25	7	\$ 163.540.714,00																												
9	MUROS Y CONFINAMIENTO	40 días	12/06/25	22/07/25	8CC+20	\$ 17.358.750,00																												
10	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	80 días	2/07/25	20/09/25	9FC-20	\$ 266.584.677,00																												
11	PAÑETES	40 días	12/07/25	21/08/25	10CC+1	\$ 12.247.881,00																												
12	ESTUCO	150 días	22/06/25	19/11/25	11FC-6C	\$ 162.831.677,00																												
13	PINTURA	155 días	2/07/25	4/12/25	12CC+1	\$ 78.220.479,00																												
14	ENCHAPES	40 días	10/10/25	19/11/25	15	\$ 33.443.785,00																												
15	PUERTAS	90 días	12/07/25	10/10/25	11CC	\$ 22.503.864,00																												
16	CIELO RASO	160 días	27/06/25	4/12/25	18CC+1	\$ 194.110.428,00																												
17	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	20 días	19/11/25	9/12/25	14	\$ 29.998.664,00																												
18	ELECTRICO	184 días	12/06/25	13/12/25	10CC-2C	\$ 1.034.285.251,00																												
19	FIN	0 días	13/12/25	13/12/25	18;16;1	\$ 0,00																												
21	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																												
22	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																												
23	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																												
24	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																												
25	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																												
21	GARZONES	295 días	23/05/25	14/03/26		\$ 3.369.430.040,00																												
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
5	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																												
7	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User\	\$ 0,00																												
8	PRELIMINARES	90 días	23/05/25	21/08/25	7	\$ 266.375.045,00																												
9	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	230 días	7/06/25	23/01/26	8CC+15	\$ 464.510.689,00																												
10	MUROS Y CONFINAMIENTO	150 días	7/07/25	4/12/25	9CC+30	\$ 240.525.480,00																												
11	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	180 días	27/07/25	23/01/26	10CC+2	\$ 364.397.682,00																												
12	PAÑETES	180 días	26/08/25	22/02/26	10CC+2	\$ 22.115.421,00																												
13																																		

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																														
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo																								
							2026																							
							abr	may	jun	Semestre 2				Semestre 3				Semestre 4												
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov				
14	PINTURA	127 días	4/11/25	11/03/26	16CC+2	\$ 172.129.629,00																								
15	PUERTAS	140 días	25/10/25	14/03/26	12CC+6	\$ 46.633.648,00																								
16	CIELO RASO	180 días	22/07/25	18/01/26	18CC+1	\$ 213.837.412,00																								
17	RED DE DESAGUES	20 días	12/02/26	4/03/26	9FC+20	\$ 21.831.215,00																								
18	ELECTRICO	250 días	7/07/25	14/03/26	11CC-20	\$ 1.352.626.704,00																								
19	FIN	0 días	14/03/26	14/03/26	18;16;1	\$ 0,00																								
21	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																								
22	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																								
23	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																								
24	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																								
25	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	19	\$ 0,00																								
22	CRISTOBAL COLON	316 días	23/05/25	4/04/26		\$ 5.017.771.016,00																								
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
5	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
7	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User	\$ 0,00																								
8	PRELIMINARES	270 días	23/05/25	17/02/26	7	\$ 570.535.056,00																								
9	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	280 días	7/06/25	14/03/26	8CC+15	\$ 86.848.177,00																								
10	MUROS Y CONFINAMIENTO	220 días	17/06/25	23/01/26	9CC+10	\$ 33.559.106,00																								
11	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	210 días	7/07/25	2/02/26	10CC+2	\$ 548.852.573,00																								
12	PAÑETES	190 días	22/07/25	28/01/26	10FF+5	\$ 34.332.379,00																								
13	ESTUCO	230 días	27/07/25	14/03/26	12CC+5	\$ 485.481.090,00																								
14	PINTURA	240 días	6/08/25	3/04/26	13CC+1	\$ 470.402.504,00																								



ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																										
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo	2026																			
							Semestre 2					Semestre 3				Semestre 4										
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
13	ESTUCO	280 días	2/07/25	8/04/26	12CC	\$ 89.789.653,00																				
14	PINTURA	230 días	1/08/25	19/03/26	13CC+3	\$ 101.860.365,00																				
15	ENCHAPES	40 días	25/09/25	4/11/25	10	\$ 117.130.064,00																				
16	PUERTAS	240 días	22/07/25	19/03/26	12CC+2	\$ 11.645.520,00																				
17	CIELO RASO	260 días	12/07/25	29/03/26	11CC+2	\$ 89.403.979,00																				
18	URBANISMO Y PAISAJISMO	120 días	19/11/25	19/03/26	14FF	\$ 28.663.308,00																				
19	RED DE DESAGUES	100 días	25/09/25	3/01/26	9CC-10	\$ 35.046.038,00																				
20	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS	100 días	25/09/25	3/01/26	19CC	\$ 1.020.277,00																				
21	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	80 días	3/01/26	24/03/26	15;20	\$ 14.390.178,00																				
22	ELECTRICO	287 días	12/07/25	25/04/26	11CC+2	\$ 549.022.160,00																				
23	VENTANAS	210 días	22/07/25	17/02/26	16CC	\$ 8.388.056,00																				
24	FIN	0 días	25/04/26	25/04/26	18;22;1	\$ 0,00																				
26	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																				
27	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																				
28	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																				
29	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																				
30	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																				
25	ANEXA	344 días	23/05/25	2/05/26		\$ 2.274.729.221,00																				
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																				
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																				
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																				
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																				
6	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User	\$ 0,00																				
7	PRELIMINARES	90 días	23/05/25	21/08/25	6	\$ 356.442.411,00																				
8	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	50 días	7/06/25	27/07																						

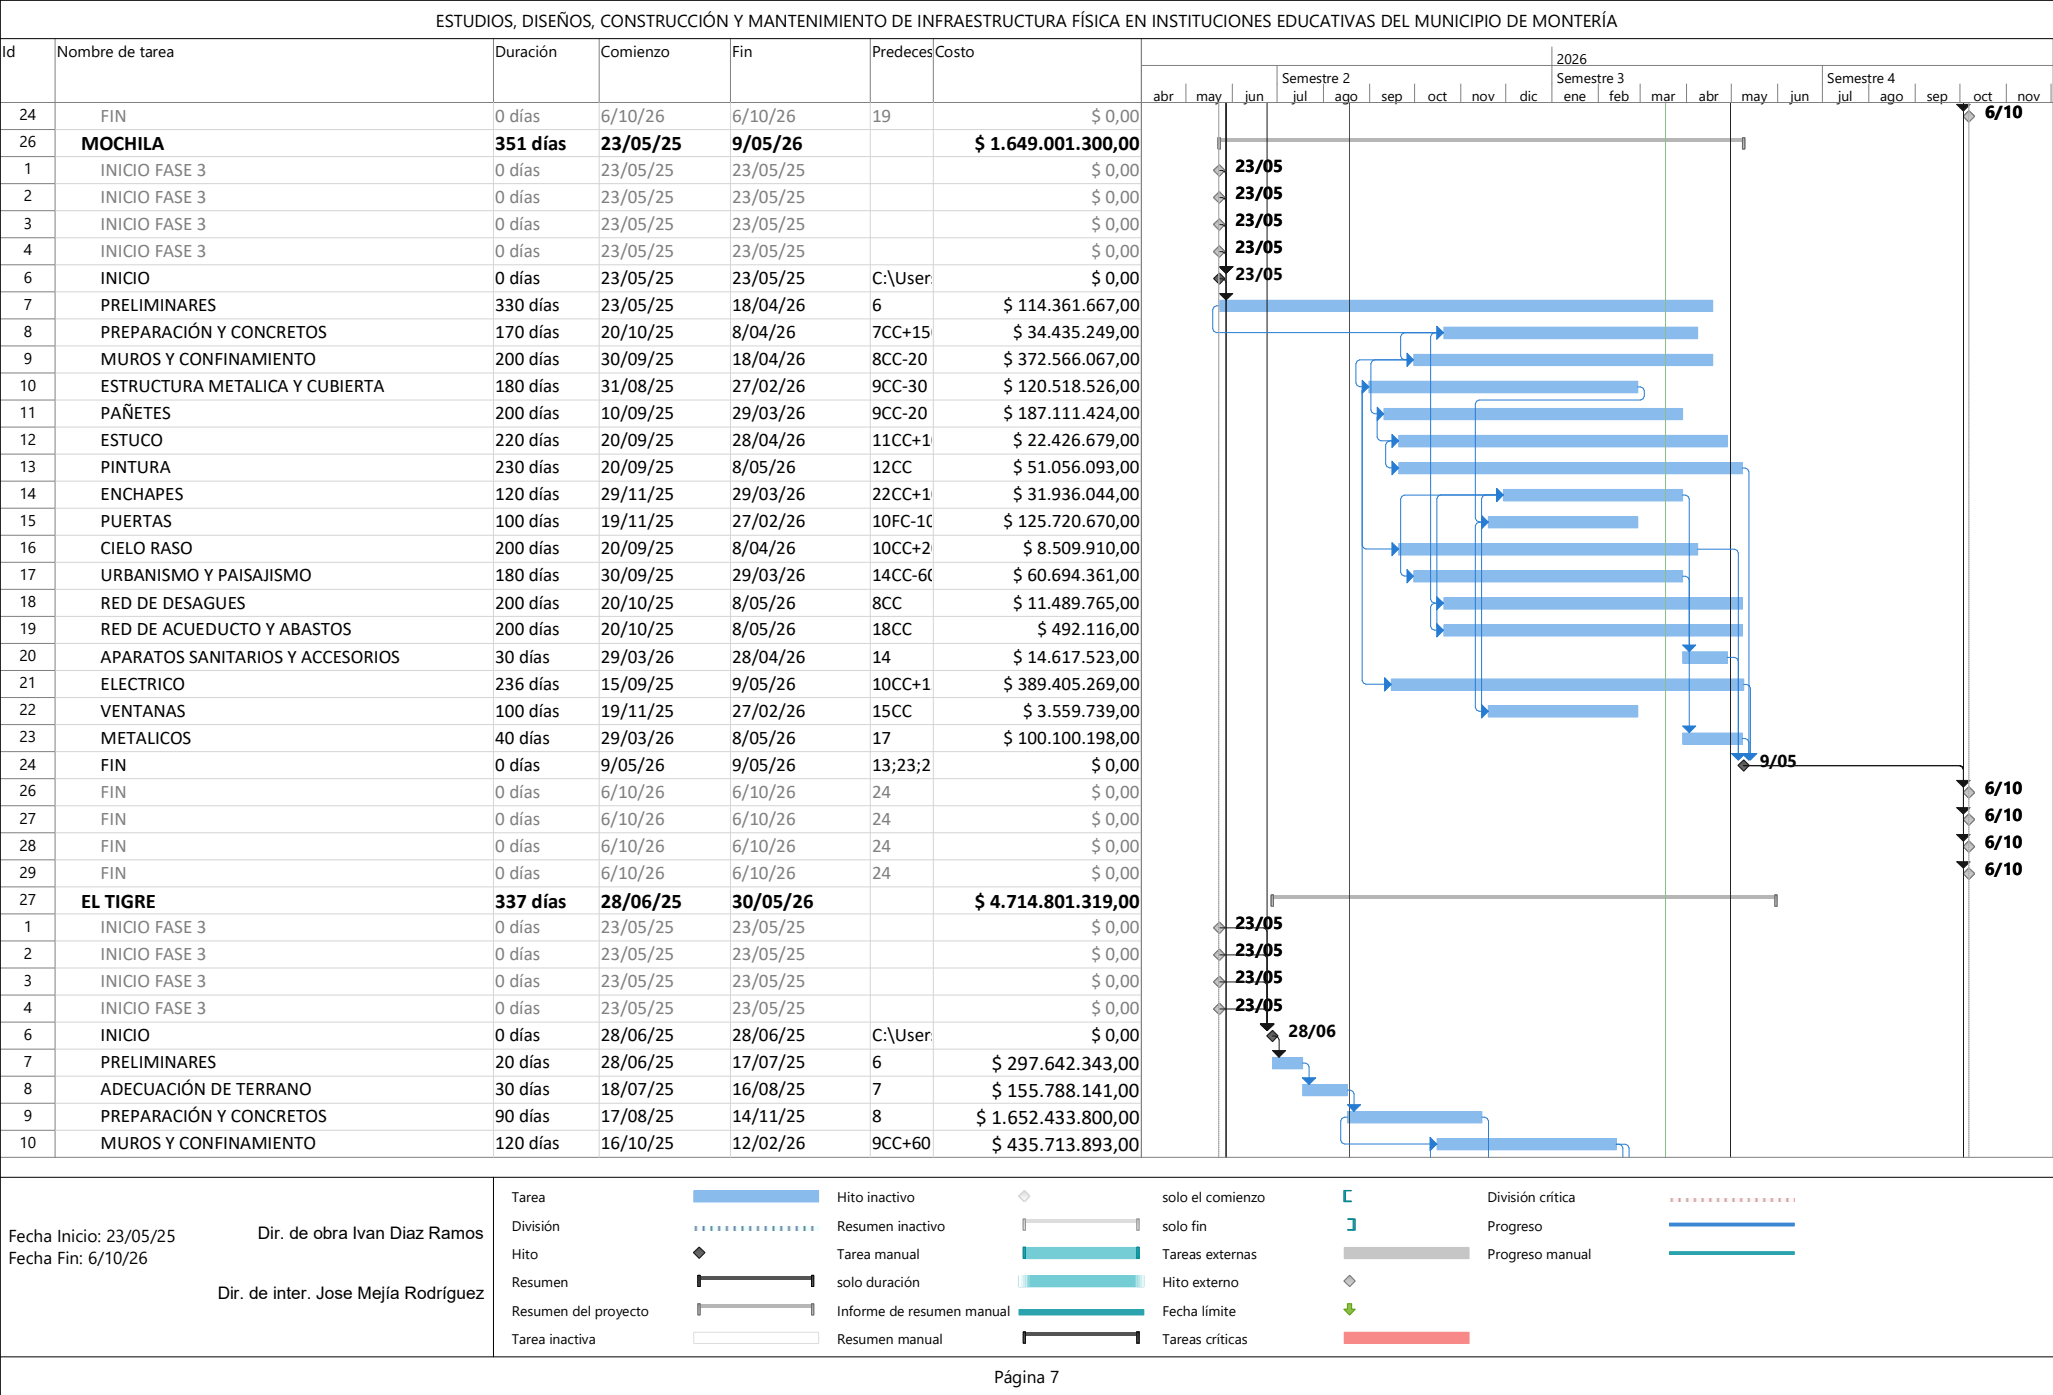

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																																
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo													2026													
							abr	may	jun	Semestre 2			sep	oct	nov	dic	Semestre 3		mar	abr	may	jun	Semestre 4			sep	oct	nov				
11	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	95 días	26/10/25	28/01/26	10CC+1	\$ 251.423.532,00																										
12	PAÑETES	40 días	4/01/26	12/02/26	10FF	\$ 59.784.568,00																										
13	ESTUCO	60 días	13/02/26	13/04/26	12	\$ 25.189.847,00																										
14	PINTURA	60 días	18/02/26	18/04/26	13CC+5	\$ 17.371.742,00																										
15	ENCHAPES	100 días	15/12/25	24/03/26	10CC+6	\$ 346.018.650,00																										
16	PUERTAS	40 días	4/04/26	13/05/26	15;17	\$ 35.388.611,00																										
17	CIELO RASO	50 días	13/02/26	3/04/26	10	\$ 23.104.052,00																										
18	RED DE DESAGUES	50 días	15/11/25	3/01/26	9	\$ 51.713.976,00																										
19	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS	50 días	15/11/25	3/01/26	18CC	\$ 23.346.605,00																										
20	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	15 días	14/05/26	28/05/26	24	\$ 71.788.281,00																										
21	ELECTRICO	130 días	4/01/26	13/05/26	19	\$ 542.748.341,00																										
22	VENTANAS	40 días	4/04/26	13/05/26	16CC	\$ 31.583.362,00																										
23	METALICOS	17 días	14/05/26	30/05/26	22	\$ 203.430.537,00																										
24	VOZ Y DATOS	10 días	4/05/26	13/05/26	21FF	\$ 37.093.138,00																										
25	JUEGOS INFANTILES	10 días	14/05/26	23/05/26	24	\$ 453.237.900,00																										
26	FIN	0 días	30/05/26	30/05/26	23;25;2	\$ 0,00																										
28	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	26	\$ 0,00																										
29	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	26	\$ 0,00																										
30	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	26	\$ 0,00																										
31	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	26	\$ 0,00																										
28	IPC	289 días	22/08/25	6/06/26		\$ 3.098.907.472,00																										
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																										
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																										
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																										
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																										
6	INICIO	0 días	22/08/25	22/08/25	C:\User	\$ 0,00																										
7	PRELIMINARES	90 días	22/08/25	19/11/25	6	\$ 688.100.637,00																										
8	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	250 días	6/09/25	13/05/26	7CC+15	\$ 519.526.109,00																										
9	MUROS Y CONFINAMIENTO	40 días	11/09/25	20/10/25	8CC+5 c	\$ 32.731.038,00																										
10	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	119 días	1/10/25	27/01/26	9FC-20	\$ 493.072.672,00																										
11	PAÑETES	60 días	18/01/26	18/03/26	9;10FC-	\$ 86.581.361,00																										
12	ESTUCO	120 días	28/01/26	27/05/26	11FC-6C	\$ 64.558.704,00																										
13	PINTURA	120 días	7/02/26	6/06/26	12CC+1	\$ 184.512.888,00																										
14	ENCHAPES	40 días	27/02/26	7/04/26	15;22	\$ 82.342.006,00																										
15	PUERTAS	40 días	18/01/26	26/02/26	11CC	\$ 15.542.834,00																										
16	CIELO RASO	230 días	26/09/25	13/05/26	21CC+1	\$ 180.448.399,00																										
17	URBANISMO Y PAISAJISMO	50 días	18/04/26	6/06/26	13FF	\$ 0,00																										
18	RED DE DESAGUES	60 días	3/02/26	3/04/26	8FC-10C	\$ 6.134.036,00																										
19	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS	60 días	3/02/26	3/04/26	18CC	\$ 1.441.517,00																										


Fecha Inicio: 23/05/25	Dir. de obra Ivan Diaz Ramos	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Fecha Fin: 6/10/26		División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
		Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Dir. de inter. Jose Mejia Rodríguez	Resumen		solo duración		Hito externo			
		Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
		Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			


Página 8

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																														
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Costo																								
							Semestre 2				2026 Semestre 3				Semestre 4															
							abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov				
20	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	45 días	8/04/26	22/05/26	14;19	\$ 24.541.174,00																								
21	ELECTRICO	259 días	11/09/25	27/05/26	10CC-2C	\$ 583.604.412,00																								
22	VENTANAS	30 días	18/01/26	16/02/26	15CC	\$ 10.865.255,00																								
23	METALICOS	20 días	18/05/26	6/06/26	13FF	\$ 124.904.430,00																								
24	FIN	0 días	6/06/26	6/06/26	17;21;2	\$ 0,00																								
26	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
27	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
28	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
29	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
29	ALIVIO	393 días	23/05/25	20/06/26		\$ 2.289.859.474,00																								
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
2	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
3	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
4	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								
6	INICIO	0 días	23/05/25	23/05/25	C:\User	\$ 0,00																								
7	PRELIMINARES	60 días	23/05/25	22/07/25	6	\$ 140.237.006,00																								
8	ADECUACIÓN DE TERRANO	30 días	22/07/25	21/08/25	7	\$ 4.599.584,00																								
9	PREPARACIÓN Y CONCRETOS	150 días	21/08/25	18/01/26	8	\$ 773.198.350,00																								
10	MUROS Y CONFINAMIENTO	120 días	10/10/25	7/02/26	9CC+50	\$ 249.689.023,00																								
11	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	120 días	20/10/25	17/02/26	10CC+1	\$ 285.230.717,00																								
12	PAÑETES	40 días	29/12/25	7/02/26	10FF	\$ 29.521.742,00																								
13	ESTUCO	130 días	7/02/26	17/06/26	12	\$ 36.091.516,00																								
14	PINTURA	128 días	12/02/26	20/06/26	13CC+5	\$ 27.956.971,00																								
15	ENCHAPES	100 días	9/11/25	17/02/26	10CC+3	\$ 122.022.098,00																								
16	PUERTAS	50 días	29/03/26	18/05/26	15;17	\$ 14.357.079,00																								
17	CIELO RASO	50 días	7/02/26	29/03/26	10	\$ 48.417.562,00																								
18	URBANISMO Y PAISAJISMO	30 días	18/05/26	17/06/26	16	\$ 1.755.912,00																								
19	RED DE DESAGUES	50 días	18/01/26	9/03/26	9	\$ 14.774.106,00																								
20	RED DE ACUEDUCTO Y ABASTOS	50 días	18/01/26	9/03/26	19CC	\$ 1.910.284,00																								
21	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	20 días	18/05/26	7/06/26	20;16	\$ 29.793.485,00																								
22	ELECTRICO	373 días	12/06/25	20/06/26	7CC+20	\$ 502.715.698,00																								
23	VENTANAS	40 días	29/03/26	8/05/26	16CC	\$ 7.588.341,00																								
24	FIN	0 días	20/06/26	20/06/26	21;18;2	\$ 0,00																								
26	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
27	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
28	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
29	FIN	0 días	6/10/26	6/10/26	24	\$ 0,00																								
30	ARROYON	400 días	23/05/25	27/06/26		\$ 2.115.682.822,00																								
1	INICIO FASE 3	0 días	23/05/25	23/05/25		\$ 0,00																								

Fecha Inicio: 23/05/25		Dir. de obra Ivan Diaz Ramos		Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
Fecha Fin: 6/10/26				División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
				Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
				Resumen		solo duración		Hito externo			
				Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
				Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

Página 9

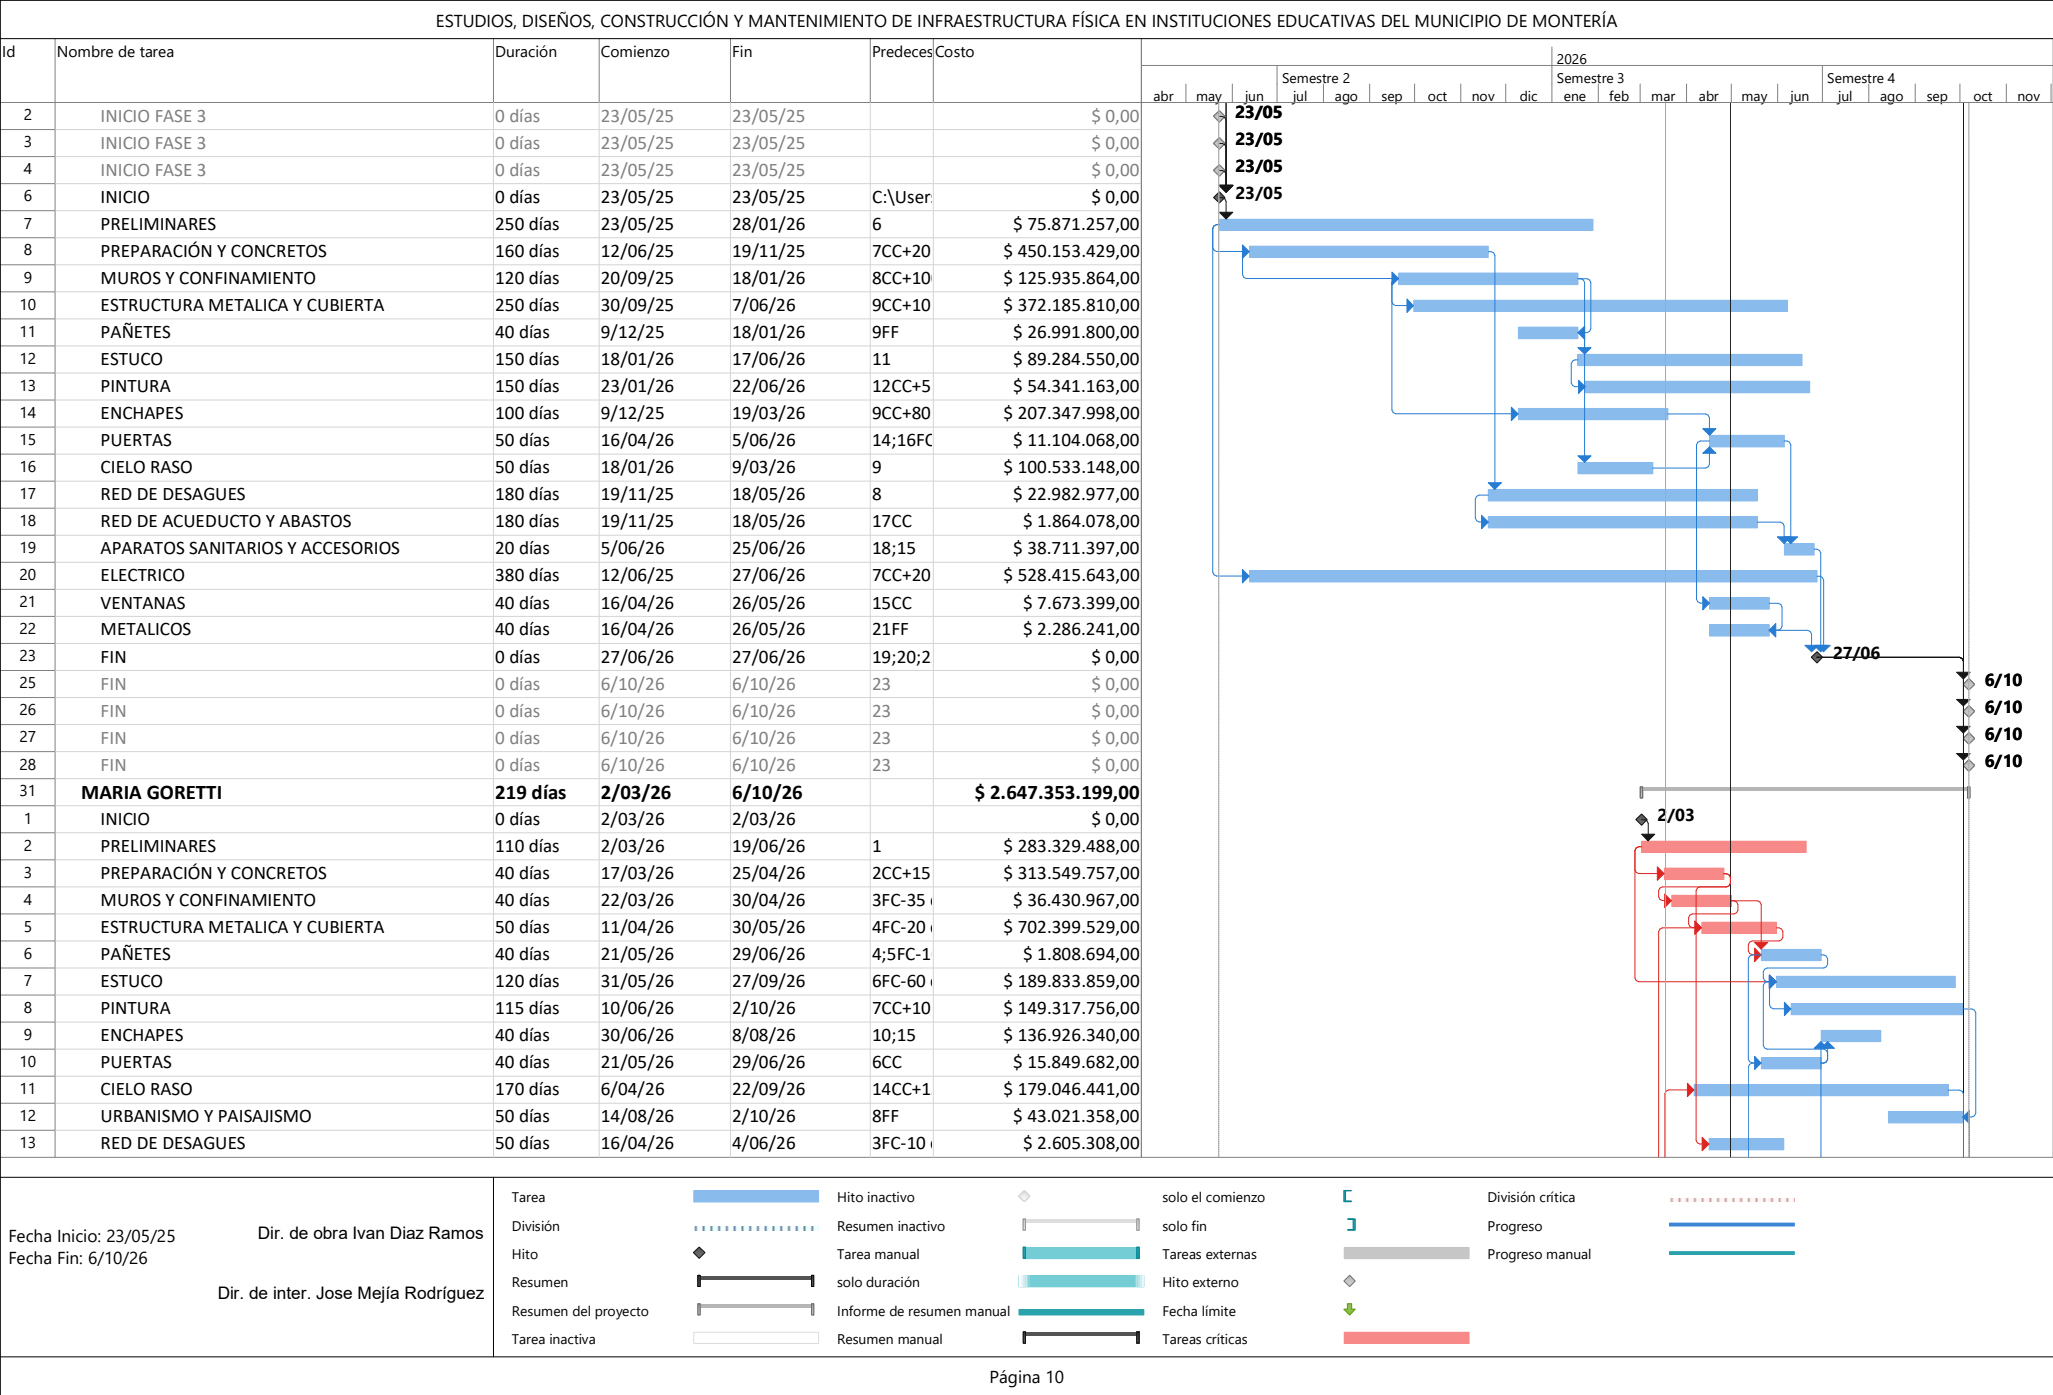

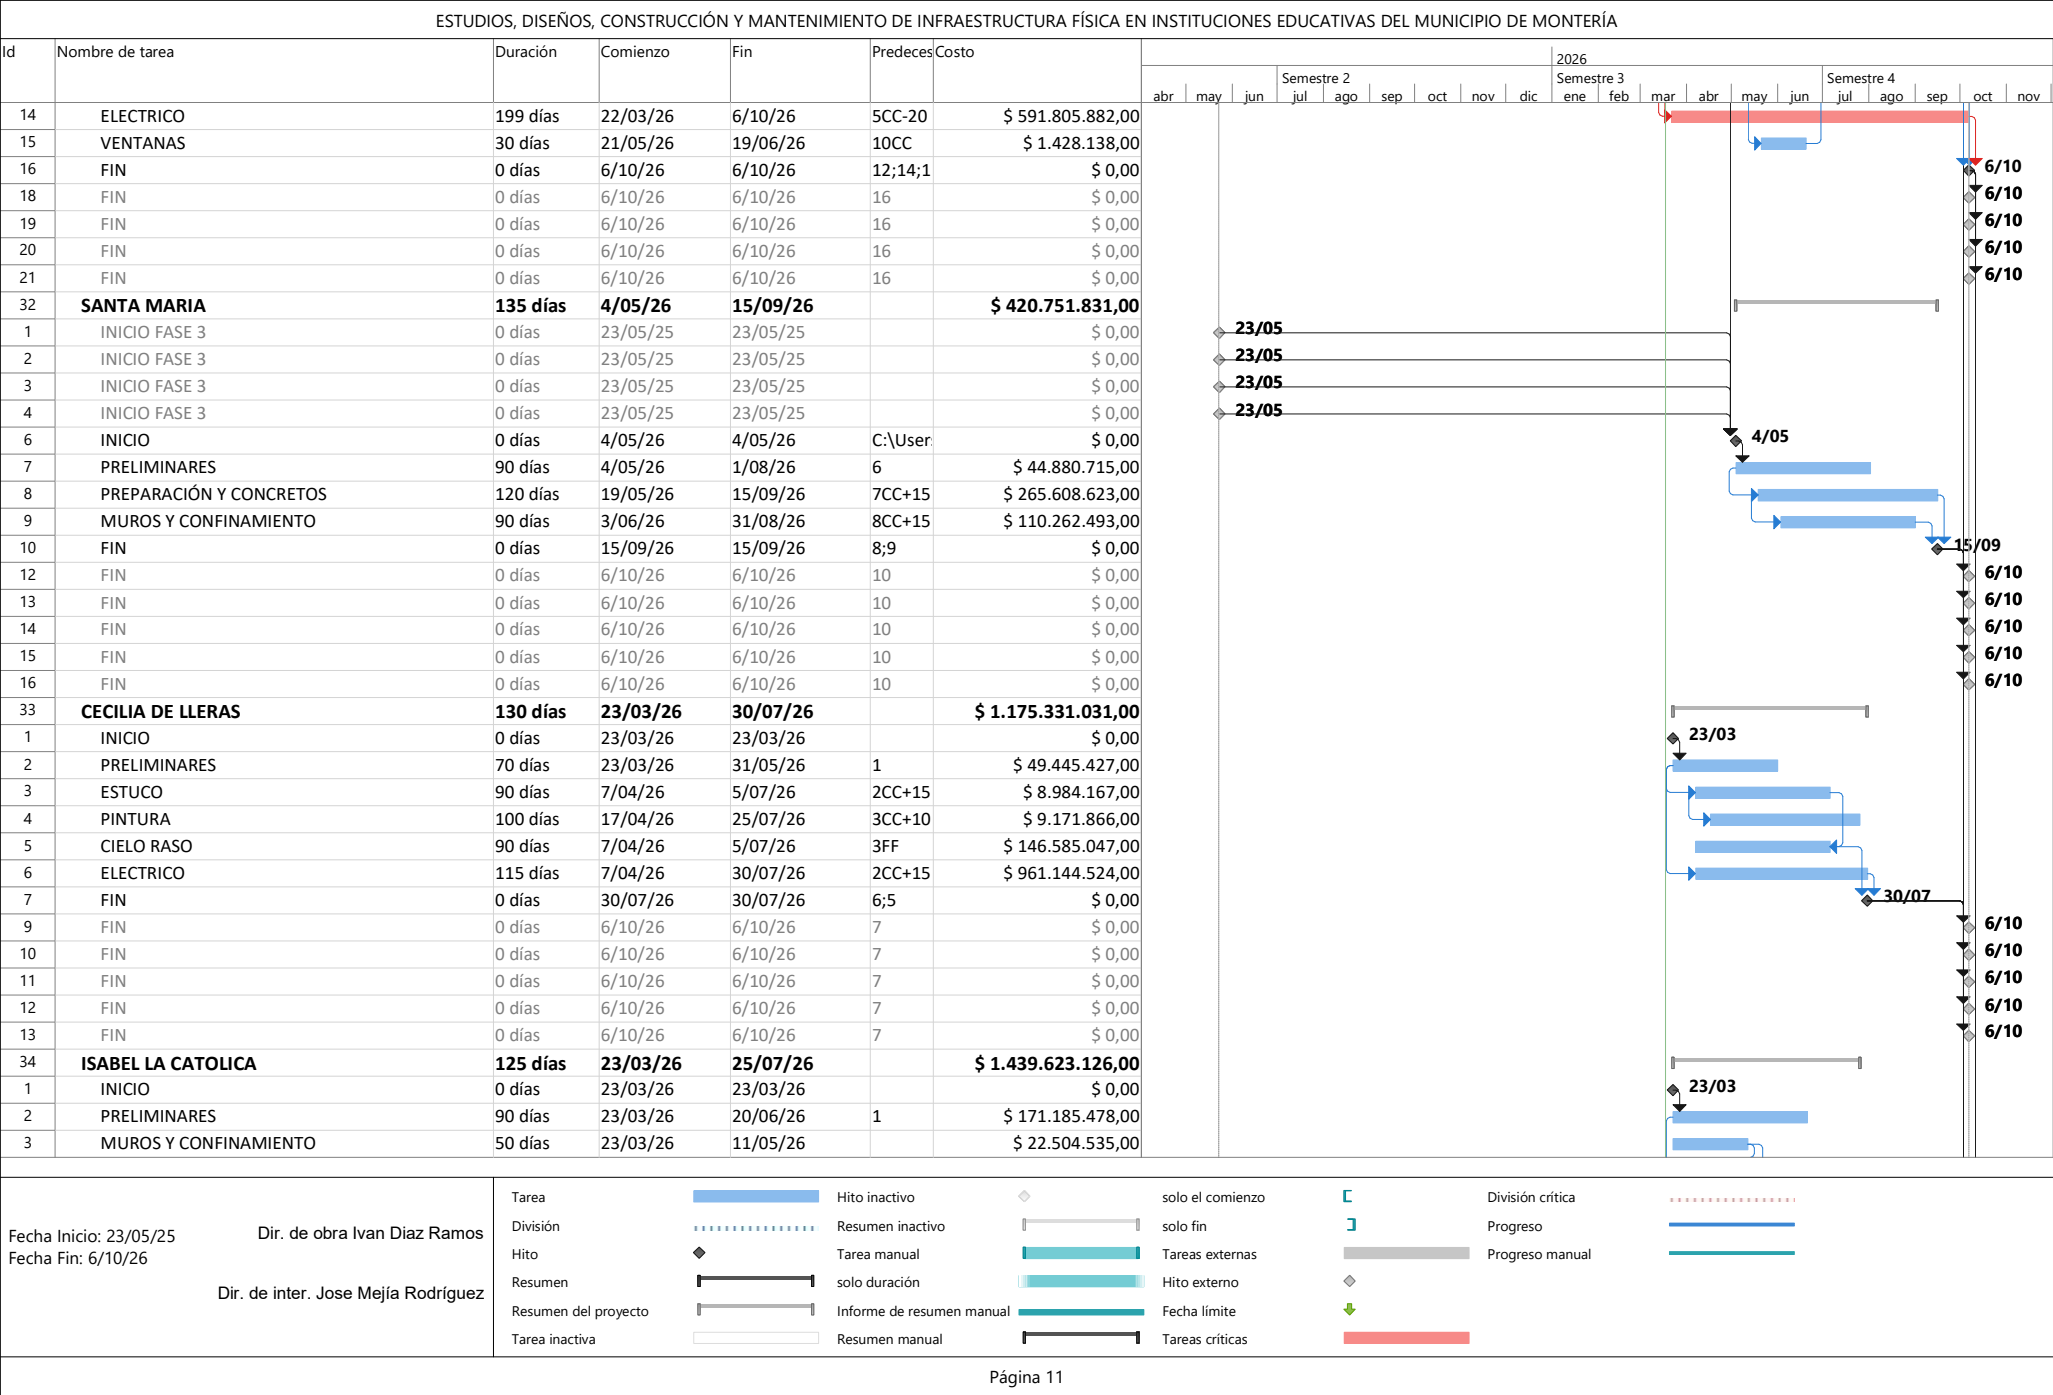

[illegible]
