

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paradiso Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 17 de abril del 2026

1090-0628

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 1 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaria de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 1 en el periodo del 29/08/2025 al 30/09/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
 Recibido por: Karen P
 Fecha: 20 ABR 2026
 Hora: 9:30 am

Elaboró: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025

Revisó: Christian Julián Fernández Reyes - Secretario de Infraestructura

1944

1944

1944

1944

1944

1944

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán Paralelo Natural
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 02 de marzo del 2026


1090-0445

Doctora:

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON

Secretaría de contratación

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta



Referencia: **CONTRATO DE OBRA No 0821 DE 2025**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META."

Asunto: Remisión de informe mensual N° 1 del contrato de la referencia

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir a su despacho la documentación entregada por el contratista de obra del contrato No. 0821 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.", la cual fue aprobada por la interventoría y verificada por la secretaría de infraestructura, respecto al Informe mensual N° 1 en el periodo del 29/08/2025 al 30/09/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Jesús Andrés Devia Tarache– Profesional de Apoyo CPS 1087 de 2025 *Jesús A.*

Revisó: Hanlly Lorena Vergara Camargo – Profesional de Apoyo CPS 1106 de 2025 *Hanlly*

CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025



C-007.25

Villavicencio (Meta), 20 septiembre de 2025

Ingeniero:

Ing JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


Calle 10 No. 10-90 Barrio Centro – Palacio Municipal

e-mail: infraestructura@puertogaitan-meta.gov.co

Puerto Gaitán – Meta.

Puerto Gaitán

2251.11.0018204



Tipo: Radicado Entrada Fecha Rad: 21/10/2025 15:15 Folios: 0
Asunto: ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO DE OBR
Radicator: MAIR ELY BETANCUR
Procedencia: JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO/CONSORCIO INTERVENTO
Destinatario: JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
La recepción del documento no implica aceptación

Ref.: Contrato de Interventoría No. 1004 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEIMPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META.

Asunto: Entrega de informes mensuales No.1. Contrato de obra 0821 de 2025 y contrato de interventoría 1004 de 2025

Cordial Saludo:

A continuación, una vez revisados y ajustados los informes mensuales de las actividades de obra e interventoría, correspondientes al asunto de la referencia, nos permitimos hacer entrega; así:

- ✓ Original informe mensual No.01 correspondiente al contrato de obra 0821 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (29 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025). # de carpetas:1.
- ✓ Original informe mensual No.01 correspondiente al contrato de interventoría 1004 de 2025, junto con sus anexos. Periodo del (29 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025). # de carpetas:1.

Cordialmente,


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

Anexo. lo enunciado en 2 carpetas

Hantz Lorenz

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Codigo:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 03/10/2025						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALUBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
Radicado No:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 29/08/2025 Hasta: 30/09/2025						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
1,01	Generalidades del contrato, localización específica, región, zona urbana o rural, georeferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	INFORMACION DEL CONTRATO					
2,01	Cuadro de trazabilidad: 1) Numero del proceso (Etapas pre-contratual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial, 3) Objeto del contrato, 4) Numero de identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato, 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de Inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
4	INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO					
4,01	Plan de inversión de anticipo	X	X			
4,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de obra.	X	X			
4,04	Acta de desembolso del anticipo de obra (si aplica).				X	
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra.	X	X			
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			
4,07	Órdenes de pago efectuadas (Desembolso de anticipo y pagos parciales)	X	X			
5	INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO					
5,01	Gráfico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas, (financiera, por porcentajes)	X	X			
5,02	Cuadro de avance con acumulado mes a mes	X	X			
5,03	Control del estado del tiempo resumen (día a día mes reportado en el informe)	X	X			
6	INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo) propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
6,02	Certificado del representante legal y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matrícula y antecedentes de la Junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			
6,03	Paz y salvo de los trabajadores (retirados al corte)				X	
7	CUADRO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO				X	
8	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)	X	X			
9	INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO					
9,01	Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del proyecto (prediales, ambientales, de construcción en otros).				X	
9,02	Seguimiento a la disposición de materiales				X	
9,03	Registro fotográfico de actividades ambientales				X	
10	ANEXOS					
10,01	Actas de socialización (informes inicial)	X	X			
10,02	Actas de vecindad (de apertura y cierre - si aplica)	X	X			
10,03	Relación de comités de obra. (según orden cronológico y debidamente numeradas)				X	
10,04	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			
10,05	Cartera topográfica de obra (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	
10,06	Calidad de los materiales, ensayos de laboratorio y certificados de calidad, (anexo de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales , anexando certificados de los materiales y de calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)	X	X			

		FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA				
		Infraestructura				
		Código:ING-FR-72	Version:05	Vigencia:10-01-2025		
Ciudad y Fecha: PUERTO GAITÁN 03/10/2025						
Contrato de obra No.: 821 DE 2025						
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META						
Radicado No:			Fecha:			
Periodo del informe: Desde: 29/08/2025 Hasta: 30/09/2025						
No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
10,07	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	
10,08	Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en el cual se registre el seguimiento de las capacitaciones, entregas de EPP, protocolos de prevención y mitigación del COVID-19 y su seguimiento mediante registros (planillas, formatos, etc.) debidamente firmados por el profesional correspondiente	X	X			
10,09	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			
10,1	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratados por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			
10,11	Ordenes de operación de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de obra (si aplica)	X	X			
10,12	Aprobación del contrato fiduciario (si aplica)	X	X			
10,13	Informe del contrato fiduciario del anticipo del contrato de obra (si aplica)				X	
10,14	Anexos (cada ficha de PMA o PAGA genera una evidencia la cual debe venir relacionada en el informe de interventoría, así como del cumplimiento de los deberes derivados de los actos administrativos, registro fotográfico), firmado por el profesional (si aplica).				X	
11	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			
NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaría de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.						
Revisó y aprobó: 						
RIL JORGE ADELMIO DIAZ SARMIENTO CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIENAS 2025						
Nota: se debe pagar los informes						



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

INFORME DE OBRA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 821 DE 2025
“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS
RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y
ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”

INFORME MENSUAL No. 1
PERIODO DEL INFORME
DEL 29 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1
R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

INTERVENTOR:
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
NIT. 901.972.868 – 4
R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	5
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo	5
2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaliba	5
3. ALCANCE DEL PROYECTO.....	8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.....	9
5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO.....	10
5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS	11
6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	12
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	12
6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	13
6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	14
6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	14
6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	15
6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.	15
6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS.....	15
7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO	16
7.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO	16
7.2 GRAFICO AVANCE PERIODO POR RESGUARDO	167
7.3 DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS	167
7.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.	18
7.5 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	18
8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.....	20
8.1 RELACION PERSONAL DE OBRA (PROFESIONAL, TÉCNICO, OPERATIVO)	20
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	21
8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	22
8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.....	22



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

9	CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	22
10	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	23
12	CONCLUSIONES.....	24
13	ANEXOS	24



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las leyes y normas, principalmente del artículo 366 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que *“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las actividades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento básico y de agua potable”*, el municipio de Puerto Gaitán en enmarcado en el cumplimiento de las metas de su Plan de Desarrollo **“JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027”** PDM 0344- Construcción, ampliación, optimización, y adecuación de redes de acueducto y plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Atendiendo a la política pública de VIVIENDA, establece como uno de los fines principales de la actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para la vida humana. El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.

Algunas comunidades Indígenas del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, presentan vulneración en el servicio de agua potable ya que no cuentan con sistemas de acueductos, se han visto afectadas por la carencia de agua potable, llevando a realizar malas prácticas de la captación del agua, tomando como forma de abastecimiento los pozos profundos rudimentarios en algunas de sus viviendas, que con el tiempo por el desconocimiento sobre las consecuencias que se podrían presentar, algunas familias construyeron pozos sépticos o letrinas a corta distancia de la fuente, lo cual ocasiona la contaminación inmediata de los mismos; evidenciándose condiciones incorrectas para el acceso al agua potable.

Surtidos los tramites de planeación del proyecto, mediante resolución No. 0014 del 10 de junio de 2025 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIP-005-2025”* se inició el proceso de contratación el cual culmino con la adjudicación y suscripción del Contrato de Obra Pública No. 821 del 17 de julio de 2025 cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”**.

Así las cosas, con la presentación del presente informe damos cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 821 – 2025 en su cláusula OCTAVA. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** numeral 6. *Cumplir con la entrega de informes mensuales de ejecución, según el avance de la obra (secuencias de actividades, etc.) de acuerdo al plazo pactado.*



Así mismo, el presente informe cumple con los requerimientos exigidos en el *FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORME MENSUAL DE OBRA (INF-FR-72 V05 vigente desde el 10/01/2025)* establecido por la entidad para tal fin.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza y beneficia a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas de la zona rural del municipio de Puerto Gaitán – Meta, así:

2.1.1 Localización comunidades Resguardo Indígena Wacoyo

RESGUARDO WACOYO									
CODIGO	COMUNIDAD POZO	COMUNIDADES BENEFICIARIAS	TOTAL COMUNIDADES	ESTE	NORTE	COTA	LONGITUD	LATITUD	D. GAITÁN
WAC01	POZO KAUWIRNAE	ACACIOS	2	898322.2694m	973031.6969m	204.700m	W71° 59' 36.52"	N4° 21' 06.35"	14.00 KM
WAC02	POZO ESMERALDA WALABO	LAS BRISAS, MANANTIAL Y WALABO	4	900418.0667m	972895.7131m	226.400m	W71° 58' 28.56"	N4° 21' 02.04"	16.00 KM
WAC03	POZO PALOGRANDE WALABO	PALOMEKO, PARAISO Y CAIMANA 2	4	900588.5666m	972854.4974m	226.400m	W71° 58' 23.03"	N4° 21' 00.67"	16.00 KM
WAC04	POZO LA UNIÓN		1	902309.6873m	973188.3818m	218.100m	W71° 57' 27.23"	N4° 21' 11.61"	16.00 KM
WAC05	POZO PUNTO GRILLO	CAROCARO, LA BALSA, LLANO ALTO, ACEITICO	5	903640.5670m	974478.3613m	221.500m	W71° 56' 44.12"	N4° 21' 53.65"	18.00 KM
WAC06	POZO ALGARROBO	SANTALINES, VILLANUEVA	3	904014.1047m	975025.1358m	221.100m	W71° 56' 32.02"	N4° 22' 11.46"	19.00 KM
WAC07	POZO MATAPALITO	LAS PIEDRAS	2	906626.4761m	979804.6633m	209.800m	W71° 55' 07.48"	N4° 24' 47.14"	27.00 KM
WAC08	POZO LA PORFIA	LA HERMOSA	2	907534.2409m	981153.8279m	191.200m	W71° 54' 38.41"	N4° 25' 31.09"	29.00 KM
WAC09	POZO LA CAIMANA	VERGEL	2	908487.6918m	971329.8396m	202.200m	W71° 55' 26.24"	N4° 20' 11.04"	18.00 KM

Tabla 1. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

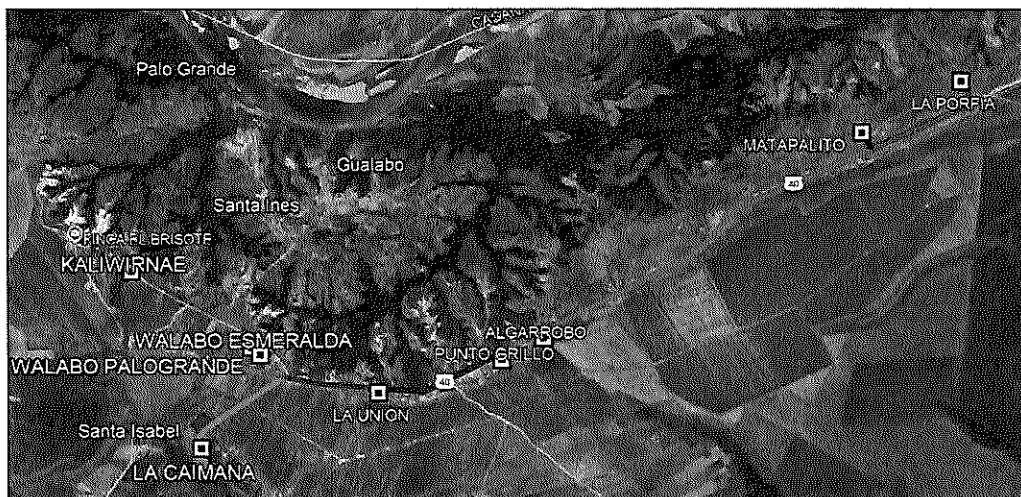


Figura 1. Localización comunidades del resguardo indígena Wacoyo

2.1.2 Localización comunidades Resguardo Indígena Awaiba



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO AWALIBA								
ASIGN.	COMUNIDAD	VEREDOS	Nº	Easting	Northing	Altura	WGS 84	UTM
AWA01	POZO MAKAPAY	LA VEREMOS	2	927966.5314m	948604.7669m	234.100m	W71° 48' 34.52"	N4° 07' 52.17"
AWA02	POZO COMUNITARIO AWALIVA CENTRAL	CEREQUITO, LA BRISA, LA PISTA, CHAVAJUAY, LA ENVIDIA, DESEO	7	932219.8422m	949522.6407m	240.200m	W71° 41' 16.65"	N4° 08' 22.16"
AWA03	POZO PUERTO LOPEZ		1	933332.3132m	944145.5908m	206.500m	W71° 40' 40.45"	N4° 05' 27.15"
AWA04	POZO PUNTO GRILLO		1	932907.1761m	942400.7501m	187.200m	W71° 40' 54.19"	N4° 04' 30.33"
AWA05	POZO SAN GIL	TAPIVA, BELLAVISTA	3	942563.2402m	947574.8922m	203.600m	W71° 35' 41.26"	N4° 07' 18.59"
AWA06	POZO FACUNAE		1	935423.3607m	942265.4095m	194.400m	W71° 39' 32.61"	N4° 04' 25.59"

Tabla 2. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

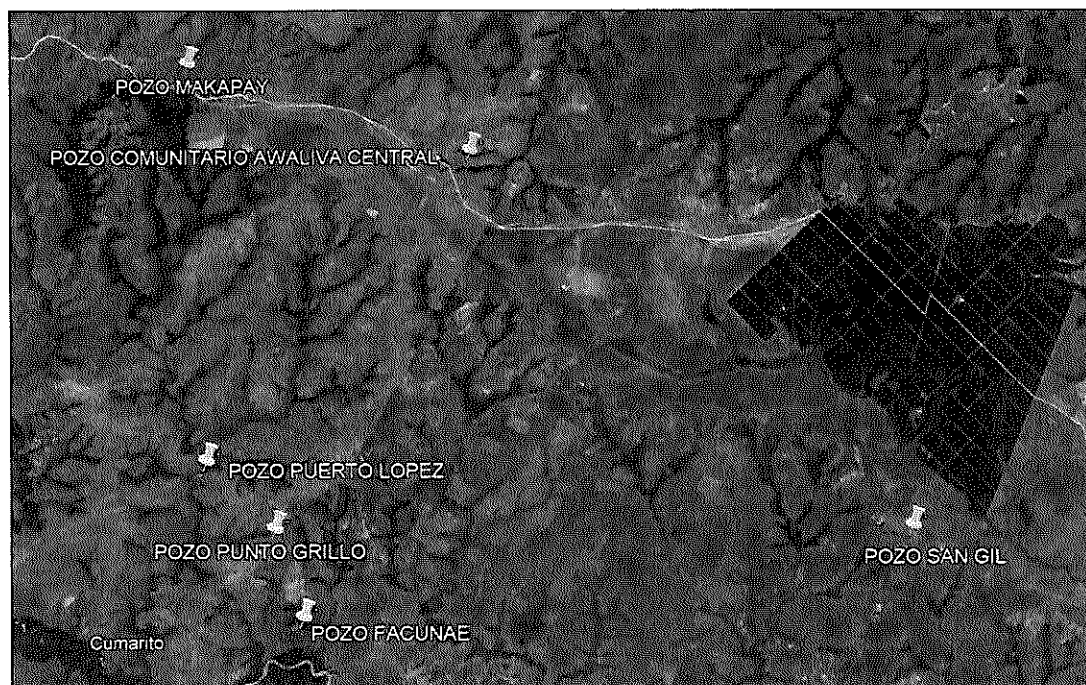


Figura 2. Localización comunidades del resguardo indígena Awaliba

2.1.3 Localización comunidades Resguardo Indígena Domoplanas

RESGUARDO DOMOPLANAS								
ASIGN.	COMUNIDAD	VEREDOS	Nº	Easting	Northing	Altura	WGS 84	UTM
DOM01	POZO OLIVOS	WARROJO	2	979779.5881m	963044.8119m	185.800m	W71° 15' 34.74"	N4° 15' 43.15"
DOM02	POZO PARAISO	VISTA HERMOSA	2	970139.3985m	962795.7268m	201.100m	W71° 20' 47.35"	N4° 15' 34.95"
DOM03	POZO BUENAVISTA		1	968668.4144m	953179.8691m	232.350m	W71° 21' 34.94"	N4° 10' 21.70"
DOM04	POZO VILLAMARCIA	DILUVIO	2	976124.0172m	945987.1103m	184.500m	W71° 17' 33.14"	N4° 06' 26.18"
DOM05	POZO LAS BRISAS		1	977507.6932m	947082.8612m	200.550m	W71° 16' 48.28"	N4° 07' 03.47"
DOM06	POZO CUMARALITO		1	977551.1217m	944929.9896m	197.550m	W71° 16' 46.86"	N4° 05' 53.40"
DOM07	POZO YATORROBO		1	976876.8066m	943115.3330m	194.900m	W71° 17' 08.70"	N4° 04' 54.32"
DOM08	POZO CERRITO		1	980241.7249m	947468.0925m	183.900m	W71° 15' 19.64"	N4° 07' 15.89"
DOM09	POZO PUERTO GAVILAN	SOLEDAD	2	983468.1415m	944328.3256m	203.100m	W71° 13' 35.02"	N4° 05' 33.86"
DOM10	POZO LAS DEUCIAS		1	985468.1246m	941561.4449m	180.200m	W71° 12' 30.16"	N4° 04' 03.79"
DOM11	POZO CACHAMITAS		1	979870.7300m	939807.9630m	186.933m	W71° 15' 31.62"	N4° 03' 06.67"

Tabla 3. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

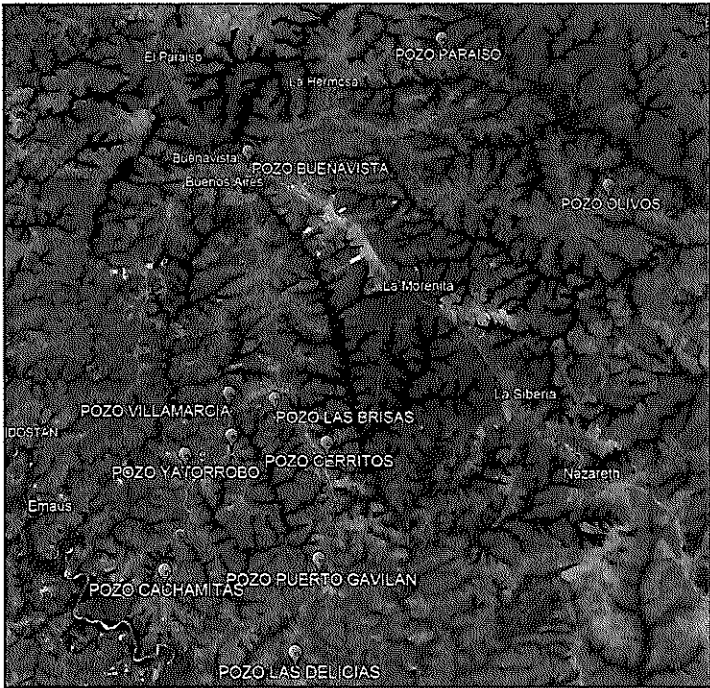


Figura 3. Localización comunidades del resguardo indígena Domoplanas

2.1.4 Localización comunidades Resguardo Indígena Aseinpome

RESGUARDO ASEINPOME									
COMUNIDAD	COORDENADAS	ASPI	Altura	Superficie	Longitud	Latitud	Altura	Superficie	Longitud
UNU01	KEKO	1	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM	
UNU01	SIETE RODRIGUEZ	2	960832.4770m	1009357.8925m	154.500m	W71° 25' 49.88"	N4° 40' 50.65"	92,00 KM	

Tabla 4. Coordenadas de localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



Figura 4. Localización comunidades del resguardo indígena Aseinpome



2.1.5 COMUNIDAD BENEFICIADA

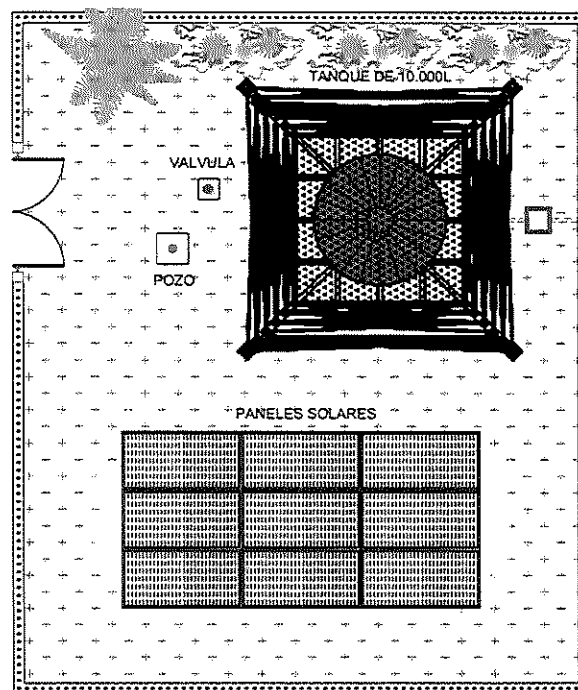
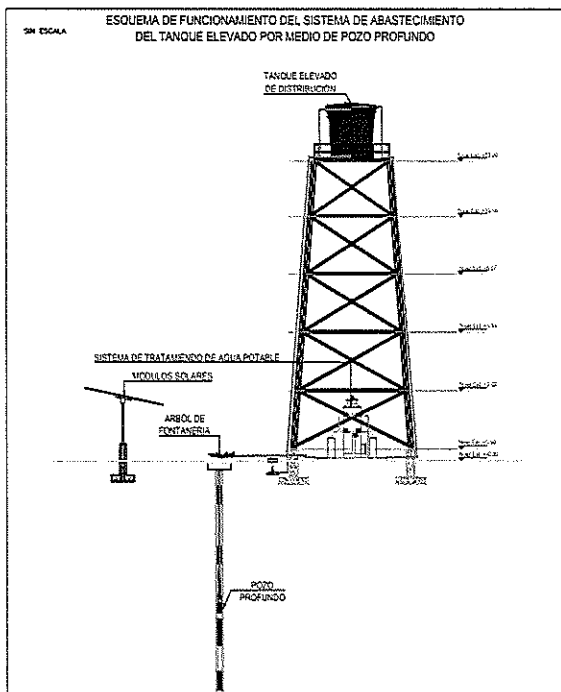
El número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto es de 3.246 habitantes como se muestra a continuación:

GRUPOS ÉTNICOS:		Población Indígena	
ETARIA:	Edad:	0 a 14 años	1.087
		15 a 19 años	390
		20 a 59 años	1.617
		Mayor de 60 años	152
GÉNERO:	Masculino:	1.737	
	Femenino:	1.509	

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto como se mencionó anteriormente beneficiara a 58 comunidades de 4 resguardos indígenas distribuidos en toda la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, cada sistema está concebido que sea igual para todas las comunidades, que requieran de la menor operación y que brinde agua potable para el beneficio de las comunidades.

El sistema consta de manera general de los siguientes componentes:




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

- **Pozo profundo:** Se contemplan profundidades de perforación desde 90 metros hasta los 153 metros, en tubería PVC de 6" al igual que los filtros.
- **Equipo de bombeo y sistema de energía solar:** bombas sumergibles solares de potencias entre 1.500, 3.000 y 16.000 wattios. Controladores de carga, sensores de nivel para tanque y pozo, y sistema de protección de malla a tierra.
Paneles solares monocristalinos de 570 wattios, distribuidos en módulos de 5, 9 y 22 paneles según las características de cada sistema.
- **Sistema de tratamiento de agua:** compuestos por una unidad presurizada en acero inoxidable que filtra, clarifica y purifica; diseñados para tratar caudales de 0.5 lts/seg, 1 lts/seg y 2 lts/seg según el requerimiento de cada sistema.
- **Redes de acueducto:** 56.682.22 metros de tubería de pvc 2" RDE 21 – 941 acometidas domiciliarias y sus respectivos accesorios (válvulas, uniones, tapones, codos, tees).
- **Tanque elevado de distribución:** tanques plásticos de 6.000 lts, 10.000 lts, y 20.000 lts, soportados en estructuras de acero estructural ASTM de 13.7 metros de altura cimentados en zapatas y pedestales en concreto de 3.000 psi.
- **Cerramiento perimetral:** en tubo galvanizado de 2" soportados en viga de cimentación y concreto ciclópeo con portón de acceso.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DEL PROCESO		LP-SIP-005-2025
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	NÚMERO:	821 DE 2025
	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
CONTRATISTA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT. 901.965.630 – 1 R.L. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

VALOR DEL CONTRATO	EN LETRAS	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
	EN NUMEROS	\$42.408.897.278,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		QUINCE (15) MESES
INTERVENTOR DEL CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 NIT. 901.972.868 – 4 R.L. JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO C.C. 79.134.525 DE FONTIBÓN interventoria.acindigenas@gmail.com
SUPERVISOR		ING. JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA ACTA DE INICIO		29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL		28 DE NOVIEMBRE DE 2026
COSTO EJECUTADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$ 1.165.283.191.00
COSTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PRESENTE CORTE		\$ 1.132.883.754.10
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO		33 días
DIAS PENDIENTES DE EJECUCION		423 días
PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO		7,24%

5. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

A continuación, se describen las pólizas expedidas por la compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. que amparan la ejecución del contrato desde su suscripción y las correspondientes modificaciones que se han realizado a la fecha del presente informe y que aplican para actualización de pólizas.

- Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 93833.
- Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 27002.


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

5.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS

PÓLIZAS INICIALES A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 17 DE JULIO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 0			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00
CIVIL DERIVADA DE							

PÓLIZAS INICIALES CORRECCIÓN NIT. DEL CONTRATISTA.

Póliza No. 93833				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17	07	2025	17	02	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	07	2025	17	10	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17	07	2025	17	02	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	17	10	2026	17	10	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 1			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CUMPLIMIENTO	17	07	2025	17	10	2026	\$2.120.444.864,00


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

PÓLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA DE VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

Póliza No. 93833				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	01	04	2027	\$4.240.889.727,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	01	12	2029	\$2.120.444.863,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29	08	2025	01	04	2027	\$21.204.448.639,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	29	08	2025	28	11	2031	\$4.240.889.727,80
Póliza No. 27002				Endoso 2			
RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29	08	2025	01	12	2026	\$2.120.444.864,00

6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

El contrato de obra No. 821 de 2025 cuenta con un anticipo del 50% del valor del contrato correspondiente a la suma de \$21.204.448.639,00; por concepto de FONSET la entidad retiene el 5% de este valor que son \$1.060.222.431,95 es decir que el valor neto entregado del anticipo corresponde a \$20.144.226.207,05.

En cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO del contrato, el contratista suscribió con la FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS denominado **PATRIMONIO AUTONOMO ANTICIPO CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, con el fin de manejar y girar los recursos del anticipo del contrato.

De igual manera se registra la cuenta de ahorros No. 500807651648 del Banco Popular correspondiente al fideicomiso donde se deben abonar los recursos objeto del contrato fiduciario.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo aprobado inicialmente y que se encuentra vigente a la fecha.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%	% PORCENTAJE PROGRAMADO DE INVERSIÓN EN EL TIEMPO EN MESES				
				1	2	3	4	5
1	MANO DE OBRA, PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS DEL PERSONAL OFERTADO Y OPERATIVO (SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, DOTACIONES)	\$2.417.307.144,85	12%	2%	3%	3%	3%	1%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	\$13.496.631.558,72	67%	15%	20%	20%	5%	7%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	\$4.230.287.503,48	21%	3%	5%	5%	5%	3%
TOTALES		\$20.144.226.207,05	100%					

6.2 ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

A continuación, se mencionan y describen cada uno de los ordenes de giro a la fiducia durante el periodo del informe

CONSECUTIVO	ITEM	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	SALDO ANTICIPO
ORDEN GIRO No. 1	1	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	\$ 462.554.100.00	25-09-2025	\$ 19.681.672.107.05
	2	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 145.631.457.22	25-09-2025	\$ 19.536.040.649.83
	3	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	\$ 3.954.010.079.94	25-09-2025	\$ 15.582.030.569.89
ORDEN GIRO No. 2	1	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	\$ 14.722.394.00	30-09-2025	\$ 15.567.308.175.89
	2	ARCOE SAS	\$ 43.072.283.00	30-09-2025	\$ 15.524.235.892.89
	3	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 6.865.773.00	30-09-2025	\$ 15.517.370.119.89



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

6.3 INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	29-08-2025 a 30-09-25	\$ 1.132.883.754.00	\$ 1.132.883.754.00	\$ 1.165.283.191.00	\$ 1.165.283.191.00
2	01-10-25 a 31-10-25	\$ 1.533.938.149.00	\$ 2.666.821.903.00		
3	01-11-25 a 30-11-25	\$ 2.752.982.664.00	\$ 5.419.804.567.00		
4	01-12-25 a 31-12-25	\$ 3.182.797.359.00	\$ 8.602.601.926.00		
5	01-01-26 a 31-01-26	\$ 3.054.586.452.00	\$ 11.657.188.378.00		
6	01-02-26 a 28-02-26	\$ 1.361.475.374.00	\$ 13.018.663.752.00		
7	01-03-26 a 31-03-06	\$ 1.707.014.984.00	\$ 14.725.678.736.00		
8	01-04-26 a 30-04-26	\$ 2.122.894.222.00	\$ 16.848.572.958.00		
9	01-05-26 a 31-05-26	\$ 3.538.600.653.00	\$ 20.387.173.611.00		
10	01-06-26 a 30-06-26	\$ 5.196.889.486.00	\$ 25.584.063.097.00		
11	01-07-26 a 31-07-26	\$ 6.886.687.533.00	\$ 32.470.750.630.00		
12	01-08-26 a 31-08-26	\$ 4.957.368.139.00	\$ 37.428.118.769.00		
13	01-09-26 a 30-09-26	\$ 3.283.638.775.00	\$ 40.711.757.544.00		
14	01-10-26 a 31-10-26	\$ 1.494.587.472.00	\$ 42.206.345.016.00		
15	01-11-26 a 28-11-26	\$ 202.576.537.00	\$ 42.408.897.278.00		

Ver anexo No. 1 Cuadro de avance actividades ejecutadas.

6.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$42.408.897.278,00
VALOR ADICIONES	\$0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$42.408.897.278,00
VALOR ANTICIPO	\$20.144.226.207,05
ACTAS PARCIALES	\$0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$20.144.226.207,05

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana

Villavicencio – Meta

e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com


CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

6.5 RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.


DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO	DIS.2025000172
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-05-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
CONCEPTO	SPGR CDP 13325 “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”.
RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.921.552,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.921.552,00

6.6 RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES - RP.

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO	RS1.2025000156
FECHA DEL REGISTRO	23-07-2025
DEPENDENCIA	SGRP – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SPGR
DESCRIPCIÓN	CTO-821 “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”.
FUENTE O RECURSO	1121-00AD – ASIGNACIONES DIRECTAS (SGR) R.C.
VALOR INICIAL	\$42.408.897.278,00
VALOR ACTUAL	\$42.408.897.278,00

6.7 ORDENES DE PAGO EFECTUADAS

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO 50,00%	2025090008	\$ 20.144.266.208,00	17/09/2025

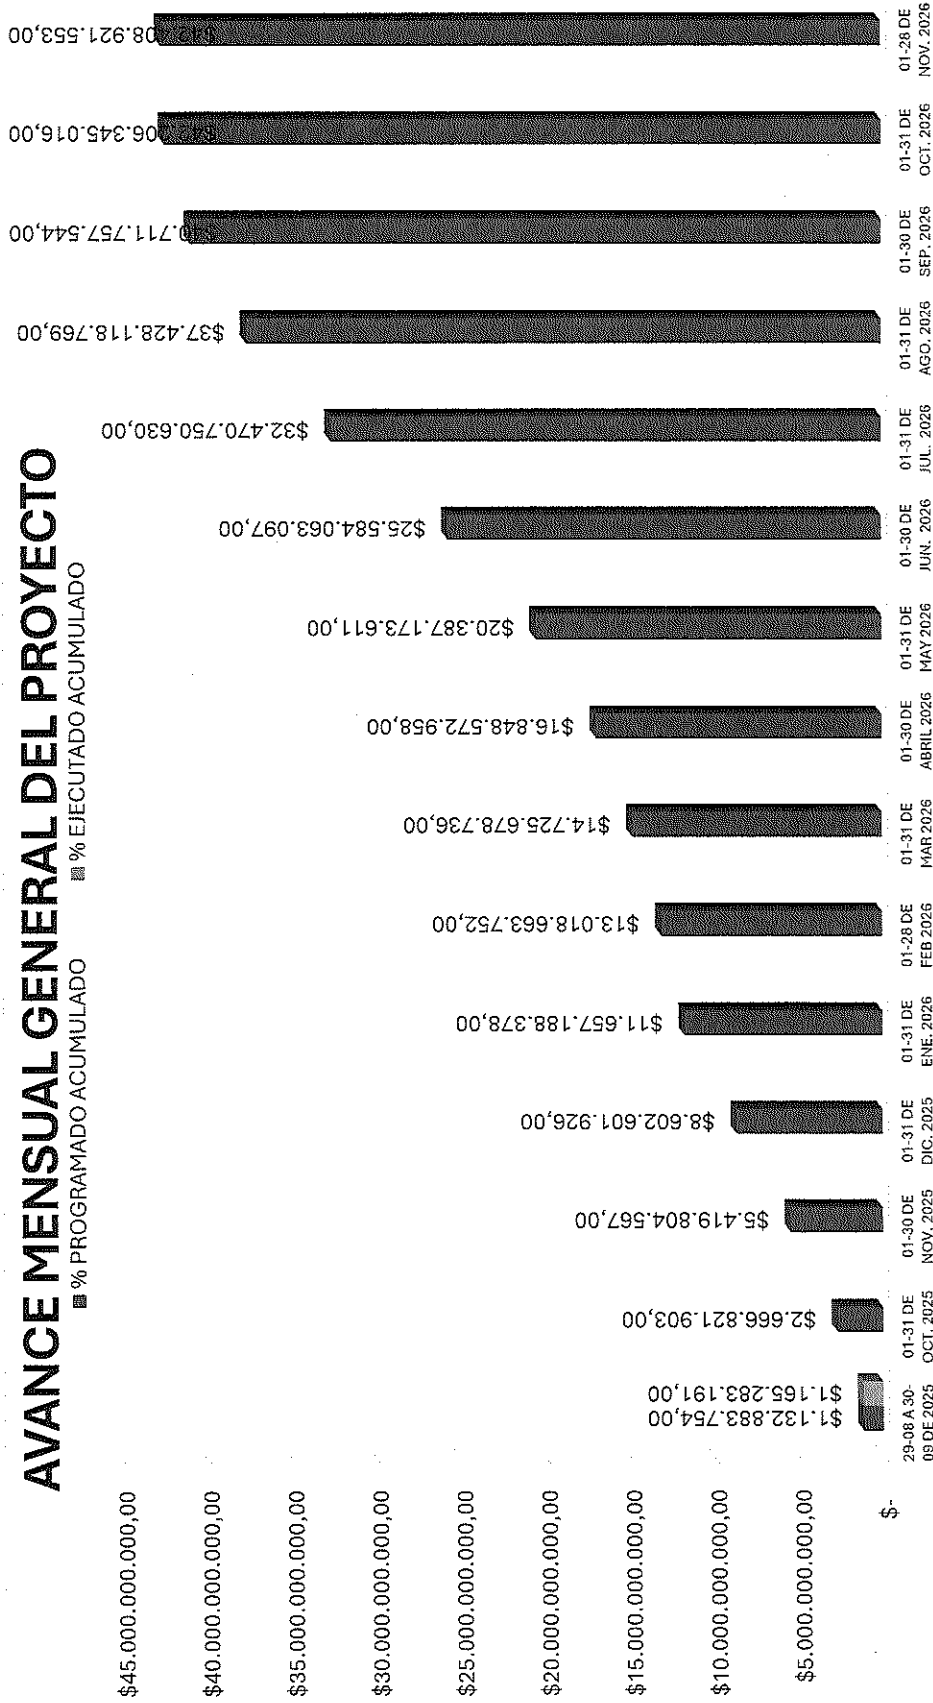


7 INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

7.1 GRAFICO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

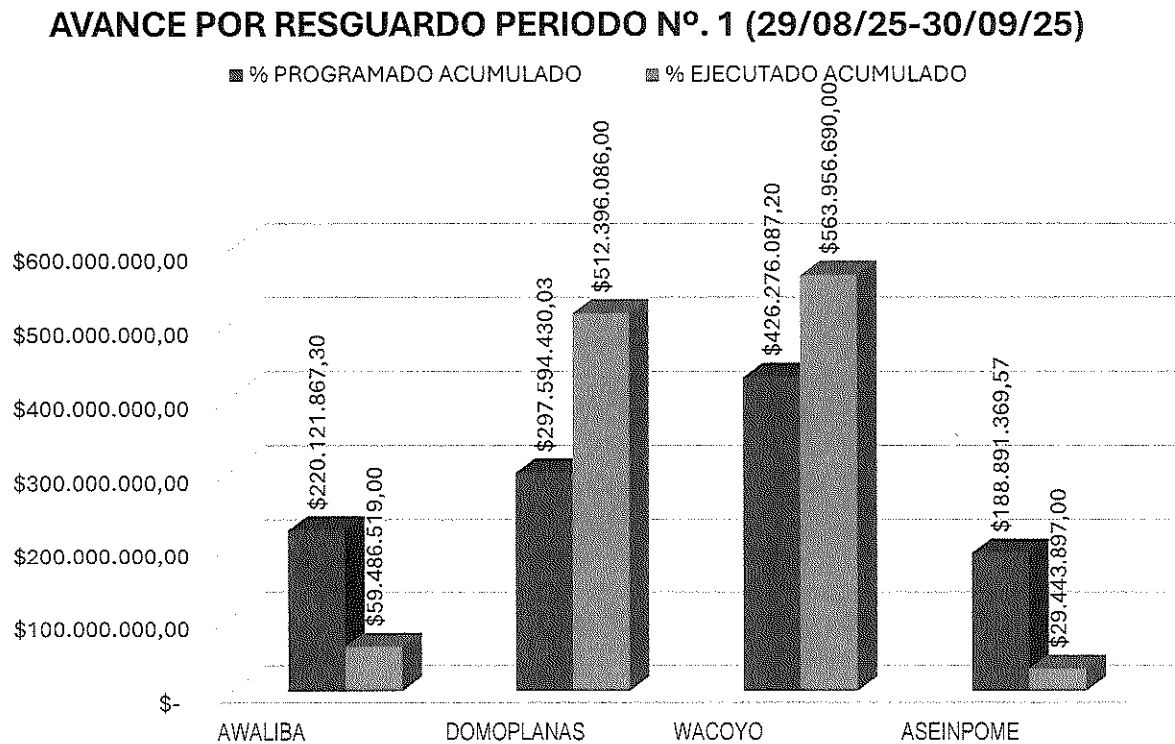
AVANCE MENSUAL GENERAL DEL PROYECTO

■ % PROGRAMADO ACUMULADO ■ % EJECUTADO ACUMULADO





7.2 GRAFICO AVANCE PERIODO POR RESGUARDO



7.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

El día 29 de agosto de 2025 el contratista de obra y la interventoría realizaron la socialización del proyecto en el resguardo Wacoyo, en compañía de la alcaldesa (E) y el secretario de infraestructura del municipio, los gobernadores de los 4 resguardos indígenas (WACOYO- DOMOPLANAS- ASEINPOME- AWALIBA) y comunidad beneficiaria, en la cual se explicó el alcance del proyecto y se aclararon dudas a los asistentes. (Se anexa acta de socialización original.)

A continuación, se relaciona las actividades de obra ejecutadas en el presente corte:

POZO PROFUNDO

Durante el periodo referenciado dentro de este informe se llevaron a cabo las actividades de localización y replanteo para pozos profundos de cada una de las 58 comunidades beneficiadas por el proyecto a cargo del consorcio aguas Gaitán 2025.



REDES DE ACUEDUCTO

Durante el periodo al cual se hace referencia dentro de este informe se realizaron las actividades de localización y replanteo para las redes de acueducto de cada una de las 58 comunidades beneficiadas por el proyecto a cargo del consorcio aguas Gaitán 2025.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

Durante el periodo al cual se hace referencia dentro de este informe se realizaron las actividades de localización y replanteo el cerramiento perimetral de cada una de las 58 comunidades beneficiadas por el proyecto a cargo del consorcio aguas Gaitán 2025.

SUMINISTROS

En el periodo de ejecución del presente informe se realizó la compra y suministro de una parte de la tubería de 2", que está contemplada para la ejecución de las redes de acueducto en las comunidades beneficiadas de los resguardos de Domoplanas y Wacoyo, que están dentro del proyecto a cargo del Consorcio Aguas Gaitán 2025.

Las cantidades ejecutadas y mencionadas anteriormente para el periodo referenciado en este informe se pueden verificar en el **Anexo N°1**.

7.4 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

En el **Anexo No. 2** se encontrarán los certificados de calidad de los materiales usados al corte del presente informe, junto con los certificados de calibración de los equipos usados si aplica.

7.5 MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se anexa el informe emitido por parte del profesional SISO, entrega de asistencia de charlas de seguridad, salud en el trabajo y las entregas de dotación. **Ver Anexo No. 3 Informe seguridad y salud en el trabajo (SISO)**

7.6 CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

MES AGOSTO 2025																																
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SECO AM																																
LLUVIAS MODERADAS AM																																
LLUVIAS INTENSAS AM																																
SECO PM																																

RESGUARDO ASEINPOME SEPTIEMBRE 2025																															
DIA	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
CLASE DE TIEMPO Y FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1

8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De acuerdo con las necesidades del proyecto, las actividades ejecutadas durante el presente periodo y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9491819049
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9491818606 - 9491367542
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9491819049
EDWIN GUZMAN PASTRANA	Profesional en Salud Ocupacional	86.040.134	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA	9491367542 9490726365
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9491787414
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	9491787414

PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9491787414
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9491787414
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9491819049
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9491787414

**PERIODO: SEPTIEMBRE 2025**

PERSONAL PROFESIONAL						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN	Director de Obra	40.326.478	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9492846565
WENDY VANESA GARZON GARCIA	Residente de Obra 1	1.121.902.403	PROTECCION	SANITAS	SURA	9492295185 9492259892 9492846748
GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS	Residente de Obra 2	1.121.834.340	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9492846565
EDWIN GUZMAN PASTRANA	Profesional en Salud Ocupacional	86.040.134	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA	9492295185 9492155718
DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO	Contadora	40.395.435	COLPENSIONES	SANITAS	SURA	9492794183
LINA MARCELA GOMEZ LEAL	Auxiliar Contable	40.328.285	PORVENIR	SANITAS	SURA	9492794183

PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO						
NOMBRE	CARGO	C.C.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA No. / PAGO OPORTUNO
GENESIS PAOLA PRADA MARTINEZ	Secretaria	1.092.394.700	PORVENIR	SANITAS	SURA	9492794183
JEIMMY ALEJANDRO MUÑOZ MURCIA	Conductor 1	80.013.513	PORVENIR	SANITAS	SURA	9492794183
ROSEMBERG MURCIA JOJOA	Conductor 2	1.003.359.252	PORVENIR	SANITAS	SURA	9492846565
OBER ASMED PEREZ PEREZ	Almacenista	96.193.788	COLPENSIONES	NUEVA EPS	SURA	9492794183

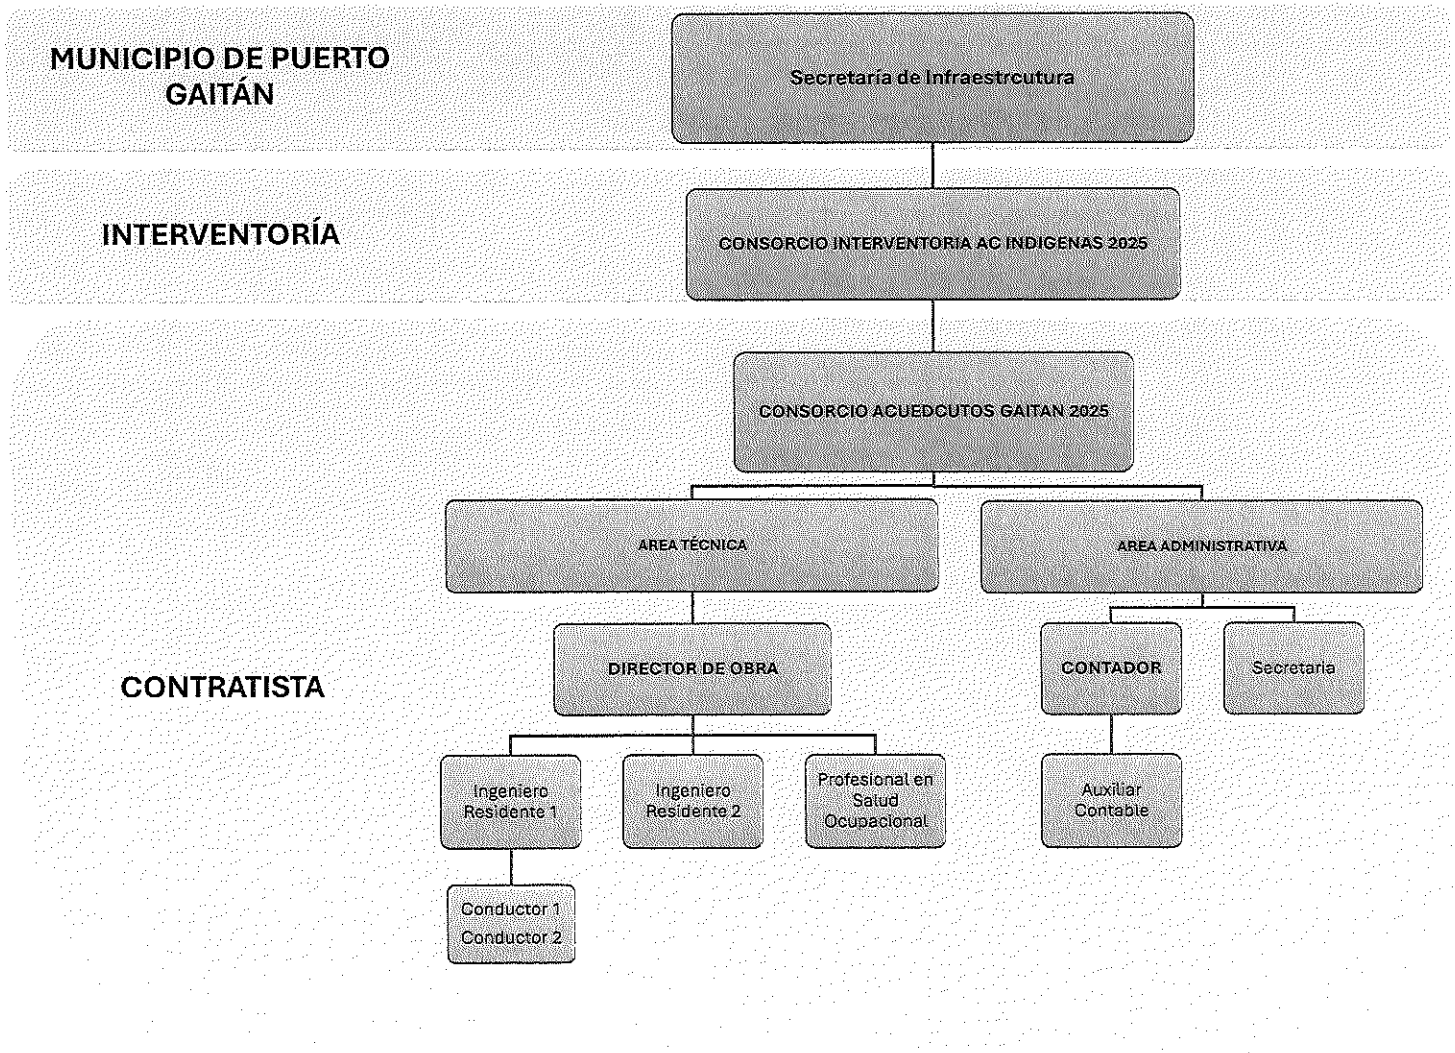
8.2 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

Ver Anexo No. 4. Planillas de pago seguridad social, afiliaciones y Certificación contador.



8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



8.4 PAZ Y SALVO PERSONAL.

En el periodo del presente informe no se presenta personal retirado.

9 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Para el periodo reportado en este informe no se presentan ensayos de laboratorio.



10 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
NIVEL DE PRECISIÓN	NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM	1
ESTACIÓN TOTAL	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOPCOM	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO.

En lo corrido del presente mes las actividades ejecutadas no causaron afectación ambiental en la zona de trabajo, ya que solamente se ejecutaron actividades de localización y suministro de tubería.

A la fecha el contrato cuenta con los permisos de prospección y exploración en de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA, los cuales a continuación se relacionan:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ



12 CONCLUSIONES

- Se presenta el siguiente informe con el fin de mantener informadas a las partes involucradas del estado y avance del contrato en el periodo correspondiente al informe mensual No. 1 con corte del (29-08-2025 al 30-09-2025), actividades que se desarrollaron con normalidad.
- Una vez recibidos los recursos de anticipo en la fiducia constituida para el manejo de este, se inició la inversión de tal forma que se logre el cumplimiento del cronograma.
- En el presente periodo se suministró aproximadamente el 29% de la tubería en los resguardos de Domoplanas y Wacoyo.
- Durante la ejecución de la actividad de localización y replanteo de las redes de acueducto en las comunidades beneficiarias se evidencio la existencia de nuevos usuarios, así como el desplazamiento de algunos usuarios dentro de la misma comunidad, situación que genera mayor cantidad de actividades de obra por lo que se cuantificara junto con interventoría para realizar el balance del contrato.

13 ANEXOS

- **ANEXO No. 1.** CUADRO DE AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
- **ANEXO No. 2.** CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS.
- **ANEXO No. 3.** INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- **ANEXO No. 4.** AFILIACIONES, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.
- **ANEXO No. 5.** ACTA DE SOCIALIZACIÓN COPIA
- **ANEXO No. 6.** REGISTRO FOTOGRAFICO.
- **ANEXO No. 7.** COPIA DE LA BITACORA.
- **ANEXO No. 8.** NOMINAS DEL PERSONAL.
- **ANEXO No. 9.** ACTAS DE VECINDAD
- **ANEXO No. 10.** ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO
- **ANEXO No. 11.** APROBACION DEL CONTRATO FIDUCIARIO

Atentamente,

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS AGUAS 2025
Contratista



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 1. CUADRO DE CANTIDADES AVANCE DE OBRA.

CONDICIONES INICIALES


N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES			PRESENTACIÓN AL 30-09-2018			AVANCE ACUMULADO			CAMBIO OBRA POR EJECUTAR		
							CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,300.00	\$ 256,460.00		\$ -		48.20	\$ 256,460.00		48.20	\$ 256,460.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO FACILITADO				\$ 256,460.00					\$ 256,460.00			\$ 256,460.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD FACILITADO				\$ 812,358.937.00					\$ 812,358.937.00			\$ 812,358.937.00			\$ -	
RESGUARDO DOMOPLANAS																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00		\$ -		1.00	\$ 140,909.00		1.00	\$ 140,909.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO OBRAS				\$ 140,909.00					\$ 140,909.00			\$ 140,909.00			\$ -	
4.00	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	3,250.85	\$ 14,131.445.00	\$ 46,131,445.00		\$ -		3,250.85	\$ 46,131,445.00		3,250.85	\$ 46,131,445.00		-	\$ -	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO OBRAS				\$ 46,131,445.00					\$ 46,131,445.00			\$ 46,131,445.00			\$ -	
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00		\$ -		48.20	\$ 258,207.00		48.20	\$ 258,207.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$ 258,207.00					\$ 258,207.00			\$ 258,207.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD PERIMETRAL				\$ 1,002,801,678.00					\$ 1,002,801,678.00			\$ 1,002,801,678.00			\$ -	
COMUNIDAD PARAIISO (6000-11) (E.Z. 1.34)																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00		\$ -		1.00	\$ 140,909.00		1.00	\$ 140,909.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO PARAIISO				\$ 140,909.00					\$ 140,909.00			\$ 140,909.00			\$ -	
4.00	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2,606.01	\$ 11,328.325.00	\$ 29,528,325.00		\$ -		2,606.01	\$ 29,528,325.00		2,606.01	\$ 29,528,325.00		-	\$ -	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO PARAIISO				\$ 29,528,325.00					\$ 29,528,325.00			\$ 29,528,325.00			\$ -	
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00		\$ -		48.20	\$ 258,207.00		48.20	\$ 258,207.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO PERIMETRAL				\$ 258,207.00					\$ 258,207.00			\$ 258,207.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD PERIMETRAL				\$ 57,583,354.00					\$ 57,583,354.00			\$ 57,583,354.00			\$ -	
COMUNIDAD BUENAVISTA (6000-0.60) (E.Z. 1.32)																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,065.00	\$ 140,065.00		\$ -		1.00	\$ 140,065.00		1.00	\$ 140,065.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO BUENAVISTA				\$ 140,065.00					\$ 140,065.00			\$ 140,065.00			\$ -	
4.00	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	826.58	\$ 3,593.143.00	\$ 2,968,143.00		\$ -		826.58	\$ 2,968,143.00		826.58	\$ 2,968,143.00		-	\$ -	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA				\$ 2,968,143.00					\$ 2,968,143.00			\$ 2,968,143.00			\$ -	
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,328.00	\$ 256,810.00		\$ -		48.20	\$ 256,810.00		48.20	\$ 256,810.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO BUENAVISTA				\$ 256,810.00					\$ 256,810.00			\$ 256,810.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD BUENAVISTA				\$ 876,933,725.00					\$ 876,933,725.00			\$ 876,933,725.00			\$ -	
COMUNIDAD VILLAMARCA (6000-11) (E.Z. 1.34)																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00		\$ -		1.00	\$ 140,909.00		1.00	\$ 140,909.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO VILLAMARCA				\$ 140,909.00					\$ 140,909.00			\$ 140,909.00			\$ -	
4.00	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	2,225.57	\$ 9,674.553.00	\$ 21,528,553.00		\$ -		2,225.57	\$ 21,528,553.00		2,225.57	\$ 21,528,553.00		-	\$ -	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO VILLAMARCA				\$ 21,528,553.00					\$ 21,528,553.00			\$ 21,528,553.00			\$ -	
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00		\$ -		48.20	\$ 258,207.00		48.20	\$ 258,207.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO VILLAMARCA				\$ 258,207.00					\$ 258,207.00			\$ 258,207.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD VILLAMARCA				\$ 1,462,338,536.00					\$ 1,462,338,536.00			\$ 1,462,338,536.00			\$ -	
COMUNIDAD LAS BRISAS (6000-0.60) (E.Z. 1.34)																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00		\$ -		1.00	\$ 140,909.00		1.00	\$ 140,909.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO LAS BRISAS				\$ 140,909.00					\$ 140,909.00			\$ 140,909.00			\$ -	
4.00	REDES DE ACUEDUCTO																	
4.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	716.07	\$ 3,108.093.00	\$ 2,228,093.00		\$ -		716.07	\$ 2,228,093.00		716.07	\$ 2,228,093.00		-	\$ -	
		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO LAS BRISAS				\$ 2,228,093.00					\$ 2,228,093.00			\$ 2,228,093.00			\$ -	
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL																	
6.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 5,357.00	\$ 258,207.00		\$ -		48.20	\$ 258,207.00		48.20	\$ 258,207.00		-	\$ -	
		TOTAL CERRAMIENTO LAS BRISAS				\$ 258,207.00					\$ 258,207.00			\$ 258,207.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD LAS BRISAS				\$ 922,660,144.00					\$ 922,660,144.00			\$ 922,660,144.00			\$ -	
COMUNIDAD GUARALITO (6000-11) (E.Z. 1.34)																		
1.00	POZO PROFUNDO																	
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00		\$ -		1.00	\$ 140,909.00		1.00	\$ 140,909.00		-	\$ -	
		TOTAL POZO PROFUNDO GUARALITO				\$ 140,909.00					\$ 140,909.00			\$ 140,909.00			\$ -	
		TOTAL COMUNIDAD GUARALITO				\$ 213,484,261.00					\$ 213,484,261.00			\$ 213,484,261.00			\$ -	

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACUYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPONE DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META

CONDICIONES INICIALES				ACTIVO ANTERIORES			PRESENTE A H. A. L. 30-09-2019			AVANCE ACUMULADO			CAMBIO OBRA POR EJECUTAR	
N° ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	2,172.88	\$ 4,347.00	\$ 9,445,944.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 9,445,944.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								
COMUNIDAD YATOROBO (6000 - 0.43) (F.Z. 1.34)														
1.00	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO CUMPLA RALITO				\$ 140,909.00								
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	1,846.90	\$ 4,347.00	\$ 8,028,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 8,028,474.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								
COMUNIDAD CERRITO (6000 - 0.43) (F.Z. 1.34)														
1.00	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO CUMPLA RALITO				\$ 140,909.00								
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	522.06	\$ 4,347.00	\$ 2,269,395.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 2,269,395.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								
COMUNIDAD PUERTO GAVILAN (10.008 - 11) (F.Z. 1.34)														
1.00	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO CUMPLA RALITO				\$ 140,909.00								
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	3,414.74	\$ 4,347.00	\$ 14,843,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 14,843,875.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								
COMUNIDAD LAS DELICIAS (6000 - 0.43) (F.Z. 1.34)														
1.00	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO CUMPLA RALITO				\$ 140,909.00								
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	1,493.19	\$ 4,347.00	\$ 6,490,897.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 6,490,897.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								
COMUNIDAD ENCANTAMIENTOS (6000 - 0.43) (F.Z. 1.34)														
1.00	POZO PROFUNDO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS	UND	1.00	\$ 140,909.00	\$ 140,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		TOTAL POZO PROFUNDO CUMPLA RALITO				\$ 140,909.00								
4.00	REDES DE ACUEDUCTO	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	MIL	1,169.03	\$ 4,347.00	\$ 5,081,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		TOTAL REDES DE ACUEDUCTO CUMPLA RALITO				\$ 5,081,773.00								
6.00	CERRAMIENTO PERIMETRAL	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	48.20	\$ 258,207.00	\$ 12,441,534.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1		TOTAL CERRAMIENTO CUMPLA RALITO				\$ 12,441,534.00								

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACQOY, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONDICIONES INICIALES			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE (ATA AL 20-09-2019)		PERIODO (08-04-2019 AL 20-09-2019)		AVANCE ACUMULADO		CANTIDAD OBRERA POR EJECUTOR	
Nº ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.17	COMUNIDAD OLIVOS (10.000 - 1L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,940.85	\$ 80.965.00	\$ 239,009,400.00	-	-	837.20	\$ 67,783,000.00	837.20	\$ 67,783,000.00
4.17	COMUNIDAD PARALISO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,996.01	\$ 80.965.00	\$ 241,565,490.00	-	-	676.63	\$ 54,783,346.00	676.63	\$ 54,783,346.00
4.17	COMUNIDAD BUENAVISTA (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.32)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	676.58	\$ 79,756.00	\$ 53,961,314.00	-	-	193.39	\$ 15,602,540.00	193.39	\$ 15,602,540.00
4.17	COMUNIDAD VILLAMARCA (10.000 - 1L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,955.57	\$ 80.965.00	\$ 158,332,725.00	-	-	576.31	\$ 46,890,838.00	576.31	\$ 46,890,838.00
4.17	COMUNIDAD LAS BRUNAS (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.32)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,992.98	\$ 80.965.00	\$ 161,255,128.00	-	-	173.37	\$ 14,198,832.00	173.37	\$ 14,198,832.00
4.17	COMUNIDAD CUMARALITO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,892.98	\$ 80.965.00	\$ 153,265,128.00	-	-	557.86	\$ 45,167,135.00	557.86	\$ 45,167,135.00
4.17	COMUNIDAD VATORORO (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,986.90	\$ 80.965.00	\$ 160,575,859.00	-	-	497.13	\$ 40,280,130.00	497.13	\$ 40,280,130.00
4.17	COMUNIDAD CERRITO (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	3,172.06	\$ 80.965.00	\$ 256,859,074.00	-	-	109.65	\$ 8,877,812.00	109.65	\$ 8,877,812.00
4.17	COMUNIDAD FUERTE GAVILAN (10.000 - 1L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	3,024.74	\$ 80.965.00	\$ 244,899,074.00	-	-	891.39	\$ 72,171,391.00	891.39	\$ 72,171,391.00
4.17	COMUNIDAD LAS DELICIAS (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,293.19	\$ 80.965.00	\$ 104,703,128.00	-	-	288.52	\$ 23,360,022.00	288.52	\$ 23,360,022.00
4.17	COMUNIDAD CACHAMITAS (10.000 - 0.8L) (F.Z. 1.34)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	979.03	\$ 80.965.00	\$ 79,261,194.00	-	-	381.10	\$ 30,855,762.00	381.10	\$ 30,855,762.00
4.17	COMUNIDAD VACOTO	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	4,544.67	\$ 73,714.00	\$ 334,898,433.00	-	-	1,274.53	\$ 93,960,704.00	1,274.53	\$ 93,960,704.00
4.17	COMUNIDAD VALMIRNE (10.000 - 1L) (F.Z. 1.32)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,968.08	\$ 73,714.00	\$ 218,606,812.00	-	-	841.07	\$ 61,998,634.00	841.07	\$ 61,998,634.00
4.17	COMUNIDAD ISERELA (10.000 - 2L) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,940.38	\$ 73,714.00	\$ 142,898,597.00	-	-	546.71	\$ 40,300,181.00	546.71	\$ 40,300,181.00
4.17	COMUNIDAD PALOGRANDE VALARDO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.32)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	779.52	\$ 73,714.00	\$ 57,461,637.00	-	-	218.62	\$ 16,115,355.00	218.62	\$ 16,115,355.00
4.17	COMUNIDAD LA UNION (10.000 - 1L) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	1,341.87	\$ 73,714.00	\$ 98,914,605.00	-	-	376.33	\$ 27,740,790.00	376.33	\$ 27,740,790.00
4.17	COMUNIDAD PUERTO GRILLO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.22)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,112.76	\$ 73,714.00	\$ 155,738,254.00	-	-	592.63	\$ 43,677,768.00	592.63	\$ 43,677,768.00
4.17	COMUNIDAD NATAPALITO (10.000 - 1L) (F.Z. 1.24)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,856.40	\$ 74,923.00	\$ 213,925,457.00	-	-	745.00	\$ 55,617,635.00	745.00	\$ 55,617,635.00
4.17	COMUNIDAD LA POPIA (10.000 - 1L) (F.Z. 1.24)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	2,249.56	\$ 74,923.00	\$ 168,543,784.00	-	-	630.69	\$ 47,268,171.00	630.69	\$ 47,268,171.00
4.17	COMUNIDAD LA CAMBARA (10.000 - 1L) (F.Z. 1.24)	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	3,653.74	\$ 73,714.00	\$ 268,912,390.00	-	-	859.43	\$ 63,130,881.00	859.43	\$ 63,130,881.00
4.17	COMUNIDAD VACOTO	TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO	ML	4,544.67	\$ 73,714.00	\$ 334,898,433.00	-	-	1,274.53	\$ 93,960,704.00	1,274.53	\$ 93,960,704.00
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AUI)						\$ 4,395,125,853.00				\$ 450,000,107.00		\$ 450,000,107.00
COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS (SIN AUI)						\$ 3,407,073,692.25				\$ 354,427,648.08		\$ 354,427,648.08
SUB TOTAL DE OBRA (INCLUYE AUI)						\$ 38,213,772,215.00				\$ 255,271,387.00		\$ 255,271,387.00
SUB TOTAL DE SUMINISTROS (INCLUYE AUI)						\$ 4,395,125,853.00				\$ 870,011,924.00		\$ 870,011,924.00
VALOR TOTAL						\$ 42,608,497,278.00				\$ 1,165,283,191.00		\$ 1,165,283,191.00
VALOR TOTAL AJUSTADO ALPESO						\$ 42,608,497,278.00				\$ 1,165,283,191.00		\$ 1,165,283,191.00


ING. LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCHA
RIL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 2. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.

CERTIFICADO DE CALIDAD**Gerfor****Laboratorio de ensayos PVC Gerfor S.A.**Fecha: 05-sept-25
Norma: NTC-382Consecutivo: 1535
Referencia: TUBO U.M. 2"
Lote de fabricación: 30000052516

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3578	60 - 60	60
OVALAMIENTO	mm	NTC-3578	< 1,60	0,75
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3578	1,78 - 2,45	1,97
PORCENTAJE DE VARIACION DE PARED	%	NTC-3578	< 12,00	8,62
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3578	6000 - 6012	6009,77

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSIÓN	MINUTOS	NTC-3578	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO.	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	68	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	70% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ROTULADO		NTC-382	LOGO IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE DIAMETRO PULG. - MM RDE PRESIÓN DE TRABAJO	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.
Muestreo realizado según la NTC 2859-1 Vigente.


Dra. Yelmí Milena Franco
Directora ConformidadNit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cora
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

		EQUIPOS GNSS RESEIVER HI-TARGET V60		Código:	HTV60-GPS-146			
		FORMATO DE CALIBRACION		Versión:	2.0			
Fecha Inspección:	4/2/2025	Persona que Inspecciona: ANDRES HERNANDEZ		Sede:	VILLAVICENCIO-META			
LUGAR: VILLAVICENCIO-META		Persona responsable del área: TECNICO OPERADOR						
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES		OPCIONES			VALORACIÓN	
				SI	NO	N/A	A	B
CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1 RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5			X			X	
	2 RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L3,L5			X			X	
	3 RECEIVER SATELLITE (BEIDOU)B1,B2,B3			X			X	
	4 RECEIVER SATELLITE (GALILEO)E1,E5 AltBOC,E5a,E5b,E6			X			X	
	5 RECEIVER SATELLITE (QZSS)L1 C/A,L1C,L2C,L5,L6			X			X	
	6 RECEIVER SATELLITE (SBAS)L1,L5			X			X	
	7 CHANNELS 220			X			X	
	8 HIGH PRECISION STATIC SURVEYING	Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS	X			X		
	9 REAL TIME KINEMATIC(<30Km) -NETWORK SURVEYING	Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS	X			X		
	10 INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz		X			X		
	11 INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban enbironmert		X			X		
	12 INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal		X			X		
	13 POWER SUPPLY WORKING TIME 5 hours	WORKING 5 hours	X			X		
								
OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES		OPCIONES			VALORACION	
				SI	NO	N/A	A	B
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS)		-		X			X	
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (HARDWARE)		-		X			X	
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84)		-		X			X	
Observaciones:								
EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.								
Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO		Cago: TECNICO OPERADOR		Firma del responsable:				
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES								
HALLAZGO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	NOMBRE(*)				
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2021	-	ANDRES HERNANDEZ				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS A CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES. B LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES C VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES D NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES								

		INSPECCION DE EQUIPOS GNSS RESEIVER STONEX-S800		Código: STS800-GPS-132	
		FORMATO PARA INSPECCIONES DE CALIDAD		Versión: 2.0	
Fecha Inspección: 8/4/2025		Persona que Inspecciona: ANDRES HERNANDEZ		Sede: VILLAVICENCIO	
LUGAR: VILLAVICENCIO-META		Persona responsable del área: TECNICO OPERADOR			

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACIÓN			
			SI	NO	N/A	A	B	C	D
CONDICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1 RECEIVER SATELLITE (GPS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5		X			X			
	2 RECEIVER SATELLITE (GLONASS) (L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L3,L5		X			X			
	3 RECEIVER SATELLITE (BEIDOU)B1,B2,B3		X			X			
	4 RECEIVER SATELLITE (GALILEO)E1,E5 AltBOC,E5a,E5b,E6		X			X			
	5 RECEIVER SATELLITE (QZSS)L1 C/A,L1C,L2C,L5,L6		X			X			
	6 RECEIVER SATELLITE (SBAS)L1,L5		X			X			
	7 CHANNELS 555		X			X			
	8 HIGH PRECISION STATIC SURVEYING	Horizontal 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical 5.0 mm + 1 ppm RMS	X			X			
	9 REAL TIME KINEMATIC(<30Km) -NETWORK SURVEYING	Fixed RTK horizontal 8mm +1 ppm RMS Fixed RTK vertical 15mm +1 ppm RMS	X			X			
	10 INTERNAL RADIO frequency range 457-467 MHz		X			X			
	11 INTERNAL RADIO maximum range 2- Km in urban enbironmert		X			X			
	12 INTERNAL RADIO maximum range up to 10 Km with optimal		X			X			
	13 POWER SUPPLY WORKING TIME 8-10 hours	WORKING 8,5 hours	X				X		

REGISTRO FOTOGRAFICO				
----------------------	--	--	---	--

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR		OBSERVACIONES	OPCIONES			VALORACION			
			SI	NO	N/A	A	B	C	D
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (PINTURA - TAPAS)		-	X			X			
CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO (HARDWARE)		-	X			X			
CONFIGURACION DE SISTEMA DE COORDENADAS (WGS84)		-	X			X			

Observaciones:
EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS.

Nombre: ANDRES HERNANDEZ MORENO	Cargo: TECNICO OPERADOR	Firma del responsable:
--	--------------------------------	-------------------------------

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES				
HALLAZGO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	NOMBRE(*)
NINGUNA	NINGUNO	9/12/2019	-	ANDRES HERNANDEZ
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2020	-	ANDRES HERNANDEZ
NINGUNA	NINGUNO	5/12/2021	-	ANDRES HERNANDEZ

CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS	
A	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
B	LIGERA VARIACION CON LAS ESPECIFICACIONES
C	VALORES FUERA DE RANGO CON ESPECIFICACIONES
D	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.690 – 1

ANEXO 3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FECHA DE INFORME			CONTRATO N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MM	DD	AAAA	821	ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 (CAG)	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
SEPTIEMBRE	30	2025				
MES AL QUE PERTENECE EL INFORME			OBJETO DEL CONTRATO			SEDE / PROYECTO
SEPTIEMBRE			CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS, ASEIPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.			MUNICIPIO DE PUERTO GATAN

1. Registro Semanal de Charlas / Capacitaciones SST										
Ítem	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	No. HORAS	Fecha Programada	Indicador cobertura			Indicador eficacia			Responsable O Líder
				Total asistentes a la capacitación	Numero de trabajadores programados	% de Cumplimiento	Numero trabajadores evaluados	Numero de evaluaciones eficaces	% de Cumplimiento	
1	Inducción SG-SST	2,00	29/08/2025	6	6	100%	6	6	100%	SST
2	Habitos Saludables	0,15	4/09/2025	7	7	100%	7	7	100%	SST
3	Estres Térmico	0,15	11/09/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
4	Pausas Activas	0,15	17/09/2025	5	5	100%	5	5	100%	SST
5	Riesgo Público	0,15	25/09/2025	7	7	100%	7	7	100%	SST
6	Peatón "Actor vial"	0,15	30/09/2025	7	7	100%	7	7	100%	SST

2. Programa de inspecciones: (Relacione las inspecciones ejecutadas durante la semana)							
Ítem	Inspección Realizada	Fecha	Periodicidad	Descripción del hallazgo	Plan de acción	Fecha del Cierre	% de Cumplimiento
1	BOTIQUÍN	10/09/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%
2	CAMILLA	10/09/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%
3	EXTINTOR	10/09/2025	Mensual	NINGUNO	N/A	N/A	100%

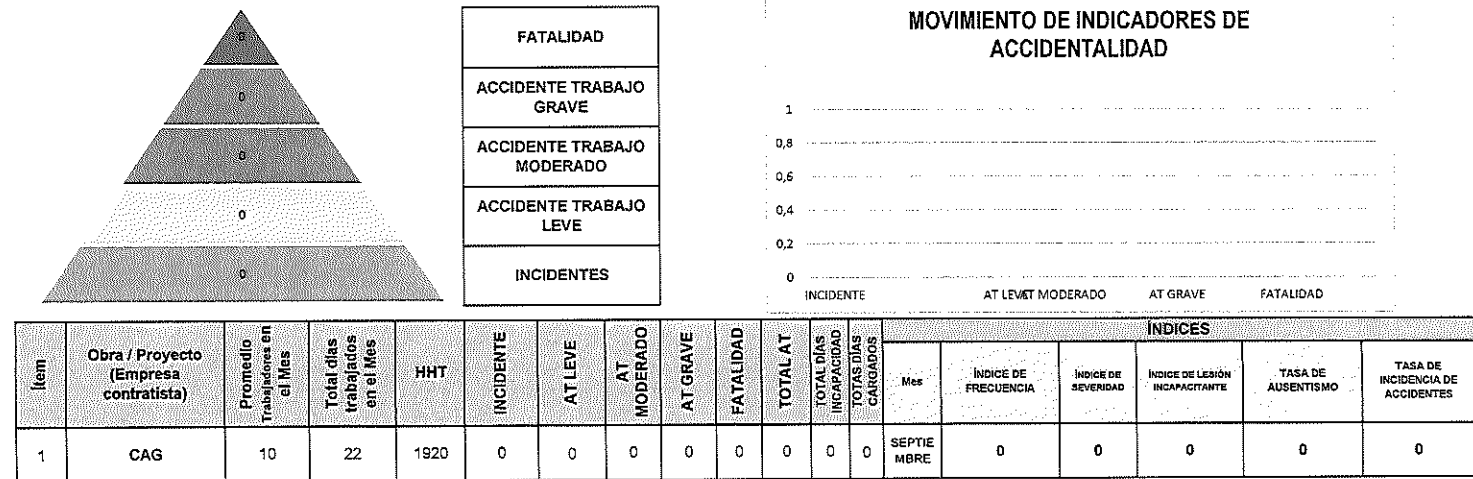
3. Seguimiento Semanal a Actividades adelantadas relacionadas a la implementación y ejecución del SG-SST			
Ítem	Descripción de Gestión SST y demás Actividades	Fecha	Observaciones
1	Se realizó inducción del SG-SST a todo el personal vinculado al contrato.	29/08/2025	
2	Se da cumplimiento a las inspecciones planeadas de los equipos de emergencias.	Mensual	
3	Se realizan charlas pre operacionales, socializando las actividades programadas para ejecutar.	Diarla	

4. Inventario de Maquinaria y Equipos					
Ítem	Nombre del Equipo	Referencia	Propio o Alquilado	Nombre del Operador	Observaciones
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Seguimiento a hallazgos y Condiciones de Seguridad, Salud y Ambiente							
Ítem	Descripción del hallazgo encontrado	Plan de Acción	Fecha	Se Notifico al Responsable		Fecha propuesta para el cierre	Estado
				Si	No		
1	NINGUNA	N/A	N/A			N/A	N/A

6. Seguimiento Ausentismo Laboral								
Ítem	Fecha	Nombre del Trabajador	Cedula	Cargo	Periodo de ausentismo		Total Dias de ausentismo	Descripción del ausentismo
					Fecha Inicial	Fecha final		
1								No se presentaron ausentismos.


7. Seguimiento a Indicadores de Accidentalidad									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



8. Descripción de los Accidentes e Incidentes presentados durante la Semana

Fecha del AT	Nombre	# Cedula	Ubicación y tipo de lesión	Incapacidad	Avance Incapacidad	At Investigado	Descripción del accidente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


9. Registro Fotográfico de Gestión SST

	
Ubicación: Oficina 826 Descripción: Inspección de extintores	Ubicación: Oficina 826 Descripción: Inspección de botiquín

	
Ubicación: Resguardo indígena Awaliba Descripción: Entrega de dotación	Ubicación: Resguardo indígena Awaliba Descripción: Charra pre operacional SST

10. Comentarios generales SST

1	Es importante destacar que se ejecutaron actividades de suministros de equipos, estructura y materiales para el desarrollo del proyecto, por lo tanto no se conto con personal operativo en el proyecto.
2	De acuerdo a lo anterior se realiza el presente informe teniendo en cuenta el personal independiente, que debido al desarrollo de proyecto solo se realizaron actividades de inspección.

FIRMA	
NOMBRE	EDWIN GUZMAN PASTRANA
CARGO	RESPONSABLE SST



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29/08/25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: GUILLERMO ALBERTO OCHOA VARGAS Documento: 1121834340
Cargo: MÓVILES RESIDENTE DE OBRA 1 N° de celular: 3102711240

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, GUILLEMO ALBERTO OJEDA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 112183434 desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE. BSA Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo:

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edwin Gutman

Firma: Edwin Gutman



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: GUILLERMO ALBERTO OCHOA UARGAS

Fecha: 29-08-25

Cedula: 1.121.834.340

Cargo: WEGGILLO RESPONSABLE DE OBRA 1

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ a. verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ b. Política de alcohol y drogas.

☒ c. Política SST.

d. Política de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.


7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035 Versión: 01 Fecha: agosto 2025
8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros: ✓		
a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.		
c. Verificar el área de trabajo. d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.		
9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es? ✓		
a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.		
b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa		
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral		
d. Ninguna de las anteriores		
10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación? ✓		
☒ SI Ubicación: CANCÚN MICRO VILLALBA		
☐ NO		
Firma del trabajador C.C.:  1121834340		Responsable de la Inducción Edwin Guzmán Cargo: coordinador SST
¡¡Gracias por su participación!!		



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN () RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: FRANCH CAROLINA ARGENTINO GARCIA

Documento: 40 326 478

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

N° de celular: 3132811163

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	SI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	SI
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	SI
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	SI
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	SI
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	SI
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	SI



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (☒) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, FRANCY CAROLINA ALEJANDRO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 40326478, desempeñando el cargo de DIRECTOR DE OGBA. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo:

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edwin Guzman

Firma: Edwin Guzman



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: FRANCY CAROLINA ADEUNO GARCIA

Fecha: 29-08-25

Cedula: 40 826 478

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Puntaje Obtenido: 100%

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo ✓

a. Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: ✓

a. Política de la empresa.

b. Política de alcohol y drogas.

c. Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. ✓

a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ✓

a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO: ✓

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo: ✓

a. Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo? ✓

a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
c. Verificar el área de trabajo. ☒ Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
☒ Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- a) ☒ SI Ubicación: CANCHA DE MICRO ULIAMALIA
b) NO

Firma del trabajador

c.c.: 403267780

Responsable de la Inducción

Edwin Guzman
Cargo: Coordinador SST.

¡¡Gracias por su participación!!



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 2025

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: *Dña Yanira Machado Tejeda*

Documento: *40395435*

Cargo: *Contadora*

N° de celular: *3142334799*

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro.	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplice las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, Dña Yanira Hadriada Tejeda, identificado con cédula de ciudadanía No. 40395437, desempeñando el cargo de Contadora, Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.

Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo:

Yanira Hadriada Tejeda

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edwin Carman

Firma: Edwin Carman



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: *Diana Yanira Machado Tejedor*

Fecha: *29 de agosto de 2025*

Cedula: *40395435*

Cargo: *Contadora*

Puntaje Obtenido: *100%*

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ Política de alcohol y drogas.

☒ Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión

☒ Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

☒ Reportar una condición de salud desfavorable.

b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

☒ Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
- c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
- ☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
- c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
- d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: *cancha micro fútbol Br. Villa María*
- b) NO

Firma del trabajador

C.C.:

Wafarra Machado Luján

Responsable de la Inducción

Edwin Guzman

Cargo: *Coordinador SST*

¡¡Gracias por su participación!!



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (x) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 2025

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: *Denesis Paola Parada Alvarado* Documento: *1-092-394700*
Cargo: *Secretaria* N° de celular: *3212385790*

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 2025

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, Genesis Paola Parada Plantines, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.092.394.700, desempeñando el cargo de Secretaria. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo:

Genesis Paola Parada Plantines

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edum Gaitán

Firma: Edum Gaitán



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Nombre del trabajador: *Genesis Paola Pareda Martinez*

Fecha: *29/08/2025*

Cedula: *1-092-394.700*

Cargo: *Secretaria*

Puntaje Obtenido: *100%*

Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:

1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

☒ a. Verdadero

b. falso

2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a. Política de la empresa.

☒ b. Política de alcohol y drogas.

☒ c. Política SST.

d. Política de de obra.

3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

☒ a. Verdadero

b. Falso

4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

☒ a. Verdadero

b. Falso

5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:

a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

☒ d. Todas las anteriores

6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:

☒ a. Reportar una condición de salud desfavorable.

☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal.

c. Cometer actos inseguros durante mis actividades.

d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?

☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reportar directamente a la ARL.

c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.

d. ninguna de las anteriores

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035		
Versión: 01				
Fecha: agosto 2025				
8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros: ✓				
☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.				
c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.				
9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es? ✓				
a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.				
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa				
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral				
d. Ninguna de las anteriores				
10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación? ✓				
☒ a) SI Ubicación: <i>Cancha nuevo fútbol Villa Klauia</i>				
b) NO				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="175 842 1036 982"> Firma del trabajador <i>Genesis p. pineda R.</i> c.c.: <i>1.092.394.700</i> </td> <td data-bbox="1036 842 1409 982"> Responsable de la Inducción <i>Edwin Cármon</i> Cargo: <i>coordinador SST</i> </td> </tr> </table>			Firma del trabajador <i>Genesis p. pineda R.</i> c.c.: <i>1.092.394.700</i>	Responsable de la Inducción <i>Edwin Cármon</i> Cargo: <i>coordinador SST</i>
Firma del trabajador <i>Genesis p. pineda R.</i> c.c.: <i>1.092.394.700</i>	Responsable de la Inducción <i>Edwin Cármon</i> Cargo: <i>coordinador SST</i>			
¡¡Gracias por su participación!!				



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: VANESA GARCÍA GARCÍA

Documento: CC. 1121902403

Cargo: JRG- RESIDUOS 2.

Nº de celular: 3205747456.

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo) , iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarrojo).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocios), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN (X) RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 25

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE ENTERADO

Yo, YANESA GARCÓN GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1121902403 desempeñando el cargo de ING. RESIDENTE 2 Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: [Firma]

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edwin Guzman

Firma: [Firma]

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035 Versión: 01 Fecha: agosto 2025
Nombre del trabajador: VANESA GARZÓN GARCÍA		
Fecha: 29-8-25	Cedula: 1121902403	
Cargo: Tnb. RESISTENTE 2.	Puntaje Obtenido: 100%	
Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:		
1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo		
☒ Verdadero		
b. falso		
2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:		
a. Política de la empresa. ☒ Política de alcohol y drogas.		
☒ Política SST. d. Política de obra.		
3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		
☒ Verdadero		
b. Falso		
4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.		
☒ Verdadero		
b. Falso		
5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:		
a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.		
b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.		
c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.		
☒ Todas las anteriores		
6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:		
☒ Reportar una condición de salud desfavorable. ☒ Hacer buen uso de los elementos de protección personal.		
c. Cometer actos inseguros durante mis actividades. d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?		
☒ Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
b. Reportar directamente a la ARL.		
c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar.		
d. ninguna de las anteriores		

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035		
Versión: 01				
Fecha: agosto 2025				
8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros: ✓				
☒ Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.				
c. Verificar el área de trabajo. ☒ Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.				
9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) es? ✓				
a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.				
☒ Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa				
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral				
d. Ninguna de las anteriores				
10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación? ✓				
a) ☒ Ubicación: CARCHA DE FUTBOL, BARRIO ULLAMARZA				
b) NO				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="175 840 1031 976"> Firma del trabajador  C.C.: 1121902403 </td> <td data-bbox="1031 840 1409 976"> Responsable de la Inducción Edwin Gaitan Cargo: coordinador SST </td> </tr> </table>			Firma del trabajador  C.C.: 1121902403	Responsable de la Inducción Edwin Gaitan Cargo: coordinador SST
Firma del trabajador  C.C.: 1121902403	Responsable de la Inducción Edwin Gaitan Cargo: coordinador SST			
¡¡Gracias por su participación!!				



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN () RE-INDUCCIÓN ()

Fecha 29 08 2025

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombres y Apellidos: Jina Marcela Gomez Leal

Documento: 40.328.785

Cargo: Auxiliar Contable

N° de celular: 3114204308

TEMAS DIVULGADOS	SI	NO	TEMAS DIVULGADOS	SI	NO
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	X		Enfermedad laboral - Procedimiento en caso de EL	X	
Objetivos del SG-SST	X		Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.	X	
Política de SST	X		COPASST / Vigía de SST	X	
Política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.	X		Ley 1010 de 2006 Acoso laboral	X	
Política de Seguridad Vial	X		Comité de Convivencia laboral	X	
Definiciones de Riesgo y peligro	X		Dotación y EPP que requieren durante la ejecución de actividades.	X	
Identificación de peligros y controles	X		Plan de emergencias: Brigadistas, Procedimiento en caso de emergencia, códigos de alarma, punto de encuentro,	X	
Reporte e investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo.	X		Reglamento de Higiene y seguridad	X	

RESPONSABILIDADES RESPECTO A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Procurar el cuidado integral de mi salud; con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud,
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la Compañía,
- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en mi sitio de trabajo,
- Participar en las actividades de prevención, mediante capacitaciones en SST, definidas en el cronograma de capacitación del SG-SST, que se realicen en la empresa.
- Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.

NORMAS DE SEGURIDAD

- El uso de la Dotación y EPP suministrados por la Empresa, es obligatorio durante toda la jornada laboral para el personal administrativo y Operativo.
- Aplique las pautas de higiene postural y de manipulación de cargas. Realice diariamente pausas activas.
- Prohibido obstaculizar, retirar, esconder u operar los equipos de emergencia como son extintores, gabinetes, camillas y botiquines, salvo en una emergencia.
- Mantener el puesto de trabajo en perfecto orden y aseo y cuidar los equipos elementos asignados para ejecutar la labor.
- Para la realización de tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y energías peligrosas) es obligatorio tramitar el Permiso para tareas de alto riesgo, contar con los equipos, herramientas y protección adecuada para su realización.
- En casos de emergencia siga los procedimientos de seguridad y reporte la situación a la persona encargada.
- Evalúe y controle los riesgos antes de ejecutar cualquier tarea; evite improvisar.
- No se permite usar joyas o prendas que puedan causar accidentes, tales como anillos, esclavas, cadenas, relojes, pulseras, ropa diferente a la entregada como dotación en obras.
- Ponga en práctica los procedimientos seguros de trabajo y respete las instrucciones, señales y advertencias

PELIGROS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO

Peligro	Descripción	Aplica (Si - No)
Biológico	Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	Si
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperatura extrema (calor y frío), presión atmosférica (normal y ajustada), radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa), radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja).	Si
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocios), gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material p	Si
Psicosocial	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.). Interfase persona/tarea (conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización). Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos).	Si
Biomecánicos	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacionales), esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas.	Si
Condiciones de seguridad:	Mecánica (elementos de máquinas-herramientas, piezas por trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos). Eléctrica (alta y baja tensión, estática). Locativa (almacenamiento, superficies de trabajo irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, caídas de objeto). Tecnológica (explosión, fuga, derrame, incendio). Accidentes de tránsito. Públicas (robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.). Trabajo en alturas, Espacios confinados.	Si
Fenómenos naturales:	Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).	Si



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Código: SST-F-034

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

INDUCCIÓN () RE-INDUCCIÓN ()

Fecha: 29/08/2025

VII. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE ENTERADO

Yo, Lina Marcela Gomez Leal, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.328.785 desempeñando el cargo de Auxiliar Contable. Certifico que recibí, la inducción o re inducción en aspectos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se han discutido conmigo los asuntos y temas arriba señalados, he manifestado todas mis dudas e inquietudes, las cuales me han sido aclaradas satisfactoriamente.
Me Comprometo a seguir y cumplir las instrucciones, normas y procedimientos establecidas por Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo.

En constancia de lo anterior firmo: Lina Marcela Gomez Leal

¡Gracias por su participación!

Responsable Inducción SST: Edwin Gomez

Firma: Emilio

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: SST-F-035 Versión: 01 Fecha: agosto 2025
Nombre del trabajador: <u>Lina Marcela Gomez Jael</u>		
Fecha: <u>29 de Agosto de 2025</u>		Cedula: <u>40.328.785</u>
Cargo: <u>Auxiliar Contable</u>		Puntaje Obtenido: <u>100%</u>
Con el fin de medir la eficacia de la capacitación, se solicita responder las siguientes preguntas relacionadas con la capacitación:		
1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo		
a. ☒ Verdadero b. falso		
2. Seleccione 2 (dos) Políticas de la Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:		
a. Política de la empresa. ☒ Política de alcohol y drogas. ☒ Política SST. d. Política de de obra.		
3. Peligro, es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.		
a. ☒ Verdadero b. Falso		
4. Riesgo, es toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.		
a. ☒ Verdadero b. Falso		
5. De los siguientes anunciados, cual corresponde a la definición de ACCIDENTE DE TRABAJO:		
a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. b. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. c. El que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión ☒ d. Todas las anteriores		
6. Seleccione 2 (dos) responsabilidades que tengo como trabajador en Seguridad y Salud en el Trabajo:		
a. ☒ Reportar una condición de salud desfavorable. ☒ b. Hacer buen uso de los elementos de protección personal. c. Cometer actos inseguros durante mis actividades. d. Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
7. ¿Qué debo hacer en caso que tenga un accidente de trabajo?		
☒ a. Reportar al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Reportar directamente a la ARL. c. Dirigirse al centro asistencial más cercano sin informar. d. ninguna de las anteriores		



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: SST-F-035

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

8. Seleccione 2 (dos) actos inseguros:

- ☒ a. Realizar trabajo en alturas sin uso de arnés. b. Usar los elementos de protección personal.
c. Verificar el área de trabajo. ☒ d. Trabajar sin uso de los guantes y la gafas de seguridad.

9. ¿El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Cопасst) es?

- a. Una entidad encargada de supervisar las labores de los trabajadores.
☒ b. Un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo dentro de la empresa
c. Un comité reglamentado para dar manejo a las conductas por acosos laboral
d. Ninguna de las anteriores

10. ¿En su sitio de trabajo Conoce el punto de encuentro en caso de evacuación?

- ☒ a) SI Ubicación: Cancha micro villa María
b) NO

Firma del trabajador

c.c.: 40.328.285.

Jina Marcela Gomez Jedd

Responsable de la Inducción

Edwin Gutman

Cargo: *coordinador est*

¡¡Gracias por su participación!!



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla <u>X</u> Visita__ Campaña__ Otra__		
Fecha de actividad: 04 SEPTIEMBRE 25	Hora: 9:00 AM	Duración: 15 minutos
Tema: HABITOS SALVABLES	Lugar: OFICINA 826	

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	VANESA GARZÓN GARCIA	1121902403	ING. RESIDENTE 2	
2	Genesis Paola Parada Martinez	1092394700	Aux/Adm Financiero	
3	Diana Yvonne Machado J	40395435	Contador	
4	ROSEMBERG MORA	1003 389252	AUX OPERATIVO CONDUCTOR	
5	Lina Marcela Gomez Jael	40.328.285	Aux Contable	
6	ALEJANDRO MUÑOZ	80023 513	CONDUCTOR	
7	GABRIEL OSORIO	1121834840	ING. RES. 1	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Edwin Guzman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 11-08-2025

Hora: 7:00 AM

Duración: 35 minutos

Tema: ESTRÉS TÉRMICO

Lugar: Oficina 826

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	GUILLERMO OSORIO	1121824840	MG-LES. 1	
2	Lina Marcela Gomez Jael	40.328.285	Aux. Contable	
3	Genesis Paola Parada Martinez	1.072.344.700	Aux. Adm. Financiera	
4	IVANESA GARRON GARCIA	1121902403	MG-LES. 2	
5	Yeva Yanira Machado J	40 395 435	Contadora	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Edwin Guzman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla ☒ Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 17-09-25 Hora: 8:00 AM Duración: 15 minutos

Tema: PAUSAS ACTIVAS Lugar: Oficina 226

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Lina Marcela Gomez Leal	40.328.285	Aux. Contable	Lina Gomez
2	IVANESA GARCIA GARCIA	1121902403	Ag. RESIDENTE 2	Ivana 2
3	GUILLERMO OSORIO	11219384340	WG-RES-1	Guillermo
4	Genesis Paola Pareda Martinez	1.092.314.700	Aux. Adm. Finanzas	Genesis Paola
5	Diana Yaira Machado J	40395435	Contadora	Diana
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Edwin Guzman

FIRMA: Edwin Guzman



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 25-09-25

Hora: 7:00 AM

Duración: 15 min.

Tema: Riesgo Público

Lugar: Oficina B26

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ROSEMAREL MORA TOLOA	1008359252	ACX- OPERATIVO CONDUCTOR	
2	GUILLERMO BORO	121834340	WG- RES. 1	
3	ALEJANDRO MUÑOZ	80013513	CONDUCTOR	
4	VANESA GARZÓN GARCÍA	1121902403	INB. RESIDENTE 2	
5	Gonzalez Paola Pamela Martinez	1.092394.700	Aux Adm Financiera	
6	Diana Yanira Machada	40395435	Contadora	
7	Lina Marcela Gomez Leal	40.328.285	AUX. contable	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Edurn Gozman

FIRMA:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: SST-F-025

Versión: 01

Fecha: agosto 2025

Tipo de actividad: Reunión__ Capacitación__ Charla X Visita__ Campaña__ Otra__

Fecha de actividad: 30-09-25

Hora: 8:00

Duración: 15 minutos

Tema: PEATON "ACTOR UAI"

Lugar: OFICINA 326

N.º	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Genesis Paola Parada Montez	1092394700	Aux. adm. Financiera	Genesis Parada
2	Rosember Mulem Jorona	1003889252	Aux. operativo conductor	Rosember
3	Vanessa Garzon Garcia	1121902403	ING. RESIDENTE 2	Vanessa
4	Diana Yanira Machada	40395435	Contadora	Diana
5	Guillermo Osorio	1121834840	WG. RES. 1	Guillermo
6	Lina Marcela Gomez Jaul	40328785	Aux. Contable	Lina Gomez
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Edwin Gomez

FIRMA: Edwin Gomez



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST-F-020
Versión: 01
Fecha: agosto 2025

FECHA INSPECCIÓN: 10.09.25

LUGAR: Oficina B26


RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Edwin Guzmán

CARGO: Coordinador SST

Bueno: B Regular: R Malo: M No Tiene: N.T No aplica: N.A

N°	Ubicación	Identificación	Capacidad	Clase	Agente	Fecha de última recarga	Acceso	Visibilidad	Señalización	Pintura	Cilindro	Etiqueta (instructivo)	Aro de seguridad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Manija de transporte	Manija de disparo	OBSERVACIONES
1	Forjotomasa	MA	30 lbs	ABC	AS	3-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Segundo piso	NA	30 lbs	ABC	Fos	3-25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

OBSERVACIONES GENERALES:



INSPECCIÓN CAMILLAS DE EMERGENCIA

Código: SST-F-021
Versión: 01
Fecha: agosto 2025

Código: N/A Fecha de Inspección: 10-09-25

Responsable de la Inspección: Eduan Guzmán Cargo: coordinador SST

Lugar: Oficina 826 Ubicación de la camilla: Oficina 826 1º Piso

DESCRIPCIÓN DE LA CAMILLA

Elemento	VERIFICACIÓN / ESTADO			DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	NA		
1	Instalación (Sitio de ubicación)	SI			
2	Estado del soporte	SI			
3	Sujetadores o Manijas de agarre	SI			
4	Correas de amarre o seguridad	SI			
5	Lugar visible y fácil acceso	SI			
6	Rotulada / Señalización	SI			
7	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	SI			

OBSERVACIONES:

Eduan Guzmán
Firma

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		Código: SST-F-022	
				Versión: 01	
				Fecha: agosto 2025	

Lugar:	Oficina 826	Fecha de inspección:	30	9	25 A.A.
Ubicación del botiquín	Cubículos Penal ADO Of. 826				


Marque con una X según las condiciones observadas:									
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	Si	X	No		Localizado en lugar visible?	Si	X	No	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Si	X	No		El botiquín se encuentra señalizado?	Si	X	No	

Ítem	Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	Cantidad Requerida	Cantidad existente	Fecha de Vencimiento (Si aplica)	Observaciones
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	32	4-29	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	1 unidad	1	-	
3	BAJALENGUAS	Paquete X 20	20	9-28	
4	TIJERAS MEDIANA PUNTA ROMA	1 unidad	1	NA	
5	TAPABOCA QUIRÚRGICO	Paquete por 5	5	NA	
6	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	Caja por 50	40	18-4-29	
7	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	1 unidad	1	28-10-25	
8	VENDA ELÁSTICA 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	8-6-27	
9	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1 unidad	1	3-27	
10	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1 unidad	1	11-26	
11	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 YARDAS	1 unidad	1	30-26	
12	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml	1 unidad	1	30-25	
13	SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc	2 unidades	1	-	
14	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 unidad	1	-	
15	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 350 ml	1 unidad	1	4-26	
16	PARCHE OCULAR	5 unidad	4	-	
17	APLICADORES	Paquete X 20	20	-	
18	VENDA TRIANGULAR	2 unidades	2	-	
19	JERINGAS	1 unidad	1	22-11-25	
20	SULFAPLATA 30 g	1 unidad	1	-	
21	SUERO ORAL SOBRE	2 unidades	3	6-26	
22	LINTERNA	1 unidad	1	-	
23	MASCARILLA RCP	1 unidad	1	-	
24	INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLÁSTICO	1 Juego	1	-	

Observaciones Generales:

Participantes en la Inspección:

Firma:





CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN CONTADOR.



EMPRESAS INGENIERIA <inforecursosh826@gmail.com>

NOTIFICACION RESULTADO NOVEDAD RELACION LABORAL

3 mensajes

Afiliaciones EPS Sanitas <afiliacionesepts@epssanitas.notify-it.com>
Para: inforecursosh826@gmail.com

16 de septiembre de 2025, 18:11



Bogotá, 16 de Septiembre de 2025

Señor(a):

CONSORCIO AGUAS GAITAN

901965630

Asunto: Solicitud Novedad Relación Laboral ID 7173594

Cordial saludo

Nos permitimos informarle el resultado de la novedad de inicio de la relación laboral para el afiliado(a) **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado(a) con CC 36051533 :

Fecha de Radicación	12/09/2025
Nro. Solicitud	503260911
Salario (IBC)	\$ 11,000,000
Fecha de ingreso a laborar	01/09/2025
Estado Cargue Novedad	Novedad cargada con éxito

[El texto citado está oculto]

Cordialmente,

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas

Coordinador Gestión de la Afiliación al SGSSS

EPS Sanitas

Usted ha recibido este correo porque se encuentra registrado como miembro de alguno de nuestros clientes en notificado.com.
Para **darse de baja** del recibo de este tipo de correos, por favor haga clic aquí.

Medellín, 08 de September de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 ADMON VILLAVO		Clase: 1		Porcentaje Cotización: 0.522 %		
C86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	09/09/2025		1755TSY2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/09/2025 16:58:48 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.96.13, 198.143.41.23, 172.16.42.57



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON** identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **40326478**, se encuentra afiliado/a desde **01/07/2019** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de septiembre de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
VIGILADO POR EL GOBIERNO



CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 40326478
NOMBRES Y APELLIDOS	Arevalo Garzon, Francy Carolina
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/04/2021
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Arevalo Garzon, Francy Carolina, a los 25 días del mes de septiembre del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

Medellín, 28 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000003 OBRA WACOYO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C40326478	AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	29/08/2025		s1631881	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/08/2025 13:44:05

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.96.13, 198.143.41.23, 172.16.42.57

VIGILADO



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **86.051.533**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 25 de Septiembre del 2025.


Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 11/09/2025, el empleador CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 identificado con NIT número 901965630 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9280627	11/09/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1121834340	GUILLERMOALBERTO OSORIO VARGAS	3300000	INGENIERO CIVIL	2025-08-29

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Septiembre del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

Medellín, 28 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000003 OBRA WACOYO		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1121834340	OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	29/08/2025		14613342	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/08/2025 13:47:56 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.96.13, 198.143.41.40, 172.16.42.57



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS** identificado/a con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número **1121834340**, se encuentra afiliado/a desde **01/01/2012** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de septiembre de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

NOTIFICACION RESULTADO NOVEDAD RELACION LABORAL

1 mensaje

Afiliaciones EPS Sanitas <afiliacionesepps@epssanitas.notify-it.com>
Para: inforecursosh826@gmail.com

1 de octubre de 2025, 19:52



Bogotá, 01 de Octubre de 2025

Señor(a):

CONSORCIO AGUAS GAITAN

901965630

Asunto: Solicitud Novedad Relación Laboral ID 7230773*Cordial saludo*

Nos permitimos informarle el resultado de la novedad de inicio de la relación laboral para el afiliado(a) **WENDY VANESA GARZON GARCIA** identificado(a) con CC 1121902403 :

Fecha de Radicación	29/09/2025
Nro. Solicitud	503304976
Salario (IBC)	\$ 2,300,000
Fecha de ingreso a laborar	17/09/2025
Estado Cargue Novedad	Novedad cargada con éxito

Cordialmente,

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas

Coordinador Gestión de la Afiliación al SGSSS

EPS Sanitas

Usted ha recibido este correo porque se encuentra registrado como miembro de alguno de nuestros clientes en notificado.com.
Para **darse de baja** del recibo de este tipo de correos, por favor haga clic [aquí](#).

Medellín, 28 de august de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

CERTIFICA:

Que WENDY VANESA GARZON GARCIA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1121902403 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 29/08/2025

Fecha fin cobertura:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 N901965630

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000003 - OBRA WACOYO

CLASE: 5 PORCENTAJE: 6.96% TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:

5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5429001

CLASE DE RIESGO: 5 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:


Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

- 1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.*
- 2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.*

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

28/08/2025 3.31 PM

Medellín, 16 de September de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000003 PUERTO GAITAN Y RESGUARDOS				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1121902403	GARZON GARCIA WENDY VANESA	17/09/2025		p1491821	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/09/2025 12:03:42 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.96.13, 198.143.41.40, 172.16.42.57

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739


Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GARZON GARCIA WENDY VANESA** identificado(a) con CC número **1.121.902.403** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de agosto de 2015 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de agosto de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/>



CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 17497322
NOMBRES Y APELLIDOS	Murcia Jojoa,Rosemberg
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/02/2020
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Murcia Jojoa,Rosemberg , a los 25 días del mes de septiembre del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

Medellín, 28 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000003 OBRA WACOYO				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C17497322	MURCIA JOJOA ROSEMBERG	29/08/2025		131J170A	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/08/2025 17:17:45 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.96.13, 198.143.41.40, 172.16.42.57



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.806-8

CERTIFICA QUE:

ROSEMBERG MURCIA JOJOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **17.497.322**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 3 de Septiembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	2025/09/08	2025/09/17	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000277	9491367542	Y				7	\$13,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLAEO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ae	tdp	ap	ag	cor	vac	in	tp	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Tarifa	
SUCURSAL COFREMA (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo OBRA PUERTO GAITAN (2 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																														
1	CC	1121902403																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	2025/09/08	2025/09/17	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000277	9491367542	Y				7	\$13,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	2	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500
TOTAL					2	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900751965	6	MURROZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLANO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor			
2025-08	2025-07	1777900302	9491787414	E	2025/09/15	2025/09/15	BAUCOLOMBIA	0	\$3,343,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes

SUCURSAL VILLANO (5 Afiliados)

Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)

1 CC 4032448 AREVALO CARLOS FRANCY CAPOQUINA

2 CC 4032425 GOMEZ LUIS LUIS ANIELA

3 CC 4032435 VACHADO TEJERO DIAZ YANIRA

4 CC 108239100 PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA

Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)

5 CC 9001353 MURROZ MURCIA EDWIN ALEJANDRO

6 CC 9019328 PEREZ PEREZ OBER AYES

Total Afiliados(6)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751965	6	MURROZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLANO	primavera urbana ofc 826	VILLAVICENCIO-META	6849992	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

NIT 900751966	6	AUNUZ AREVAL
---------------	---	--------------

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/HORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)

COLPENSIONES

PORVENIR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

ARL SURA

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

COFREIA

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SAHITAS

TOTAL

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF.	
CC 1121902403		GARZON GARCIA WENDY VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 B ESTE 19 22	VILLAVICENCIO-META	3142344798	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000280	9491818606	1	2025/09/02	2025/09/17	BANCO DE BOGOTA	14	\$27,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$15,200	\$200	\$0	\$15,400	\$15,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$11,900	\$200	\$0	\$12,100	\$12,100
TOTAL				1	\$27,100	\$400	\$0	\$27,500	\$27,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
CC 86040134		GUZMAN PASTRANA EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 C N.° 24 - 77	VILLAVICENCIO-META	3204992242	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2025-08	2025-08	49305921		I	2025/09/08	2025/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$618,800										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$48,800	\$0
1	CC 86040134	GUZMAN EDWIN	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS007	30	\$2,000,000	\$250,000		14-23	30	\$2,000,000	\$48,800	0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000				\$0	\$0		\$2,000,000	\$48,800	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 86040134			GUZMAN PASTRANA EDWIN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CALLE 4 C.N. 24 - 77		VILLAVICENCIO-META	3204992242	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor							
2025-08	2025-08	49305921	9490726365			2025/09/08	2025/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$618,800							
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$320,000		\$0		\$0		\$320,000	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		1		\$320,000		\$0		\$0		\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$48,800		\$0		\$0		\$48,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		1		\$48,800		\$0		\$0		\$48,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$250,000		\$0		\$0		\$250,000	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		1		\$250,000		\$0		\$0		\$250,000	
TOTAL								1		\$618,800		\$0		\$0		\$618,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900751966	6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S	B - MIENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVO	primavera urbana o/c 826	VILLAVICENCIO-META	68-9992	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
Pensión	Salud	2025-10	1818854244	Planilla	E	2025/10/16	2025/10/01	BAJOCOLUMBIA	\$3,332,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	de	top	con	est	un	lee
NOVEDADES									
PENSIÓN									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
TOTAL APORTES									
SUCURSAL VILLAVO (4 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)									
1	CC	10326478	AREVALO GARCIA	PRINCE CAROLINA	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
2	CC	10328285	GOMEZ TEAL LINA	MARCELA	15-14	30	\$9,256,100	\$9,256,100	\$9,256,100
3	CC	10328435	WACHADO TEREIRO	DINA VAHURA	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
4	CC	10329408	PEREZ MARTINEZ	GENESIS PAOLA	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
Centro de Trabajo: OBRA (2 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)									
5	CC	10013513	MUÑOZ AREVALO	ADRIANA	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
6	CC	10193788	PEREZ PEREZ OBER	ANNE	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
7	CC	10193788	PEREZ PEREZ OBER	ANNE	15-14	30	\$3,332,700	\$3,332,700	\$3,332,700
TOTAL									
							\$33,332,700	\$33,332,700	\$33,332,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COFREA	VILLAVICENCIO- META	3142334798	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salida	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	18253040931	9492846655	E	2025/10/08	2025/10/03	BAUCOLOMBIA	0	\$4.862,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										9497846565	182530493	2025-10	E	2025/10/08	2025/10/01	UNICOLLOMBIA											
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes			
No.	Identificación	Hombre	Insignificativa	Reducción de aportes	Aumento de aportes	Seguro médico	Seguro dental	Código Bías	IBC	Aporte	Código Bías	IBC	Aporte	Código Plus	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Zonero de SGU e CEF	Total Aportes		
SUBURSAL COBREM (CAMBIOS)																											
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																											
1	CC	84051533		X				23-010	3D	\$11,000,000	\$1,870,000	(F5003) 30	\$11,000,000	\$440,000	CCF34	3D	\$11,000,000	\$440,000	14-11	3D	\$11,000,000	0.3225	\$57,500	3D	\$0	\$1	\$2,807,500
Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (3 Afiliados)																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																											
2	CC	40326478						25-14	3D	\$1,493,500	\$221,600	(F5003) 30	\$1,493,500	\$57,000	CCF34	3D	\$1,493,500	\$57,000	14-11	3D	\$1,493,500	6.9600	\$79,100	3D	\$0	\$1	\$4,609,100
3	CC	17497322						23-010	3D	\$1,912,000	\$306,000	(F5003) 30	\$1,912,000	\$76,500	CCF34	3D	\$1,912,000	\$76,500	14-11	3D	\$1,912,000	6.9600	\$131,100	3D	\$0	\$1	\$592,100
4	CC	1171849440						25-14	3D	\$3,300,000	\$528,000	(F5037) 30	\$3,300,000	\$132,000	CCF34	3D	\$3,300,000	\$132,000	14-11	3D	\$3,300,000	6.9600	\$229,700	3D	\$0	\$1	\$1,002,700
Total Subursal Cobrem (Cambio)																											
										\$17,635,500	\$2,931,800		\$17,635,500	\$705,500		\$17,635,500	\$705,500		\$17,635,500			\$519,400		\$0	\$4,482,200		

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$2,931,800	\$0	\$0	\$2,931,800
COLPENSIONES	25-14	900,316,004	7	2	\$755,800	\$0	\$0	\$755,800
PORVENIR	230301	800,724,808	8	2	\$2,176,000	\$0	\$0	\$2,176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
HUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$573,500	\$0	\$0	\$573,500
TOTAL				4	\$4,862,200	\$0	\$0	\$4,862,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MEJORES DE 200 COTIZANTES	COFREVA	CL 15-40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
2025-09	25153872	9492295185	Y	2025/10/08	2025/10/02	0	\$152,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Des	Dep	Rep	Cod	Días	IEC	Aporte	Cod	Días	IEC	Aporte	Cod	Días	IEC	Aporte	Cod	Días	IEC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL COFREVA (2 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (2 Afiliados)																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																										
1	EC	1121902403									\$0				\$0				\$0				\$152,000	\$0	\$152,000	
Exonerado GARCIA																										
Exonerado VARELA																										
2	EC	86040134									\$0				\$0				\$0				\$0	\$0	\$0	
COZIANI																										
PASTRAVA EDWIN																										
Afiliados (2)																										
Total Afiliados (2)																										

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000	
TOTAL				2	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF			
NIT 90196530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2005	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREIA	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
Pensión 2025-09	182533-048	94928-62748	E	2025/10/08	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$332,600			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	Identificación	Nombre	Apellido	
SUCURSAL COFREIA (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																															
1	CC	11721902403	GARZON VIBRDI	X																											
Total Afiliados(1)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF			
NIT 90196530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2005	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREIA	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
Pensión 2025-09	182533-048	94928-62748	E	2025/10/08	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$332,600			

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000			
COFREIA	CCF34	892,000,146	3	1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000			
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000			
TOTAL				1	\$332,600	\$0	\$0	\$332,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF						
CC 1121902403		GARZON GARCIA WEIDY VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 B ESTE 19 22	VILLAVICENCIO-META	3142334798	No						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor							
Pensión	Salud	Planilla	2025/10/02	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	\$220,400							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		NOVEDADES										PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Arquitectura	Planificación	Contabilidad	Administración	Recursos Humanos	Seguridad	Legal	Financiera	Salud	Pensión	Exonerado SENIA e ICBF
SUJOSAS PRINCIPAL (4 AFIADOS)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 AFIADOS)														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 AFIADOS)														
1	CC 1121902403	GARZON WEIDY	X	X								2020	16	0.5722
Total Afiados(1)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF						
CC 1121902403		GARZON GARCIA WEIDY VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 B ESTE 19 22	VILLAVICENCIO-META	3142334798	No						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor							
Pensión	Salud	Planilla	2025/10/02	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	\$220,400							

RESUMEN DE PAGO														
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500						
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$121,500	\$0	\$0	\$121,500						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000						
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900						
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900						
TOTAL				1	\$220,400	\$0	\$0	\$220,400						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 86040134		GUZMAN PASTRANA EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 C.N. 24 - 77	VILLAVICENCIO-META	3204992242	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	29161081	I	2025/10/08	2025/10/09	BAICO DE OCCIDENTE	1	\$619,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$48,800	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$48,800	\$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)										\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$48,800	\$0
1	CC	86040134	GUZMAN EDWIN	25-14	30	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$2,000,000	\$250,000	14-23	30	\$2,000,000	\$48,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)										\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$250,000				\$2,000,000	\$48,800	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 8640134		GUZMAN PASTAÑA EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4 C N.° 24 - 77	VILLAVICENCIO-META	3204992242	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	20181081	9492155718			2025/10/08	2025/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$619,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$200	\$0	\$320,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$200	\$0	\$320,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$100	\$0	\$48,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,800	\$100	\$0	\$48,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$200	\$0	\$250,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$250,000	\$200	\$0	\$250,200
TOTAL				1	\$618,800	\$500	\$0	\$619,300

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: junio 2025

Villavicencio, 01 de octubre de 2025


CERTIFICACIÓN:

Yo, **DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO**, identificada con Cédula de ciudadanía. No. 40.395.435 de Villavicencio y TP 227117 -T, designada como Contadora del **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con **NIT. 901.965.630-1**, certifico que en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025, CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META" la entidad cumplió del 29 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, y en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicios Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, por lo tanto la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide el primer (01) día del mes de octubre del año 2025.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 DE VILLAVICENCIO
 R.L. CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025


DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
 C.C. 40.395.435 DE VILLAVICENCIO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 227117-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.395.435

MACHADO TEJEIRO

APELLIDOS

DIVA YANIRA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1972

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

24-SEP-1990-VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00126010-F-0040395435-20081108

00055-72-14 1

6720006039

Junta Central de Contadores
Ministerio del Comercio Exterior y Turismo

227117-T

DIVA YANIRA
MACHADO TEJEIRO
C.C. 40395435

RES. INSCRIPCION 297 DEL 31/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244564

PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
COMO CONTADOR DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025


Junta Central de Contadores

Junta Central de Contadores

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C.

FIRMA



En el municipio de Villavicencio, siendo las 09:00 a.m. del día 4 de agosto de 2025 se reunieron los integrantes del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** para adelantar la presente reunión extraordinaria de integrantes y desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Solicitud para que un consorciado aporte el personal presentado en el A.I.U. del contrato de obra N°0821 de 2025.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo:

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de los integrantes del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, así:

Nombre del integrante	Porcentaje de Participación
MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.	99,5%
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	0,5%

La firma **MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS** está representada por **LUIS FERNANDO MUÑOZ GARCIA**.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

Se designó como presidente a **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** y como secretaria a **FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON**, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

3. Solicitud para que un consorciado aporte el personal presentado en el A.I.U. del contrato de obra N°0821 de 2025.

El integrante **MUÑOZ AREVALO INGENIERÍA S.A.S.** identificado con NIT. 900.751.966 – 6 a través de su representante legal **LUIS FERNANDO MUÑOZ GARCIA**, manifiesta su intención de poner a disposición el personal relacionado a continuación: Conductor, contador, almacenista, secretaria y asistente contable, durante las actividades previas al inicio, ejecución, recibo y liquidación del contrato de obra N°0821 de 2025, el cual, se encuentra vinculado con la empresa mediante contratos a término indefinido y tendrían dedicación del 100% a las actividades requeridas en el contrato de Obra, por lo tanto, las planillas integradas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social del personal serían presentadas bajo el nombre del consorciado **MUÑOZ AREVALO INGENIERÍA S.A.S.**

Así las cosas, y analizada la solicitud se pone a consideración de los integrantes del consorcio la propuesta de que el siguiente personal: Conductor, contador, almacenista, secretaria y asistente contable; sea dispuesto por el consorciado **MUÑOZ AREVALO INGENIERÍA S.A.S.**, obteniendo la siguiente votación:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

**ACTA No. 1
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE INTEGRANTES DEL
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**

Nombre del integrante	Porcentaje de Participación	Aceptan	No Aceptan
MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S. R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533	99,5%	SI	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL C.C. 79.846.131	0,5%	SI	

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los miembros integrantes del consorcio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión y en consecuencia se autoriza al representante a realizar los trámites necesarios.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 4 días del mes de agosto de 2025.

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533
R/L MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL
C.C. 79.846.131



LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C. 86.051.533
R/L CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON
C.C. 40.326.478
R/L SUPLENTE CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	ACTA No. 1 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
--	---

ASISTENCIA A REUNIÓN

Fecha: 4 de agosto de 2025

Nombre del integrante	Porcentaje de Participación	Nombre Asistente	Firma
MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S. R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA C.C. 86.051.533	99,5%	LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	
EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL C.C. 79.846.131	0,5%	EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL	




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 5. ACTA DE SOCIALIZACIÓN COPIA

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE ACTA DE REUNION			 Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
Código: INF-FR-94	Versión: 02		Vigencia: 10-01-2025	

Fecha:	29 de agosto de 2025	Lugar:	Resguardo Wacoyo – Polideportivo sector 1	
Municipio:	Puerto Gaitán	Hora de Inicio:	10:45 a.m.	
Departamento:	Meta	Hora de Terminación:	12:30 p.m.	

ASISTENTES				
Se anexa listado de asistencia				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Socializar ante la comunidad beneficiaria el alcance del Contrato de Obra No. 821 de 2025 suscrito entre el Municipio de Puerto Gaitán y el CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.				
TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DÍA)				
- Presentación de funcionarios entidad contratante, autoridades indígenas presentes y personal de obra e interventoría. - Socialización del proyecto. - Inquietudes y preguntas. -				
TEMAS TRATADOS (DESARROLLO ORDEN DEL DÍA)				
Siendo las 10:45 a.m. se da inicio al acto de socialización del contrato 821 de 2025, se presentan los funcionarios de la alcaldía presentes entre los que se encuentran la Señora alcaldesa (e) del municipio, el secretario de infraestructura en su calidad de supervisor y demás acompañantes; igualmente se presentan los Gobernadores de los 4 resguardos indígenas beneficiarios del proyecto (WACOYO – DOMOPLANAS – AWALIBA – ASEINPOME) los cuales asistieron con sus				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE ACTA DE REUNION			 Puerto Gaitán A.C. INDÍGENAS
	Infraestructura Pública			
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	Vigencia: 10-01-2025	

respectivos acompañantes, acto seguido se presentan los representantes del contratista de obra (CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025) y de la interventoría (CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025). Una vez realizado el saludo a la comunidad asistente al acto, se inicia la presentación del proyecto por parte del contratista de obra, indicando las generalidades del contrato como son objeto, valor, plazo, fecha de inicio, localización y de más información. Se realiza la entrega de un folleto a cada uno de los asistentes el cual contiene la información del proyecto (se adjunta y hace parte de la presente acta). Se informa el alcance del contrato realizando una descripción de cada uno de los capítulos que contiene el proyecto, así como de las comunidades beneficiarias de cada resguardo. Por ultimo y terminando con el orden del día, se otorga la palabra a la comunidad interesada en realizar preguntas o inquietudes sobre el proyecto, interviniendo cada uno de los gobernadores de los resguardos, así como líderes de las comunidades beneficiarias; cada pregunta fue resuelta por parte de la administración y por contratista e interventoría de acuerdo a su competencia. Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la socialización.									
DECISIONES TOMADAS									
Se da inicio a la ejecución del contrato de obra No. 821 de 2025, suscribiéndose el acta de inicio correspondiente con fecha 29 de agosto de 2025.									
COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Compromiso</th> <th>Fecha de cumplimiento</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable						
Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable							

 ALCALDÍA DE PUERTO QUIÉBAN	FORMATO DE ACTA DE REUNION		 Puerto Quiéban
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: Lucy Gaitany
NOMBRE: Lucy Gaitany
CARGO: MAKAPAY

FIRMA: Emperlina Jean
NOMBRE: Emperlina Jean
CARGO: MAKAPAY

FIRMA: [Firma]
NOMBRE: Enis Eduardo
CARGO: Lider

FIRMA: Ana Ruth
NOMBRE: Ana Ruth
CARGO: Lider

FIRMA: Carmen
NOMBRE: Carmen
CARGO:

FIRMA: Rafael
NOMBRE: Rafael Centem
CARGO: Lider

FIRMA: [Firma]
NOMBRE: Alfredo Rodriguez
CARGO: Capitan

FIRMA: [Firma]
NOMBRE: Monica Diaz
CARGO: Oficials Unidos

FIRMA: Seila ameyá
NOMBRE: Seila ameyá
CARGO: amade ceta


FIRMA: Diana Estrada
NOMBRE: Diana Estrada
CARGO: walabo

FIRMA: Diana Borgia
NOMBRE: Diana Judith Goveia
CARGO: walabo 1

FIRMA: Waldemar
NOMBRE: Robinson
CARGO:

FIRMA: Carmelo
NOMBRE: Gerardo
CARGO: miralindo

FIRMA: Waldemar
NOMBRE: Waldemar
CARGO: capitan Fido



FORMATO DE ACTA DE REUNION

Infraestructura Pública

Código: INF-FR-94

Versión: 02

Vigencia: 10-01-2025



Puerto Ortíz
Mérida

FIRMA: Thonkops
NOMBRE: Thonkops Yebes
CARGO: Gerente

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Heinbel Contreras Toral
CARGO: Arquitecto

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Ramiro Mena
CARGO: Carretero

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Donato Mena
CARGO: Vigilante

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Capitan Mirolimbo
CARGO: Capitan

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Aylinio Coitán
CARGO: Capitan

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Capitan Coitán
CARGO: Capitan

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Amal Chipiye
CARGO: ASEINPOME

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: José Gabriel Coitán Ronuma
CARGO: Secretario General del Resguardo Wacoyo


FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Marcos Aguilar Yebes
CARGO: capitan

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Jesús Yebes G.
CARGO: Lider Wacoyo

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Manuel Rodríguez
CARGO: Wacoyai

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: José Vicente Delgado
CARGO: capitan

FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Sandra Pérez
CARGO: ASEINPOME



FORMATO DE ACTA DE REUNION

Infraestructura Pública

Código: INF-FR-94

Versión: 02

Vigencia: 10-01-2025



Puerto Rico

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Diego Keko

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Marta Idalis Rincon R.
Artesana

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Fabian chipige baitan.
Coordinador de Guardia.

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Pedro Rodriguez
Pedro Rodriguez
Conductor

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Sara Gabriela L.G.
Cocinera

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Glady Vilchez chioje

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Capitan Awaliba
Camtrai

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Roberto Quintana
Capitan

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Leobardo Estrada
Capitan Sta Lucia
Awaliba

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Antonio Berriz
Capitan

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Wilsa Nicolson
Capitan

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Franco Chipise
Capitan makapai

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


Walter Ponce
Lider Macapay

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Leonel Estrada
Capitan.



FORMATO DE ACTA DE REUNION

Infraestructura Pública

Vigencia: 10-01-2025

Código: INF-FR-94

Versión: 02



Puerto Gallán
Méta

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Libardo Escobedo
Capitán S.N.B.G.

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Walter A. P. A.
Participante - Progreso

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Alexander Castañeda
Capitán Matagüilla

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Quinto Alvarado
Presidente Comite
Dinámico de la I.B.F.

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Santiago Mendez
Santiago
Capitán Materiba

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Sando Erremanio
Sando Erremanio
Materiba

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Margarita Macabrey
Margarita Macabrey
lider - comunidad - Algarrobo

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Alfredo R. Contreras G.
Comunero C. Algarrobo

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Harmon Gilson Huay
Comunero

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Juan Sosa
Capitán Político

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Gilberto Yeper
Capitán Camidun

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Luz Stella Galindo Cuniche
Luz Stella Galindo Cuniche
Capitana

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:


Olga Galindo
Olga Galindo
Capitana

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

Walter Chiripaje
Walter Chiripaje
Comunero

	FORMATO DE ACTA DE REUNION		
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: Felix Chaparral
 NOMBRE: Felix Chaparral
 CARGO: Alguacil

FIRMA: Diego Armando Chipirre R.
 NOMBRE: Diego Armando Chipirre R.
 CARGO: Asesor

FIRMA: Edwin Velasco
 NOMBRE: Edwin Velasco
 CARGO: Capitán Kaliumayo

FIRMA: Daniel Castañeda
 NOMBRE: Daniel Castañeda
 CARGO: Lider. Majagüilla

FIRMA: Felix Yepes
 NOMBRE: Felix Yepes
 CARGO: Capitán Monichal

FIRMA: Felix Yepes Gaitan
 NOMBRE: Felix Yepes Gaitan
 CARGO: Capitán

FIRMA: Campesino
 NOMBRE: Campesino
 CARGO: Alguacil

FIRMA: Betha
 NOMBRE: Betha
 CARGO: Asistente

FIRMA: Luana Eneda Garcia B.
 NOMBRE: Luana Eneda Garcia B.
 CARGO: Asistente


FIRMA: Marta P. Cantelero U.
 NOMBRE: Marta P. Cantelero U.
 CARGO: Directora de Tránsito

FIRMA: Edgar Ceballos
 NOMBRE: Edgar Ceballos
 CARGO: Profesor Universitario C-3

FIRMA: Jorge A. Díaz S.
 NOMBRE: Jorge A. Díaz S.
 CARGO: Director Interventoría

FIRMA: Hernando Yepes B.
 NOMBRE: Hernando Yepes B.
 CARGO: Asesor

FIRMA: Edgar Ceballos
 NOMBRE: Edgar Ceballos
 CARGO: Profesor Universitario C-3

	FORMATO DE ACTA DE REUNION		
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Diego Gaitán
 CARGO: Lider

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Manuel Díaz
 CARGO: capitán

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: José Gregorio Sanabria
 CARGO: capitán Mangal

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Maichy Yexenia Guevara
 CARGO: Delegada por el capitán Brisas

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Manuela Gonsu A.
 CARGO: Pienso - Alcaldía.

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Hanlly Lorena Vergara
 CARGO: Profesional de apoyo

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: Jesus Peña
 CARGO: Profesional de Apoyo


FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

	FORMATO DE ACTA DE REUNION		
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: Baudilio David Landeros
 NOMBRE: Baudilio David Landeros
 CARGO: Tesorero deportivo

FIRMA: Florencio Yanes
 NOMBRE: Florencio Yanes
 CARGO: Capitán

FIRMA: Sosilda Roldán
 NOMBRE: Sosilda Roldán
 CARGO: Capitán

FIRMA: Quil Torres
 NOMBRE: Quil Torres
 CARGO: Coordinadora mujeres

FIRMA: Alexia Yanes
 NOMBRE: Alexia Yanes
 CARGO: Capitana

FIRMA: Albeldina Goitán
 NOMBRE: Albeldina Goitán
 CARGO: Capitana

FIRMA: Anatilde Yanes
 NOMBRE: Anatilde Yanes
 CARGO: Capitana

FIRMA: Baudilio David Landeros
 NOMBRE: Baudilio David Landeros
 CARGO: Tesorero deportivo

FIRMA: Florencio Yanes
 NOMBRE: Florencio Yanes
 CARGO: Capitán


FIRMA: Sosilda Roldán
 NOMBRE: Sosilda Roldán
 CARGO: Capitana


FIRMA: Quil Torres
 NOMBRE: Quil Torres
 CARGO: Coordinadora mujeres

FIRMA: Alexia Yanes
 NOMBRE: Alexia Yanes
 CARGO: Capitana

FIRMA: Albeldina Goitán
 NOMBRE: Albeldina Goitán
 CARGO: Capitana

FIRMA: Anatilde Yanes
 NOMBRE: Anatilde Yanes
 CARGO: Capitana

	FORMATO DE ACTA DE REUNION		
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: 
 NOMBRE: Luis Alejandro Soto
 CARGO: Polomeco. wucoyo

FIRMA: Wilson González
 NOMBRE: Wilson
 CARGO: Aguasil: polomeco wucoyo

FIRMA: Ramon Amayo
 NOMBRE: Ramon Amaya Herrera-
 CARGO: Wocoyo I.

FIRMA: 
 NOMBRE: Cristina Escobar
 CARGO: Aguasil miralindo wucoyo

FIRMA: Edilberto
 NOMBRE: Edilberto Sosa
 CARGO: Aguasil miralindo wucoyo

FIRMA: Mana Orlin Walabo
 NOMBRE: Maria Orlin Puntiero
 CARGO: madre tambo

FIRMA: 
 NOMBRE: Thelma
 CARGO: madre Walabo 1

FIRMA: Carmen Cabareo
 NOMBRE: Carmen Cabareo
 CARGO: Walabo uno.

FIRMA: Rafael yepo
 NOMBRE: Rafael yepo
 CARGO: medico Ancestral.


FIRMA: Insula y.o
 NOMBRE: Insula y.o
 CARGO: ama de casa

FIRMA: Blanca yepes
 NOMBRE: Blanca Astid yepes
 CARGO: Ama de casa

FIRMA: 
 NOMBRE: Jorge Plan
 CARGO: padre escolar y fab mero

FIRMA: 
 NOMBRE: Jairo Lopez
 CARGO: Docante

FIRMA: Fabio yepes
 NOMBRE: Fabio yepes
 CARGO: padre yepes

 ALCALDÍA DE PUERTO GALLÁN, META	FORMATO DE ACTA DE REUNION		 Puerto Gallán Méta
	Infraestructura Pública		
	Código: INF-FR-94	Versión: 02	

FIRMA: 
NOMBRE: David Aldemar Lopez
CARGO: concejal

FIRMA: 
NOMBRE: Paulo Lisandro Chiripio
CARGO: Resguardo Ascinpame - gobernador

FIRMA: 
NOMBRE: Guido Sanchez Diaz
CARGO: Gobernador - como Plenos

FIRMA: 
NOMBRE: Ricardo Pardo Garcia
CARGO: Cabildo gobernador Awaiba

FIRMA: 
NOMBRE: Edilberto Apurumay G.
CARGO: Cabildo gobernador - cebsayo


FIRMA: 
NOMBRE: Alexander Polomino
CARGO: Profesional EPS - Dir. Asuntos Est Nicos R-12


FIRMA: 
NOMBRE: Denny Jossar Borda
CARGO: Alcalde DE]

Decreto 0222 de 19 Agosto 2025.

FIRMA: 
NOMBRE: Alexander Jaramillo
CARGO: Director General

FIRMA: 
NOMBRE: Johan Perdomo
CARGO: Secretario De Infraestructura

FIRMA: 
NOMBRE: Guillermo Alberto Osorio
CARGO: INE RESIDENTE C.A.G

FIRMA: 
NOMBRE: Luis Fernando Munoz
CARGO: Reg. Legal Comercio

FIRMA: 
NOMBRE: William Morales
CARGO: Concejal Aguas Gallán 2015

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

FIRMA: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO WACOYO

COMUNIDAD KALIWIRNAE

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD KALIWIRNAE

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvcp



COMUNIDAD ESMERALDA WALABO

Ítem 6,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.



Localización y replanteo

COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO

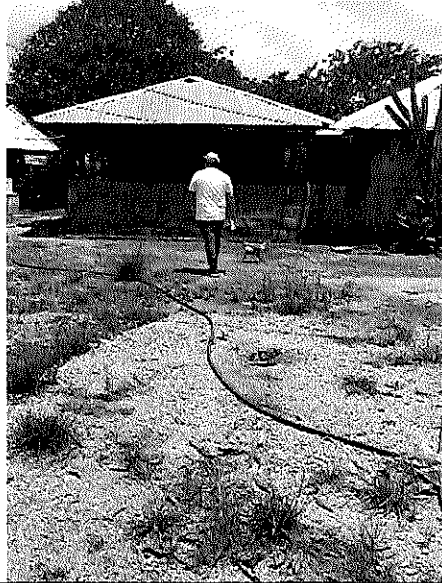


Suministro tubería pvcp



COMUNIDAD LA UNIÓN

Ítem 1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD LA UNIÓN

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD PUNTO GRILLO

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvcp



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 – 1

COMUNIDAD ALGARROBO

Ítem 1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD LA CAIMANA

Ítem 1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS.



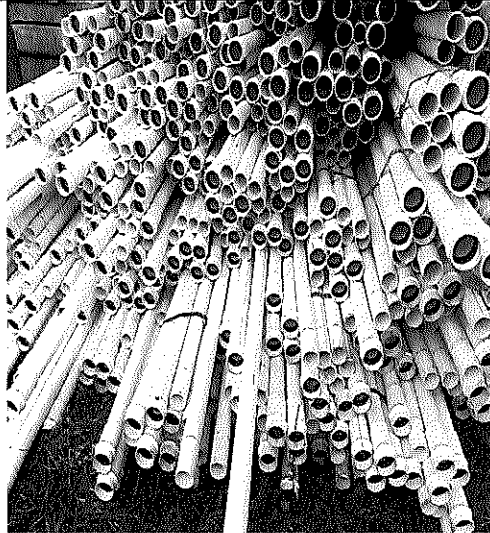
Localización y replanteo



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 - 1

COMUNIDAD LA CAIMANA

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc p

RESGUARDO AWALIBA

COMUNIDAD MAKAPAY

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD PUERTO LOPEZ

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



COMUNIDAD PUNTO GRILLO

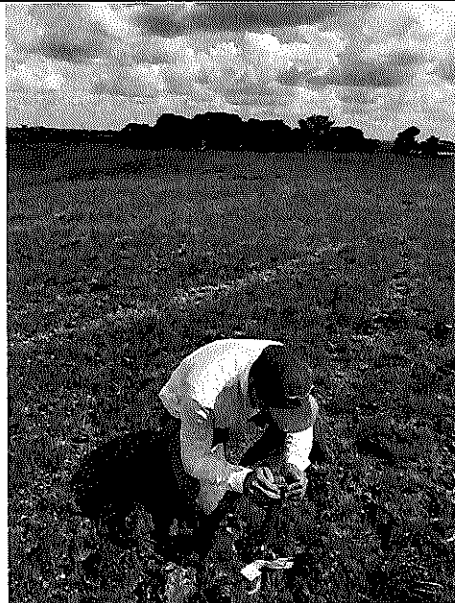
Ítem 1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA POZOS PROFUNDOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD SAN GIL

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



COMUNIDAD FACUNAE

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

RESGUARDO DOMOPLANAS

COMUNIDAD LOS OLIVOS

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.

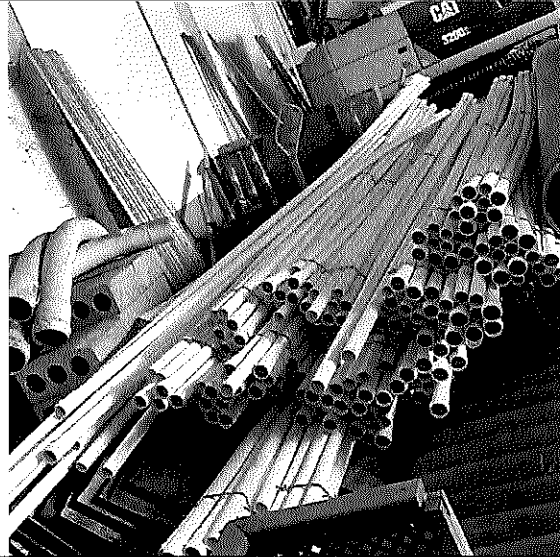


Localización y replanteo



COMUNIDAD LOS OLIVOS

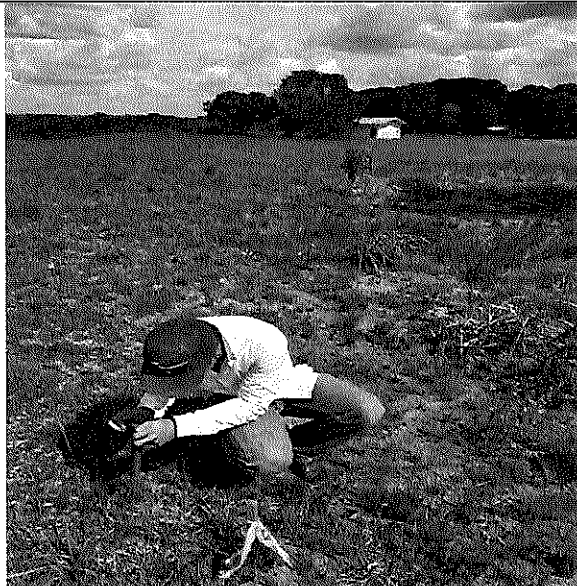
Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc-p

COMUNIDAD PARAISO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.

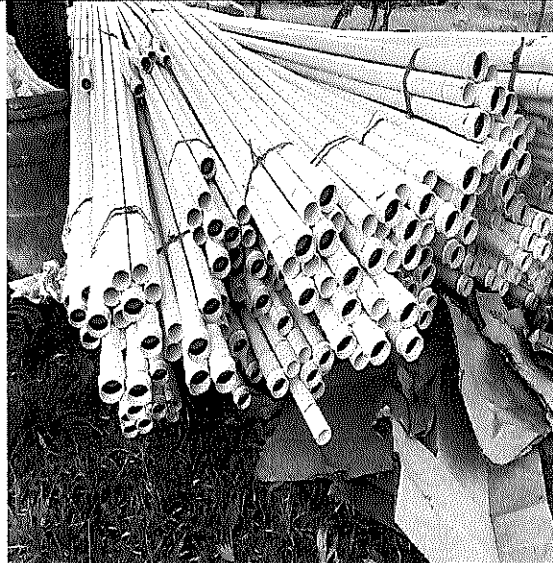


Localización y replanteo



COMUNIDAD PARAISO

Ítem 4,17 SUMINISTRO TUBERÍA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO



Suministro tubería pvc p

COMUNIDAD BUENAVISTA

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



COMUNIDAD VILLAMARCIA

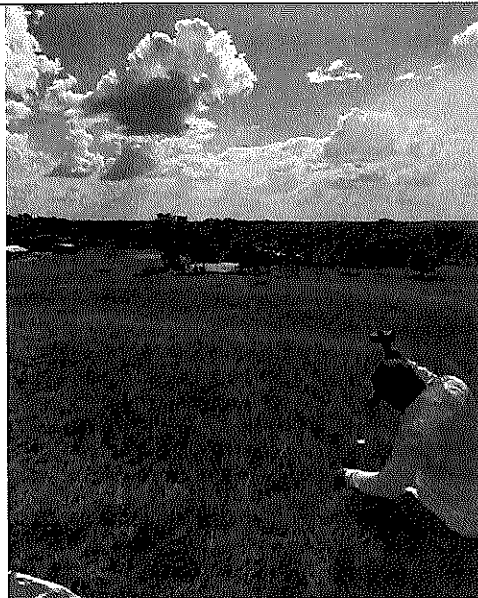
Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD CUMARALITO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



COMUNIDAD YATARROBO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD CERRITO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

RESGUARDO ASEINPOME

COMUNIDAD KEKO

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo

COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ

Ítem 4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.



Localización y replanteo



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 7. COPIA DE LA BITACORA.

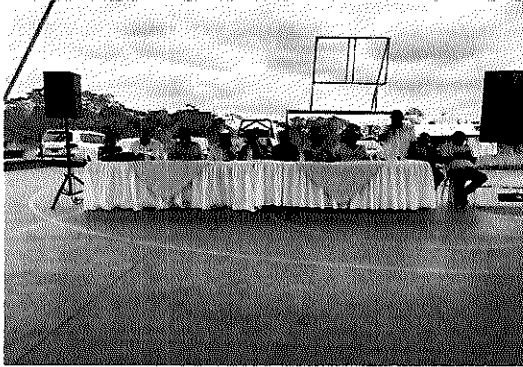
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán "Vivir es un deber"
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Viernes 29 de agosto 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	1	DIAS PENDIENTES		455			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800				Cascos		
RESIDENTE	1	GPS RTK HI-TARGET V60				Gafas		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		
OFICIAL						Guantes		
OPERARIO						Botas		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
Se realizo la socialización del proyecto a los 4 resguardos en compañía de la alcaldesa (E) y el secretario de infraestructura del municipio					
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA									
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA							
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Sábado 30 de agosto 2025	HORAS DE LLUVIA:						
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	2	DÍAS PENDIENTES				
		454						
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
			C	NC				
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD KALIWIRNAE						
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD KALIWIRNAE						
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD KALIWIRNAE						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD			SEGUIMIENTO				
				C	NC	FECHA		
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				SI		NO		
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán								
	Infraestructura											
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA		NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA										
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 31 de agosto 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	3	DÍAS PENDIENTES
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	2	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	2	
PROFESIONAL SST	1	PORTATIL	1	
OFICIAL		CAMIONETA HILUX	1	
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Cultura y Desarrollo
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Lunes 01 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	4	DÍAS PENDIENTES
452				
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO Y PALOGRANDE WALABO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO Y PALOGRANDE WALABO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD ESMERALDA WALABO Y PALOGRANDE WALABO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Territorio Vital						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Martes 02 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	5	DÍAS PENDIENTES
		451		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD LA UNION Y LA CAIMANA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD LA UNION Y LA CAIMANA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD LA UNION Y LA CAIMANA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO CAÑÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		 Puerto Cañán						
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-12	Version:04		Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
ESQUEMA DE OBRA									
									
OBSERVACIONES:									
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>				C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA							
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE							
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara									

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán PUERTO METANO
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	



SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Miercoles 03 de septiembre 2025			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	6	DÍAS PENDIENTES		450			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								




DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD PUNTO GRILLO			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.




REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Jueves 04 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	7	DÍAS PENDIENTES
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD ALGARROBO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD ALGARROBO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD ALGARROBO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Viernes 05 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	8	DIAS PENDIENTES
		448		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD MATAPALITO Y LA PORFIA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD MATAPALITO Y LA PORFIA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD MATAPALITO Y LA PORFIA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO DE META						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Sabado 06 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	9	DÍAS PENDIENTES
		447		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD MAKAPAY		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD MAKAPAY		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD MAKAPAY		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán <i>Construyendo el futuro</i>						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										


 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Domingo 07 de septiembre 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	10	DÍAS PENDIENTES		446			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		
OFICIAL						Guantes		
OPERARIO						Botas		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND				
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML				
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2				
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán PUERTO METANO
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	


SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Lunes 08 de septiembre 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	11	DÍAS PENDIENTES	445				

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES
			SI	NO	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Naturaleza Activa
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRÉS DÍAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Martes 09 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	12	DÍAS PENDIENTES
		444		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación Mantenimiento
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Elemento SI NO			
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

**FORMATO LIBRO DE BITÁCORA****Infraestructura****Codigo: INF-FR-12****Version: 04****Vigencia: 10-01-2025****Puerto Gaitán**
META**SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA****ESQUEMA DE OBRA****OBSERVACIONES:****C: Conforme****FIRMA****NC: No Conforme****RESIDENTE 1 OBRA**
ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO**RESIDENTE 1 INTERVENTORIA**
ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE**NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara**

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Miercoles 10 de septiembre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	13	DÍAS PENDIENTES
		443		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								


DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD PUERTO LÓPEZ Y PUNTO GRILLO			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD PUERTO LÓPEZ Y PUNTO GRILLO			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD PUERTO LÓPEZ Y PUNTO GRILLO			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, MEYU	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		 FIRMA
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 11 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	14	DÍAS PENDIENTES
		442		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD FACUNAE		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD FACUNAE		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD FACUNAE		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
			SI	NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
			SI	NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Cesar, Colombia
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Zona Urbana
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 12 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	15	DÍAS PENDIENTES
				441
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD SAN GIL		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD SAN GIL		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD SAN GIL		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme	 FIRMA		 FIRMA	
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán META
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:	Sabado 13 de septiembre 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	16	DÍAS PENDIENTES		440			



PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guanles		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD KEKO ASEINPOME			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD KEKO ASEINPOME			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD KEKO ASEINPOME			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, MEYA	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Mérida								
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">C: Conforme</td> <td style="width:20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width:40%;"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 14 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	17	DÍAS PENDIENTES
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán META
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE Y INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán METLA ALMANE
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA				
FECHA:		Lunes 15 de septiembre 2025			HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS		18	DIAS PENDIENTES			438	

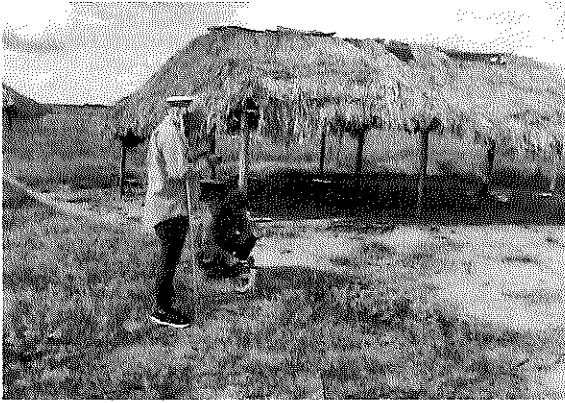



PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD			SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS			SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					


REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta - Colombia						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Martes 16 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	19	DÍAS PENDIENTES
				437
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento SI NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos X
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas X
OFICIAL				Guantes X
OPERARIO				Botas X
AYUDANTE				Alcohol X
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD OLIVOS		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD OLIVOS		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD OLIVOS		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA									
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025	
OBJETO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META	
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO	
FECHA:	Miercoles 17 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	20	DÍAS PENDIENTES
				436
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD PARAISO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD PARAISO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD PARAISO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES	NO
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán "El corazón del Meta"
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán MUNICIPIO DE META
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

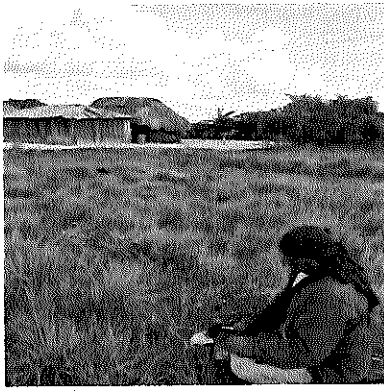



SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Jueves 18 de septiembre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	21	DÍAS PENDIENTES
				435

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD BUENAVISTA			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD BUENAVISTA			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD BUENAVISTA			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
			SI	NO	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
			SI	NO	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.


REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Capital del Meta								
	Infraestructura											
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td></td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td></td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA									
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												


 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Páez de Muzumbe
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Viernes 19 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	22	DÍAS PENDIENTES
				434
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación
				Mantenimiento
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
				Elemento
				SI
				NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	Cascos
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	Gafas
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	Tapabocas
OFICIAL				Guantes
OPERARIO				Botas
AYUDANTE				Alcohol
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD VILLAMARCIA		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI
				NO
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI
				NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Meta
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

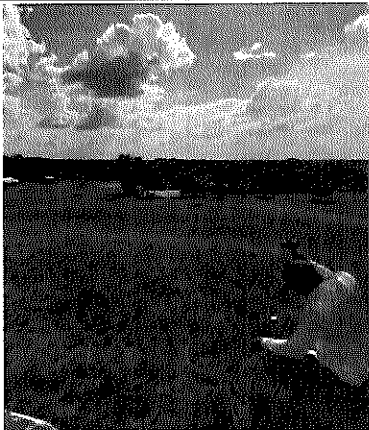

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Sabado 20 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	23	DÍAS PENDIENTES
				433
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD LAS BRISAS		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD LAS BRISAS		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD LAS BRISAS		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
			SI	NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS
				SI
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES
				SI
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
				FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Nuestro Hogar es el Mundo
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio del Meta
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 21 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	24	DÍAS PENDIENTES
				432
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI	NO		
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán "GRANDE Y FELIZ"
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				




 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Lunes 22 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	25	DÍAS PENDIENTES
		431		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD CUMARALITO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD CUMARALITO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD CUMARALITO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Martes 23 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	26	DÍAS PENDIENTES
		430		
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD YATARROBO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD YATARROBO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD YATARROBO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, MÉXICO	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán								
	Infraestructura											
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025									
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA												
ESQUEMA DE OBRA												
												
OBSERVACIONES:												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">C: Conforme</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">  FIRMA </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td style="text-align: center;"> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> <td></td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA		NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA										
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE										
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara												

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Miercoles 24 de septiembre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	27	DÍAS PENDIENTES
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
				Operación Mantenimiento
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1	
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1	
OFICIAL				
OPERARIO				
AYUDANTE				
TOPOGRAFO	1			
INSPECTOR SISO				
CELADOR				
CONDUCTOR	1			
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA				
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON				
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD CERRITO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD CERRITO		
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD CERRITO		
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI NO
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI NO
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.				
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO	
			C	NC
			FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Nuestro Pueblo						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Naturaleza y Desarrollo
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	


SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Jueves 25 de septiembre 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	28	DÍAS PENDIENTES		428			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD PUERTO GAVILAN			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán META
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 OBRA ING.GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Futuro Presente
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	


SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025					CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025				
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META				
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO				
FECHA:	Viernes 26 de septiembre 2025				HORAS DE LLUVIA:				
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	29	DÍAS PENDIENTES		427			

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes		X
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND	COMUNIDAD CACHAMITAS Y LAS DELICIAS			
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML	COMUNIDAD CACHAMITAS Y LAS DELICIAS			
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2	COMUNIDAD CACHAMITAS Y LAS DELICIAS			
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA				 Puerto Gaitán Pueblo Indígena			
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025					
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META			OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META					
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE			RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO					
FECHA:	Sabado 27 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	30	DÍAS PENDIENTES	426			
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes	X	
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD					
			C	NC				
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"	ML							
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES					
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO		
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD		SEGUIMIENTO					
			C	NC	FECHA			
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?			SI	NO				
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA ESQUEMA DE OBRA				
				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA		
NC: No Conforme		RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
		 FIRMA		
		RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		
NOTA: La presente bitácora debe venir impresa a doble cara				


 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio Metense
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA		
FECHA:	Domingo 28 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:	
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	31	DÍAS PENDIENTES
				425

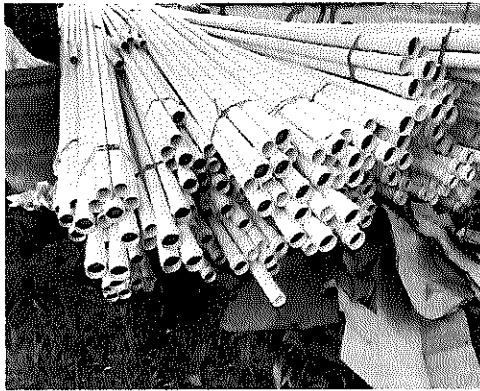



PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos		
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		
OFICIAL						Guantes		
OPERARIO						Botas		
AYUDANTE						Alcohol		
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
LOCALIZACION Y REPLANTEO POZO PROFUNDO	UND				
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES	ML				
LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO	M2				
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		
Nota: Adjuntar los soporte de la Investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.					

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Municipio
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
ESQUEMA DE OBRA				
OBSERVACIONES:				
C: Conforme		 FIRMA	 FIRMA	
NC: No Conforme		RESIDENTE 2 OBRA ING.VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE	
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro				
	Infraestructura							
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025					
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025						
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META						
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 2: VANESA GARZON GARCIA						
FECHA:	Lunes 29 de septiembre 2025		HORAS DE LLUVIA:					
PLAZO ACTUAL	456	DIAS TRANSCURRIDOS	32	DIAS PENDIENTES				
424								
PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes	X	
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								
DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON								
ACTIVIDAD REALIZADA		UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CONFORMIDAD			
					C	NC		
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"		ML						
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA		SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD		SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		SI	NO	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		SI	NO	
Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.								
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA								
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO						
		C	NC	FECHA				
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO					
OBSERVACIONES:								

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 2 OBRA ING. VANESA GARZON GARCIA	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán Punto de Encuentro
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-12	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025	

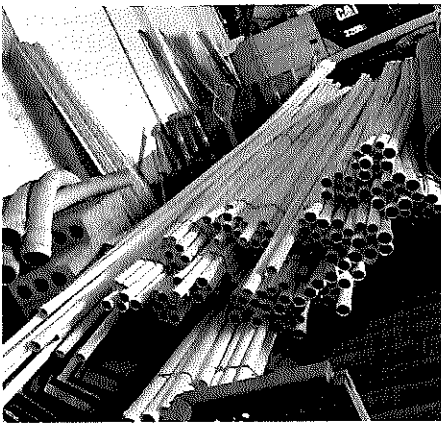



SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1004 DE 2025		CONTRATO DE OBRA No. 821 DE 2025		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		OBJETO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META		
RESIDENTE 1: JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE		RESIDENTE 1: GUILLERMO ALBERTO OSORIO		
FECHA:	Martes 30 de septiembre 2025	HORAS DE LLUVIA:		
PLAZO ACTUAL	456	DÍAS TRANSCURRIDOS	33	DÍAS PENDIENTES
				423

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	GPS RTK STONEX S800	1			Cascos	X	
RESIDENTE	2	GPS RTK HI-TARGET V60	1			Gafas		X
PROFESIONAL SST	1	CAMIONETA HILUX	1			Tapabocas		X
OFICIAL						Guantes	X	
OPERARIO						Botas	X	
AYUDANTE						Alcohol		X
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO								
CELADOR								
CONDUCTOR	1							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON					
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD		
			C	NC	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"	ML				
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS		
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES		

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA				
NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	NO	
OBSERVACIONES:				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			 Puerto Gaitán						
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025							
SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA										
ESQUEMA DE OBRA										
										
OBSERVACIONES:										
<table border="1"> <tr> <td>C: Conforme</td> <td>  FIRMA </td> <td>  FIRMA </td> </tr> <tr> <td>NC: No Conforme</td> <td> RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO </td> <td> RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE </td> </tr> </table>					C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA	NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
C: Conforme	 FIRMA	 FIRMA								
NC: No Conforme	RESIDENTE 1 OBRA ING. GUILLERMO ALBERTO OSORIO	RESIDENTE 1 INTERVENTORIA ING. JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE								
NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara										



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 8. NOMINAS DEL PERSONAL.

Nomina del día 16 al 31 de Agosto de 2.025

2025

DEBERGALES										DEVEDORES										OBSERVACIONES	
Número de Empleado	No. de Empleado	Cargo	Periodo	Saldo a favor	Deuda a favor	Técnicos	Ano de Empleado	Unidad de Empleado	Importancia (IPASAL)	Precio de Empleado	Saldo	Periodo	Primer	Apogeo de Empleado	Técnicos de Empleado	Saldo de Empleado	OBSERVACIONES				
APEVALO GARZON FRANCY CAROLINA (1)	40,336,478	DIRECTOR DE OBRA	6	\$ 1,423,500	2	\$ 84,800	\$ 13,333	\$ -	\$ -	\$ 100,233	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 100,633	Se envía despendible de nómina al correo: CAROLINAE_INGENIERO@hotmail.com				
MURCIA JOJOA ROSEMBERG (1)	17,437,322	CONDUCTOR	5	\$ 1,912,000	2	\$ 127,467	\$ 13,333	\$ -	\$ -	\$ 140,800	\$ 5,100	\$ 5,100	\$ -	\$ -	\$ 10,200	\$ 130,600	Se envía despendible de nómina al correo: asessoriasym@gmail.com				
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (1)	1,121,834,340	INDUSTRIAL	5	\$ 3,300,000	2	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ 8,800	\$ 8,800	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ 202,400	Se envía despendible de nómina al correo: es-kr87@hotmail.com				
					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTALES						\$ 142,367	\$ 26,657	\$ -	\$ -	\$ 489,033	\$ 17,760	\$ 17,760	\$ -	\$ -	\$ 35,400	\$ 433,633					

State of Tennessee	\$ 1,472,500
Total	\$ 202,000

Year	1991	1992	1993
1	1	0.27%	
2	2	1.08%	
3	3	2.44%	
4	4	4.33%	
5	5	6.79%	

FECHA ENVÍO DE OBJETOS DE NORMA	5202/6/11
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NORMA	5202/6/11

[illegible]


TOUS PAYS/USCAGES		1 312,137
Total enregistré		
Des de la zone 1		37
		2,31

[illegible][illegible]

DIVA YATIRA MACHADO TEJEIRO
1ªª CONTADORIA

NEW CONCEPTS

NEW CONCEPTS




NTT, 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 15 de Septiembre de 2.025

DINA YAMIRA MAGNADO TEJEIRO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 16 al 30 de Septiembre de 2.025

Salario Mínimo (Legal Vigente 2021)	S	1.423,500
Avalio de transporte	S	200,000

RIESGO AL	
Tipo	Tanda
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,96%

FECHA ENVÍO DESPRENDIBLES DE NOMINIA	01/10/2025
FECHA DE CONSIDERACIÓN DE LA NOMINA	30/9/2025


IMPORTANTE!	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Pensafiscales y Salud Ley 1607 de 20127	
marque con una "X" si es así.	
SI	X

30	30
733	733

[illegible]

1075040 L'ESPERA REINTEGRADA SALVADOR LANTONIO MARTINEZ LOMONOSOV RESIDENTE ES 04412	010014	VAKESKONE 1075040
---	--------	----------------------


DEVA YANIRA MACHADO TEJEIRO



Registro de Operación: 097435167
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 17:54:12
Secuencia : 166 Código usuario: 012
Número de producto: 84441009723
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1,610,133.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 1,610,133.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 03/10/2025 Hora: 14:03:34
Jornada: Normal
Oficina: 0984
Terminal: C30984W101
Usuario: C9A
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000097070052234
Titular Producto:
LUIS FERNANDO MUNOZ MURCIA
Vr. Efectivo: \$4,763,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$4,763,000.00
Costo transaccion: \$0.00
No Transaccion: 306758
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
No Id: 901965630
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



Registro de Operación: 113553915
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMavera
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 15/09/2025 Hora: 11:23:48
Secuencia: 406 Código usuario: 011
Número de producto: 84400006251
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1,110,213.00
Valor Cheque: \$ 0.00
Valor Total: \$ 1,110,213.00

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 138212778
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMavera
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:28:06
Secuencia: 125 Código usuario: 012
Número de producto: 84488944231
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1,080,867.00
Valor Cheque: \$ 0.00
Valor Total: \$ 1,080,867.00

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 717652432
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMavera
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:27:29
Secuencia: 172 Código usuario: 012
Número de producto: 84400006251
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 979,600.00
Valor Cheque: \$ 0.00
Valor Total: \$ 979,600.00

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 169547174
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMavera
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:28:36
Secuencia: 128 Código usuario: 012
Número de producto: 84968486569
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 2,470,400.00
Valor Cheque: \$ 0.00
Valor Total: \$ 2,470,400.00

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO


NUMERO: 00000024

FECHA: 15/09/2025

CODIGO	CC NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	1509202 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS	5,005,000.00	
110505001	1	1509202 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS		5,005,000.00
VALOR :		5,005,000.00	SUMAS IGUALES:		5,005,000.00	5,005,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito


Recibio C.C / Nit: 86.051533 Vldro

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000022

FECHA: 30/09/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS	768,000.00	
110505001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS		768,000.00
VALOR :		768,000.00		SUMAS IGUALES:		768,000.00	768,000.00

CBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

1121834340

133

CONSORCIO AGUAS CAITAN 2025 NIT: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U		COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000018 FECHA: 29/09/2025	
---	--	---	--

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501003	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403	GARZON GARCIA WENDY	854,100.00	
110505001	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403	GARZON GARCIA WENDY		854,100.00
VALOR :		854,100.00		SUMAS IGUALES:		854,100.00	854,100.00

OBS: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE OBRAS", CONTRATO N° CPSP-01-2025, DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito


 Recibo C.C / Nit: 1121902403

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000029

FECHA: 30/09/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501003	1	300920	PRESTACION SERVICIOS SEPTIEMBR	86040134	GUZMAN PASTRANA EDWI	1,423,500.00	
110505001	1	300920	PRESTACION SERVICIOS SEPTIEMBR	86040134	GUZMAN PASTRANA EDWI		1,423,500.00
VALOR :		1,423,500.00		SUMAS IGUALES:		1,423,500.00	1,423,500.00

CBS: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio CSC Nit: 86.040.134

Empresa: MUNOZ AREVALO
NIT: 900751966
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL31_AGOSTO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 057000001408

Fecha de envío del pago: 31-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2025

Fecha: 01-09-2025
Hora: 09:45:12
Fecha de Generación: 01-09-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$6,350,750.00	Valor Registros Procesados: \$4,795,250.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,555,500.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00469000200190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,555,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-08-2025
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2025
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,038,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2025
58600018048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2025

135

MUÑOZ AREVALO INGENIERIA S.A.S.

NTT 900.751.968-6

Nome da/das dia 01 a 15 de Setembro de 2 025

NOMINA PERSONA CAG 2026

Nombre del Empleado	Cargo	MÉTODO	DETALLADO						GENERALIZADO						Observación				
			Salario Básico	Auxilio de desempleo	EGARAF	Unidad Monetaria Nacional	Adicional Incentivo al Trabajo	Otro incentivo	Total Dedicación	Sold.	Prestes	Pagos de Subsidios y Prestaciones	Ratificación la Fecha	Apoyos \$S. Prerrogativas Municipales		Corta Duración por día	Total Dedicación	Neto Pagaré	
GOMEZ LEAL LUIS MARCELA	ASISTENTE CONTABLE	1	\$ 1.749.000	15	\$ 874.500	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 974.500	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ 904.500	Se envía despachable da nómina al correo: marta.g13@hotmail.com
MACHADO TEJERO DIVYA YAHIRA	CONTADOR	1	\$ 2.702.200	15	\$ 1.351.100	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.451.100	\$ 64.000	\$ 64.000	\$ -	\$ -	\$ 108.000	\$ 1.343.100	Se envía despachable de nómina al correo: divya_2003@hotmail.com
MURCZ MURCIA JENNY ALEANDRO	CONDUCTOR	5	\$ 2.038.800	15	\$ 1.019.400	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.118.750	\$ 40.800	\$ 40.800	\$ -	\$ -	\$ 81.000	\$ 1.038.150	Se envía despachable de nómina al correo: alejandromurcz@gmail.com
PARADA MARTINEZ GENESIS PAOLA	SECRETARIA	1	\$ 1.423.600	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 764.750	Se envía despachable de nómina al correo: paraapala18@gmail.com
PEREZ PEREZ OBER ASMED (ING)	ALMACENISTA	5	\$ 1.423.600	13	\$ 616.850	\$ 86.667	\$ 94.900	\$ -	\$ 13.333	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750	Se envía despachable de nómina al correo: comperce1979@gmail.com
			\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES			\$ 4.873.900		\$ 486.667	\$ 94.900	\$ -	\$ 13.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.168.850	\$ 168.800	\$ 168.800	\$ -	\$ -	\$ 373.600	\$ 4.785.250	

[illegible]

Total a cargo del empleador:	\$ 1.977.616
------------------------------	--------------

Días de la semana	30
Horas trabajadas en día	7.30

[illegible]

Salario Mínimo Legal Vigente 2.025	\$ 1.423.570
Auxilio de Transporte	\$ 200.000

RIESGO ARL	
Tpo	Yield
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,95%

FECHA ENVIO DESPACHABLES DE NOMINA
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA

POVERAD	POVERAD		
RICAPACIDAD	RICAPACIDAD		
INTELECOMUNICACION	INTELECOMUNICACION	INTELECOMUNICACION	INTELECOMUNICACION
LICERCA	LICERCA	LICERCA	LICERCA
RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES	VACACIONES
Anticipos a 15 días	Anticipos a 15 días	Anticipos a 15 días	Anticipos a 15 días
PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL
PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL	PRESTAMO COMERCIAL

Empresa: MUNOZ AREVALO
NIT: 900751966
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_SEPTIEM
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 15-09-2025
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 15-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$6,350,750.00	Valor Registros Procesados: \$5,596,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$754,750.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,555,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
84100000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MUJ OZ	1,038,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
58600010048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-09-2025
00000003136184167	Ahorros	96193768	OBER ASMED PEREZ	754,750.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	15-09-2025



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNOZ AREVALO

NIT: 900751966

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL30_SEPT
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 05700001408

Fecha: 30-09-2025 Hora: 12:25:56
Fecha de Generación: 30-09-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: pagos826

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$6,337,417.00	Valor Registros Procesados: \$4,040,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,296,917.00


NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0048900200190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	1,555,500.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR30-09-2025 OTRO BANCO	30-09-2025
841000000320	Ahorros	40328285	LINA MARCELA GOMEZ	904,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025
84424812683	Ahorros	40395435	DIVA MACHADO	1,343,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025
84424840296	Ahorros	80013513	ALEJANDRO MU OZ	1,038,150.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025
58600019048	Ahorros	1092394700	GENESIS PAOLA PARA	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025
00000003136184167	Ahorros	96193788	OBER ASMED PEREZ	741,417.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	30-09-2025

7410



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

ANEXO 09. ACTA DE VECINDAD.



FORMATO ACTA DE VECINDAD



Infraestructura

Código: INF-FR-04

Version: 03

Vigencia: 10-01-2025

ACTA DE VECINDAD N° 01

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO/CONVENIO N°

821 DE 2023

Objeto:

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOMÉ DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.

Contratista

CONSORCIO AGUAS GAIFAN 2025

Interventor

CONSORCIO INTERVENTORA AC INDIGENAS 2025

Supervisor

ING. JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO

Tipo de Acta

Predio

Finca

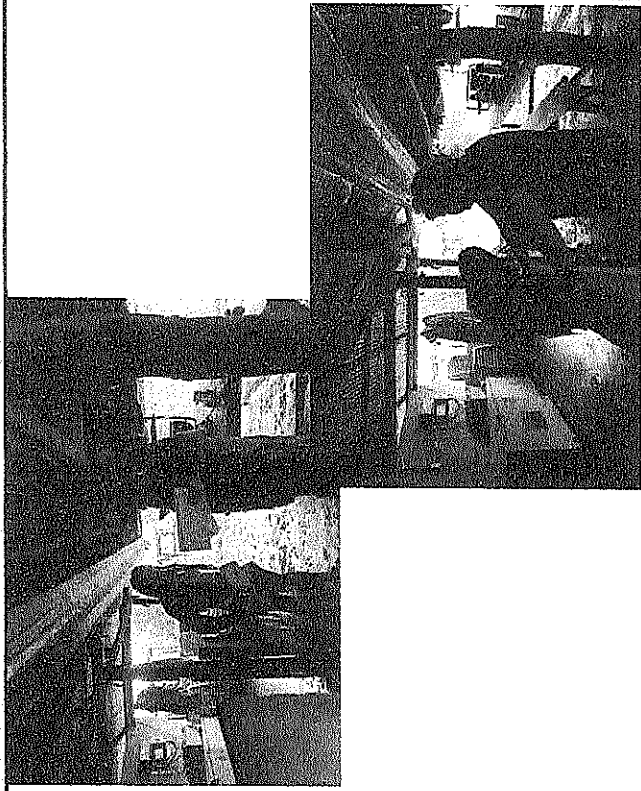
Vías

Sistema

Hoja

De

Registro Fotográfico:



Datos

Nombre del Propietario

Tenedor Responsable

del Predio

Propietario

Atendimiento

Parafirma

CLAUDIA ANONCA COLA

1006946049

Dirección COMUNIDAD LA LAMANA

RESEVABO WACOYO

Alcaldes

SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SERVICIO

SI

NO

OBSERVACIONES

1. Agua

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Telefonos

5. Gas

6. Televisión Cable

ACCESOS VEHICULAR

1. Propia

2. Arrendado

3. Otros

4. Propia

5. Arrendado

6. Propia

7. Arrendado

8. Propia

9. Arrendado

10. Otros

Cuántos:

Uso actual del

Parqueadero

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

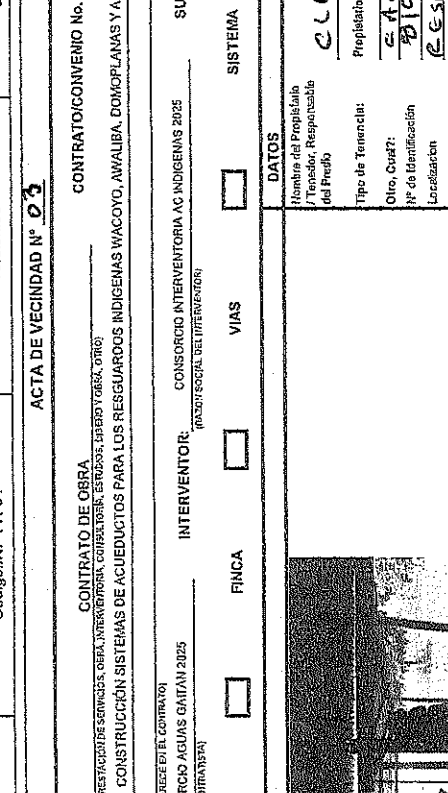
(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIMIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIMIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ANEXA.

FORMATO ACTA DE VECINDAD					
Codigo: INF-FR-04		Infraestructura		Vigencia: 10-01-2025	
Version: 03					
ACTA DE VECINDAD N° 01					
ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD					
REGISTRO FOTOGRAFICO	☒	REGISTRO FILMICO	☐	OTROS	☐
FIRMA	<i>Claudia Concha</i>	FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ANDREA CONCHA	NOMBRE	LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE	JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
C. e. N°	1006946049	C. e. N°	86051533 De Villavicendo	C. e. N°	79134525 De Fontibon
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
ORIGINAL: CONTRATANTE COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR COPIA N° 1: CONTRATISTA COPIA N° 2: INTERVENTORIA					

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA DE VECINDAD			 Puerba Capital	
	Código: INF-FR-04	Infraestructura	Vigencia: 10-01-2025		
ACTA DE VECINDAD N° 02					
ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD					
REGISTRO FOTOGRAFICO	☒	REGISTRO FILMICO	☐	OTROS	☐
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Federico Pomare	NOMBRE	LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE	JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
C. c. N°	1125548342	C. c. N°	86051533 De Villavicencio	C. c. N°	79134525 De Fossilbon
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
ORIGINAL: CONTRATANTE COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR COPIA N° 1: CONTRATISTA COPIA N° 2: INTERVENTORIA					

 ACADEMIA DE PUERTO GAITÁN D.T.A.	FORMATO ACTA DE VEGETAD Infraestructura Vigencia: 10-01-2025	 Puerto Gaitán																																																		
ACTA DE VEGETAD N° 03																																																				
TIPO DE CONTRATO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARCOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META.	CONTRATO/CONVENIO No. _____ (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS, INTERVENCIÓN, CONSULTORÍA, ENTRENAMIENTO Y OTRO) FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO: 021 DE 2025																																																			
OBJETO: CONSTRUCIÓN DE LA OBRA INTERVENCIÓN, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO Y OTRO	SUPERVISOR: ING. JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO DEBE SER COMPLETO DEL SUPLENTE DESIGNADO																																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORA AC INDIGENAS 2025 RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	HOJA _____ DE _____																																																		
TIPO DE ACTA ☐ FINCA ☐ VIAS ☒ SISTEMA ☒ HOJA ☐ DE																																																				
REGISTRO FOTOGRAFICO:																																																				
																																																				
DATOS Nombre del Propietario / Tenedor, Responsable del Predio: _____ Tipo de Tenencia: _____ Otro, Cuál?: _____ Nº de Identificación: _____ Dirección: COMUNIDAD KALIWIRES Localización: _____ Teléfono(s): _____ Alcance(s): _____ Long. de Intervención (m): _____																																																				
SERVICIOS PÚBLICOS EN CASO DE PREDIO O FINCA REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACION <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SERVICIO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Agua</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Alcantarillado</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Energía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Teléfonos</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Gas</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Tratamiento de Aguas</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	1. Agua		X		2. Alcantarillado		X		3. Energía				4. Teléfonos	X			5. Gas		X		6. Tratamiento de Aguas		X																							
SERVICIO	SI	NO	OBSERVACIONES																																																	
1. Agua		X																																																		
2. Alcantarillado		X																																																		
3. Energía																																																				
4. Teléfonos	X																																																			
5. Gas		X																																																		
6. Tratamiento de Aguas		X																																																		
ACCESOS VEHICULARES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">USO ACTUAL</th> <th colspan="3">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Propia</td> <td>X</td> <td>1. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>2. Restricción</td> <td>X</td> <td>2. Arriendo</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>3. Comercial</td> <td></td> <td>3. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>4. Institucional</td> <td></td> <td>4. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>5. Desplazamiento</td> <td></td> <td>5. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>6. Parquadero</td> <td></td> <td>6. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>7. Recreación</td> <td></td> <td>7. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>8. Inst. educativa</td> <td></td> <td>8. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> <tr> <td>9. Otros</td> <td></td> <td>9. Propia</td> <td>2. Arriendo</td> <td>3. Otros</td> </tr> </tbody> </table>			USO ACTUAL		OBSERVACIONES			1. Propia	X	1. Propia	2. Arriendo	3. Otros	2. Restricción	X	2. Arriendo	2. Arriendo	3. Otros	3. Comercial		3. Propia	2. Arriendo	3. Otros	4. Institucional		4. Propia	2. Arriendo	3. Otros	5. Desplazamiento		5. Propia	2. Arriendo	3. Otros	6. Parquadero		6. Propia	2. Arriendo	3. Otros	7. Recreación		7. Propia	2. Arriendo	3. Otros	8. Inst. educativa		8. Propia	2. Arriendo	3. Otros	9. Otros		9. Propia	2. Arriendo	3. Otros
USO ACTUAL		OBSERVACIONES																																																		
1. Propia	X	1. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
2. Restricción	X	2. Arriendo	2. Arriendo	3. Otros																																																
3. Comercial		3. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
4. Institucional		4. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
5. Desplazamiento		5. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
6. Parquadero		6. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
7. Recreación		7. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
8. Inst. educativa		8. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
9. Otros		9. Propia	2. Arriendo	3. Otros																																																
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ADICIONAL.																																																				
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO, FINCA, SERVIDUMBRE, ETC., ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (FAVOR DETALLAR EXISTENCIA DE HUNDIENTOS, GRIETAS, ZONAS INUNDABLES, DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES). SI EL ESPACIO ES INSUFICIENTE, REGISTRAR HOJA ADICIONAL.																																																				

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN		FORMATO ACTA DE VECINDAD		 Puerto Gaitán	
Código: INF-FR-04		Infraestructura		Vigencia: 10-01-2025	
Version: 03		ACTA DE VECINDAD N° 03			
ANEXOS DEL ACTA DE VECINDAD					
REGISTRO FOTOGRAFICO ☒	REGISTRO FILMICO ☐	OTROS ☐			
FIRMA <i>Clemente gaitan</i>	FIRMA <i>8191061</i>	FIRMA <i>8191061</i>			
NOMBRE Clemente gaitan	NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA	NOMBRE JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO			
C. c. N° 86051533 De Villavicendo	C. c. N° 86051533 De Villavicendo	C. c. N° 79134525 De Fontibon			
PROPIETARIO O TENEDOR	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA			
ORIGINAL: CONTRATANTE COPIA N° 1: PROPIETARIO O TENEDOR COPIA N° 1: CONTRATISTA COPIA N° 2: INTERVENTORIA					




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 10. ORDENES DE OPERACIÓN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES

Atendiendo al contenido de Educación Musical solicitamos los

[illegible][illegible]

RESERVACIONES DELAS OPERACIONES

[illegible]

Atendiendo el contrato de Fideucia Mercantil solicitamos los

Attendees will receive:

PA ANT. COTIS AGUAS GASTAN 2025	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]


CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									
CAUSAR Y PAGAR									

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

NOMBRE CARGO	FRASE AUTORIZADA	NOMBRE CARGO	PROCESO
		ELABORÓ	



Industrial Operation



SI	IMPUESTOS					VALOR NETO A SUAR	TIPO DE PAGO	BANCO	N° CUBRA	TIPO	Regim. Criterio	TIPO DE SUBSTITUCIÓN	BONIFICACIÓN FINAL PAGO		CONCEPTO DE PAGO	
	RETECIÓN FUENTE	RETEIVA	RETEIGANTIA	OTROS DEDUCCIONES	NOVIEMBRE 1 6 HT								FEPELLO 2			
	VALOR IVA				14.772.394,00	ACH	Banco del	2690789783	CH	SI	CEUDIL A	41871552	IASIA	DEL CARMEN	FORERO	COMPR DE MATERIALES Y ACCESORIOS
					43.072.263,00	ACH	Banco del	38452837120	CC	SI	HT	90076321	ASCOF S.A.S			COMPR DE MATERIALES Y ACCESORIOS
					6.665.775,00	ACH	Banco del	05070717431	CH	SI	CEUDIL A	66010218	JULIAN	HERNEY	LOZANO	COMPR DE MATERIALES Y ACCESORIOS

VALOR BRUTO	\$	64.650.450,00
VALOR NETO	\$	64.650.450,00

OVERFOLDS	OVERFOLDS
1 PRINCE ALBERTA NOMBRE LUIS FERNANDO MUÑOZ MARCHA CARGO RIL COORDINADOR AGUAS BANTAN 2025	PRINCE ALBERTA NOMBRE JORGE ADELAR LÓPEZ ANDRÉS CARGO RIL COORDINADOR INTERCOMUNICACIÓN AC INDIANAS 2025



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

ANEXO 11. APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIA

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			 Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	Versión: 05	Vigencia: 07/01/2025	

Puerto Gaitán, 27 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 NIT 800.079.035-1 R/L LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 C.C. 86.051.533 de Villavicencio
 Calle 15 No. 40-01 Centro Comercial Primavera Urbana
 Celular 3123143658
Consortioaguasgaitan2025@gmail.com
 Villavicencio Meta

Asunto: ACEPTACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TITULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 (CONTRATO DE OBRA No. 0821 de 2025).

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que ustedes atendieron cabalmente los requerimientos que le hiciere la Administración Municipal contenidos en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Obra No. 0821 de 2025, cuyo objeto es " **CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META** " y de conformidad al Art. 91 de la Ley 1474 de 2011, "En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista" y que, frente a nuestro deber legal de pronunciamos como entidad contratante, debemos indicar que el Municipio de Puerto Gaitán (Meta) por medio la Secretaria de Contratación, responde **POSITIVAMENTE** a la aceptación del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de administración y pagos, para la Administración de los recursos entregados como anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LOS FIDEICOMITENTES DEL CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025.

La mencionada aceptación, se efectúa de conformidad con el Decreto Administrativo No. 001 del siete (07) de enero de 2025, por medio del cual se deroga el Decreto No. 0180 del tres (3) de julio de 2024, y se delegan unas facultades en materia de contratación pública y ordenación del gasto en el municipio de Puerto Gaitán - Meta

Con todo respeto,


ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
 Secretaria de Contratación

Elaboró: Herder Fabián Burgos García	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS SO	Cargo: Secretaria de Contratación	Cargo: Secretaria de Contratación

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT. 800.141.235-0

CERTIFICA:

Que entre Consorcio Aguas Gaitan 2025 y Fiduciaria Popular S.A, se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil; para el manejo de los recursos a título de anticipo del Contrato de Obra No 0821 suscrito el 17 de julio de 2025, entre, Municipio de Puerto Gaitan y Consorcio Aguas Gaitan 2025 cuyo objeto consiste en: "Construcción sistemas de acueducto para los resguardos indígenas Wacoyo, Awaliba, Domoplanas, Aseinpome del Municipio de Puerto Gaitan Meta

Que los recursos objeto del contrato fiduciario, podrá abonarse en la cuenta del Fideicomiso que relacionamos a continuación;

Cuenta de ahorros No 500807651648 del Banco Popular.

A nombre de P.A. ANT CONS AGUAS GAITAN 2025 – FIDUPOPULAR con NIT 830.053.691-8.

Agradecemos remitirnos el soporte de la consignación de los recursos del anticipo para su correspondiente contabilización en la cuenta del Patrimonio Autónomo Anticipo Consorcio Aguas Gaitan 2025, a los correos:

patrica.quintana@fidupopular.com.co; daniela.ortiz@fidupopular.com.co

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 27 de agosto de 2025.

Cordialmente,

Alba Liliana
Landinez Tellez

Firmado digitalmente por
Alba Liliana Landinez Tellez
Fecha: 2025.08.28 08:08:21
+05'00'

Alba Liliana Landinez Tellez
Gerente Regional Zona Centro

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Pureza Natural	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025			INF.FR-14
					Versión: 04
		Contrato de Interventoría			1004 de 2025
		Contrato de Obra Pública			0821 de 2025
CERTIFICACION					

CERTIFICACION
CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No.: No. 821 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS GAITÁN 202

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2025

PERIODO EVALUADO: Del 29 de agosto al 30 de septiembre de 2025

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

1. AVANCE FINANCIERO (PROGRAMADO VS EJECUTADO)


AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 30 SEPT	\$ 1,132,883,754	\$ 1,165,283,191
INVERSION ACUMULADA	\$ 1,132,883,754	\$ 1,165,283,191
ADELANTO EN PROGRAMACION		\$ 32,399,437

2. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que el proyecto presenta un avance de obra física ejecutada del \$1.165.283.191 versus un avance de obra programada del \$ 1.132.883.754, este valor representa en el replanteo de las comunidades indígenas, lo cual fue la actividad que se desarrolló durante el primer mes de ejecución y se realizó en los tiempos establecidos. Se presenta un adelanto en inversión financiera del 0.0286% es decir de \$ 32.399.437.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
	Contrato de Interventoría		Versión: 04
	Contrato de Obra Pública		1004 de 2025

CERTIFICACION CERTIFICACIÓN


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES, Y PEDIALES

Teniendo en cuenta las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, particularmente la establecida en la **CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**, numeral 34. “**EL CONTRATISTA debe realizar los trámites y atender los requerimientos que le realice la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial “La Macarena”-CORMACARENA y las entidades y/o autoridades con las que se tengan permisos, licencias o autorizaciones**”; en mi calidad de Interventor del contrato mencionado, para el periodo comprendido desde el 29 de agosto al 30 de septiembre de 2025, me permito **CERTIFICAR** el cumplimiento de esta obligación en relación a los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas tramitados por el municipio de Puerto Gaitán ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, los cuales se encuentran vigentes y amparan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, conforme a la siguiente relación:

EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	FECHA	VIGENCIA	RESGUARDO INDÍGENA	POZO COMUNIDAD
3.37.2.6.025.001	PS-GJ. 1.2.6.25.0361	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	WACOYO	KALIWIRNAE – ESMERALDA WALABO – PALOGRANDE WALABO – LA UNION – PUNTO GRILLO – ALGARROBO – MATAPALITO – LA PORIFA – LA CAIMANA
3.37.2.6.025.004	PS-GJ. 1.2.6.25.0359	30/04/2025	1 AÑO (VIGENTE)	AWALIBA	MAKAPAY – AWALIBA CENTRAL – PUERTO LOPEZ – PUNTO GRILLO – SAN GIL – FACUNAE
3.37.2.6.025.002	PS-GJ. 1.2.6.25.0416	19/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	DOMOPLANAS	OLIVOS – PARAISO – BUENA VISTA – VILLAMARCIA – LAS BRISAS – CUMARALITO – YATARROBO – CERRITO – PUERTO GAVILAN – LAS DELICIAS – CACHAMITAS
3.37.2.6.025.005	PS-GJ. 1.2.6.25.0369	06/05/2025	1 AÑO (VIGENTE)	ASEINPOME	KEKO ASEINPOME – SIETE RODRIGUEZ

Así mismo, se verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollan dentro del alcance de los permisos otorgados y conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes,


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO

Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND

Director Interventoría - CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION			

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1004 DE 2025**,

CERTIFICO QUE:

El **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META**”, durante el periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil, M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Parque Nacional	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
				Versión: 04
		Contrato de Interventoría	1004 de 2025	
		Contrato de Obra Pública	0821 de 2025	
CERTIFICACION				

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 0821 de 2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:


Durante el periodo comprendido desde el 29 de agosto al 30 de septiembre 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
Director Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025		INF.FR-14
			Versión: 04
			1004 de 2025
	Contrato de Obra Pública		0821 de 2025
CERTIFICACION CERTIFICACIÓN			

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones del **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 0821 de 2025** cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META**”, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito **CERTIFICAR** que:

Durante el periodo comprendido desde el 29 de agosto al 30 de septiembre 2025, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de impactos ambientales.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil. M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025

 ALCALDIA DE PUERTO GAITÁN, META	 <i>Puerto Gaitán</i> Municipio Indígena	CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025			INF.FR-14
					Versión: 04
		Contrato de Interventoría		1004 de 2025	
		Contrato de Obra Pública		0821 de 2025	
CERTIFICACION					

CERTIFICACION

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de septiembre de 2025, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista **CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-SIP-005-2025, el **CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**, identificado con NIT. 901.965.630 - 1 representado legalmente por **LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.051.533, certificamos que se **CUMPLIO** con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de septiembre de 2025. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:


Tabla 1. Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio Agua Gaitan 2025.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	1
CAMION ESTACAS	CHEVROLET	1
EQUIPO DE PERFORACION	PORTADRILL 502, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 5 x 8	1
EQUIPO DE PERFORACION	DEUTZ, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
EQUIPO DE PERFORACION	REO, MOTOR DIESEL, BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER 4 x 6	1
RETROEXCAVADORA	HITACHI	1
RETROEXCAVADORA	CARTERPILLA	1

Fuente: Elaboración propio Consorcio Interventoría AC Indígenas 2025.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2025, para los fines pertinentes.

Cordialmente:


JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO
 Ingeniero Civil M.P. No. 25202- 68120 CND
 Director Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORÍA AC INDÍGENAS 2025
